

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML-00008-2024-71

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Semenářského závodu Týniště nad Orlicí, na základě pověření ze dne 11. 1. 2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Týniště nad Orlicí

číslo účtu: 9707571/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

GAMET elektro, s.r.o.

se sídlem Žižkova 165, 533 03 Dašice

IČO: 259 45 670

DIČ: CZ25945670

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16629

zastoupená: Ing. Lukášem Vajerem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: Ing. Lukáš Vajer, stavbyvedoucí

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 78-9025880287/0100

datová schránka: f537ne6

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00008-2024-71 ze dne 26. března 2024 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Při plnění předmětu Smlouvy o dílo č. SML-00008-2024-71 na zakázce „Sklad šišek, Mrazírenská hala, Luštírna-spojovací most - elektroinstalace - realizace stavebních prací“, evidenční číslo zakázky: S71/2024/012, uzavřené dne 26. března 2024 (dále jen „smlouva“), byla zjištěna a oběma smluvními stranami odsouhlasena potřeba změny rozsahu prací, které nemění celkovou povahu předmětu díla. Změny jsou popsány ve Změnovém listu stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku a zároveň se stává Přílohou č. 2 smlouvy. Z důvodu tam uvedených méněprací a víceprací se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo. Objednatel a zhotovitel uvedli změny oproti původní projektové dokumentaci v zápisech do stavebního deníku.

Rekapitulace nákladů:

Původní cena	Dodatek č. 1		Nová cena
	méněpráce	vícepráce	
785 671,59 Kč bez DPH	4 537,03Kč bez DPH	11 893,81 Kč bez DPH	793 028,37 Kč bez DPH

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na následující změně čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní:

Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 793 028,37 Kč (slovy: sedm set devadesát tři tisíc dvacet osm korun českých třicet sedm haléřů) bez DPH.

3. Smluvní strany se dohodly na doplnění přílohy ke smlouvě, kdy čl. XII. odst. 8 smlouvy se doplňuje o Přílohu č. 2 – Změnový list stavby č. 1.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (jako Příloha č. 2 smlouvy) – Změnový list stavby č. 1

V Týništi nad Orlicí, dne/
dle elektronického podpisu

V Dašicích, dne/
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
[redacted]
[redacted] Semenářského závodu
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Lukáš Vajer
jednatel společnosti
GAMET elektro, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 25.07. 2024	
Název veř. zakázky: Sklad šišek, Mrazírenská hala, Luštírna-spojovací most – elektroinstalace – realizace stavebních prací, evidenční číslo zakázky S71/2024/012			
Zhotovitel: GAMET elektro, s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
Název akce (majetku): xxx	Charakter akce: I N — IP — NP	Číslo objektů: xxx	Stavební díly: xxx
Popis změny: Z důvodu nemožné instalace odpojovačů do rozvaděče 0039 RH (šišky 1NP) bude doplněn nový rozvaděč RH/1. V mrazírenské hale nebude provedena instalace rezervní kabelové trasy včetně jištění z rozvaděče RS1 (č. 0063). Zdůvodnění změny: U rozvaděče 0039 RH (šišky 1NP) bylo při realizaci zjištěno, že konstrukčně nevyhovuje instalaci odpojovačů. Řešeno jinou investiční akcí objednatele.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum: 24 -07- 2024	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: NE
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: 4 537,03Kč N: 0	Bilance: 7 356,78 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 11 893,81 Kč N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně		793 028,37 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		793 028,37 Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno: Ing. Lukáš Vajer jednatel společnosti		Datum: 24 -07- 2024	Podpis:
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 25 -07- 2024	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) 1. kopie listů stavebního deníku 2. fotodokumentace 3. soupis méněprací 4. soupis víceprací			

Poznámka:

Rozvaděč RH

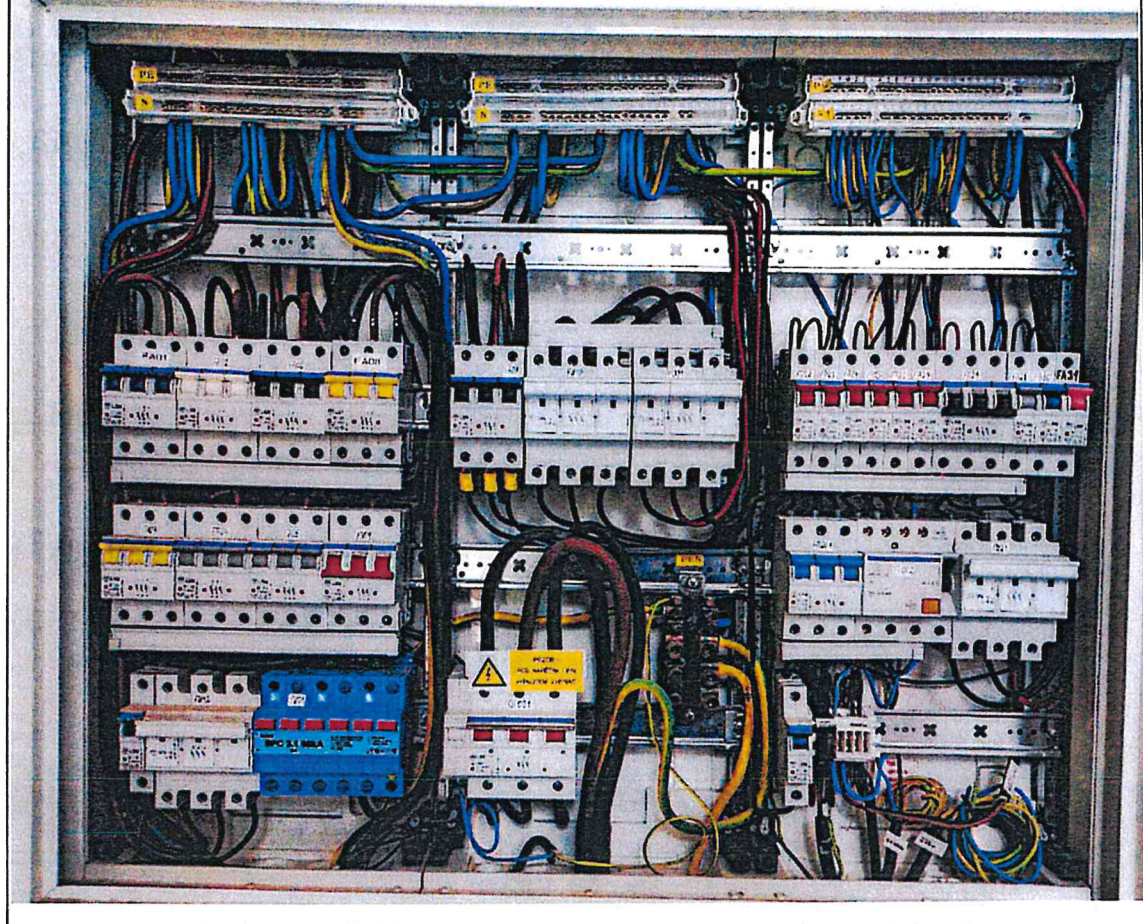

Datum	Denní záznamy stavby
29. 4.	PRACOVNÍCI [REDACTED]
	OD 6 ⁰⁰ DO 14 ³⁰
	POČASÍ: 19 STUPNŮ - PLOJASNO
	PROVÁDĚNÍ PRÍPRAVNÝCH PRACÍ VE SKLADE /
	SÍŤEK - KONSTRUKCE KANCELARIE
29. 4. 24	MONTÁŽ TDO - 822 PRÍPRAVU [REDACTED]
30. 4.	PRACOVNÍCI [REDACTED]
	OD 6 ⁰⁰ DO 14 ³⁰
	POČASÍ: 20 STUPNŮ JASNO [REDACTED]
	PROVÁDĚNÍ PRÍPRAVNÝCH PRACÍ VE SKLADE
	SÍŤEK - KONSTRUKCE KANCELARIE
1. 5.	PRACOVNÍCI [REDACTED]
	OD 6 ⁰⁰ DO 14 ³⁰
	POČASÍ: POKLJASNO 19 STUPNŮ
	MONTÁŽ LÍST, VYPÍNAČŮ A ZASUVIEK V
	KONSTRUKCE KANCELARIE
	POPIS ZASUVIEK VE SKLADE SÍŤEK
3. 5. 24	24. 5. TDO
	BYL DOHODOUZO, ŽE PORVADIE RNSO (LUSTIEU)
	BUDE DOKONČEN UPRAVU, BŔE NUVU MŔSNU
	A ADO ZKONČENÍ SKUTČNÉ PŔEDVŔ
	UPRAVADIEŔŔ 0039 EN (LÍSTY 10P) PRÍ REALIZACI
	BYLO ZNÍŠŤENŔ KONSTRUKCIE LUVU KŔUVIE INSTALACI
	ODPOVOVŔIE. BUDE UPRAVŔENO POZÍCIEŔŔ. SÍŤEK.
	PORVADIEŔ. ZKŔTOUČŔ PŔEDVŔ MŔVŔ 2L
	A ADO ZKONČENÍ SKUTČNÉ PŔEDVŔ
	ADO SCHVŔIEŔ MŔVŔ SVŔŤIDEL DŔE PŔILUV
	26 DŔE 30. 4. 2024

Datum	Denní záznamy stavby
	OBJEDAVATEL POŽADUJE KONSTRUKCI KABEL VÝSTAV JIŠŤENÍ VE RYBIČI BLOK Z DOBYVACÍ RS1 DOČ POZI REALIZACI A PŘEVEDENÍ KUCY JAKO VYŠŠÍHO JÍLOU KONSTRUKCI AKCI. ZKONTROLUJTE PŘÍKAZ ZL. ZKONTROLUJTE PŘÍKAZ RIZIK OD STAVBY
5.5.	PRACOVNÍK: [REDAKCE]
	OD 6⁰⁰ DO 14³⁰ POČASÍ: OBLAČNO A7 STUPNŮ MONTÁŽ TRUBEK A LIST V LUSTIČNĚ NA OHODBĚ. TĚMŽÍ KABELŮ PRO SVĚTLA A ŽÁŘIVKY. ODPOJENÍ ŽÁŘIVKY V KONSTRUKCI KANCELAR DEMONTÁŽ ŽÁŘIVKY
6.5.	PRACOVNÍK: [REDAKCE]
	OD 6⁰⁰ DO 14³⁰ POČASÍ: ZATÍŽENO A7 STUPNŮ MONTÁŽ TRASY PRO KABEL NA ŽÁŘIVKOVOC SKRINĚ NA PASÁŽE PRACOVNÍ MONTÁŽ KABELOVÝCH ŽLÁBKŮ PRO PŘÍLODY K NOVÝM ROZVADĚČŮM NA PRACOVNÍČNĚ
7.5.	KONTROLA STAVBY - BOJ PŘÍPOMÍNA
7.5.	PRACOVNÍK: [REDAKCE]

MÉNĚ PRÁCE

[illegible]

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
Mrazírenská hala								
Uprava rozvaděče RS1 (č. 0063)								
<i>JISTIČE (na DIN lištu)</i>								
<i>min. zkratová odolnost 10kA</i>								
B20/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A	ks	-1,00	576,00	-576,00	312,50	-312,50	888,50	-888,50
ŘADOVÉ SVORKY								
Řadová svorka do 4mm ²	ks	-3,00	12,36	-37,08	12,50	-37,50	24,86	-74,58
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Uprava stavajícího rozvaděče	hod	-2,00		0,00	437,50	-875,00	437,50	-875,00
Uprava rozvaděče RS1 (č. 0063) - celkem				-613,08		-1 225,00		-1 838,08
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
CYKY-J 5x4 mm ² , pevně	m	-29,00	58,80	-1 705,20	31,25	-906,25	90,05	-2 611,45
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
do 6 mm ²	ks	-5,00		0,00	17,50	-87,50	17,50	-87,50
Mrazírenská hala - celkem				-2 318,28		-2 218,75		-4 537,03
Elektromontáže - celkem				-2 318,28		-2 218,75		-4 537,03

VÍCE PRÁCE

[illegible]

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Rozvaděč RH/1 (sklad šišek)								
<i>PLASTOVÝ ROZVADĚČ zapuštěný IP30</i>								
Rozvodnice nástěnná, 4-řadá, 48 mod., IP30	ks	1,00	5 315,55	5 315,55	572,00	572,00	5 887,55	5 887,55
Ostatní montážní materiál	ks	1,00	600,00	600,00	150,00	150,00	750,00	750,00
ŘADOVÉ SVORKY								
Řadová svorka do 6x35mm ²	ks	3,00	158,40	475,20	132,00	396,00	290,40	871,20
<i>VODIČ PRO PROPOJOVÁNÍ</i>								
CY16, pevně	m	12,00	55,81	669,72	39,82	477,84	95,63	1 147,56
Rozvaděč RH/1 (sklad šišek) - celkem				7 060,47		1 595,84		8 656,31
Dodávky								
Rozvaděč RH/1 (sklad šišek)	ks	1,00	8 656,31	8 656,31		0,00	8 656,31	8 656,31
Dodávky - celkem				8 656,31		0,00		8 656,31
Elektromontáže								
Sklad šišek								
<i>MONTÁŽ ROZVODNIC</i>								
Do 50 kg	ks	1,00		0,00	612,50	612,50	612,50	612,50
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
Demontaz stávajícího zařízení	hod	1,00		0,00	437,50	437,50	437,50	437,50
Napojení na stávající zařízení	hod	1,00		0,00	437,50	437,50	437,50	437,50
Zkusební provoz	hod	0,50		0,00	437,50	218,75	437,50	218,75
Zabezpečení pracoviště	hod	0,50		0,00	437,50	218,75	437,50	218,75
Stavební přípomoc, sekání	hod	3,00		0,00	437,50	1 312,50	437,50	1 312,50
Sklad šišek - celkem				0,00		3 237,50		3 237,50
Elektromontáže - celkem				0,00		3 237,50		3 237,50

Indexy dle Smlouvy o dílo čl. III. odst. 4

Číslo rozpočtového dílu	nabídková cena dílu (GARMET)	ceníková cena dílu (z rozpočtu PD)	index
dodávka	134 734,35	152 868,27	0,88
elektromontáže	635 824,74	803 913,24	0,79
stavební práce	15 112,50	44 917,50	0,34
			#####

Celé dílo		
nabídková cena dílu (Garmet)	ceníková cena za celé dílo (z rozpočtu PD)	index
785 671,59	1 001 699,00	0,78

Doplňeny ceny projektantem dle ceníku Verox

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Rozvaděč RH/1 (sklad šišek)								
<i>PLASTOVÝ ROZVADĚČ zapuštěný IP30</i>								
Rozvodnice nástěnná, 4-řadá, 48 mod., IP30	ks	1,00	6 040,40	6 040,40	650,00	650,00	6 690,40	6 690,40
Ostatní montážní materiál	ks	1,00	600,00	600,00	150,00	150,00	750,00	750,00
ŘADOVÉ SVORKY								
Řadová svorka do 6x35mm ²	ks	3,00	180,00	540,00	150,00	450,00	330,00	990,00
<i>VODIČ PRO PROPOJOVÁNÍ</i>								
CY16, pevně	m	12,00	63,42	761,04	45,25	543,00	108,67	1 304,04
Rozvaděč RH/1 (sklad šišek) - celkem				7 941,44		1 793,00		9 734,44
Dodávky								
Rozvaděč RH/1 (sklad šišek)	ks	1,00	9 734,44	9 734,44		0,00	9 734,44	9 734,44
Dodávky - celkem				9 734,44		0,00		9 734,44
Elektromontáže								
Sklad šišek								
MONTÁŽ ROZVODNIC								
Do 50 kg	ks	1,00		0,00	612,50	612,50	612,50	612,50
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Demontaz stávajícího zařízení	hod	1,00		0,00	437,50	437,50	437,50	437,50
Napojení na stávající zařízení	hod	1,00		0,00	437,50	437,50	437,50	437,50
Zkušební provoz	hod	0,50		0,00	437,50	218,75	437,50	218,75
Zabezpečení pracoviště	hod	0,50		0,00	437,50	218,75	437,50	218,75
Stavební přípomoc, sekání	hod	3,00		0,00	437,50	1 312,50	437,50	1 312,50
Sklad šišek - celkem				0,00		3 237,50		3 237,50
Elektromontáže - celkem				0,00		3 237,50		3 237,50

III. 4. b) 1. nejsou-li příslušné práce a ceny v ř
SOD

III. 4. b) 1. nejsou-li příslušné práce a ceny v ř

III. 4. b) 1. nejsou-li příslušné práce a ceny v ř

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

III. 4. c) není-li cena nové položky v ceníku uv

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 24. července 2024 10:51
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: {EXTERNÍ ODESÍLATEL} RE: Lesy CR

Dobrý den,
zasílám jednotkové ceny, včetně montáže:

	materiál	montáž
1) Rozvodnice nástěnná, 4-řadá, 48 mod., IP30 – Hager FWU41S(ks)	6040,40 Kč	650,- Kč
2) Řadová svorka do 6x35mm2 - BEČOV 3xRSA35+Koncovka+propojovací díl(ks)	180,00 Kč	150,- Kč
3) CY16, pevně – DRAKA H07V-U 16(m)	63,42 Kč	45,25 Kč

- položka stavební přípomoc – sekání není uvedena v ceníku Verox

S pozdravem

[REDACTED]
530 02 Pardubice

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, July 23, 2024 9:59 AM
To: [REDACTED]
Subject: FW: {EXTERNÍ ODESÍLATEL} RE: Lesy CR

Dobrý den,
Dovoluji si Vás požádat o zjištění ceníkové ceny u níže označených položek. Děkuji.

S pozdravem

[REDACTED]
Lesy České republiky, s.p.
Semenářský závod
Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí
www.lesycr.cz
www.semenarskyzavod.cz



Hospodaříme v souladu se standardy trvale udržitelného hospodaření.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp). V případech, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal Compliance Programem, je možné takové jednání oznámit (www.lesycr.cz/ccp).

From: GAMET elektro, s.r.o. [REDACTED]
Sent: Tuesday, July 23, 2024 9:38 AM
To: [REDACTED]
Subject: {EXTERNÍ ODESILATEL} RE: Lesy CR


Dobrý den paní [REDACTED]

Zasílám doplněné položky:

PLASTOVÝ ROZVADĚČ zapuštěný IP30	
Rozvodnice nástěnná, 4-řadá, 48 mod., IP30 – Hager FWU41S	ks
Ostatní montážní materiál	ks
ŘADOVÉ SVORKY	
Řadová svorka do 6x35mm ² - BEČOV 3xRSA35+Koncovka+propojovací díl	ks
VODIČ PRO PROPOJOVÁNÍ	
CY16, pevně – DRAKA H07V-U 16	m

Děkuji.

S pozdravem



GAMET elektro, s.r.o.
Žižkova 165, Dašice



From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, July 23, 2024 7:47 AM
To: GAMET elektro, s.r.o. [REDACTED]
Subject: Lesy CR

Dobrý den,
Dovoluji si připomenout včerejší dohodu. Prosím Vás o zaslání výrobců k položkám víceprací – označených poznámkou c).....
Děkuji.

S pozdravem

S pozdravem

