



MHMPXPOXGJ93

Dodatek č. 2 k SoD

k provedení stavby č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/007746/2023

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního

dále jen jako „**Objednatel**“

pro vybrané činnosti dle Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):

Sdružení CM-QM

Contract management, a.s. (správce)

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 05306035

a

QM-4C, s.r.o.

se sídlem: Jeronýmova 62/24, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec
IČO: 09686380

dále jen jako „**Příkazník**“

a

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.

se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, sp.zn. C 2362
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 4012303031/0100
zastoupena: Evou Smolíkovou a Ing. Milošem Smolíkem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Předmětem Dodatku č. 2 se v souladu s článkem 4. Změny díla (odstavec 4.3. Smluvní změny Díla) a v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ mění původní předmět plnění Smlouvy o Dílo (včetně Dodatku č. 1) o tyto vícepráce:

Změnový list č. 6: Změny SO 02 Odvodnění komunikace

- Do doby spuštění nové SK je nutné umožnit vypouštění z domovní čistírny č.p. 2632/23 do nové DK. Je potřeba přípojka pod novou RN.

Tato změna bude mít dopad do ceny jako vícepráce 152 204,28 Kč bez DPH.

Změnový list č. 7: Změny SO 03 Komunikace

- Kvůli výškovému rozdílu u č.p. 2612/19 je potřeba provést palisádu, provést obrubník u č.p. 4155/1, schody u č.p. 1947/10, úprava příčného sklonu u č.p. 1947/10, chránička u č.p. 2852, obnova zabetonovaného odvodňovacího žlabu, obnova stávajících zaasfaltovaných UV, přeložka sdělovacího vedení, které je v kolizi s novými konstrukcemi vrstvami, chráničky veřejného rozhlasu v místě křížení s komunikací a u č.p. 2165/16.

Tato změna bude mít dopad do ceny jako vícepráce 438 360,03 Kč bez DPH.

Změnový list č. 8: Změny SO 01 Splašková kanalizace

- PVK požaduje vydláždit plochu nad budovanou ČS, bude větší pilíř technologie ČS, potrubí VZT DN 200 bude staženo až k hladině, prostupy budou provedeny v počtu a profilech dle požadavku PVK, v místě napojení na stávající kanalizaci je nutné provést novou kanalizační šachtu.

Tato změna bude mít dopad do ceny jako vícepráce 171 417,56 Kč bez DPH.

Změnový list č. 9: Změny SO 01 Splašková kanalizace

- Dle geologického posudku vyplynulo, že některých částech úseku I jsou místo očekávané tř.t. II/3 práce prováděny v horninách II/4,5 a III/6. Dále je potřeba upravit výsledná spád, aby byl menší než 5%.

Tato změna bude mít dopad do ceny jako vícepráce 756 100,77 Kč bez DPH.

Změnový list č. 10: Změny SO 01 Splašková kanalizace

- Ve výkazu výměr nebylo (na rozdíl od projektové dokumentace) počítáno s vybouráním stávajících povrchů a jejich obnovou na pozemku č.p. 4200/27. Dále bude na základě schválení investora obnovena obrusná vrstva v plné šíři komunikace. Při bourání bylo zjištěno, že celková tloušťka je 35 cm.

Tyto změny bude mít dopad do ceny jako vícepráce 1 031 419,01 Kč bez DPH.

Změnový list č. 11: Změny SO 01 Splašková kanalizace

- V úseku šachet Š 1-22 stoky I se počítalo s obnovou stávajících podkladních vrstev komunikace. Po sfrézování se ukázalo, že v některých částech komunikace nejsou prakticky žádné podkladní vrstvy a obrusná vrstva leží na hlíně.

Tato změna bude mít dopad do ceny jako vícepráce 562 061,95 Kč bez DPH.

Změnový list č. 12: Změny SO 01 Splašková kanalizace

- TSK trvá na svém požadavku ze stanoviska k SP, které projektant nezohlednil, a to na obnovení obnovu pokryvu v ulici Ve Žlábku v celé šíři a nejen v místě výkopu.

Tato změna bude mít dopad do ceny jako vícepráce 854 938,13 Kč bez DPH.

Změnový list č. 13: Změny SO 01 Splašková kanalizace

- V místě výkopu budoucí ČS je dle geologického posudku jiná třída těžitelnosti. Práce probíhají za výrazného přítoku spodní vody a je nutné neustálé odčerpávání.

Tato změna bude mít dopad do ceny jako vícepráce 339 739,66 Kč bez DPH.

Změnový list č. 14: Změny SO 01 Splašková kanalizace

- Dle geologického posudku vyplynulo, že některých částech úseku 2 jsou místo očekávané tř.t. II/3 práce prováděny v horninách II/4,5 a III/6. Dále je potřeba upravit výsledná spád, aby byl menší než 5%.

Tato změna bude mít dopad do ceny jako vícepráce 102 549,14 Kč bez DPH.

Změnový list č. 15: Změny SO 01 Splašková kanalizace

- Oproti předpokladům v zadávací dokumentaci je hladina spodní vody výrazně výše. Začíná asi 1 m pod úrovní terénu a tím pádem je nutné neustále odčerpávat přítékající vodu v množství výrazně vyšším, než předpokládala dokumentace a na delší vzdálenosti.

Tato změna bude mít dopad do ceny jako vícepráce 245 647,00 Kč bez DPH.

Změnový list č. 16: Změny SO 01 Splašková kanalizace

- Na základě požadavku budoucího správce PVK je nutné zvětšit profil ukliďovací šachty výtlačku splaškové kanalizace na DN 1200, na dně čerpací jímky provést betonové bloky a dno musí být z čediče (ve VV jsou všechna dna betonová).

Tato změna bude mít dopad do ceny jako vícepráce 86 394,01 Kč bez DPH.

Změnový list č. 17: Změny SO 02 Odvodnění komunikace

- Severně od větve 3 se mají provést terénní vykopávky a výkop vodoteče k odvodnění této části komunikace. Dle provedených sond jsou zde tvrdší horniny, než předpokládal VV. Práce tedy nebudou prováděny v očekávané tř.t. II/3 práce, ale v horninách II/5 a III/6.

Tato změna bude mít dopad do ceny jako vícepráce 534 238,12 Kč bez DPH.

Změnový list č. 18: Změny SO 01 Splašková kanalizace

- Při realizaci splaškové kanalizace stoky 2 došlo ke kolizi se stávajícími přípojkami uličních vpustí komunikace Ve Žlíbku. Původní výkop byl kompletně vybetonován až do podkladních betonů komunikace. Bude nutná obnova přípojek i těles vpustí.

Tato změna bude mít dopad do ceny jako vícepráce 302 787,84 Kč bez DPH.

Změnový list č. 19: Změny SO 01 Splašková kanalizace

- Při realizaci splaškové kanalizace stoky 2 došlo za šachtou Š25 ke kolizi se ocelovými chráničkami vedení vysokého napětí. Chráničky jsou přímo v trase kanalizace. Je tedy nutné úsek od Š24 po Š25 vykopat a vybourat část již realizované kanalizace a kanalizaci zahloubit, aby chráničky podešla. Od šachty Š26 dojde k překročení 5% podélného spádu, takže bude nutné použít čedičová dno.

Tato změna bude mít dopad do ceny jako vícepráce 533 743,10 Kč bez DPH.

Změnový list č. 20: Změny SO 03 Komunikace a SO 02.1 Přípojky odvodnění

- SO 03 Komunikace – Niveleta plánovaného chodníku jde pod úrovní stávajícího terénu, přičemž přiléhající zeď v havarijním stavu nemá žádný základ. Je nutné ji v délce 21 m zbourat. Dále jsou v trase budoucího chodníku mělce uložené kabely NN – je nutné je odkopat, spustit níže a vytvořit zadní opěru dlažby chodníku.

- **SO 02.1 Přípojky odvodnění** Dle požadavku MČ je třeba na větvi 2 vytvořit v místě začátku obytné zóny zpomalovací retardér, dále u vjezdů u parc.č. 301 a 298 doplnit obrubu, aby bylo o co opřít dlažbu vjezdů a na větvi 1 doplnit svislé dopravní značení.
- **SO 02.1 – Odvodnění komunikace** – Na větvi 3 je nutné místo pískového obsypu kompletně zabetonovat přípojky odvodnění UV 1-3 a UV 3-3.

Tyto změny budou mít dopad do ceny jako vícepráce 237 621,36 Kč bez DPH.

Celková cena změn dle ZL 6-20 činí 6 349 221,96 Kč bez DPH, tj. 16,29 % z původní ceny Díla.

ZL číslo / cena v Kč bez DPH	Méněpráce	Vícepráce	Celkem
ZL 6		152 204,28	152 204,28
ZL 7		438 360,03	438 360,03
ZL 8	11 120,00	182 537,56	171 417,56
ZL 9	103 548,57	859 649,34	756 100,77
ZL 10		1 031 419,01	1 031 419,01
ZL 11		562 061,95	562 061,95
ZL 12	275 655,60	1 130 593,73	854 938,13
ZL 13	168 790,18	508 529,84	339 739,66
ZL 14	15 117,10	117 666,24	102 549,14
ZL 15		245 647,00	245 647,00
ZL 16	19 948,00	106 342,01	86 394,01
ZL 17	22 208,02	556 4469,14	534 238,12
ZL 18		302 787,84	302 787,84
ZL 19		533 743,10	533 743,10
ZL 20	12 228,67	249 850,03	237 621,36
CELKEM	628 616,14	6 977 838,10	6 349 221,96

1.2. Cena díla

Z důvodu výše uvedeného se mění cena díla dle čl. 6 Cena Díla. odst. 6.1 Smlouvy takto:

	Změna ceny	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena díla dle SOD	38 970 000,00 Kč	8 183 700,00 Kč	47 153 700,00 Kč
Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1	40 758 914,81 Kč	8 559 372,11 Kč	49 318 286,92 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2	6 349 221,96 Kč	1 333 336,61 Kč	7 682 558,57 Kč
Nová cena díla včetně Dodatku č. 2	47 108 136,77 Kč	9 892 708,72 Kč	57 000 845,49 Kč

Platební podmínky zůstávají beze změny.

V návaznosti na změnu ceny Díla se upravuje příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě – Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů a nahrazuje se přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

1.3. Ustanovení v Části V., odstavci 8., pododstavci 8.3. se ruší a nově zní takto:

Lhůta pro dokončení díla: do 31. 12. 2024.

1.4.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 2.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o dílo vč. tohoto Dodatku č. 2 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení této smlouvy, datu jejího podpisu a textu této smlouvy. Výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o dílo vč. tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 2.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku č. 2 a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to dnem připojení posledního z nich.
- 2.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č. 2 obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
- 2.6. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí hl. m. Praha.
- 2.7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 2.
- 2.8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1716 ze dne 12. 8. 2024 o svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 2 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Příloha č. 2 - Změnové listy č. 6 - 20

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: _____

Jméno: Ing. arch. Tomáš Veselý

Funkce: zástupce ředitele Magistrátu pro
sekcí rozhodování o území, pověřen řízením
odboru investičního

ZHOTOVITEL

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.,
zkratka EKIS, spol. s r.o.

Eva Smolíková

Podpis: _____

Jméno: Eva Smolíková

Funkce: jednatelka společnosti

Digitálně podepsal Eva

Smolíková

Datum: 2024.08.22 09:25:20

+02'00'

Miloš

Smolík

Podpis: _____

Jméno: Ing. Miloš Smolík

Funkce: jednatel společnosti

Digitálně podepsal

Miloš Smolík

Datum: 2024.08.22

13:00:07 +02'00'

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)			
		MČ	PVS	THMP	
1	2	3	4	5	6
SO 01 Splašková kanalizace	22 775 751,48		22 775 751,48		
SO 01.1 Kanalizační přípojky	1 967 503,73		1 967 503,73		
SO 02 Odvodnění komunikace	5 882 797,13	5 882 797,13			
SO 02.1 Přípojky odvodnění	348 602,90	348 602,90			
SO 03 Komunikace	13 842 558,42	13 842 558,42			
SO 04 Veřejné osvětlení	224 337,45			224 337,45	
PS 01.1 Elektrotechnická část čerpací stanice	578 393,00		578 393,00		
PS 01.2 Strojní část čerpací stanice	615 580,80		615 580,80		
901 VON	872 611,86	395 940,97	472 693,36	3 977,53	
Celkem zákl. cena	47 108 136,77	20 469 899,42	26 409 922,37	228 314,98	
DPH 21 %	9 892 708,72	4 298 678,88	5 546 083,70	47 946,15	
Cena stavby vč. DPH	57 000 845,49	24 768 578,30	31 956 006,07	276 261,13	

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavčtině				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 6	
Komu: INV MHMP				Datum: 19.12.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně	
Týká se:		SOD č. DIL/21/08/007746/2023			
Odkazy: na specifikaci:		Obnova stávajícího stavu			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval: zhotovitel			
na jinou část smlouvy:					
kategorizace položek:					
Změna 02- SO 02 Odvodnění: 02 - SO 02 Odvodnění - v průběhu realizace stavby dostal objednatel-stavebník od vlastníka objektu č.p.2632/23 informaci, že do stávajícího trativodu, napojeného do dešťové kanalizace, je legálně povoleno vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovní čistírny č.p. 2632/23. Protože trasa nového řádu D1 dešťové kanalizace jde v trase stávajícího trativodu, tak bude při provádění výstavby řádu D1 tento trativod zrušen. Do doby zkolaudování SK a možnosti vypouštění do SK je nutné provést a zachovat vypouštění z domovní čistírny č.p. 2632/23 do nové DK. A protože v místě stávající přípojky je plánována nová retenční nádrž, tak je nutné provést z DK novou přípojku, která se do potrubí DK napojuje pod RN. Tato přípojka bude křížit stávající síť – vodovod, plynovod, silnoproudy a slaboproudy tj. práce budou prováděny v ochranném pásmu těchto sítí a v silně zvodnělé zemině.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: stávajícím stavem					
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).					

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č.6											
NOZ zpracoval: Ing. Zwiener, EKIS, spol. s r.o.			Datum: 19.12.2023											
NOZ č. 6 navazuje na:	OZ č. 6	PZ č.	PI. č.:											
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně										
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007746/2023 předkládám návrh úpravy dohodnuté ceny díla zpracované v návaznosti na rozpočtové podklady: Příloha k NOZ č.6 – Soupis prací Cena stavebních prací <table> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>152 204,28-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>152 204,28-Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>31 962,90-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>184 167,18-Kč</td> </tr> </table> V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. /21/08/007746/2023 Zhotovitel provedl Neodkladnou změnu dle čl. 5, zpracoval a předložil Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provedl kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD. Počet listů příloh: 2 listy ZL č.6					Cena přípočty	152 204,28-Kč	Cena odpočty	0,00-Kč	Cena celkem	152 204,28-Kč	DPH 21 %	31 962,90-Kč	Cena včetně DPH	184 167,18-Kč
Cena přípočty	152 204,28-Kč													
Cena odpočty	0,00-Kč													
Cena celkem	152 204,28-Kč													
DPH 21 %	31 962,90-Kč													
Cena včetně DPH	184 167,18-Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 152 204,28- Kč (stopadesát dvatisíc dvěstě čtyřikorundva setosmá línů) (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0,5 měsíce												
Datum: 21.12.2023	Datum:	Datum:	Datum:											

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně

FO 03

POTVRZENÍ ZMĚNY

PoZ č. 6

PoZ vystavil:

Datum:

PoZ č. na NOZ č. 6

na jiný dokument:

Odesláno/

předáno:

osobně

Podpsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Změny v navrhovaném Dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007746/2023 jsou ve smyslu § 222 odst. 6) zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ, nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 152 204,28-Kč bez DPH tj. 0,39%, odpočty činí: 0,-Kč bez DPH tj. 0%, připočty činí: 152 204,28-Kč bez DPH tj. 0,39% ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.

Cena změny dle NoZ1, NoZ 2, NoZ3, NoZ4, NoZ5, NoZ6 je 1 941 119,09-Kč bez DPH tj. 4,98% ceny díla bez DPH.

Počet připojených listů

specifikací: 2 listy ZI. č.6

Počet připojených výkresů:

Změna ceny díla (bez DPH):

152 204,28-Kč

Změny lhůty dokončení díla:

0,5 měsíc

Nová cena díla (bez DPH):

40 911 119,09-Kč

Nová lhůta dokončení díla:

14,5 měsíců

Důvod ke změně:

Požadavky objednatele.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Poznámka:

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 7	
Komu: INV MHMP				Datum: 27.3.2024	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně	
Týká se:		SOD č. DIL/21/08/007746/2023			
Odkazy: na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval: zhotovitel			
na jinou část smlouvy:					
kategorizace položek:					
03 - SO 03 Komunikace – v souvislosti s realizací komunikace bude nutné provést následující úpravy: - vyrovnat výškový rozdíl mezi komunikací a vstupem do č.p. 2612/19 umístěním palisády za obrubou a změněním nivelety přilehlého nově budovaného chodníku, - po prořezání vegetace bylo zjištěno, že stávající oplocení pozemku 4155/1 nemá podezdívku. Dodatečně vložit obrubník, který bude sloužit jako oporu pro dlažbu chodníku, - vjezdy č.p. 2852, 1947, 2626 je třeba přizpůsobit skutečnosti na stavbě a vstup č.p. 1947/10 připojit ke komunikaci schody; - u č.p. 1947/10 upravit příčný sklon komunikace, aby bylo možné zajistit bezpečný vjezd vozidla, - na hranici vjezdu k č.p. 2590/1 vůči sousednímu pozemku provést výraznou podbetonávku obrubníků, - pod vjezdem k č.p. 2852 je nutná ochrana stávajícího silového kabelu NN veř. osvětlení chráničkou - obnovit zabetonovaný odvodňovací žlab v drátkobetonu na rozhraní pozemku Hl. m. Prahy a Nomie (4200/27). Po realizaci splaškové kanalizace stoky 1 a dešťové kanalizace řad D1 bude vybouraný žlab zpětně obnoven, - po odfrézování původního asfaltového krytu komunikace nad stokou 2 se zjistilo, že pod asfaltem jsou staré uliční vpusti. Na základě požadavku MČ Praha 20 budou vpusti, včetně přípojek obnoveny. V SZ rohu stavby – u křižovatky větve 3 komunikace a komunikace Ve Žitbku se stávající komunikace rozšiřuje na 7m a zároveň zde vzniká chodník šířky 5,5m. Při provádění sond ke zjištění skutečného průběhu stávajících sítí bylo zjištěno, že stávající sdělovací vedení by kolidovalo s nově budovanými konstrukčními vrstvami komunikace a chodníku. Sdělovací vedení bude nutné přeložit do větší hloubky. Provést ochranu stávajících kabelů veřejného rozhlasu v místě křížení s komunikací a pod vjezdy č.p. 2165/16 dle požadavku MČ Praha 20. Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: stávajícím stavem, požadavkem MČ Praha 20					
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).					

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně	FO 2
---	------

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY	NOZ č.7
------------------------	---------

NOZ zpracoval: Ing. Zwiener, EKIS, spol. s r.o.	Datum: 27.3.2024
---	------------------

NOZ č.7 navazuje na:	OZ č. 7	PZ č.	PL č.:
----------------------	---------	-------	--------

Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
--------------------	--------	--	--------

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. **DIL/21/08/007746/2023** předkládáme návrh úpravy

dohodnuté ceny díla zpracované v návaznosti na rozpočtové podklady:

Příloha k NOZ č.7 – Soupis prací

Cena stavebních prací

Cena přípočty	438 360,03-Kč
Cena odpočty	0,00-Kč
Cena celkem	438 360,03-Kč
DPH 21 %	92 055,60-Kč
Cena včetně DPH	530 415,63-Kč

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. /21/08/007746/2023 Zhotovitel provedl Neodkladnou změnu dle čl.5 , zpracoval a předložil Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provedl kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.

Počet listů příloh: 8 listů ZI. č.7

Navrhovaná změna ceny díla (slovy):	Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:
438 360,03- Kč (čtyřístatřicet osm tisíc šest set šedesát korun a tři halíře) (bez DPH)	0,5 měsíce

-------------	--	--	--

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č.7

Strana 01/1

TV Horní Počernice, zastup. 0034 V Slavětíně, opr.3

Objekt

Místo

Praha 9 Horní Počernice, V Slavětíně

Datum: 12.03.2024

Zpracovatel:

Hl.m.Praha INV

Zpracovatel:

EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel: Zwiener

Kód díla - Popis

Cena celkem [CZK]

Odpočty

Připočty

Náklady celkem bez DPH

438 360,03

Náklady celkem bez DPH - připočty

438 360,03

Náklady celkem bez DPH - odpočty

0,00

438 360,03

03 - SO 03 Komunikace - palisáda před vstupem do č.p.2812/19; obrubník severně od pozemku 4155/1 jako opora pro dlažbu chodníku, vjezdy č.p. 2852, 1947, 2626, schody do vstupu č.p. 1947/10, úprava apádu komunikace z důvodů vjezdu č.p. 1947/10, vyrovnání výškového rozdílu na hranici vjezdu č.p. 2590/1

162 090,39

0,00

162 090,39

03 - SO 03 Komunikace - chránička stáv.kabelu pod vjezdem č.p. 2852

6 526,03

0,00

6 526,03

03 - SO 03 Komunikace - obnova stávajícího žlabu

52 659,08

0,00

52 659,08

03 - SO 03 Komunikace - obnova stávajících zaasfaltovaných UV

84 486,65

0,00

84 486,65

02.1 - SO 02.1 Přípojky odvodnění - obnova stávajících 3UV dl. 2,1+2,2+2,4bm

49 795,62

0,00

49 795,62

03 - SO 03 Komunikace - přeložka stávajících sdělovacích kabelů

36 467,97

0,00

36 467,97

03 - SO 03 Komunikace - dle požadavku MC P20 z KD dne 18.9.2023 ochrana stáv.kabelu veřejného rozhlasu v místě křížení s komunikací a pod vjezdy č.p.2165/16

46 334,29

0,00

46 334,29

SOUPIS PRACÍ

Strana 53

TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně, opr.3 - ochrana stáv.kabeľu ve vjezdu č.p. 2852

Místo: Praha 9 Horní Počernice
Zakazatel: Hlavní město Praha
Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

Datum: 26. 8. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Pr.	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 526,03

0	M		Práce a dodávky M					
0	46-M		Zemní práce při elektr. mont. pracích					
1	K	460161412	Řezání kabelových rýh ručně š 55 cm hl 50 cm v hl. 3 skupiny 3					
			2,8*2*0,5					
2	K	460241111	Připravení za zřízení vykopávek při elektromontážích v tlakové podzemní vodě					
			0,5*0,65*(2,8+2*0,5)					
3	K	460212221	Provázání a zajištění kabelů ve výkopech při jejich soubo					
			2,8*2*0,5					
4	K	460131432	Zásyp kabelových rýh ručně š 55 cm hl 50 cm v hl. 3 skupiny 3					
			2,8*2*0,5					
5	K	460571113	Výslovná práce pro křiží kabelů šířky 34 cm					
			2,8*2*0,5					
6	K	460742131	Osažení kabelových prolupů a imit. plastových do rýh obestavením průměru do 10 cm					
			2,8*2*0,5					
7	M	34571098	Trubka elektroinstalční ochranná (chráňka) Ø 30g/10m H40E					
			(2,8+2*0,3)*1,05					
8	K	460981111	Práce a mont. pro pumocné složení práce při elektromontážích					

SOUPIS PRACÍ

Klient:

Stavba č.3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slávetině - obnova odvodňovacího žlabu

Objekt:

Stavba:

Číslo:

Hlavní Právník

EKIS, spol. s r.o.

03.01.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Projekt IV

Zwierer

PO	Typ	Kód	Popis	TAJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za m2
----	-----	-----	-------	-----	----------	--------------	-------------------	------------

Náklady soupisu celkem

52 559,00

0	HSV		Práce a dodávky HSV					
0	9		Ústřední konstrukce a práce, bourání					
1	K	035113171	Odsazení odvodňovacího polymerního žlabu s krycími deskami šířky do 200 mm					
2	M	40227101	Práce odstraňování z polymerního žlabu směrem dole povrchová vrstva s 10mm					
3	K	035823216	Odsazení vpruhy pro odvodňovací žlab betonový nebo překrytí betonový s krycími deskami šířky do 200 mm					
4	M	59727021	Ústřední práce záděvek a žlabů odvodňovacího žlabu polymerního betonového žlabu s 10mm					
5	M	56241370	Práce na odvodňovací žlabu šířky do 200 mm s 10mm					
6	M	56241371	Práce na odvodňovací žlabu šířky do 200 mm s 10mm					
7	M	56260000	Práce na odvodňovací žlabu šířky do 200 mm s 10mm					
8	M	59727070	Práce na odvodňovací žlabu šířky do 200 mm s 10mm					
90	K	016291121	Práce pod úroveň žlabu, krajníky nebo odvodňovací žlabu z betonu nebo železobetonu (práce odvodňovací)					
0	938		Přesun hmot					
01	K	002276111	Přesun hmot pro tržní veškeré zrub z plastických hmot (práce odvodňovací)					
02	K	002276174	Přísada k přesunu hmot pro tržní veškeré zrub z plastických hmot za zvláštní přístroj do 0,5 m					

SOUPIS PRACÍ

Objekt

03 - SO 03 Komunikace - obnova stávajících zaasfaltovaných UV

Stavba

II m. Praha INV

Datum: 12.03.2024

Zhotovitel

EKIS, spol. s r.o.

Projekční

Zakazník

Zaměstnanec

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Celková souhlava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------	------------------

Náklady soupisu celkem

84 486,65

0 1 Zemní práce								
29	K	151251201	Náklady na vykopávání hromad zbytků znečištěných skupiny 1 objem do 20 m ³ strojově pro ukládání (1,5-1,2-0,2)					
		A73						
		B20						
33	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 300 m výkopku/sypání z hromady zbytků znečištěných skupiny T a2 3					
		B23						
		B23						
34	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 10 000 m výkopku/sypání z hromady zbytků znečištěných skupiny 1 a2 3					
		B23						
35	K	167151101	Náklady na vykopávání hromad zbytků znečištěných skupiny 1 a2 3 do 100 m ³					
		B23						
36	K	171251201	Uložení sypání na skládku nebo mulčovací					
		B23						
37	K	174751101	Zřezání jím. šachet rýh nebo kolárů objemů sypání se znečištěním					
		A07						
		B07						
		B07						
		B07						
47	K	275313617	Zakládání patky z betonu [l. C 16/20] pod UV (170,23)					
		A47						
D 8 Trubní vedení								
66	K	850601101	Zřízení vrtací konstrukce uložení z betonových dělců typ U/V-50 normální					
		A66						
		B16						
67	M	59221645	Vpustkový komín zakládání (perforovaný) betonový 400/500/500/1000mm					
68	K	590204112	Osažení rýh z betonových válců rámců s křes na betonu pro těkání zařízení Ø400, L=500					
		A68						
		B16						
70	M	592423H	Uložení mřížky z nerez (300x300) Ø 400					
71	M	59241001	Koš kalový pod mřížkou mříž					
U 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
99	K	901104101	Bourání uložení vrtací vrt. potrubí					
		A99						
		B16						
U 997 Přesun sutě								
101	K	997271561	Vodorovná doprava sutě z krasových masenat do 1 km					
		A101						
		B101						
102	K	997221509	Připravení ZKD 1 km v vodorovné dopravě sutě z krasových masenat					
D 998 Přesun hmot								
105	K	990223011	Přesun hmot pro přepravu komunikace s krytem dlažebním					
106	K	990223031	Připravení k přepravě hmot pro posuvnou komunikace s krytem dlažebním za zvláštní přesun do 1000 m					
D 999 Skladkovná								
107	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skladkovná) kod odpadu 17 05 04					
		A107						
111	K	1907013071	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkovná) smíšeného stavebního a demontážního kod odpadu 17 05 04					
		A111						

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

02.1 - SO 02.1 Přípojky odvodnění - obnova stávajících 3UV dle 2,1+2,2+2,4bm

Akce:

Začátek:

Hl.m. Praha JNV

Závěr:

SKB, spol. s r.o.

Datum:

12.03.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Zimener

HČ	Typ	Kód	Nápis	MJ	Množství	Jednot. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná položka
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

49 795,82

1	K	113101201	Zemní práce					
			Doprava vrtu (u dopravě výšku do 10 m průměrný příloz do 500 mm)					
2	K	115101301	Přechodové čerpadlo soustavy pro dopravu výšku do 10 m průměrný do 500 mm					
3	K	102201203	Plastové zapuštěné rýhy s do 2000 mm v hmotné třídy těžnosti I skupiny s objem do 100 m3					
			"Mz (7,8) 20"					
			"Práci (1,1) 100,0"					
			"Celkem: 10"					
	K	138001101	Přístavek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení					
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 100 m výkopu (sypání) z hmotné třídy těžnosti I skupiny 1 až 3					
			"Mz (7,8) 20"					
			"Práci (1,1) 100,0"					
			"Celkem: 10"					
5	K	162351117	Vodorovné přemístění přes 9 400 do 100 m výkopu (sypání) z hmotné třídy těžnosti I skupiny 1 až 3					
			"Mz (7,8) 20"					
			"Práci (1,1) 100,0"					
			"Celkem: 10"					
6	K	167151104	Nákladní výkopku z hornin třídy těžnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3					
			"Mz (7,8) 20"					
			"Práci (1,1) 100,0"					
			"Celkem: 10"					
7	K	17251201	Uložení sypání na skládky nebo mořské doly					
			"Mz (7,8) 20"					
			"Práci (1,1) 100,0"					
			"Celkem: 10"					
8	K	174151103	Zřízení jam, šachet rýh nebo kolmých výkopů sypání se zvláštním					
			"Mz (7,8) 20"					
			"Práci (1,1) 100,0"					
			"Celkem: 10"					
9	K	175151101	Obtížnější potrubí s výškovým symetrickým bez průřezu, ušlechtilé do 2 m					
			"Mz (7,8) 20"					
			"Práci (1,1) 100,0"					
			"Celkem: 10"					
10	K	175151201	Plastové potrubí s výškovým symetrickým bez průřezu, ušlechtilé do 2 m					
			"Mz (7,8) 20"					
			"Práci (1,1) 100,0"					
			"Celkem: 10"					
11	K	175151101	Obtížnější potrubí s výškovým symetrickým bez průřezu, ušlechtilé do 2 m					
			"Mz (7,8) 20"					
			"Práci (1,1) 100,0"					
			"Celkem: 10"					
12	K	175151101	Obtížnější potrubí s výškovým symetrickým bez průřezu, ušlechtilé do 2 m					
			"Mz (7,8) 20"					
			"Práci (1,1) 100,0"					
			"Celkem: 10"					
13	K	175151101	Obtížnější potrubí s výškovým symetrickým bez průřezu, ušlechtilé do 2 m					
			"Mz (7,8) 20"					
			"Práci (1,1) 100,0"					
			"Celkem: 10"					
14	K	175151101	Obtížnější potrubí s výškovým symetrickým bez průřezu, ušlechtilé do 2 m					
			"Mz (7,8) 20"					
			"Práci (1,1) 100,0"					
			"Celkem: 10"					
15	K	175151101	Obtížnější potrubí s výškovým symetrickým bez průřezu, ušlechtilé do 2 m					
			"Mz (7,8) 20"					
			"Práci (1,1) 100,0"					
			"Celkem: 10"					
16	K	175151101	Obtížnější potrubí s výškovým symetrickým bez průřezu, ušlechtilé do 2 m					
			"Mz (7,8) 20"					
			"Práci (1,1) 100,0"					
			"Celkem: 10"					
17	K	175151101	Obtížnější potrubí s výškovým symetrickým bez průřezu, ušlechtilé do 2 m					
			"Mz (7,8) 20"					
			"Práci (1,1) 100,0"					
			"Celkem: 10"					
18	K	175151101	Obtížnější potrubí s výškovým symetrickým bez průřezu, ušlechtilé do 2 m					
			"Mz (7,8) 20"					
			"Práci (1,1) 100,0"					
			"Celkem: 10"					
19	K	175151101	Obtížnější potrubí s výškovým symetrickým bez průřezu, ušlechtilé do 2 m					
			"Mz (7,8) 20"					
			"Práci (1,1) 100,0"					
			"Celkem: 10"					
20	K	175151101	Obtížnější potrubí s výškovým symetrickým bez průřezu, ušlechtilé do 2 m					
			"Mz (7,8) 20"					
			"Práci (1,1) 100,0"					
			"Celkem: 10"					
21	K	175151101	Obtížnější potrubí s výškovým symetrickým bez průřezu, ušlechtilé do 2 m					
			"Mz (7,8) 20"					
			"Práci (1,1) 100,0"					
			"Celkem: 10"					
22	K	175151101	Obtížnější potrubí s výškovým symetrickým bez průřezu, ušlechtilé do 2 m					
			"Mz (7,8) 20"					
			"Práci (1,1) 100,0"					
			"Celkem: 10"					

SOUPIS PRACÍ

TV Horní Počernice, v Slavětíně, přeložka stávajících sdělných kabelů

Objekt

ROD KAZ

15.03.2024

Zakazník

HLN Praha INV

Zhotovitel

EKIS, spol. s r.o.

Pracovní

Zpracoval

Zwoner

PC Typ

Kod

Popis

MJ

Množství

Jedn. cena

Cena celkem (Kč)

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

38 467,97

0	HSV	Práce a dodávky HSV					
0	1	Zemní práce					
K	113001401	Bočníkové zaplacení kabelů u kabelových tráv ze 3. ročního ročního kabelů					
K	132222137	Hrubé přemístění rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžkosti I skupiny 3 ručně					
		11,5 m ³ 1,1					
K	130001101	Příplatek za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení					
K	187111101	Nakládání výkopku z hloubky třídy těžkosti I do skupiny 1 až 3					
		1,1 m ³					
7	K 162251112	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 10 000 m výkopky: výkopky z horniny třídy těžkosti I skupiny 1 až 3					
		11,5 m ³ 1,1					
22	K 171201201	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační dráhu (silniční) v případě 17. Dle D4					
		1,1 m ³					
K	174111101	Zácpy jím, šachet rýh nebo kladem objektů vyplněním se zhuštěným materiálem					
		11,5 m ³ 1,1					
K	175111101	Výkop - dráhy					
		11,5 m ³ 1,1					
M	28031351	Obtírání přírub ručně šponkou bez rozložení, včetně					
		11,5 m ³ 1,1					
		11,5 m ³ 1,1					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavčtině, opr.3 - dle požadavku MC P20 z KO
 dne 18.9.2023 ochrana stáv. kabelu veřejného rozhlasu v místě křížení s
 komunikací a pod vjezdy č.p.2165/18

Místo:

Praha 9 Horní Počernice

Obec/oblast:

Hlavní město Praha

Stavbytel:

CKIS, spol. s r.o.

Datum:

21.09.2023

Projedáno:

Zpracovatel:

Pr. Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	Jednotka (G2K)	Cena celkem (G2K)	Cenná soustava
---------	-----	-------	----	----------	----------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem

46 334,28

0	M	Práce a dodávky M					
0	46-M	Centrální práce při externí práci					
1	K	460161412 Hlasivý kabelový rýh ručně s šířkou hloubky 30 mm a hloubkou 30 mm	m				
		10+8+9					
2	K	460241111 Připravení na montáž výkopových při elektrifikacích v blízkosti podzemního vedení	m				
		0,5*0,5*10+8+9					
3	K	460242221 Provázání zastřešení kabelů ve výkopových při jejich souběhu	m				
		10+8+9					
4	K	460431432 Skrytí kabelových rýh ručně se šířkou hloubkou 60 mm a hloubkou 30 mm	m				
		10+8+9					
5	K	460511113 Výstražné pásy pod kabelem šířky 14 cm	m				
		10+8+9					
6	K	460742131 Osazení kabelových přístupů z trub plastových do rýh s obestavením průměru do 10 cm	m				
		10+8+9					
7	M	34571038 trubka elektroinstalace dle specifikace (chodová) L=1000 (mm)	m				
		10+8+9*1,05					
8	K	460981111 Práce na montáži stavební práce při elektrifikacích	m				

CN zpracována dle předaného zakresu vedení veřej. rozhlasu. V případě, že by skutečná trasa kabelů vedla v místech nové

18.9.23
 14.9.23
 19.9.23

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavčtině

FO 03

POTVRZENÍ ZMĚNY

PoZ č. 7

PoZ vystavil:

Datum:

PoZ č. na NOZ č. 7

na jiný dokument:

Odesláno/

předáno:

osobně

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Změny v navrhovaném Dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007746/2023 jsou ve smyslu § 222 odst. 6) zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ, nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 438 360,03-Kč bez DPH tj. 1,12%, odpočty činí: 0,-Kč bez DPH tj. 0%, přípočty činí: 438 360,03-Kč bez DPH tj. 1,12% ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny. Cena změny dle NoZ1, NoZ 2, NoZ3, NoZ4, NoZ5, NoZ6, NoZ 7 je 2 379 479,12-Kč bez DPH tj. 6,11% ceny díla bez DPH.

Počet připojených listů
specifikací: 8 listů ZI č. 7

Počet připojených výkresů:

Změna ceny díla (bez DPH):
438 360,03-Kč

Změny lhůty dokončení díla:

0,5 měsíce

Nová cena díla (bez DPH):
41 349 479,12-Kč

Nová lhůta dokončení díla:
15 měsíců

Důvod ke změně:

Požadavky objednatele.

Všechny práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Poznámka:

Data

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 8	
Komu: INV MHMP				Datum: 27.3.2024	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně	
Týká se:				SOD č. DIL/21/08/007746/2023	
Odkazy: na specifikaci:		Požadavek PVK a.s.			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval: zhotovitel			
na jinou část smlouvy:					
kategorizace položek:					
01 - SO 01 Splašková kanalizace - změny ČS dle požadavku PVK a.s.: dle požadavku PVK a.s. bude nad ČS provedena zpevněná - dlážděná plocha; dle požadavku PVK a.s. bude větší pilíř technologie ČS; v souladu s požadavkem PVK bude potrubí VZT DN 200 a bude staženo dolů až k hladině; prostupy do ČS budou provedeny v počtu a profilech dle požadavku PVK; v místě napojení na stávající kanalizaci je nutné provést novou kanalizační šachtu					
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).					

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č.8	
NOZ zpracoval: Ing. Karel BÍLO			Datum: 27.3.2024	
NOZ č. 8 navazuje na:		OZ č. 8	PZ č.	PL č.:
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007746/2023 předkládáme návrh úpravy				
dohodnuté ceny díla zpracované v návaznosti na rozpočtové podklady:				
Příloha k NOZ č.7 – Soupis prací				
Cena stavebních prací				
Cena přípočty 182 537,56-Kč				
Cena odpočty - 11 120,00-Kč				
Cena celkem 171 417,56-Kč				
DPH 21 % 35 997,68-Kč				
Cena včetně DPH 207 415,24-Kč				
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. /21/08/007746/2023 Zhotovitel provedl Neodkladnou změnu dle čl.5 , zpracoval a předložil Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provedl kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.				
Počet listů příloh: 6 listů ZI, č.8				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:		
171 417,56- Kč (stosedmdesátjednatísícčtyřístasedmnáctkorunpa desátšesthalířů)		0,5 měsíce		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č.8

Obj. nro.

TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně, opr.3

Obj. nro.

01 - SO 01 Splašková kanalizace - změny dle požadavku PVK a.s.

Město:

Praha 8 Horní Počernice, V Slavětíně

Datum: 28.03.2024

Investor:

HLm.Praha INV

Zhotovitel:

EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel: Zwiener

Kód díla - Popis

	Cena celkem [CZK]	Odpočty	Připočty
Náklady celkem bez DPH	171 417,56		
Náklady celkem bez DPH - připočty	182 537,56		
Náklady celkem bez DPH - odpočty	-11 120,00	-11 120,00	182 537,56
Dížděná plocha			
Příř ČS	47 560,99	0,00	47 560,99
Potrubi VZT	11 160,72	0,00	11 160,72
Prostupy do ČS	6 526,03	0,00	6 526,03
01 - SO 01 Splašková kanalizace - nová kanalizační šachta v místě napojení na stávající kanalizaci	6 900,00	-11 120,00	18 020,00
	99 269,82	0,00	99 269,82

v rozpočtu nejsou vyčísleny požadavky PVK na zvětšení betonových dobetonávek-klínů v jímce ČS a změny na UŠ - k datu zpracování ZL nebyly tyto změny ze strany PVK zcela specifikovány

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Stavba kanalizace a vodovodu v ul. ...

Číslo:

01 - SO 01 Splašková kanalizace - dle požadavku PVK a.s. bude nad čs
provedené zpevněné - dlaždená plocha

Místo:

Praha 9 Horní Počernice, V Slavičíně

Zadavatel:

Hl.n.s.Praha MvV

Zhotovitel:

EKS, spol. s r.o.

Datum:

12.07.2023

Projektant:

Projekt IV

Zpracovatel:

Ing. Zvěrník

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úprava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

47 560,99

0	5		Komunikace pozemní					
06	K	504851011	Podklad ze železobetonu do 100 a2 tl 150 mm					
		ABS	Normované dílčí dílo (11)					
		ABS	"Celkem" "ABS"					
06	K	50485111101	Nákladní železobetonové dílčí dílo komunikace pro jízdu					
		ABS	Normované dílčí dílo (11)					
		ABS	"Celkem" "ABS"					
07	M	502450151	dlažba betonová tl 60 mm					
		ABS	Normované dílčí dílo (11)					
		ABS	"Celkem" "ABS"					

0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
155	K	916131213	Ostatní silniční dílny betonového struktura s ložní opětou do lože z betonu prostého					
		A145	blokové dílny (11)					
		B141	"Celkem" "A145"					
156	M	50217028	obrubky betonové tl 500 a2 tl 250 mm					
157	K	916891121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z železobetonu krajek z betonu prostého					
		A147	blokové dílny (11)					
		B147	"Celkem" "A147"					

0	998		Přesun hmot					
173	K	938275101	Přesun hmot pro tržní vedení z trub kameninových dlažebný výkop					
174	K	938275124	Přilepek a přesun hmot pro tržní vedení z trub kameninových za zvěšený přesun hmot do 500 m					

SOUPIS PRACÍ

Průběh:

Průběh: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

Objekt:

01 - SO 01 Splašková kanalizace - dle požadavku PVK a.s. bude větší příř technologie ČS

Místo:

Praha 9 Horní Počernice, V Slávitíně

Datum:

15.08.2023

Zadavatel:

Hl.m.Praha INV

Projektant:

Projekt IV

Zhotovitel:

EKIS, spol. s r.o.

Zamovavatel:

Ing. Zwierner

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cení [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 160,72

D	D11		Zemní práce
47	K	4800270007	zdění příře pro RM I
			velikost příře dle PD:2,4*2,54*0,7
			velikost příře dle pož.PVK: 3,1*2,54*0,7+0,9*2,54*0,15
			příř dle požadavku PVK je větší a:
D	D8		Ostatní materiál
84	K	1.1.2.5.002.1	Stavební materiál pro příř u ČS
			velikost příře dle PD:2,4*2,54*0,7
			velikost příře dle pož.PVK: 3,1*2,54*0,7+0,9*2,54*0,15
			příř dle požadavku PVK je větší a:

SOUPIS PRACÍ

Místo: Praha 9 Horní Počernice, V Slavětině
 Zadavatel: HLm.Praha JNV
 Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

52 - PS 01.2 Strojní část čerpací stanice - v souladu s požadavkem PVK bude potrubí VZT DN 200 a bude staženo dolů až k hladině

Datum: 15.08.2023
 Projektant: Projekt IV
 Zpracovatel: Ing. Zwiener


PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

22 410,00

0	381x		Strojní technologie				
9	K	381R611	Kotvy a spory při zapojení potrubí				
		R3	3				
		R8	*Celkem: *A3				
10	K	381R615	drobný spojovací materiál, šrouby, matice				
		A10	10				
		B10	*Celkem: *A10				
17	K	381R655	potrubí PVC DN 150				
		A17	8,1 (PVC 150)				
			přívod DN 200: 1,2*1+0,8*4)+1,3				
			odvod DN 200				
		B17	*Celkem: *A17				
18	K	381R901	dispozice a montáž				
		A18	1				
		R18	*Celkem: *A18				

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 8	
PoZ vystavil:		Datum:	
PoZ č. na NOZ č. 8		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
Podpsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007746/2023 jsou ve smyslu § 222 odst. 6) zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ. nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 171 417,56-Kč bez DPH tj. 0,44%, odpočty činí: -11 120,00-Kč bez DPH tj. 0,03%, přípočty činí: 182 537,56-Kč bez DPH tj. 0,47% ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny. Cena změny dle NoZ1, NoZ 2, NoZ3, NoZ4, NoZ5, NoZ6, NoZ 7, NoZ 8 je 2 550 896,68-Kč bez DPH tj. 6,55% ceny díla bez DPH.			
Počet připojených listů specifikací: 6 listů ZI. č.8		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 171 417,56-Kč		Změny lhůty dokončení díla: 0,5 měsíce	
Nová cena díla (bez DPH): 41 520 896,68-Kč		Nová lhůta dokončení díla: 15,5 měsíců	
Důvod ke změně: Požadavky objednatele a budoucího správce PVK a.s.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka: 			
Datum:		Datum:	

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 9	
Komu: INV MIIMP				Datum: 12.9.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně	
Týká se:				SOD č. DIL/21/08/007746/2023	
Odkazy: na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:				Specifikace prací zpracoval: zhotovitel	
na jinou část smlouvy:					
kategorizace položek:					
01 - SO 01 Splašková kanalizace – upřesnění geologie oproti předpokladům v zadávací dokumentaci. Při provádění zemních prací na stoce 1 došlo na několika úsecích k zastižení hornin jiné třídy těžitelnosti tvrdosti než bylo předpokládáno v zadávací dokumentaci. Geotechnik objednatele provedl 12.9.2023 prohlídku přímo na stavbě a k datu 12.12.2023 byl zhotoviteli zaslán posudek ze kterého plyne, že v dotčených úsecích byly práce místo v hor. tř. těžitelnosti II/3, prováděny v horninách II/4,5 a III/6. Dále by třeba v několika úsecích upravit – zahloubit podélný profil kanalizace tak, aby výsledný spád byl menší než 5%. V opačném případě by bylo nutné používat šachtová dna obkládaná čedičem, (při spádu 5% a vyšším je požadováno dle městských standardů PVS) s čímž zadávací dokumentace nepočítala. V úsecích, kde byla prováděny výkopové práce v hor. III/6 bylo třeba rozšířit výkop tak, aby se do zapaženého výkopu vešla bourací hlava strojního zařízení umožňující rozrušení horniny III/6. Dále bylo třeba zvětšit zemní práce včetně přípojek na úseku Š2 – Š4, tak aby bylo možné přípojkou podejit obetonování stávající DK vedoucí v souběhu s budovaným řádem kanalizace a bylo možné provést ruční výkopy v hor. II/4,5 – III/6 pod stávajícími sítěmi NN, slaboproudů atd.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: skutečnými podmínkami					
					
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).					

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č.9											
NOZ zpracoval: [REDACTED]		Datum: 19.1.2024												
NOZ č. 9 navazuje na:	OZ č. 9	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně										
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007746/2023 předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny díla zpracované v návaznosti na rozpočtové podklady: Příloha k NOZ č.9 Soupis prací Cena stavebních prací <table> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>859 649,34-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>-103 548,57-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>756 100,77-Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>158 781,16-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>914 881,93-Kč</td> </tr> </table> V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. /21/08/007746/2023 Zhotovitel provedl Neodkladnou změnu dle čl.5 , zpracoval a předložil Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provedl kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD. Počet listů příloh: 11 listů ZL č.9					Cena přípočty	859 649,34-Kč	Cena odpočty	-103 548,57-Kč	Cena celkem	756 100,77-Kč	DPH 21 %	158 781,16-Kč	Cena včetně DPH	914 881,93-Kč
Cena přípočty	859 649,34-Kč													
Cena odpočty	-103 548,57-Kč													
Cena celkem	756 100,77-Kč													
DPH 21 %	158 781,16-Kč													
Cena včetně DPH	914 881,93-Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:												
756 100,77 - Kč (sedmsetpadesátšesttisícstokorunsedmdesátšedn halířů) (bez DPH)		1 měsíc												
OS [REDACTED] PM [REDACTED] MM [REDACTED] TT [REDACTED]		13 0 369/2												
Dat [REDACTED]														

Stavba č.3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 v Slavětíně

Rekapitulace

	celkem	odpočet	přípočet
01 - SO 01 Splašková kanalizace - výkopy v hor. tř. 3- 6 v úseku Š1-Š4	360 823,30 Kč	-38 925,02 Kč	399 748,32 Kč
01 - SO 01 Splašková kanalizace - výkopy v hor. tř. 3 - 6 přípojek v úseku Š1-Š4	197 687,13 Kč	0,00 Kč	197 687,13 Kč
01 - SO 01 Splašková kanalizace - výkopy v hor. tř. 3-5 v úseku Š12 - Š16	107 657,41 Kč	-64 623,55 Kč	172 280,96 Kč
01 - SO 01 Splašková kanalizace - prohloubení výkopů v úseku Š8 - Š16	89 932,93 Kč		89 932,93 Kč
Celkem bez DPH	756 100,77 Kč	-103 548,57 Kč	859 649,34 Kč

SOUPIS PRACÍ

Tr. Hrad Půvčnická, k.ú. C331 V. Světlá, okr. 3

01 - SD 01 Společná kanalizace

Datum: 10.01.2024

Pracovník:

Pracovník:

IPČ	Typ	Kód	Popis	MU	Minutáž	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena jednotky	Objem	Plocha
-----	-----	-----	-------	----	---------	-------------	-------------------	---------------	-------	--------

Náklady soupisu celkem

0	1		Zemní práce							
13	K	132354208	Hloubení zapeřazených rýh š. do 2000 mm v hornině třída III až skupiny I objem do 5000 m3							
			původní výměra							
			nová výměra							
K	132354204		Hloubení zapeřazených rýh š. do 2000 mm v hornině třída III až skupiny II objem do 500 m3							
			původní výměra							
			nová výměra							
K	132354204		Hloubení zapeřazených rýh š. do 2000 mm v hornině třída III až skupiny II objem přes 100m3 do 500 m3							
			původní výměra							
			nová výměra							
K	132354202		Hloubení zapeřazených rýh š. do 2000 mm v hornině třída III až skupiny III objem do 50 m3							
			původní výměra							
			nová výměra							
45	K	162331103	Vodorovné přeměření rýh š. do 500 m výškopřesýlacem z horniny třída III až skupiny I až 3							
			původní výměra							
			nová výměra							
47	K	162751117	Vodorovné přeměření přes 3 000 do 10000 m výškopřesýlacem z horniny třída III až skupiny I až 3							
49	K	167151114	Nakládání výkopku z horniny třída III až skupiny I až 3 přes 100 m3							
50	K	171251201	Uložení výkopku na sklady nebo naskládání							
51	K	174151101	Zábytej želez, šachet rýh nebo kolem objektů sypantnou se zdivem							
52	K	15537377	Sčítání celkové práce 0/22							

13
686380
městi 669/2a
ant. 02

Výměry "skály" v úseku Š1 - Š4 byly dle geodetické posouzení objednatele v členění:

- 3. třída 45%
- 4. třída 35%
- 5. třída 15%
- 6. třída 5%

šachta	hloubka výkopu	odpočet bc průměrné hloubka	šířka	délka	objem
Š1	4,03	3,68			
Š2	3,68	3,33	3,505	2 11,95	83,77
Š3	3,45	3,1	3,215	2 26,8	172,32
Š4	3,15	2,8	2,95	2 35	206,50
rozšíření pro šachty Š2 a Š3					
celkem objem výkopů rýh pro řad a šachty					
					12,35
					474,94
z toho ve třídě 3					
					213,72
z toho ve třídě 4					
					166,23
z toho ve třídě 5					
					71,24
z toho ve třídě 6					
					23,75
					474,9391

výměra výkopů dle rozpočtu:

*stoka Š1" $(1,2*3,85*14,5)+(1,2*3,45*65,5)+(1,2*2,2*340)$

"rozšíření pro šachty" $(1,3*2,5*92,79)+(1,5*2,5*9,04)$

tj. výměry pro úsek Š1 - Š4:

1,2*3,85*11,95

1,2*3,45*(26,8+35)

1,3*2,5*(3,68+3,45)

Hloubení rýh š do 2000 mm v hor tř třř l skupiny 3 objem do 5000 m3 celkem

55,21

255,85

23,17

334,23

SOUPIS PRACÍ

Objekt: Úprava ústředí v číselníku 2483

01.1 - SO 01.1 Kanalizační přípojky

Přehled Hlavní Podmínky
Hlavní Přehled INV
EKLIS, spol. s r.o.

14. 8. 2022

Projektant
Zpracovatel

PO	Typ	Kód	Popis	M/J	Množství	Cena (C79)	Cena celkem (C24)	Objekt	Připočet
Náklady soupisu celkem									
1	K	13225-204	Zemní práce Hrubé zpevnění 100 m ² do 2000 mm v horní části přípojky I skupiny 3 objem do 500 m ³						13
2	K	13225-204	"přípojky" 100 mm - 100 mm (100 mm) přípojky 100 mm - 100 mm (100 mm) přípojky 100 mm - 100 mm (100 mm)						37
3	K	13225-204	Hrubé zpevnění 100 m ² do 2000 mm v horní části přípojky II skupiny 5 objem do 500 m ³						53
4	K	13225-204	Hrubé zpevnění 100 m ² do 2000 mm v horní části přípojky III skupiny 5 objem do 500 m ³						39
5	K	13225-204	Hrubé zpevnění 100 m ² do 2000 mm v horní části přípojky IV skupiny 5 objem do 500 m ³						10
6	K	13225-204	Hrubé zpevnění 100 m ² do 2000 mm v horní části přípojky V skupiny 5 objem do 500 m ³						18
7	K	13225-204	Hrubé zpevnění 100 m ² do 2000 mm v horní části přípojky VI skupiny 5 objem do 500 m ³						72
8	K	13225-204	Hrubé zpevnění 100 m ² do 2000 mm v horní části přípojky VII skupiny 5 objem do 500 m ³						19
9	K	13225-204	Hrubé zpevnění 100 m ² do 2000 mm v horní části přípojky VIII skupiny 5 objem do 500 m ³						1
10	K	13225-204	Hrubé zpevnění 100 m ² do 2000 mm v horní části přípojky IX skupiny 5 objem do 500 m ³						7
11	K	13225-204	Hrubé zpevnění 100 m ² do 2000 mm v horní části přípojky X skupiny 5 objem do 500 m ³						
12	K	13225-204	Hrubé zpevnění 100 m ² do 2000 mm v horní části přípojky XI skupiny 5 objem do 500 m ³						
13	K	13225-204	Hrubé zpevnění 100 m ² do 2000 mm v horní části přípojky XII skupiny 5 objem do 500 m ³						
14	K	13225-204	Hrubé zpevnění 100 m ² do 2000 mm v horní části přípojky XIII skupiny 5 objem do 500 m ³						


přípojka č.p. 2483/77a
přípojka č.p. 2483/73 - 1
přípojka č.p. 2483/73 - 2

přípojky prováděny v horních 3 - 5 m tělesnosti
přípojky kopány ručně okolo stávajících sítí
přípojky byly kopány do větších hloubek - přípojky do sítě (Norma dle PD přípojky, tak aby aniž byl o
přípojky pro č.p. 2483 musely podejít betonový blok okolo potrubí stávající dešťové kanalizace

Výkaz výměr přípojek na úseku Š2 - Š4:

přípojka č.p. 2402/77a	6,15
spád dle PD v %	10,40
délka dle PD	3,50
spád dle PD přípojky v %	10,50
délka dle PD přípojky	0,28
hloubka na konci je větší o	
"přípojky" (1.1*1.8*217.1)	
výkopy přípojky dle rozpočtu:	20,59
terén	
výkop v místě odbočky	265,67
výkop v místě napojení	262,54
výkop po odpočtu bourané kom.	3,13
terén	2,78
výkop v místě konce přípojky na hranici pozemku	265,67
výkop v místě konce přípojky na hranici pozemku	262,91
výkop po odpočtu bourané komunikace	2,76
délka	2,41
průměrná hloubka	10,50
průměrná šířka výkopu	2,60
skutečný objem výkopů	2,31
přípojka č.p. 2483/73 - 1	62,97
spád dle PD v %	
délka dle PD	27,39
spád přípojky v %	4,60
délka přípojky	4,78
hloubka na konci je větší o	
"přípojky" (1.1*1.8*217.1)	
výkopy přípojky dle rozpočtu:	4,60
terén	0,28
výkop v místě odbočky	9,11
výkop v místě napojení	265,58
výkop po odpočtu bourané kom.	262,16
	3,42
	3,07

musel se zmenšit spád z důvodů nutnosti podejítí obetonování stávající DK



terén	265,58	
výkop v místě konce přípojky na hranici pozemku	262,38	
výkop v místě konce přípojky na hranici pozemku	3,20	
výkop po odpočtu bourané komunikace	2,85	
délka	4,50	
průměrná hloubka	2,96	
průměrná šířka výkopu	1,88	
skutečný objem výkopů	25,53	
přípojka č.p. 2483/73 - 2		
spád dle PD v %	27,11	
délka dle PD	4,50	
spád přípojky v %	3,78	musel se zmenšit spád z důvodů nutnosti podejít obetonování stávající DK
délka přípojky	4,50	
hloubka na konci je větší o	0,28	
"přípojky" (1,1*1,8*217,1)		
výkopy přípojky dle rozpočtu:	8,91	
terén	265,65	
výkop v místě odbočky	262,35	
výkop v místě napojení	3,30	
výkop po odpočtu bourané kom.	2,95	
terén	265,65	
výkop v místě konce přípojky na hranici pozemku	262,52	
výkop v místě konce přípojky na hranici pozemku	3,13	
výkop po odpočtu bourané komunikace	2,78	
délka	4,50	
průměrná hloubka	2,86	
průměrná šířka výkopu	2,50	
skutečný objem výkopů	32,23	
celkem objem výkopů tří přípojek	38,61	
celkem skutečný objem výkopů tří přípojek	120,73	
z toho ve třídě 3	54,33	
z toho ve třídě 4	42,26	
z toho ve třídě 5	18,11	
z toho ve třídě 6	6,04	



SOUPIS PRACÍ

1. Vlastní Početní, ar. 03/24 V Slavičíně, op. 3

01 - SO 01 Splašková kanalizace

Praha 9 Horní Počernice
Hl.m. Praha IIV
EKIS, spol. s r.o.

Datum: 10.01.2024
Projekant: Zvišener
Zpracovatel: Zvišener

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenná soustava	Objekt	Připočet
Náklady soupisu celkem										
0	1		Zemní práce							
18	K	132254206	Hloubení zpevněných rýh š. do 2000 mm v hornině třídy I až III (včetně) I skupiny 3 objem do 5000 m3							
	K	132354204	Hloubení zpevněných rýh š. do 2000 mm v hornině třídy I až III (včetně) II skupiny 4 objem přes 1000m3 do 500 m3							
	K	132454204	Hloubení zpevněných rýh š. do 2000 mm v hornině třídy I až III (včetně) II skupiny 5 objem přes 1000m3 do 500 m3							

Výměry "skály" v úseku Š12 - Š16 byly dle geologického posouzení objednatele v členění:

3. třída 45%

4. třída 40%

5. třída 15%

výměra:

1,2*2,2* délka

rozšíření pro šachty 1,3*2,5*výška šachet
navýšení kubatury o větší výkopy Š12 - Š16

celkem výkopy

z toho ve třídě 3

z toho ve třídě 4

z toho ve třídě 5

m3

290,66

36,86

36,25

363,77

163,70


145,51

54,57

Výměry větších výkopů stoky S1 v úseku Š12 - Š16 (výpočet výměry pro potřeby výpočtu výměry skály v úseku Š12-Š16)

Při spádu 5% a větším musí být šachtová dna šachet dle MS HL.m.Prahy s čedičovým dnem. Čedičová dna v zadávací dokumentaci nebyla na což byl zadavatel upozorněn v rámci dodatečných informací. Protože by PVK čedičová dna požadovala, tak AD rozhodnul, aby spád byl upraven tak, aby nedošlo k dosažení a překročení 5% spádu. Což znamená, že při mírnějším spádu došlo na úseku Š8 - Š16 k zahloubení kanalizace oproti podélnému profilu a to:


u šachty	zahloubení v m	průměrné zahloubení na úseku	šířka	rýhy	rozšíření pro šachty
Š12	0,27				
Š13	0,20	20,30	0,24	1,20	5,72
Š14	0,59	36,10	0,40	1,20	17,11
Š15	0,20	10,60	0,40	1,20	5,02
Š16	0,00	43,10	0,10	1,20	5,17
				33,03	3,22
celkem větší výkopy řadů a šachet o				36,25	



Výměry větších výkopů stoky S1 v úseku Š10 - Š16

Při spádu 5% a větším musí být šachtová dna šachet dle MS Hl.m.Prahy s čedičovým dnem. Čedičová dna v zadávací dokumentaci nebyla na což byl zadavatel upozorněn v rámci dodatečných informací. Protože by PVK čedičová dna požadovala, tak AD rozhodnul, aby spád byl upraven tak, aby nedošlo k dosažení a překročení 5% spádu. Což znamenalo, že při mírnějším spádu došlo na úseku Š8 - Š16 k zahloubení kanalizace oproti podélnému profilu a to:

u šachty	hloubení v m	průměrné zahloubení na úseku	šířka	rýhy	rozšíření pro šachty
Š10	0,00				
Š11	0,17	23,60	0,09	1,20	2,41
Š12	0,27	19,10	0,22	1,20	5,04
Š13	0,20	20,30	0,24	1,20	5,72
Š14	0,59	36,10	0,40	1,20	17,11
Š15	0,20	10,60	0,40	1,20	5,02
Š16	0,00	43,10	0,10	1,20	5,17
celkem větší výkopy řadů a šachet o				40,48	4,65
				45,13	



Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavčtině

FO 03

POTVRZENÍ ZMĚNY

PoZ č. 9

PoZ vystavil:

Datum:

PoZ č. na NOZ č. 9

na jiný dokument:

Odesláno/

předáno:

osobně

Podpisem zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Změny v navrhovaném Dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. DII /21/08/007746/2023 jsou ve smyslu § 222 odst. 6) zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 756 100,77-Kč bez DPH tj. 1,94%, odpočty činí: -103 548,57-Kč bez DPH tj. 0,27%, přípočty činí: 859 649,34-Kč bez DPH tj. 2,21% ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny. Cena změny dle NoZ1, NoZ 2, NoZ3, NoZ4, NoZ5, NoZ6, NoZ 7, NoZ 8, NoZ 9 je 3 306 997,45-Kč bez DPH tj. 8,49% ceny díla bez DPH.

Počet připojených listů

specifikací: 11 listů ZL č.9

Počet připojených výkresů:

Změna ceny díla (bez DPH):

756 100,77-Kč

Změny lhůty dokončení díla:

1 měsíc

Nová cena díla (bez DPH):

42 276 997,45-Kč

Nová lhůta dokončení díla:

16,5 měsíců

Důvod ke změně:

skutečnými podmínkami

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Poznámka:

Dat

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 10	
Komu: INV MIIMP			Datum: 23.4.2024		
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně	
Týká se:			SOD č. DIL/21/08/007746/2023		
Odkazy: na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:			Specifikace prací zpracoval: zhotovitel		
na jinou část smlouvy:					
kategorizace položek:					
01 - SO 01 Splašková kanalizace – v rámci výkazu výměr zadávací dokumentace stavby nebylo počítáno s vybouráním stávajících povrchů komunikace a jejich obnovou na pozemku 4200/27. Dále objednatel akceptoval požadavek vlastníka pozemku 4200/27, aby byla po pokládce kanalizace obnovena ohrusná vrstva v plné šíři komunikace. Při provádění bouracích vrstev stávajících asfaltových povrchů bylo zjištěno, že jejich celková tloušťka je 35cm.					
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).					

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č.10	
NOZ zpracoval: I [REDACTED]		Datum: 23.4.2024		
NOZ č. 10 navazuje na:		OZ č. 10	PZ č.	PL č.:
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007746/2023 předkládáme návrh úpravy				
dohodnuté ceny díla zpracované v návaznosti na rozpočtové podklady:				
Příloha k NOZ č.10 – Soupis prací				
Cena stavebních prací				
Cena přípočty	1 031 419,01-Kč			
Cena odpočty	0,00-Kč			
Cena celkem	1 031 419,01-Kč			
DPH 21 %	216 597,99-Kč			
Cena včetně DPH	1 248 017,00-Kč			
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. /21/08/007746/2023 Zhotovitel provedl Neodkladnou změnu dle čl.5 , zpracoval a předložil Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provedl kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.				
Počet listů příloh: 3 listy ZL č.10				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:		
1 031 419,01 - Kč (jedenmiliontřicetjedentisícčtyřistadevaletnáctkor unjedenhalíř) (bez DPH)		0,5 měsíce		
[REDACTED]				

SOUPIS PRÁČI

Stavba: TV Horní Počernice, etapa 00/31 V Slavětíně, opr.3
01 - SO 01 Splašková kanalizace - obnova komunikace na pozemku 4200/27 po
výstavbě splaškové kanalizace

Místo: Praha 9 Horní Počernice
Zadávatel: HLÚ Praha RMV
Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

Datum: 21.11.2023
Projektant:
Zpracovatel: Zmlener

PC	Typ	Kód	Popis	MU	Měrná jednotka	Jednotka (CZK)	Cena celkem (CZK)	Deníková soustava
----	-----	-----	-------	----	----------------	----------------	-------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem bez DPH

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
K	113106023		Rozkopání dráhy při přeložení komunikací pro pář. ze zámkové dlažby ručně					
K	113107149		Odstřanění podkladu živého tl. 50 mm ručně					
K	113107152		Odstřanění podkladu z kamenné těžné (asfaltový roztok) tl. přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2					
	113107146		Odstřanění podkladu živého tl. přes 250 do 300mm ručně					
			Práce v rámci výstavby pro dle a b) Na výstavbu a dle výstavby a b) Práce v rámci výstavby a b) Práce v rámci výstavby a b) Práce v rámci výstavby a b) Práce v rámci výstavby a b) Práce v rámci výstavby a b) Práce v rámci výstavby a b) Práce v rámci výstavby a b)					
K	113154263		Frézování živého korytl 50 mm průř. a přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v lase					
K	113154264		Frézování živého korytl 300 mm průř. a přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v lase					
T	K	113202171	Vytváření atolu krajního obrubníků jednotlivých					
K	113204111		Vytváření obrub. záhonových					
K	181912112		Úprava pláň v horní části (výškovosti) skupiny 3 se živými tl. ručně					
D	5		Komunikace pozemní					
K	564861111		Podklad ze směsi štěrku 50 plochy přes 100 m2 tl 200 mm					
K	567512112		Pl. nat. tl. přes 120 do 150 mm tl. do 1000 m2					
SE	K	577106111A	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ASB14) tl 70 mm					
			2 vrstvy a 190,38 m2					
90	K	58112211R	Podklad ze směsi štěrku cementem SC-C (B14) (KSC 1) tl 100 mm					
			2 vrstvy a 700 mm					
92	K	573111111A	Podklad infiltrační					
5b	K	573231100A	Podklad živých spojovací ze silniční emulze					
K	577144111		Asfaltový beton vrstva obrubna ACL 11 (ASB) Ø 50 mm s do 3 m z modifikovaného asfaltu					
90	K	586211110A	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pář.					
K	588212210		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pář. ručně a 50 mm skupiny A pl. do 50 m2					
D	8		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
18	K	916131213	Odpření stínění obrubníků betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prázdného					
17	M	58217071	Alumobrik betonový silniční 1000x150x250mm					
18	K	916331112	Odpření zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou					
18	M	58217071	Alumobrik betonový parkový					
90	K	916831121	Lože pod obr. železný, kámen nebo obruby z dlažebních kamenů z betonu prázdného					
	B90		silniční (C0,05)					
	C80		zahradní (C0,05)					
	D90		celkem 280+800=1080					
91	K	919112217	Řezání spár pro vytvoření komůrek s 10 mm vý 20 mm pro beton. závlaku v živém korytl					
92	K	919122111	Řezání spár závlaku za tepla pro komůrk. s 10 mm vý 20 mm s silničním profilem					
D	99		Přesun sušé					
101	K	997211581	Vodorovná doprava suš. z kusových materiálů do 1 km					
	U10		sušé					
	C47B1		Třída: 47B1					
102	K	997221009	Příprava 200-1 km u vodorovné dopravy suš. z kusových materiálů					
10	998		Přesun tříso					

EK

N

č.3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně - obnova komunikace na pozemku 4200/27 po výstavbě splaškové kanalizace - výměry

	délka	šířka	m2	celkem
frézování obrusu 5cm	10,6	10,55	111,83	
	9,4	5,9	55,46	
ruční dobourání obrusu 5cm podél obrubníků a u vpustí	44,8	7,8	349,44	516,73
frézování obrusu celkem				-26,43
				490,3
frézování podbalu tl. 30cm	58	2	116	116
bourání podbalu tl. 30cm v místě rozšíření pro Š2 a Š3	6,4	0,6	3,84	
bourání podbalu tl. 30cm směrem z Š2 na Š1	5,5	2	11	
bourání podbalu tl. 30cm v místě přípojek 1	2,5	3	7,5	
bourání podbalu tl. 30cm v místě přípojek 2	2,5	3,4	8,5	
bourání podbalu tl. 30cm v místě přípojek 3	3,3	3,8	12,54	
dobourání podbalu před vjezdem Nomie	3	4	12	
dobourání podbalu před vjezdem Nomie	9,5	2	19	74,38
dobourání obrusu tl. 5cm před vjezdem Nomie	12,5	6	75	75
dobourání obrusu tl. 5cm podél obrubníků	117,75	0,2	23,55	
dobourání obrusu tl. 5cm u vpustí	3,2	1,8	2,88	26,43
nová obrusná vstva celkem				591,73
nový podbal celkem				190,38
asfaltový recyklát - provizorní dosyp do úrovně podbalu tj. tl. 150mm + následně odstranění				190,38
obrubník silniční (v místě přípojek + severní obruba vjezdu z ul. Ve Žlíbku			19,5	
obrubník sadový			8	
dlažba chodník nad přípojkou	5,5	2,2	12,1	
dlažba pruh parkoviště	7	1	7	
spára v asfaltu - obrusu			16	
v místě vjezdu z ul. Ve Žlíbku			10	26
v místě vjezdu do areálu Nomie				
kabelový žlab v překopu rýhy u šachty Š2 ve vjezdu z ulice Ve Žlíbku			2	2

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně

FO 03

POTVRZENÍ ZMĚNY

PoZ č. 10

PoZ vystavil:

Datum:

PoZ č. na NOZ č. 10

na jiný dokument:

Odesláno/

předáno:

osobně

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Změny v navrhovaném Dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007746/2023 jsou ve smyslu § 222 odst. 6) zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ, nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 1 031 419,01-Kč bez DPH tj. 2,65%, odpočty činí: 0,00-Kč bez DPH tj. 0,00%, připočty činí: 1 031 419,01-Kč bez DPH tj. 2,65% ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny. Cena změny dle NoZ1, NoZ 2, NoZ3, NoZ4, NoZ5, NoZ6, NoZ 7, NoZ 8, NoZ 9, NoZ 10 je 4 338 416,46-Kč bez DPH tj. 11,13% ceny díla bez DPH.

Počet připojených listů
specifikací: 3 listy ZL č.10

Počet připojených výkresů:

Změna ceny díla (bez DPH):
1 031 419,01-Kč

Změny lhůty dokončení díla:

0,5 měsíce


Nová cena díla (bez DPH):
43 308 416,46-KčNová lhůta dokončení díla:
17 měsíců

Důvod ke změně:

požadavkem objednatele a skutečnými podmínkami

Všechné práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Poznámka:

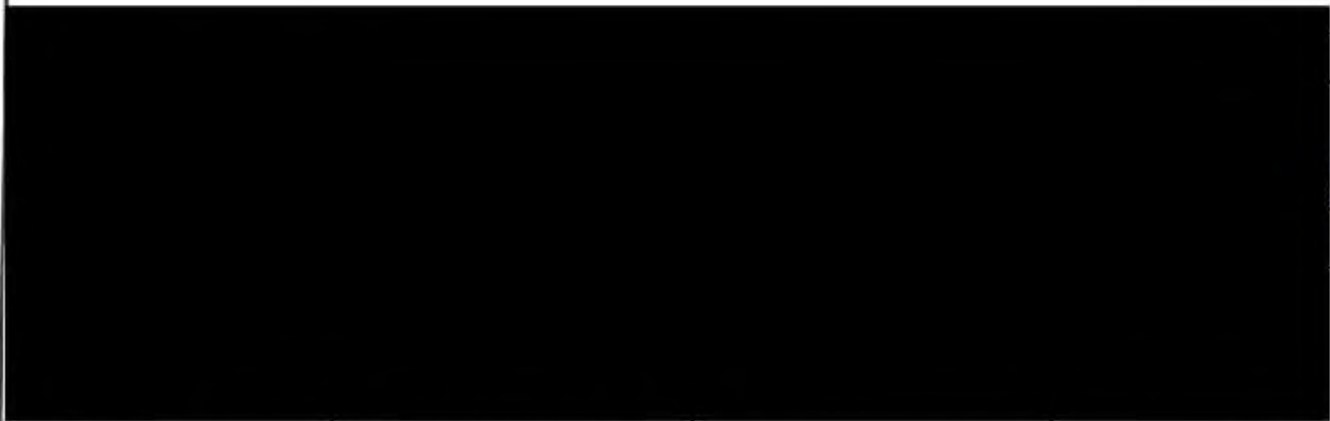Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 11	
Komu: INV MIIMP				Datum: 23.4.2024	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně	
Týká se:			SOD č. DIL/21/08/007746/2023		
Odkazy: na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:			Specifikace prací zpracoval: zhotovitel		
na jinou část smlouvy:					
kategorizace položek:					
01 - SO 01 Splašková kanalizace – v rámci výkazu výměr zadávací dokumentace stavby se počítalo na úseku Š1 – Š22 úseku stoky 1 s obnovou ohrusné vrstvy v celé šíři komunikace a s obnovením stávajících podkladních vrstev komunikace v šířce rýhy kanalizace. Po zfrézování ohrusné vrstvy stávajícího živičného krytu v tl. 4cm se ukázalo, že v některých částech komunikace, v místech mimo rýhu budované kanalizace, nejsou prakticky žádné stávající podkladní vrstvy, že stávající „ohrusná“ vrstva ležela tzv. na hlině. V těchto místech je nutné chybějící konstrukční vrstvy komunikace doplnit a až pak zrealizovat obnovu ohrusné vrstvy.					
					
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).					

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č.11											
NOZ zpracoval: In [REDACTED]		Datum: 23.4.2024												
NOZ č. 11 navazuje na:		OZ č. 11	PZ č.	PL č.:										
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně										
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DFL/21/08/007746/2023 předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny díla zpracované v návaznosti na rozpočtové podklady: Příloha k NOZ č.11 – Soupis prací Cena stavebních prací <table><tr><td>Cena přípočty</td><td>562 061,95-Kč</td></tr><tr><td>Cena odpočty</td><td>0,00-Kč</td></tr><tr><td>Cena celkem</td><td>562 061,95-Kč</td></tr><tr><td>DPH 21 %</td><td>118 033,00-Kč</td></tr><tr><td>Cena včetně DPH</td><td>680 094,95-Kč</td></tr></table> V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. /21/08/007746/2023 Zhotovitel provedl Neodkladnou změnu dle čl.5 , zpracoval a předložil Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provedl kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD. Počet listů příloh: 2 listy ZL č.11					Cena přípočty	562 061,95-Kč	Cena odpočty	0,00-Kč	Cena celkem	562 061,95-Kč	DPH 21 %	118 033,00-Kč	Cena včetně DPH	680 094,95-Kč
Cena přípočty	562 061,95-Kč													
Cena odpočty	0,00-Kč													
Cena celkem	562 061,95-Kč													
DPH 21 %	118 033,00-Kč													
Cena včetně DPH	680 094,95-Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 562 061,95 - Kč (pětsotšedesátčtyřtisícšedesátjedenakorundevadesátpěthalírů)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0,5 měsíce												
[REDACTED]														

SOUPIS PRACÍ

Místo: Praha 8 Horní Počernice
Objekt: Vodařská ul. 2. úsek
Stavba:

01 - SO 01 Splašková kanalizace - doplnění chybějících konstrukčních vrstev stávající komunikace stoka 2 v úseku Š2 - Š22

Místo: Praha 8 Horní Počernice
Zadavatel: HL.m.Praha INV
Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

Datum: 23.04.2024
Projektant:
Zpracovatel: Zvlener

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem bez DPH

19	K	122251106	Dokumovky a protopásky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojě					
34	K	162731117	Vodoravně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopkyšypacíny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1					
98	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky					
107	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládková) kód odpadu 17 05 04					
42	K	181951112	Úprava plátna v komině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a2 3 zhuštěním strojě					
87	K	564851111	Podklad ze šetrkovité štěrku plochy přes 100 m2 tl 200 mm					
91	K	567134111	Podklad ze směsi sláčené cementem SO C II 200 mm					
92	K	573191111A	Postřik infiltrační					
95	K	577150111A	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ADVH) tl 70 mm					
93	K	573231108A	Postřik žlutý spojovací ze silniční emulze					
94	K	577134111A	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 1 tl 40 mm					
155	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
156	M	59211006	obrubník betonový silniční 500x150x250mm					
157	K	916591127	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kosek z betonu prostého					
88	K	916331112	Osazení zábradřího obrubníku betonového itc lože z betonu prostého					
89	M	59211006	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm					
90	K	918591127	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kosek z betonu prostého					
105	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace					
106	K	998223081	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace za zvýšený přesun do 1000 m					



V souladu se zadací dokumentací byla zhrnována obrusná vrstva komunikace. Následně se ukázalo, že pod částí komunikace není žádná skladba (asfalt) lež. Objednatel rozhodnul o doplnění chybějících konstrukčních vrstev.

EKIS
v
Náč
193

**01 - SO 01 Splašková kanalizace - doplnění chybějících konstrukčních vrstev stávající komunikace stoka 2 v úseku Š2 - Š22 -
výměry:**

celková plocha komunikace		
délka	m	130,00
šířka	m	6,00
vjezdy jen v místě mezi vel. pruhy		z toho
celková délka	m	30,50
šířka	m	2,00
č.p. 296 jen hlína se šetrkem (zpevnění tam nebylo) 5,5*2	m2	-11,00
č.p. 1946 zůstaly původní zp. plochy 9*2	m2	18,00
ve spojení vjezdu 2641 a 302 zůstaly původní zp. plochy výjma 2m šíře, 1*2	m2	-14,00
vjezd č.p. 303 zůstal zpevněný, ale ani není v PD		
vjezd č.p. 2307 zůstal zpevněný 3*2	m2	-6,00
vjezd č.p. 2037 zůstal zpevněný 4*2	m2	-8,00
celkem		-57,00
celková plocha komunikace bez chodníku	m2	841,00
celková plocha komunikace bez zpevněných částí vjezdů	m2	784,00
v rozpočtu máme obrus, podbaly, betony od Š1 tj.	m	123,50
obrus	m2	741,00 6m šíře
podbal	m2	370,50 3m šíře
podkladní beton	m2	370,50 3m šíře
ŠD	m2	271,70 1,2m a 1m šíře
z původních kčních vrstev, na která se dá udělat jen obrus zůstalo: 191,73m2 16,4m2-1/5,4m2	m2	175,33
na obnovu komunikace nad stokou 2 zhruba po Š22 potřebujeme		
ACO 11 tl. 40mm	m2	13,00
ACO 22 tl. 70mm	m2	238,17
podkladní beton SCC	m2	238,17
ŠD	m2	336,97
dále bude potřeba doplnit		
sadový obrubník	bm	10,00
silniční obrubník	bm	22,00
původní kční vrstvy: měřeno na stavbě, (k 19.4.2024 se ještě nedělala obnova těch 3 stávajících UV, z toho jedna je ve vjezdu (celkem 3*2*2+1*2,2*2=16,4m2))		
26*2,1	m2	54,6
31,5*2,1	m2	66,15
8*2,1	m2	16,8
10*2,1	m2	21
5*2,1	m2	10,5
5*2,1	m2	10,5
5,8*2,1	m2	12,18
	m2	191,73
výbory a obnova povrchu v místě stávajících UV	m2	-16,4
celkem výměra zbyvajících povrchu	m2	175,33

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 11	
PoZ vystavil:		Datum:	
PoZ č. na NOZ č. 11		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. DII./21/08/007746/2023 jsou ve smyslu § 222 odst. 6) zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 562 061,95-Kč bez DPH tj. 1,44%, odpočty činí: 0,00-Kč bez DPH tj. 0,00%, připočty činí: 562 061,95-Kč bez DPH tj. 1,44% ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny. Cena změny dle NoZ1, NoZ 2, NoZ3, NoZ4, NoZ5, NoZ6, NoZ 7, NoZ 8, NoZ 9, NoZ 10, NoZ 11 je 4 900 478,41-Kč bez DPH tj. 12,58% ceny díla bez DPH.			
Počet připojených listů specifikací: 2 listy Zl. č.11		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 562 061,95-Kč		Změny lhůty dokončení díla: 0,5 měsíce	
Nová cena díla (bez DPH): 43 870 478,41-Kč		Nová lhůta dokončení díla: 17,5 měsíců	
Důvod ke změně: Skutečným stávajícím stavem			
			

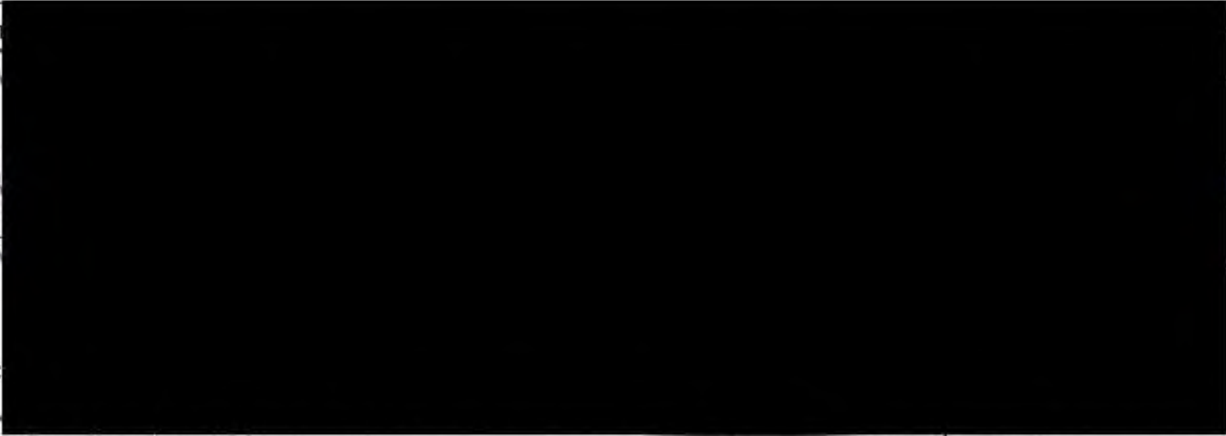Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně			FO I	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 12	
Komu: INV MHMP			Datum: 23.4.2024	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/08/007746/2023		
Odkazy: na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval: zhotovitel		
na jinou část smlouvy:				
kategorizace položek:				
01 - SO 01 Splašková kanalizace – v rámci průzkumných prací a inženýrsko-geologických sond prováděných zhotovitelem v rámci stavby byla provedena dne 28.8.2023 i sonda na zjištění skutečné tloušťky stávajících konstrukčních vrstev stávající komunikace Ve Žlábku. V ručně vybourané sondě bylo zjištěno, že stávající zpevněné konstrukční vrstvy (asfalt + beton) mají celk. tl. přes 50cm, z toho asfaltové vrstvy 25cm. Z následných jednání se zástupci TSK vyplynulo, že trvají na vyjádření uvedeném ve stanovisku svodné komise TSK tj. že výkopy narušený povrch krajnice požadují obnovit v celé šíři a že v úseku, kde kanalizace zasahuje do jízdního pruhu požadují obnovu krytu celé poloviny komunikace až k podélné spáře a nikoliv jen v šíři 3m samotného jízdního pruhu. Z výše uvedeného plyne, že je třeba vybourat stávající konstrukční vrstvy o daleko větší mocnosti, než s čím bylo uvažováno v zadávací dokumentaci, následně bude třeba obnovit asfaltové povrchy o větší výměře, než bylo uvažováno v zadávací dokumentaci a rovněž ve výrazně mocnější skladbě.				
Oznám				
03.02				
				
Datum:				
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně

FO 2

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY

NOZ č.12

NOZ zpracoval:

Datum: 23.4.2024

NOZ č. 12 navazuje na:

OZ č. 12

PZ č.

Pl. č.:

Odesláno/ předáno:

osobně

osobně

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. **DIL/21/08/007746/2023** předkládáme návrh úpravy

dohodnuté ceny díla zpracované v návaznosti na rozpočtové podklady:

Příloha k NOZ č.12 – Soupis prací

Cena stavebních prací

Cena přípočty 1 130 593,73-Kč

Cena odpočty - 275 655,60-Kč

Cena celkem 854 938,13-Kč

DPH 21 % 179 537,00-Kč

Cena včetně DPH 1 034 475,13-Kč

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. /21/08/007746/2023 Zhotovitel provedl Neodkladnou změnu dle čl.5 , zpracoval a předložil Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provedl kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.

Počet listů příloh: 4 listy ZL č.12

Navrhovaná změna ceny díla (slovy):

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:

854 938,13- Kč

(osmstěpadesátčtyřtisícdevětsetřicet osm korun a
ináčthalířů)

0,5 měsíce

Slendro

3649

01 - SO 01 Spitzkuni kanalizacija

454

Задача

 $2\text{HCO}_2\text{Al} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 + \text{HCO}_2\text{Al} + \text{Al}(\text{OH})_3$

PČ Typ	Nájd	Popis	MJ	Názov	Kód	Príloha	Príloha
Nákupný súpis	01	Nákupný súpis	1	Nákupný súpis	01	Príloha	Príloha

Nālikādyā śūpīṣa celiḥḥ


[illegible]

			fréza	bouržini asf. do tl. 100mm
Úsek "Š27 - Š25"			1 338,05	1 362,56
výměny	délka	72,00		
	šířka	7,80		
	SMA	553,80	553,80	
	ACL 22 70mm	298,20		596,40
	KSC 200	255,60		
infiltrační postřik spojovací postřik	ŠD 200	213,00		
		298,70		
		553,80		
úsek "Š25 - Š27"				
infiltrační postřik spojovací postřik úsek "Š27 - Š30"	délka	33,00		
	šířka	6,00		
	SMA	198,00	198,00	
	ACL 22 70mm	105,60		711,20
	KSC 200	85,80		
	ŠD 200	66,00		
		105,60		
infiltrační postřik spojovací postřik úsek "Š27 - Š30"		198,00		
	délka	67,00		
	šířka	8,75		
	SMA	585,25	585,25	
	ACL 22 80mm	214,40		714,40
	ACP 22 80mm	214,40		214,40
	KCS 200mm	174,20		
	ŠD 200mm	134,00		
		714,40		
		800,65		
rozšíření v místě šachet v jízdním pruhu v krajnici v místě šachty výtlaku a jámy protáku	ks	5+3		
	ks	3,00		
	ks	5,00		
	ks	1,00		
	ACL 22 70mm	16,80		33,60
	ACL 22 80mm	1,68		4,68
	ACP 22 80mm	4,68		4,68
	KCS 200mm	19,24		
	ŠD 200mm	16,48		
		4,68		
		4,68		
	délka	13,00		
	ACL 22 70mm	41,60		83,20
infiltrační postřik spojovací postřik Celkem bez přípojek SMA 40mm ACL 22 70mm ACL 22 80mm ACP 22 80mm KSC 200 ŠD 200 infiltrační postřik spojovací postřik úsek "Š2 - Š22"	KSC 200	33,80		
	ŠD 200	26,00		
		41,60		
		0,00		
	m2	1 338,05		
	m2	420,60		
	m2	214,40		
	m2	214,40		
	m2	534,84		
	m2	429,48		
přípojky - délka v kom. obnova stávajících UV (3ks, z toho jedna v asf. vjezdu) - dl. 2,2bm)		664,48		
		1 557,13		
	m	0,00		
	ACO 11	0,00	0,00	
	ACL 22	0,00		0,00
	KSC 200	0,00		
	ŠD 200	0,00		
	m	0,00		
	kus	0,00		
	ACL 22	0,00		
infiltrační postřik spojovací postřik	KSC 200	0,00		
	ŠD 200	0,00		
		0,00		
		0,00		
chodník - délka v m úsek Š2 - Š22 úsek Š22 - Š30		10,00		
		10,00		
	ACL 22	34,00		
	KSC 200	34,00		
	ŠD 200	22,00		
infiltrační postřik spojovací postřik				

2. kresťanský výstavba, kresťanský výstavba v štýle (S. 231)

2. kresťanský výstavba

2. kresťanský výstavba

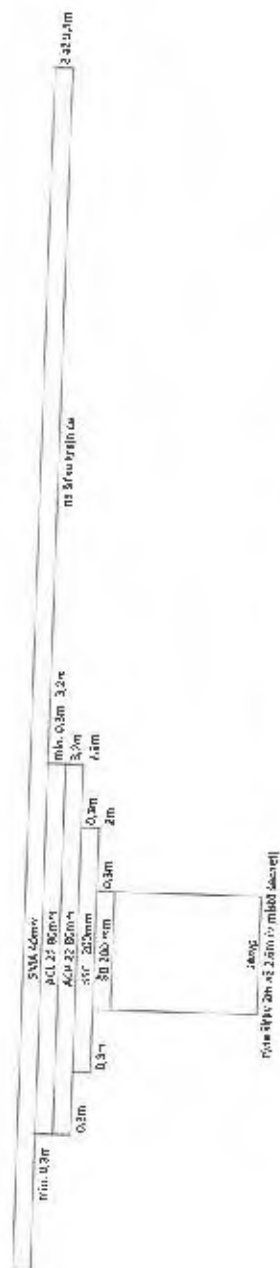

2. kresťanský výstavba, kresťanský výstavba v štýle (S. 231)





Téchnická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Adresát:

PROJEKT IV s.r.o.

Bassova 98

190 00 Praha 9 - Vysočany

Vaše č. j.:

Naše č. j.

Vyřizuje/tel.:

Dne:

TSK/08029/21/1109/Br

Pavel Brabec / 257 015 568

21.04.2021

Praha 20, Horní Počernice, V Slavětíně, Ve Žlíbku, parc.č. 4501/1, 4501/11, 4502/9 a další, „Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně“, výstavba nové dopravní a technické infrastruktury - SO 01 – 03 a PS 01, (investor INV MHMP), DSP.

Projednali jsme dokumentaci pro stavební, respektive vodoprávní řízení výše uvedených stavebních objektů a provozního souboru a vydáváme toto **technické stanovisko**:

- upozorňujeme, že v naší správě a údržbě je vlastní stavba vozovky, včetně zpevněných krajnic a západního chodníku a komunikační zeleň komunikace Ve Žlíbku na pozemku parc.č. 4502/9 k.ú. Horní Počernice, pozemky parc. č. 4501/1, 4501/11 a další k.ú. Horní Počernice nejsou v naší správě,
- dále upozorňujeme, že komunikace V Slavětíně jsou ve správě příslušné MČ,
- za vlastníka HMP souhlasíme, podle § 10 zákona 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s připojením stavby a staveniště na komunikaci Ve Žlíbku,
- přechod vozovky komunikace Ve Žlíbku požadujeme provést bezvýkopovou technologií (dle předložené PD),
- s narušením nového povrchu vozovky komunikace Ve Žlíbku, který je do 05/2023 v záruční lhůtě (viz příloženě koordinační vyjádření), souhlasíme pouze v místě zpevněné krajnice (mimo úsek stoky S2 od šachty Š27 až Š30), kde výkopy narušený povrch zpevněné krajnice požadujeme následně obnovit v celé šíři a v jedné souvislé celistvé ploše,
- v úseku, ve kterém kanalizační stoka S2 (od šachty Š27 po Š30) zasahuje i do nového povrchu jízdního pruhu vozovky komunikace Ve Žlíbku, souhlasíme s narušením tohoto nového povrchu pouze za podmínek, že investor uzavře smlouvu se zhotovitelem původní rekonstrukce vozovky této komunikace na provedení zpětného zásypu a oprav vozovky s novou záruční lhůtou (firma Porr, a.s., Václav Marhan 602 239 038, email: vaclav.marhan@porr.cz - tato

smlouva musí být uzavřena ještě před vydáním výkopového povolení a doložena na OS TSK pro Prahu - Sever při uzavírání výpůjční smlouvy) a že výkopy narušený povrch vozovky bude následně obnoven v celé polovině šíře až k podélné spáře a to v celé délce výkopu a v jedné celistvé ploše ohraničené dvěma kolmými spárami, nikoliž dle navrhované obnovy povrchu vozovky dle výkresu obnovy povrchů - TSK pouze v šíři jednoho jízdního (3,0 m),

- před vydáním výkopového povolení a uzavřením výpůjční smlouvy požadujeme předložit přímo OS TSK pro Prahu - Sever k odsouhlasení upravený výkres obnovy povrchů - TSK se zakreslením zpětné obnovy nového povrchu vozovky komunikace Ve Žlíbku dle výše uvedených požadavků,

- připojení na stávající živičné vrstvy vozovky komunikace Ve Žlíbku požadujeme realizovat stupňovitě po jednotlivých konstrukčních vrstvách (tzv. „zámkování“),

- upozorňujeme, že v případě poškozování a znečišťování přilehlých komunikací v souvislosti se stavbou a staveništní dopravou, budeme požadovat provádění jejich průběžné údržby a čištění po dobu výstavby na náklady investora, za účelem zajištění jejich sjízdnosti a schůdnosti,

- zrekonstruovanou komunikaci V Slavětíně (větev „1“, větev „2“ a větev „3“) a obslužnou plochu pro ČS nebudeme přebírat do naší správy a údržby (v současné době je komunikace ve správě příslušné MČ),

- v místě realizované kanalizace v jízdním pruhu respektive ve zpevněné krajnici vozovky komunikace Ve Žlíbku požadujeme provádět kontroly hutnění zásypu rýh pomocí statických zatěžovacích zkoušek,

- při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací požadujeme dodržovat „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“, schválené usnesením RHMP číslo 95 ze dne 31.1.2012, s účinností od 1.2.2012, ve znění přílohy číslo 1 usnesení RHMP číslo 127 ze dne 28.1.2014, s účinností od 1.2.2014,

- veškeré bližší informace a případné konzultace kvýše uvedenému paní Vodrážková, číslo telefonu: 257 015 611.

Oddělení odborných správ (oddělení 1326) nemá, z hlediska kanalizačních staveb, námitek, oddělení 1326 TSK nebude do své správy a údržby přebírat žádné nově realizované kanalizační zařízení.

Z hlediska oddělení správy dopravního značení (oddělení 1330) upozorňujeme, že do naší správy a údržby budeme přebírat pouze dopravní značení sloužící pro potřeby provozu na

komunikaci ve správě TSK; toto dopravní značení musí být provedeno dle „Technických podmínek pro svislé a vodorovné dopravní značení“ (viz příloha),

Úsek dopravního inženýrství (úsek 2131) nemá, z dopravně-inženýrského hlediska, námitek.

Z hlediska oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB (oddělení 4161) nemáme námitek.

– před termínem kolaudace požadujeme předání dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) do oddělení 3252 TSK (geodetické zaměření, včetně i nově realizovaného svislého a vodorovného dopravního značení + realizační dokumentace, bližší informace paní Koťátková, číslo telefonu: 257 015 236). Výkresy s geodetickým zaměřením budou předány v digitální formě (formát např. dgn, dxf, dwg, vyk, vbx) a označeny číslem akce 2018-1025-03064, přiděleným oddělením koordinace TSK. Kladné vyjádření od oddělení 3252 k předání této DSPS je nezbytnou součástí pro ukončení výkopového povolení a nájemní smlouvy,

– k této projektové dokumentaci přikládáme stanovisko od oddělení koordinace TSK, které si ponechává PD pro vlastní potřebu,

– závěrem upozorňujeme, že toto **technické stanovisko TSK slouží pouze jako podklad pro stanovisko vlastníka EVM MHMP, Praha 1, náměstí Franze Kafky 1, se kterým je rovněž nutné řešit majetko-právní vztahy u komunikací a pozemků, které jsou ve správě TSK.**

Přílohy: koordinační vyjádření TSK/371/21/1110/Ryb k akci č. 2018-1025-03064

„Technické podmínky pro svislé a vodorovné dopravní značení“

Kopie: 1110, 1320, 1326/KS, 1330, 2131, 3252, 4161, 1109/SK - ev.č. 145/2021,

PKD MHMP, EVM MHMP + návrh majetko-právního řešení

bečzan@tsk

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen TSK) tímto potvrzuje, že předložené technické podmínky jsou v souladu s předloženými podmínkami pro svislé a vodorovné dopravní značení. Zpracování a poskytnutí této DSPS bude provedeno dle požadavků zadavatele, který je uveden v příloze. TSK tímto potvrzuje, že předložené technické podmínky jsou v souladu s předloženými podmínkami pro svislé a vodorovné dopravní značení. Zpracování a poskytnutí této DSPS bude provedeno dle požadavků zadavatele, který je uveden v příloze. TSK tímto potvrzuje, že předložené technické podmínky jsou v souladu s předloženými podmínkami pro svislé a vodorovné dopravní značení. Zpracování a poskytnutí této DSPS bude provedeno dle požadavků zadavatele, který je uveden v příloze.

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně

FO 03

POTVRZENÍ ZMĚNY

PoZ č. 12

PoZ vystavil:

Datum:

PoZ č. na NOZ č. 12

na jiný dokument:

Odesláno/

předáno:

osobně

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Změny v navrhovaném Dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. DH /21/08/007746/2023 jsou ve smyslu § 222 odst. 6) zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 854 938,13-Kč bez DPH tj. 2,19%, odpočty činí: -275 655,60-Kč bez DPH tj. -0,71%, připočty činí: 1 130 593,73-Kč bez DPH tj. 2,90% ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny. Cena změny dle NoZ1, NoZ 2, NoZ3, NoZ4, NoZ5, NoZ6, NoZ 7, NoZ 8, NoZ 9, NoZ 10, NoZ 11, NoZ 12 je 5 755 416,54-Kč bez DPH tj. 14,77% ceny díla bez DPH.

Počet připojených listů

specifikací: 4 listy ZL č.12

Počet připojených výkresů:

Změna ceny díla (bez DPH):

854 938,13-Kč

Změny lhůty dokončení díla:

0,5 měsíc

Nová cena díla (bez DPH):

44 725 416,54-Kč

Nová lhůta dokončení díla:

18 měsíců

Důvod ke změně:

Skutečným stávajícím stavem a požadavkem TSK.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Poznámka:

Dat

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 13	
Komu: INV MHMP			Datum: 23.4.2024		
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně	
Týká se:			SOD č. DIL/21/08/007746/2023		
Odkazy: na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:			Specifikace prací zpracoval: zhotovitel		
na jinou část smlouvy:					
kategorizace položek:					
01 - SO 01 Splašková kanalizace – změna geologie oproti předpokladům v zadávací dokumentaci: Při provádění zemních prací stavební jámy čerpací stanice splaškových vod došlo k zastižení hornin tvrdších, než bylo předpokládáno v zadávací dokumentaci. Geotechnik objednatel provedl opakované prohlídky přímo na stavbě a k datu 12.4.2024 byl zhotoviteli zasláno skutečné zařídění z hlediska třídy těžitelnosti. Práce byly prováděny za výrazného přítoku spodní vody. Bylo nutné hor. tř. II/4.5 a III/6 rozrušovat ve stavební jámě ručními bouracími kladivy a bagrem na dně jámy, zvodnělý výkopek drapákem vytahoval ze dne jámy a nakládat na TNV, který zvodnělý výkopek převážel na mezideponii stavby do 500m. Až následně, po proschnutí výkopku na mezideponii, byl výkopek na mezideponii nakládán a odvážen na skládku.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: skutečnými hydrogeologickými podmínkami					
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).					

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně				FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY				NOZ č.13											
NOZ zpracoval: [REDACTED]				Datum: 23.4.2024											
NOZ č. 13 navazuje na:		OZ č. 13	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:		osobně			osobně										
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007746/2023 předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny díla zpracované v návaznosti na rozpočtové podklady: Příloha k NOZ č.13 – Soupis prací Cena stavebních prací <table> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>508 539,84-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>- 168 790,18-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>339 739,66-Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>71 345,33-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>411 084,99-Kč</td> </tr> </table> V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. /21/08/007746/2023 Zhotovitel provedl Neodkladnou změnu dle čl.5 , zpracoval a předložil Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provedl kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD. Počet listů příloh: 1 list ZL č.13						Cena přípočty	508 539,84-Kč	Cena odpočty	- 168 790,18-Kč	Cena celkem	339 739,66-Kč	DPH 21 %	71 345,33-Kč	Cena včetně DPH	411 084,99-Kč
Cena přípočty	508 539,84-Kč														
Cena odpočty	- 168 790,18-Kč														
Cena celkem	339 739,66-Kč														
DPH 21 %	71 345,33-Kč														
Cena včetně DPH	411 084,99-Kč														
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:												
339 739,66- Kč (třístatřicetdevět tisíc sedm set třicet devět korun šedesát šest halířů) (bez DPH)			0,5 měsíce												
[REDACTED]															


Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 13	
PoZ vystavil:		Datum:	
PoZ č. na NOZ č. 13		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
Podpis zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. DII/21/08/007746/2023 jsou ve smyslu § 222 odst. 6) zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 339 739,66-Kč bez DPH tj. 0,87%, odpočty činí: -168 790,18-Kč bez DPH tj. -0,43%, připočty činí: 508 529,84-Kč bez DPH tj. 1,30% ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny. Cena změny dle NoZ1, NoZ 2, NoZ3, NoZ4, NoZ5, NoZ6, NoZ 7, NoZ 8, NoZ 9, NoZ 10, NoZ 11, NoZ 12, NoZ 13 je 6 095 156,20-Kč bez DPH tj. 15,64% ceny díla bez DPH.			
Počet připojených listů specifikací: 1 list ZL č.13		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 339 739,68-Kč		Změny lhůty dokončení díla: 0,5 měsíce	
Nová cena díla (bez DPH): 45 065 156,20-Kč		Nová lhůta dokončení díla: 18,5 měsíců	
Důvod ke změně: Skutečnými hydrogeologickými podmínkami.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Datum:		Datum:	

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně			FO I	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 14	
Komu: INV MHMP			Datum: 20.2.2024	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/08/007746/2023		
Odkazy: na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval: zhotovitel		
na jinou část smlouvy:				
kategorizace položek:				
01 - SO 01 Splašková kanalizace – změna geologie oproti předpokladům v zadávací dokumentaci: Při provádění zemních prací na stoce 2 došlo k zastižení hornin jiné třídy těžitelnosti než bylo předpokládáno v zadávací dokumentaci. Z posudku geotechnika objednatele, zaslaného dne 12.12.2023, plyne, že v dotčených úsecích byly práce místo v hor. tř. těžitelnosti II/3, prováděny v horninách II/4,5 a III/6. Dále bylo třeba zhloubit podélný profil kanalizace tak, aby výsledný spád byl menší než 5%. V opačném případě by bylo nutné používat šachtová dna obkládaná čedičem, (při spádu 5% a vyšším je požadováno dle městských standardů PVS) s čímž zadávací dokumentace nepočítala.				
Oz	[Redacted Signature Area]			
Os				
Pr				
Da				
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č.14	
NOZ zpracoval: [REDACTED]		Datum: 20.2.2024		
NOZ č. 14 navazuje na:	OZ č. 14	PZ č.	PI č.:	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007746/2023 předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny díla zpracované v návaznosti na rozpočtové podklady: Příloha k NOZ č.14 – Soupis prací Cena stavebních prací Cena přípočty 117 666,24-Kč Cena odpočty - 15 117,10-Kč Cena celkem 102 549,14-Kč DPH 21 % 21 535,31-Kč Cena včetně DPH 124 084,45-Kč V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. /21/08/007746/2023 Zhotovitel provedl N neodkladnou změnu dle čl.5 , zpracoval a předložil Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny N neodkladné změny. Příkazník provedl kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD. Počet listů příloh: 6 listů ZL č.14				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 102 549,14 - Kč (stodvatisícepětsčtyřicetdevěttisícčtrnácthalířů) (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0,5 měsíce		
[REDACTED]				
Da				

Stavba č.3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 v Slavětíně
 Rekapitulace

	celkem	odpočet	přípočet
01 - SO 01 Splašková kanalizace - výkopy v hor. tř. 3- 6 v úseku Š1-st 27,2	66 172,41 Kč	-15 117,10 Kč	81 289,51 Kč
01 - SO 01 Splašková kanalizace - prohloubení výkopů v úseku Š1 - Š21	36 376,73 Kč		36 376,73 Kč
Celkem bez DPH	102 549,14 Kč	-15 117,10 Kč	117 666,24 Kč



SOUPIS PRACÍ

Stavba: TV Horní Počámkice, etapa 0034 v Blavetíně, ngr.3

01 - 30 01 Splašková kanalizace

Objekt

Objekt (obj)

Datum: 20.02.2024

Projekční ústav

Klient: Stavební úřad

Průběh	Typ	Kód	Popis	MU	Množství	Jednotka (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena s DPH	Průběh
Náklady soupisu celkem									
D 1 Zemní práce									
18	K	132254208	Hloubení zapečetěných rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	M3					
			původní výměra						
			nová výměra						
	K	132254202	Hloubení zapečetěných rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	M3					
			původní výměra						
			nová výměra						
	K	132454201	Hloubení zapečetěných rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3	M3					
			původní výměra						
			nová výměra						
	K	132554201	Hloubení zapečetěných rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3	M3					
			původní výměra						
			nová výměra						
							56 172,41		
							-16 177,10		
								81 289,54	

Výměra "skály" v úseku Š1 - Š19 a dále cca po přípojkou č.p. 2037 tj. do staničení 27,2 k šachtě Š20 a dle geodetické posouzení objednatele v členění:

- 3.třída 45%
- 4.třída 35%
- 5.třída 15%
- 6.třída 5%

Výměra výkopů dle rozpočtu:

"stoka Š1" $(1,2 \times 3,85 \times 14,5) + (1,2 \times 3,45 \times 85,5) + (1,2 \times 2,2 \times 340)$

"rozšíření pro šachty" $(1,3 \times 2,5 \times 92,79) + (1,5 \times 2,5 \times 9,04)$

tj. výměry pro úsek Š1 - st 27,2:

1,2*3,85*(14,5-11,95)

1,2*3,45*(65,6-26,8-35)

1,2*2,2*(13,2+11-(14,5-11,95)-(65,6-26,8-35))

1,3*2,5*(3,98+3,82)

Hloubení rýh š do 2000 mm v hor tř těž I skupiny 3 objem do 5000 m3 celkem
hlubší výkopy

celkem objem výkopů rýhy pro řad a šachty

z toho ve třídě 3

z toho ve třídě 4

z toho ve třídě 5

z toho ve třídě 6

11,781

15,732

47,124

25,350

88,206

3,802

92,008


41,404

32,203

13,801

4,600

92,008



Výměry hlubších výkopů stoky S2 v úseku Š1 - Š21 (výpočet výměry pro potřeby výpočtu výměry skály v úseku Š1-Š21)

Při spádu 5% a větším musí být šachtová dna šachet dle MS HL.m.Prahy s čedičovým dnem.

Čedičová dna v zadávací dokumentaci nebyla na což byl zadavatel upozorněn v rámci

dodatečných informací. Protože by PVK čedičová dna požadovala, tak AD rozhodnul, aby spád

byl upraven tak, aby nedošlo k dosažení a překročení 5% spádu. Což znamenalo, že při

mírnějším spádu došlo na úseku Š1- Š21 k zahloubení kanalizace oproti podélnému profilu a

to:

u šachty	zahloubení v m	průměrné zahloubení na šířka	rýhy	rozšíření pro šachty
Š1	0			
Š19	0,09	0,045	1,2	0,594
st 27,2	0,21	0,15	1,2	2,916
				0
				3,51
				0,2925
				3,8025

celkem větší výkopy řadů a šachet o

SOUPIS PRACÍ

Typ domu: Početnice, řada C34 V S světl. 3 opt. 3

01 - SO 01 Splašková kanalizace

akt
11.1.2024

Datum: 16.02.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Ř.č.	Typ	Kód	Popis	M.j.	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za instalaci	Přípočet
------	-----	-----	-------	------	----------	---------------	-------------------	-------------------	----------


Náklady soupisu celkem

0	1		Zemní práce						
16	K	132264239	Hlukb. závažných rýh s do 2000 mm v hornité řídě těželnosti 1 skupiny 3 odem do 5000 m3						
46	K	162251103	Vodorovné přímáření přes 50 do 500 m výkopku/sypání z normy třídy těželnosti 1 skupiny 1 až 3						
		Buř	Zásypa, obep, podk. št.						
47	K	162761117	Vodorovné přímáření přes 8 000 do 10000 m výkopku/sypání z horní třídy těželnosti 1 skupiny 1 až 3						
48	K	162161111	"Přetvářecí" výkop na sklád.						
		Buř	Nakládání výkopku z horní třídy těželnosti 1 skupiny 1 až 3 přes 100 m3						
50	K	171251301	Zásypa, obep, podk. št.						
		Buř	Uložení sypání na skládě nebo mazaně						
51	K	174151101	Zásypa, obep, podk. št.						
52	M	58227331	Zásypa, obep, podk. št.						
		A32	Zhutněním						
132	K	804911511	šlákování, frakce 0/22						
		B122	"Čekání" 1h.22						
133	M	50224180	Česání betonovým rabo železobetonových dílů pro šachty skruží rových 820 + 1*220						
134	M	50224181	"Čekání" 1h.22						
136	M	50224181	škrub kanalizační a ocelovými stupadly 100x25x12cm						
		Buř	škrub kanalizační a ocelovými stupadly 100x50x12cm						
137	M	50224181	škrub kanalizační a ocelovými stupadly 60x25x12cm						
		Buř	řezání elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000						

Výměry hlubších výkopů stoky S2 v úseku Š1 - Š21:

Při spádu 5% a větším musí být šachtová dna šachet dle MS HL.m.Prahy s čedičovým dnem. Čedičová dna v zadávací dokumentaci nebyla na což byl zadavatel upozorněn v rámci dodatečných informací. Protože by PVK čedičová dna požadovala, tak AD rozhodnul, aby spád byl upraven tak, aby nedošlo k dosažení a překročení 5% spádu. Což znamenalo, že při mírnějším spádu došlo na úseku Š1- Š21 k zahloubení kanalizace oproti podélnému profilu a to:

u šachty	zahloubení v m	průměrné zahloubení na úseku	šířka	rýhy	rozšíření pro šachty
Š1	0				
Š19	0,09	11	0,045	1,2	0,594
Š20	0,39	39,7	0,24	1,2	11,4336
Š21	0	50	0,195	1,2	11,7
					0
				23,7276	1,56
				25,2876	
celkem větší výkopy řadů a šachet o					



Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně				FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY				PoZ č. 14	
PoZ vystavil:			Datum:		
PoZ č. na NOZ č. 14			na jiný dokument:		
Odesláno/ předáno:				osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007746/2023 jsou ve smyslu § 222 odst. 6) zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 102 549,14-Kč bez DPH tj. 0,26%, odpočty činí: -15 117,10-Kč bez DPH tj. -0,04%, přípočty činí: 117 666,24-Kč bez DPH tj. 0,30% ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny. Cena změny dle NoZ1, NoZ 2, NoZ3, NoZ4, NoZ5, NoZ6, NoZ 7, NoZ 8, NoZ 9, NoZ 10, NoZ 11, NoZ 12, NoZ 13, NoZ 14 je 6 197 705,34-Kč bez DPH tj. 15,90% ceny díla bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací: 6 listů ZI. č.14			Počet připojených výkresů:		
Změna ceny díla (bez DPH): 102 549,14-Kč			Změny lhůty dokončení díla: 0,5 měsíce		
Nová cena díla (bez DPH): 45 167 705,34-Kč			Nová lhůta dokončení díla: 19 měsíců		
Důvod ke změně: Skutečnými hydrogeologickými podmínkami.					
Všecké práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Poznámka:					

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 15	
Komu: INV MHMP			Datum: 16.4.2024	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/08/007746/2023		
Odkazy: na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval: zhotovitel		
na jinou část smlouvy:				
kategorizace položek:				
01 - SO 01 Splašková kanalizace – změna hydrogeologie oproti předpokladům v zadávací dokumentaci: Při provádění zemních prací na splaškové a dešťové kanalizace došlo k zastižení hladiny spodní vody výrazně výše než předpokládala zadávací dokumentace. Hladina spodní vody začínala cca 1bm pod úrovní terénu z čehož vyplynula nutnost zřízení výrazně většího množství čerpacích jímek, výrazně většího čerpání spodní vody v průběhu realizace stavby a čerpání vody na výrazně delší vzdálenosti než bylo původně v zadávací dokumentaci předpokládáno.				
Oznámení a průběh řízení o změně je zpracováno elektronicky a dokumentováno v souboru:				
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č.15	
NOZ zpracoval: [REDACTED]		Datum: 16.4.2024		
NOZ č. 15 navazuje na:		OZ č. 15	PZ č.	PL č.:
Odesláno/ předáno:		osobně		osobně
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007746/2023 předkládáme návrh úpravy				
dohodnuté ceny díla zpracované v návaznosti na rozpočtové podklady:				
Příloha k NOZ č.15 – Soupis prací				
Cena stavebních prací				
Cena přípočty	245 647,00-Kč			
Cena odpočty	0,00-Kč			
Cena celkem	245 647,00-Kč			
DPH 21 %	51 585,87-Kč			
Cena včetně DPH	297 232,87-Kč			
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. /21/08/007746/2023 Zhotovitel provedl Neodkladnou změnu dle čl.5 , zpracoval a předložil Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provedl kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.				
Počet listů příloh: 2 listy ZL č.15				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:		
245 647,00 - Kč (dvěstěčtyřicetpět tisíc šest set čtyřicet sedm korun) (bez DPH)				
[REDACTED]				

SOUPIS PRACÍ

TV Horní Počernice, etapa 003.4 V Slavětíně, opr.3

Čerpání spodní vody

Praha 9 Horní Počernice, V Slavětíně
Hl.m.Praha INV
EKIS, spol. s r.o.

Datum: 15.04.2024
Projektant:
Zpracovatel: Zvlener

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14	D	1	Zemní práce					
	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min					
	VV	A14	1443 klad v SD, v rozpočtu celkem 1224hod					
15	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní do 10 m přítok do 500 l/min					
			203 dní v SD, v rozpočtu celkem 51					
	K	115001101	Čerpání vody - převedení vody potrubím pr DN do 100mm					
			20+40+40+20					
66	K	242111R02	Čerpací jímka hl. 2-3 m - zřízení a odstranění					

SD Compul - standardizanta 0,1

epoching justing	sq inch	5.437 inches
12.1	13.7	14.1
13.7	14.1	14.7
14.1	14.7	15.4
15.4	16.1	16.7
16.1	16.7	17.4
17.4	18.1	18.7
18.1	18.7	19.4
19.4	20.1	20.7
20.1	20.7	21.4
21.4	22.1	22.7
22.1	22.7	23.4
23.4	24.1	24.7
24.1	24.7	25.4
25.4	26.1	26.7
26.1	26.7	27.4
27.4	28.1	28.7
28.1	28.7	29.4
29.4	30.1	30.7
30.1	30.7	31.4
31.4	32.1	32.7
32.1	32.7	33.4
33.4	34.1	34.7
34.1	34.7	35.4
35.4	36.1	36.7
36.1	36.7	37.4
37.4	38.1	38.7
38.1	38.7	39.4
39.4	40.1	40.7
40.1	40.7	41.4
41.4	42.1	42.7
42.1	42.7	43.4
43.4	44.1	44.7
44.1	44.7	45.4
45.4	46.1	46.7
46.1	46.7	47.4
47.4	48.1	48.7
48.1	48.7	49.4
49.4	50.1	50.7
50.1	50.7	51.4
51.4	52.1	52.7
52.1	52.7	53.4
53.4	54.1	54.7
54.1	54.7	55.4
55.4	56.1	56.7
56.1	56.7	57.4
57.4	58.1	58.7
58.1	58.7	59.4
59.4	60.1	60.7
60.1	60.7	61.4
61.4	62.1	62.7
62.1	62.7	63.4
63.4	64.1	64.7
64.1	64.7	65.4
65.4	66.1	66.7
66.1	66.7	67.4
67.4	68.1	68.7
68.1	68.7	69.4
69.4	70.1	70.7
70.1	70.7	71.4
71.4	72.1	72.7
72.1	72.7	73.4
73.4	74.1	74.7
74.1	74.7	75.4
75.4	76.1	76.7
76.1	76.7	77.4
77.4	78.1	78.7
78.1	78.7	79.4
79.4	80.1	80.7
80.1	80.7	81.4
81.4	82.1	82.7
82.1	82.7	83.4
83.4	84.1	84.7
84.1	84.7	85.4
85.4	86.1	86.7
86.1	86.7	87.4
87.4	88.1	88.7
88.1	88.7	89.4
89.4	90.1	90.7
90.1	90.7	91.4
91.4	92.1	92.7
92.1	92.7	93.4
93.4	94.1	94.7
94.1	94.7	95.4
95.4	96.1	96.7
96.1	96.7	97.4
97.4	98.1	98.7
98.1	98.7	99.4
99.4	100.1	100.7
100.1	100.7	101.4
101.4	102.1	102.7
102.1	102.7	103.4
103.4	104.1	104.7
104.1	104.7	105.4
105.4	106.1	106.7
106.1	106.7	107.4
107.4	108.1	108.7
108.1	108.7	109.4
109.4	110.1	110.7
110.1	110.7	111.4
111.4	112.1	112.7
112.1	112.7	113.4
113.4	114.1	114.7
114.1	114.7	115.4
115.4	116.1	116.7
116.1	116.7	117.4
117.4	118.1	118.7
118.1	118.7	119.4
119.4	120.1	120.7
120.1	120.7	121.4
121.4	122.1	122.7
122.1	122.7	123.4
123.4	124.1	124.7
124.1	124.7	125.4
125.4	126.1	126.7
126.1	126.7	127.4
127.4	128.1	128.7
128.1	128.7	129.4
129.4	130.1	130.7
130.1	130.7	131.4
131.4	132.1	132.7
132.1	132.7	133.4
133.4	134.1	134.7
134.1	134.7	135.4
135.4	136.1	136.7
136.1	136.7	137.4
137.4	138.1	138.7
138.1	138.7	139.4
139.4	140.1	140.7
140.1	140.7	141.4
141.4	142.1	142.7
142.1	142.7	143.4
143.4	144.1	144.7
144.1	144.7	145.4
145.4	146.1	146.7
146.1	146.7	147.4
147.4	148.1	148.7
148.1	148.7	149.4
149.4	150.1	150.7
150.1	150.7	151.4
151.4	152.1	152.7
152.1	152.7	153.4
153.4	154.1	154.7
154.1	154.7	155.4
155.4	156.1	156.7
156.1	156.7	157.4
157.4	158.1	158.7
158.1	158.7	159.4
159.4	160.1	160.7
160.1	160.7	161.4
161.4	162.1	162.7
162.1	162.7	163.4
163.4	164.1	164.7
164.1	164.7	165.4
165.4	166.1	166.7
166.1	166.7	167.4
167.4	168.1	168.7
168.1	168.7	169.4
169.4	170.1	170.7
170.1	170.7	171.4
171.4	172.1	172.7
172.1	172.7	173.4
173.4	174.1	174.7
174.1	174.7	175.4
175.4	176.1	176.7
176.1	176.7	177.4
177.4	178.1	178.7
178.1	178.7	179.4
179.4	180.1	180.7
180.1	180.7	181.4
181.4	182.1	182.7
182.1	182.7	183.4
183.4	184.1	184.7
184.1	184.7	185.4
185.4	186.1	186.7
186.1	186.7	187.4
187.4	188.1	188.7
188.1	188.7	189.4
189.4	190.1	190.7
190.1	190.7	191.4
191.4	192.1	192.7
192.1	192.7	193.4
193.4	194.1	194.7
194.1	194.7	195.4
195.4	196.1	196.7
196.1	196.7	197.4
197.4	198.1	198.7
198.1	198.7	199.4
199.4	200.1	200.7
200.1	200.7	201.4
201.4	202.1	202.7
202.1	202.7	203.4
203.4	204.1	204.7
204.1	204.7	205.4
205.4	206.1	206.7
206.1	206.7	207.4
207.4	208.1	208.7
208.1	208.7	209.4
209.4	210.1	210.7
210.1	210.7	211.4
211.4	212.1	212.7
212.1	212.7	213.4
213.4	214.1	214.7
214.1	214.7	215.4
215.4	216.1	216.7
216.1	216.7	217.4
217.4	218.1	218.7
218.1	218.7	219.4
219.4	220.1	220.7
220.1	220.7	221.4
221.4	222.1	222.7
222.1	222.7	223.4
223.4	224.1	224.7
224.1	224.7	225.4
225.4	226.1	226.7
226.1	226.7	227.4
227.4	228.1	228.7
228.1	228.7	229.4
229.4	230.1	230.7
230.1	230.7	231.4
231.4	232.1	232.7
232.1	232.7	233.4
233.4	234.1	234.7
234.1	234.7	235.4
235.4	236.1	236.7
236.1	236.7	237.4
237.4	238.1	238.7
238.1	238.7	239.4
239.4	240.1	240.7
240.1	240.7	241.4
241.4	242.1	242.7
242.1	242.7	243.4
243.4	244.1	244.7
244.1	244.7	245.4
245.4	246.1	246.7
246.1	246.7	247.4
247.4	248.1	248.7
248.1	248.7	249.4
249.4	250.1	250.7
250.1	250.7	251.4
251.4	252.1	252.7
252.1	252.7	253.4
253.4	254.1	254.7
254.1	254.7	255.4
255.4	256.1	256.7
256.1	256.7	257.4
257.4	258.1	258.7
258.1	258.7	259.4
259.4	260.1	260.7
260.1	260.7	261.4
261.4	262.1	262.7
262.1	262.7	263.4
263.4	264.1	264.7
264.1	264.7	265.4
265.4	266.1	266.7
266.1	266.7	267.4
267.4	268.1	268.7
268.1	268.7	269.4
269.4	270.1	270.7
270.1	270.7	271.4
271.4	272.1	272.7
272.1	272.7	273.4
273.4	274.1	274.7
274.1	274.7	275.4
275.4	276.1	276.7
276.1	276.7	277.4
277.4	278.1	278.7
278.1	278.7	279.4
279.4	280.1	280.7
280.1	280.7	281.4
281.4	282.1	282.7
282.1	282.7	283.4
283.4	284.1	284.7
284.1	284.7	285.4
285.4	286.1	286.7
286.1	286.7	287.4
287.4	288.1	288.7
288.1	288.7	289.4
289.4	290.1	290.7
290.1	290.7	291.4
291.4	292.1	292.7
292.1	292.7	293.4
293.4	294.1	294.7
294.1	294.7	295.4
295.4	296.1	296.7
296.1	296.7	297.4
297.4	298.1	298.7
298.1	298.7	299.4
299.4	300.1	300.7
300.1	300.7	301.4
301.4	302.1	302.7
302.1	302.7	303.4
303.4	304.1	304.7
304.1	304.7	305.4
305.4	306.1	306.7
306.1	306.7	307.4
307.4	308.1	308.7
308.1	308.7	309.4
309.4	310.1	310.7
310.1	310.7	311.4
311.4	312.1	312.7
312.1	312.7	313.4
313.4	314.1	314.7
314.1	314.7	315.4
315.4	316.1	316.7
316.1	316.7	317.4
317.4	318.1	318.7
318.1	318.7	319.4
319.4	320.1	320.7
320.1	320.7	321.4
321.4	322.1	322.7
322.1	322.7	323.4
323.4	324.1	324.7
324.1	324.7	325.4
325.4	326.1	326.7
326.1	326.7	327.4
327.4	328.1	328.7
328.1	328.7	329.4
329.4	330.1	330.7
330.1	330.7	331.4
331.4	332.1	332.7
332.1	332.7	333.4
333.4	334.1	334.7
334.1	334.7	335.4
335.4	336.1	336.7
336.1	336.7	337.4
337.4	338.1	338.7
338.1	338.7	339.4
339.4	340.1	340.7
340.1	340.7	341.4
341.4	342.1	342.7
342.1	342.7	343.4
343.4	344.1	344.7
344.1	344.7	345.4
345.4	346.1	346.7
346.1	346.7	347.4
347.4	348.1	348.7
348.1	348.7	349.4
349.4	350.1	350.7
350.1	350.7	351.4
351.4	352.1	352.7
352.1	352.7	353.4
353.4	354.1	354.7
354.1	354.7	355.4
355.4	356.1	356.7
356.1	356.7	357.4
357.4	358.1	358.7
358.1	358.7	359.4
359.4	360.1	360.7
360.1	360.7	361.4
361.4	362.1	362.7
362.1	362.7	363.4
363.4	364.1	364.7
364.1	364.7	365.4
365.4	366.1	366.7
366.1	366.7	367.4
367.4	368.1	368.7
368.1	368.7	369.4
369.4	370.1	370.7
370.1	370.7	371.4
371.4	372.1	372.7
372.1	372.7	373.4
373.4	374.1	374.7
374.1	374.7	375.4
375.4	376.1	376.7
376.1	376.7	377.4
377.4	378.1	378.7
378.1	378.7	379.4
379.4	380.1	380.7
380.1	380.7	381.4
381.4	382.1	382.7
382.1	382.7	38

277

Year	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
Year	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
Year	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100

అంశము - స్తంభముల ద్వారా

[illegible]

၂၂၂

	Defendant	Days	For	Days	Days
	rehabilitation, dependent	51	20	10	15
		1224	402	240	360
					144

Հերթ՝ լիմֆ:

[illegible]

также имеет место в: 34

[illegible]

Figure 1. *ImpK*

470

1970s

7

УКР Загратије у Српској напојени те ствари још казалима да у припадницима Војске

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 15	
PoZ vystavil:		Datum:	
PoZ č. na NOZ č. 15		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007746/2023 jsou ve smyslu § 222 odst. 6) zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 245 647,00-Kč bez DPH tj. 0,63%, odpochty činí: 0,00-Kč bez DPH tj. 0,00%, přípočty činí: 245 647,00-Kč bez DPH tj. 0,63% ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny. Cena změny dle NoZ 1, NoZ 2, NoZ 3, NoZ 4, NoZ 5, NoZ 6, NoZ 7, NoZ 8, NoZ 9, NoZ 10, NoZ 11, NoZ 12, NoZ 13, NoZ 14, NoZ 15 je 6 443 352,34-Kč bez DPH tj. 16,53% ceny díla bez DPH.			
Počet připojených listů specifikací: 2 listy ZL č.15		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 245 647,00-Kč		Změny lhůty dokončení díla:	
Nová cena díla (bez DPH): 45 413 352,34-Kč		Nová lhůta dokončení díla:	
Důvod ke změně:			
Skutečnými hydrogeologickými podmínkami.			
Všechné práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Datum:			

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 16	
Komu: INV MHMP			Datum: 25.4.2024	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/08/007746/2023		
Odkazy: na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval: zhotovitel		
na jinou část smlouvy:				
kategorizace položek:				
01 - SO 01 Splašková kanalizace – na základě požadavku zástupce PVK a.s. z 25.4.2024 je nutné provést změny týkající se uklidňovací šachty výtlaku kanalizace a spádových betonů na dně čerpací jímky: Uklidňovací šachtu zvětšit na vnitřní profil DN 1200, čedič na dně šachty (ve výkazu výměr zadávací dokumentace jsou všechna dna, včetně uklidňovací šachty, betonová), na dně oblouk natočený směrem do odtoku ze šachty, svislou část výtlaku v šachtě ukotvit objímkami do stěny. Na dně jímky čerpací stanice provést betonové bloky a klíny dle požadavku.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: požadavkem budoucího správce-provozovatele PVK a.s.				
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně				FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY				NOZ č.16											
NOZ zpracoval: [REDACTED]				Datum: 26.4.2024											
NOZ č. 16 navazuje na:		OZ č. 16	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:		osobně			osobně										
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007746/2023 předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny díla zpracované v návaznosti na rozpočtové podklady: Příloha k NOZ č.15 – Soupis prací Cena stavebních prací <table> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>106 342,01-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>- 19 948,00-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>86 394,01-Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>18 142,74-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>104 536,75-Kč</td> </tr> </table> V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. /21/08/007746/2023 Zhotovitel provedl Neodkladnou změnu dle čl.5 , zpracoval a předložil Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provedl kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD. Počet listů příloh: 1 list ZL č.16						Cena přípočty	106 342,01-Kč	Cena odpočty	- 19 948,00-Kč	Cena celkem	86 394,01-Kč	DPH 21 %	18 142,74-Kč	Cena včetně DPH	104 536,75-Kč
Cena přípočty	106 342,01-Kč														
Cena odpočty	- 19 948,00-Kč														
Cena celkem	86 394,01-Kč														
DPH 21 %	18 142,74-Kč														
Cena včetně DPH	104 536,75-Kč														
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:												
86 394,01 - Kč (osmdesátšesttisícťristadevadesátčtyřikorunjeden halír) (bez DPH)															
[REDACTED]															

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TV I lom Počernice, etapa 0034 V Slavětíně opr.S

Objekt:

01 - SO 01 Splaškové kanalizace - změna ukliďovací šachty dle požadavku PVK a
spádové betony na dně čpací šachty dle požadavku PVK

Místo:

Praha 3 Horní Počernice

Datum: 28.04.2024

Zaměst:

Hlm.Praha INV

Projektant:

Zhotovitel:

EKS, spol. s r.o.

Zpracovatel: Zwiener

PČ Typ

Kód

Popis

MI

Množství

Jednot. [ČZK]

Cena celkem [ČZK]

Celková soustava

Odjezd

Přibývá

Náklady soupisu celkem

86 394,01

15 945,00

105 342,01

U	Š	Trubní vedení	
120	K	977265201	Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PL trub d 110
122	M	20914091	elektroobložení PE 100 PN16 D 110mm
126	K	877265212	Montáž elektrického 90° na kanalizačním potrubí z PE trub d 110
127	M	78914937	elektroobložení 20° PE 100 PN16 D 110mm
9	K	38180114	kovový materiál pro zachytávání potrubí
10	K	38180115	služby spojené s materiálem, směsí, malbou
132	K	894417311	Ochrana betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných
133	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm
134	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm
	M	59224162	skruž kanalizační DN 1200 kanalizační
	M	59224163	120x120x13,5cm, stupadla pořízená
135	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm
	M	59224163	skruž kanalizační DN 1200 kanalizační
	M	59224164	120x120x13,5cm, stupadla pořízená
137	M	59224165	skruž kanalizační s ocelovými stupadly DN 1200
	M	59224166	skruž kanalizační DN 1200
138	X	884417211	Dělení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových
	M	59224162	skruž kanalizační DN 1200
140	K	894417211	Ochrana betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových (dno)
141	M	59224165	skruž kanalizační DN 1200
1	K	084102221	Stěny šachty z betonových dílců s výškou 11 250 mm
	VV		stěna šachty z betonových dílců
	VV		stěna šachty z betonových dílců
	VV		stěna šachty z betonových dílců
2	K	894104221	Stěny šachty z dílců z kyselinosvazované kamenniny průměr do 600 mm
	VV		stěna šachty z dílců z kyselinosvazované kamenniny
	VV		stěna šachty z dílců z kyselinosvazované kamenniny
	VV		stěna šachty z dílců z kyselinosvazované kamenniny
3	K	894105122	Dlažba šachty z dílců z kyselinosvazované kamenniny
	VV		dlažba šachty z dílců z kyselinosvazované kamenniny
	VV		dlažba šachty z dílců z kyselinosvazované kamenniny
	VV		dlažba šachty z dílců z kyselinosvazované kamenniny
4	K	894201120	Dno šachty z dílců z kyselinosvazované kamenniny
	VV		dno šachty z dílců z kyselinosvazované kamenniny
	VV		dno šachty z dílců z kyselinosvazované kamenniny
	VV		dno šachty z dílců z kyselinosvazované kamenniny
5	K	899501221	Stupadla do šachty ocelová v PE povlaku s výškou pro přímé zabudování do hmoty
	VV		stupadla do šachty ocelová v PE povlaku s výškou pro přímé zabudování do hmoty
	VV		stupadla do šachty ocelová v PE povlaku s výškou pro přímé zabudování do hmoty
	VV		stupadla do šachty ocelová v PE povlaku s výškou pro přímé zabudování do hmoty
35	K	321311116	Konstrukce vnitřní stěny z betonu prosklené
	VV		konstrukce vnitřní stěny z betonu prosklené
36	K	321351010	Bednění konstrukcí vnitřních stěn rovných - zřezání
	VV		bednění konstrukcí vnitřních stěn rovných - zřezání
38	K	321351010	Bednění konstrukcí vnitřních stěn rovných - zřezání
	VV		bednění konstrukcí vnitřních stěn rovných - zřezání
173	K	940275101	Převod hmoty pro šachty vedení z trub kanalizačních
	VV		převod hmoty pro šachty vedení z trub kanalizačních
174	K	95275121	Převod hmoty pro šachty vedení z trub kanalizačních
	VV		převod hmoty pro šachty vedení z trub kanalizačních

UŠ

zvětšit na průměr DN 1200

výšledek zástupce na výšku a naměřit do odstavce

výšledek zástupce ke stěně šachty

dno z čísel

ČS

na dně šachty na jedné straně ocelový blok a na druhé straně

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně				FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY				PoZ č. 16	
PoZ vystavil:			Datum:		
PoZ č. na NOZ č. 16			na jiný dokument:		
Odesláno/ předáno:				osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007746/2023 jsou ve smyslu § 222 odst. 6) zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 86 394,01-Kč bez DPH tj. 0,22%, odpočty činí: -19 948,00-Kč bez DPH tj. -0,05%, připočty činí: 106 342,01-Kč bez DPH tj. 0,27% ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny. Cena změny dle NoZ1, NoZ 2, NoZ3, NoZ4, NoZ5, NoZ6, NoZ 7, NoZ 8, NoZ 9, NoZ 10, NoZ 11, NoZ 12, NoZ 13, NoZ 14, NoZ 15, NoZ16 je 6 529 746,35-Kč bez DPH tj. 16,76% ceny díla bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací: 1 list ZL č.16			Počet připojených výkresů:		
Změna ceny díla (bez DPH): 86 394,01-Kč			Změny lhůty dokončení díla:		
Nová cena díla (bez DPH): 45 499 746,35-Kč			Nová lhůta dokončení díla:		
Důvod ke změně:					
Požadavkem budoucího správce-provozovatele PVK a.s.					
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Poznámka:					

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně						FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY						OZ č. 17	
Komu: INV MHMP					Datum: 26.4.2024		
Odesláno/ předáno:		osobně				osobně	
				Týká se:	SOD č. DIL/21/08/007746/2023		
Odkazy: na specifikaci:							
na výkresy:							
na rozpočtové podklady:				Specifikace prací zpracoval: zhotovitel			
na jinou část smlouvy:							
kategorizace položek:							
02 - SO 02 Odvodnění komunikace – změna geologie oproti předpokladům v zadávací dokumentaci: Severně od větve 3 komunikace se mají, dle zadávací dokumentace, provádět terénní odkopávky a výkop vodoteče sloužící k odvodnění této části komunikace. V prostoru plánovaných terénních úprav a vodoteče byly provedeny sondy k ověření skutečných hydrogeologických podmínek. V těchto sondách byly v severovýchodní části zastiženy horniny tvrdší, než předpokládá výkaz výměr zadávací dokumentace stavby. Dle posudku geotechnika objednatele, který byl zhotoviteli zaslán dne 26.4.2024, nebudou v těchto místech prováděny zemní práce v horninách I/3 tř. těžitelnosti, ale v II/5 resp. III/6 třídě těžitelnosti. AD prověřil sklon vodoteče vzhledem k požadavku zatravnění a předpokladu budoucí cyklostezky v souběhu s komunikací. Sklon je potřeba na základě požadavku MČ Praha 20 z důvodu bezpečnosti snížit a upravit, aby vyšly spády. Vpust UV3-3 bude snížena, a terénními úpravami se voda nasměruje mimo poslední dům větve 3 – č.p. 2612. Vzhledem k nesouladu DVZ a rozpočtu je potřeba navýšit objem odkopávek a vodorovného přemisťování výkopku.							
Potvrzením změny (PoZ).							

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č.17											
NOZ zpracoval: [REDACTED]		Datum: 26.4.2024												
NOZ č. 17 navazuje na:	OZ č. 17	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně										
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007746/2023 předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny díla zpracované v návaznosti na rozpočtové podklady: Příloha k NOZ č.17 – Soupis prací Cena stavebních prací <table> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>556 446,14-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>- 22 208,02-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>534 238,12-Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>112 190,00-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>646 428,12-Kč</td> </tr> </table> V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. /21/08/007746/2023 Zhotovitel provedl Neodkladnou změnu dle čl.5 , zpracoval a předložil Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provedl kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD. Počet listů příloh: 2 listy ZL č.17					Cena přípočty	556 446,14-Kč	Cena odpočty	- 22 208,02-Kč	Cena celkem	534 238,12-Kč	DPH 21 %	112 190,00-Kč	Cena včetně DPH	646 428,12-Kč
Cena přípočty	556 446,14-Kč													
Cena odpočty	- 22 208,02-Kč													
Cena celkem	534 238,12-Kč													
DPH 21 %	112 190,00-Kč													
Cena včetně DPH	646 428,12-Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:												
534 238,12 - Kč (pětsettřicetčtyřitisícdvěstětřicetosmkorundvaú ctahřů)		0,5 měsíce												

Topic: _____
Name: _____

TV Homí Pačenič, strana 0034 v Slavécině, opr.3

02 - SO 02 Odvodnění komunikace - zřízení zemních prací terénních úprav a výkopu vodoteče severně od komunikace větev 3 - zemní práce prováděné v hor.
tr. 5 a 6

Praga 9 Horní Počernice

Address: H.M. Press, NY

Address:

Datum: 28.04.2024

Prüfung:

Zusammenfassung:

Cena celkom [CZK]

J. Cerna [CZK]

М. Мошков

Poplis

Náklady soupisu celkem

5 1 Zemní práce

4	✓ 422251:05	Odkosáčky z prokocávky nřazpažené v hovině řídý táž te nosí lřcuplny 3 objem cc 1020 mř strnř
---	-------------	--

K 12245104

K 122551-02

B K 152761147

Príloha k vodonomnému plánistiť výkopu, vypaniny

1030 m přes 10000 m

K 162761-37

Príloha k vodorovnému premiataniu vykukulavystatiny

K 162751158
hominy tridy izšitelnost in skupiny 6 až 7 ZKD i započ
1000m přes 1300čm
2000čm přes 1300čm

D 999 Skladkovné

Poplatek za ułożenie ziemi i kamieni na recyklażni ekologicznej (składowiskowej) odpadów 7 05 04

E-42261453

Werkstuk nr. 226m3

См. также: [Список глав из книги](#)

Za potreby gospodarstva občin na območju:

Sonda svojí plátnou dosáhla už 3,30 m pod "vlněnou" vlnu. Znamená to, že vlny jsou méně aktivní, plovoucí válečkové olše č. 257346505.

Řez 1: mimo komunikace od staničení 0,0 do 47,7

m2/m

6,33
2,45
2,17

0,82
0,51

Celkem m2/m

délka úseku od 0,0 do 47,7

Celkem m3

12,27
47,70
585,16

Řez 2: mimo komunikace od staničení 66,2 do cca 104

4,57

2,13

2,21

1,04

0,62

10,56

37,80

399,17

Celkem m2/m

délka úseku od 66,2 do 104

Celkem m3

od staničení 47,7 do 66,2 tj. 18,5bm se přechází z Řezu 1 na Řez 2 tj.

Řez 1

Řez 2

Průměr

délka úseku od 47,7 do 66,2

Celkem m3

12,27

10,56

11,41

18,50

211,15

ve staničení 104 by se úprava ukončila

Řez 2

Konec

Průměr

délka úseku od 104 do 127

Celkem m3

0,00

0,00

0,00

23,00

0,00

Celkem

1 195,48

Celkem sloupce B+D

1 544,63

V rozpočtu

Nad rámec rozpočtový celkem m3

1 213,00

331,49

Řez 1: nad komunikací (na úrovni nivelety) v m2/m

0,33

0,19

0,64

2,85

4,01

47,70

191,38

0,52

0,55

1,49

2,56

37,80

96,82

495,99 celkem kor.tř. 5 a 6

4,01

2,56

3,29

18,50

60,80

z toho kor. tř. 5 a 6

495,99 celkem kor.tř. 5 a 6

446,39 z toho kor. tř. 5

49,80 z toho kor. tř. 6

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 17	
PoZ vystavil:		Datum:	
PoZ č. na NOZ č. 17		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
Podpisem zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007746/2023 jsou ve smyslu § 222 odst. 6) zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 534 238,12-Kč bez DPH tj. 1,37%, odpočty činí: -22 208,02-Kč bez DPH tj. -0,06%, připočty činí: 556 446,14-Kč bez DPH tj. 1,43% ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny. Cena změny dle NoZ1, NoZ 2, NoZ3, NoZ4, NoZ5, NoZ6, NoZ 7, NoZ 8, NoZ 9, NoZ 10, NoZ 11, NoZ 12, NoZ 13, NoZ 14, NoZ 15, NoZ16, NoZ 17 je 7 063 984,47-Kč bez DPH tj. 18,13 % ceny díla bez DPH.			
Počet připojených listů specifikací: 2 listy ZL č.17		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 534 238,12-Kč		Změny lhůty dokončení díla: 0,5 měsíce	
Nová cena díla (bez DPH): 46 033 984,47-Kč		Nová lhůta dokončení díla: 19,5 měsíce	
Důvod ke změně: Skutečným hydrogeologickými podmínkami.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
D		Datum:	

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 18	
Komu: INV MHMP			Datum: 26.4.2024		
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně	
Týká se:			SOD č. DIL/21/08/007746/2023		
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:			Specifikace prací zpracoval: zhotovitel		
na jinou část smlouvy:					
kategorizace položek:					
01 - SO 01 Splašková kanalizace – obnov stávajících přípojek UV, včetně těles UV: Při realizaci řadu splaškové gravitační kanalizace KT DN 300 stoky 2 došlo v úseku Š22 – Š27 postupně ke kolizi s potrubím KT DN 200 stávajících přípojek uličních vpustí komunikace Ve Žlíbku. Původní výkop přípojek byl kompletně zabetonován až do úrovně podkladních betonů komunikace. Přípojky UV bude nutné v původní trase obnovit v celé délce od UV až za hranici rýhy stoky 2 a souběžně vedeného výtlaku. Vzhledem k tomu, že jsou masivně zabetonovány i tělesa vpustí, tak bude nutná obnova i samotných těles UV. Beton, kterým byly rýhy zabetonovány, bude třeba vybourat až do úrovně nivelety nové trasy přípojek.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno skutečným plošením stávajících i nových těles UV 					
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).					

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č.18	
NOZ zpracoval: [REDACTED]		Datum: 26.4.2024		
NOZ č. 18 navazuje na:	OZ č. 18	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007746/2023 předkládáme návrh úpravy				
dohodnuté ceny díla zpracované v návaznosti na rozpočtové podklady:				
Příloha k NOZ č.18 - Soupis prací				
Cena stavebních prací				
Cena přípočty	302 787,84-Kč			
Cena odpočty	0,00 -Kč			
Cena celkem	302 787,84-Kč			
DPH 21 %	63 585,44-Kč			
Cena včetně DPH	366 373,28-Kč			
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. /21/08/007746/2023 Zhotovitel provedl Neodkladnou změnu dle čl.5 , zpracoval a předložil Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provedl kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.				
Počet listů příloh: 2 listy ZL č.18				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:		
302 787,74 - Kč (třístadvatisíc sedm set osmdesát sedm korun osmdesát čtyř halířů) (bez DPH)				
[REDACTED]				

69	K	384204112	Osazení omítky železobetonových rámců a koutů na bázi po- litily zvláště D4110, 2010	PLUS
70	M	3324236	úprava omítky v rámci (500x500) Ø 400	KUS
71	M	65241001	úprava kotelny pod kotelovou mříž	KUS
9				
85	K	961044R01	Ostatní konstrukce a práce, bourání Bourání utěsnění vpravo vč. poklopem mříž	KUS
2				
34	K	997271561	Přesun sutě Vrchní vrstva dopravní sítě z kusových materiálů do 1 km	T
	W	A32	"beton"	
	W	B34	"železo"	
	W	C34	"železo"	
35	K	997221668	Příplatek 2 km 1 km u vrchní vrstvy dopravní sítě z kusových materiálů	T
0				
36	K	098275101	Přesun hmot Přesun hmot pro tržní vodorovný 7 km kamentarůvek stavební výkop	I
37	K	888275124	Příplatek k přesunu hmot pro tržní vodorovný 7 km kamentarůvek za zvláštní přesun hmot do 500 m	T
2				
39	K	037271861	Skládkovné Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z povrchu betonu par kódem 17 01 01	T
	W	A60	"beton"	
41	K	887221076	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) odpadového bez obecního dlehu všechného do Kotelny odpadů par kódem 17 03 02	T
	W	A41	"beton"	
111	K	997013871	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a stavebního kód odpadů 17 03 04	T
	W	A111	"železo"	

stávající přípojky byly zabetonovány až do úrovně podkladních betonů komunikace tj. na celou výšku rýhy
novými přípojkami se píše přes plyn, vodu, mař. řadem SK a nad výšakem a že tím vším se špejdne na návetu původní přípojky
stávající též se UV jsou zabetonovány a tak se budou muset kompletně vykopat
bude se muset vykopat stávající komunikace mezi hranou výkopu a UV a následně zase obnavit

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavčtině		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 18	
PoZ vystavil:		Datum:	
PoZ č. na NOZ č. 18		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007746/2023 jsou ve smyslu § 222 odst. 6) zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 302 787,84-Kč bez DPH tj. 0,78%, odpočty činí: 0,00-Kč bez DPH tj. 0,00%, připočty činí: 302 787,84-Kč bez DPH tj. 0,78% ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny. Cena změny dle NoZ1, NoZ 2, NoZ3, NoZ4, NoZ5, NoZ6, NoZ 7, NoZ 8, NoZ 9, NoZ 10, NoZ 11, NoZ 12, NoZ 13, NoZ 14, NoZ 15, NoZ16, NoZ 17, NoZ 18 je 7 366 772,31-Kč bez DPH tj. 18,90 % ceny díla bez DPH.			
Počet připojených listů specifikací: 2 listy ZL č.18		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 302 787,84-Kč -Kč		Změny lhůty dokončení díla:	
Nová cena díla (bez DPH): 46 336 772,31-Kč		Nová lhůta dokončení díla: 19,5 měsíce	
Důvod ke změně:			
Skutečným uložením stávajících inženýrských sítí.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
			

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 19	
Komu: INV MHMP			Datum: 24.4.2024	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/08/007746/2023		
Odkazy: na specifikaci:				
na výkresy:		Změna PD z 26.4.2024		
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval: zhotovitel		
na jinou část smlouvy:				
kategorizace položek:				
01 - SO 01 Splašková kanalizace dne 24.4.2024 byla zjištěna kolize budovaného řadu stoky 2 nad šachtou Š25 se stávajícími ocelovými chráničkami DN160 vedení vysokého napětí. Chráničky s VN jsou přímo v trase kanalizace. Vedou napříč výkopem. O kolizi byl hned informován příkazník objednatele, následně zástupce objednatele a autorský dozor projektanta stavby a byla pořízena fotodokumentace stavby. O kolizi byl učiněn zápis do stavebního deníku a práce na pokračování výstavby stoky 2 od Š25 zastaveny. Navržené řešení – vykopat a vybourat část již provedené úsaku Š24 – Š25, včetně dna šachty Š25, souběžně položeného výtlaku, posunout umístění šachty Š25, od nové pozice šachty Š25 se zahloubit směrem k šachtě Š26, tak aby kanalizace ocelové chráničky VN podešla a od šachty Š26 se vracet na projektový spád v Š27 V Š26 dojde k překročení 5% podélného spádu kanalizace, což by vyvolá nutnost použít čedič na šachtové dno.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: skutečným uložním stávajících inženýrských sítí				
				
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně				FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY				NOZ č.19											
NOZ zpracoval: [REDACTED]			Datum: 26.4.2024												
NOZ č. 19 navazuje na:		OZ č. 19	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:		osobně		osobně											
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007746/2023 předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny díla zpracované v návaznosti na rozpočtové podklady: Příloha k NOZ č.19 – Rámcový Soupis prací Cena stavebních prací <table> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>533 743,10,-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>533 743,10-Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>112 086,05-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>645 829,15-Kč</td> </tr> </table> V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. /21/08/007746/2023 Zhotovitel provedl Neodkladnou změnu dle čl.5 , zpracoval a předložil Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provedl kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD. Počet listů příloh: 3 list ZL č.19						Cena přípočty	533 743,10,-Kč	Cena odpočty	0,00-Kč	Cena celkem	533 743,10-Kč	DPH 21 %	112 086,05-Kč	Cena včetně DPH	645 829,15-Kč
Cena přípočty	533 743,10,-Kč														
Cena odpočty	0,00-Kč														
Cena celkem	533 743,10-Kč														
DPH 21 %	112 086,05-Kč														
Cena včetně DPH	645 829,15-Kč														
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:												
533 743,10- Kč (pětsettřicettřítisícšedmsetčtyřicettřikorundceth alfůů) (bez DPH)			0,5 měsíc												
D		26.4.2024													

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 V Horní Počernici, čp. 0034 V Slávetině, npr. 3

Objekt:

01 - SO 01 Splašková kanalizace - odhad nákladů na vybourání již položené kanalizace v části úseku Š24 - Š25 a její následné zahloubení tak, aby podala stávající ocelové chráničky s vedením VM, včetně vybourání šachtového dna Š25 a jejího provedení v nové pozici, včetně vybourání a nové položení v souběhu běžícího výtlaku od úrovně Š24 k ŠV1, na zahloubení kanalizace v následujícím úseku od Š25 k Š26 a Š27 oproti PD, čedičové dno šachty Š26

Místo:

Praha 9 Horní Počernice

Datum:

25.04.2024

Zadavatel:

Hl.m. Praha INV

Projektant:

Zhotovitel:

EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Zvlener

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem bez DPH							533 743,10	
1 Zemní práce								
14	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min					
	W	A14	5-2					
	W	B14	*Celkem: *A14					
15	K	115101301	Pohotovostní berpaci soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min					
	K	131213702	Hloubení jam ručně v hor. št. 3					
	K	141111101	Zásyp jam ručně					
			výkop a zásyp sandy ke řízení výšky chrániček kabelů NN v korytu úrovně 415-415					
18	K	132254208	Hloubení zapálených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3					
	W		*vz. 1,2 a PD*					
	W	A18	*okna S1* (1,2*2,2)					
	W	G10	*výtlak* (1,0*1,05)					
	W	H18	*kvalitní pro šachty* (1,3*2,5*2,7)					
			branění					
	W	J18	podtlubení (okna) Š25 - Š26 - Š27 + okna P11					
	K		*Celkem: *A18+G10+C18+D18+E18+H18+J18+K18+L18+M18+N18+O18+P18+Q18+R18+S18+T18+U18+V18+W18+X18+Y18+Z18					
			Příplatek za bourání v tvrdé, skále - hor. 104,5					
			prohloubení kanalizace Š25 - Š26 - Š27					
	K	135001101	Průběžek za zřízení výkop v blízkosti podzemního vedení					
	K	119001401	Občasné znečištění podzemního vedení ve výkopě potrubí ocelového nebo litinového DN do 200mm					
28	K	161811131	Osazení pažebního boxu N výkopu do 4 m š do 1,7 m					
	W		*vz. 1,2 a PD*					
	W		*vz. 1,2 a PD*					
	W	A28	*okna S1* (2*3)					
	W	F28	*výtlak* (2*1,85)					
	W	G28	*kvalitní pro šachty* (1,3*2*2,7)					
	W	H28	*Celkem: *A28+G28+C28+D28+E28+F28+H28+I28+J28+K28+L28+M28+N28+O28+P28+Q28+R28+S28+T28+U28+V28+W28+X28+Y28+Z28					
29	K	151811131	Odstavení pažebního boxu N výkopu do 4 m š do 1,2 m					
46	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopu/spariny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	W	B46	*zásyp, obsyp, podtl. ep*					
47	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopu/spariny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	W	A47	*přemístění výkopu na skládku* (přes 500+31,75+70,810)					
49	K	167151111	Nehledně výkopu z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3					
	W	B49	*zásyp, obsyp, podtl. ep*					
50	K	171251201	Uložení sypání na skládku nebo náciskládky					
	W	B50	*zásyp, obsyp, podtl. ep*					
51	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním					
	W	A51	*výkopy rýh*					
	W		*odpočet vyložení kubelům*					
			Osazení potrubí ocelové sypáním ke prohloubení, vložkou do 3 m					
	W	B51	Lože pod potrubí ocelový výkop ze železobetonu					
	W	C51	Podzemní stěny z betonu prosádky K, C 12/15 s výhledem výkop					
	W	D51	Sedlové žito z betonu prosádky K, C 12/15 s výhledem výkop					
	W		Ocelová potrubí nebo zdiva sítí betonem prosádky K, C 12/15 v náběhu výkopu					
	W	B51	*odpočet vyložení kubelům*					
	W	F51	*Celkem: *B51+C51+D51+H51+I51+J51+K51+L51+M51+N51+O51+P51+Q51+R51+S51+T51+U51+V51+W51+X51+Y51+Z51					
52	M	58337331	šetrnost/šetrnost 0/22					
	W	A52	*1,67*1,23					
59	K	175151101	Obtápění potrubí střílnou sypáním bez prohození, uložkou do 3 m					
	W		*vz. 77 a PD*					
	W	A59	*DN 110* (1,0*1,25)					
60	M	58337331	šetrnost/šetrnost 0/22					
	W	A59	*1,67*1,23					

D 2		Zakládání
83	K 212751133	Trávilov z drenážních trubek, flexibilních PVC-U SN 4 neprofanovaná, včetně lože otevřený výkop DN 80 pro melioraci "Viz T7 a P1" "DN 300"
D 4		Vodorovné konstrukce
72	K 451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štrkovisku "Viz I 2 a P1" "DN 110" (1,0x0,1) "šachty" 1,5x1,5x0,1m "Celkem" A71+B71
83	K 452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop "Viz T7 a P1" "DN 300" (1,2x0,15) "šachty" 1,5x1,5x0,15m "Celkem" A82+B82
84	K 452317131	Sešková lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop "Viz T2 a P1" "DN 300" (1,2x0,15)
D 8		Trubní vedení
219	K 1531372121	Montáž potrubí z trub křemelinových, tvrdých s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 ‰ DN 300 "Viz I 2 a P1" "šachty 51" 410,7
110	M 55710707	Instalace kamennová glazovaná DN 300 dle 2,50m spojovací systém C 176a 240
116	K 871265201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop, svařovací elektrosvařkou C 110x10,0 mm "výkop" "potrubí kanalizační tlaková PE 100 SDR11 Akwin se signalizační vrstvou 110x10,0mm" "Montáž elektrosvařky na kanalizačním potrubí z PE třídy 110" "elektrosvařka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm"
121	M 28615875	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop, svařovací elektrosvařkou C 110x10,0 mm
124	K 892211111	Tlaková zkušební vodou potrubí DN 100 nebo 125
130	K 892372121	Tlaková zkušební vzduchem potrubí DN 300 tlakovým vakem ucpávacím
132	K 894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty sklonů rovných
133	M 58224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm
134	M 58224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm, ucpávacím S26
137	M 58224161	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty sklonů rovných
145	K 894411111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty sklonů rovných (dno)
146	M 58224161	dno betonové šachtové 100x70x10cm
152	K 89623741	Obletování potrubí nebo zdva stěh betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu "DN 300" (1,2x0,15x0,07) "šachty 51" 410,7
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání
2	K 139951121	Bourání keř v hloubkách vykopávacích ze zdva z betonu prostého stěh
3	K 139951121	Bourání stávajícího kamenného potrubí DN přes 205 do 400
D 997		Přesun sítě
166	K 997221551	Vodorovná doprava sítě ze sypaných materiálů do 1 km "materiál" "tržba" "Celkem" A155+B155
168	K 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sítě ze sypaných materiálů
170	K 997221561	Vodorovná doprava sítě z kusových materiálů do 1 km "materiál" 1 dno S26 "šachty" "tržba" "Celkem" A160+B160
171	K 997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sítě z kusových materiálů
D 998		Přesun hmot
173	K 998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub křemelinových otevřený výkop
174	K 998275124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub křemelinových za zvláštní přesun limit do 3110 m
D 999		Skádkovně
178	K 171201238	Příplatek za uložení zeminy a křemelin na recyklační skládce (skádkovně) kod odpadů 17 05 01

FRG	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z proslého bezání pod kódem 17 01 01
W	A178		"beton"
W	B178		"kamení"
W	C178		"Celkem: "A178+B178"
	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z proslého bezání zajištěného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 04
			"Asfaltová"
177	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zajištěného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
W	A177		"Asfaltová"
W	B177		"Celkem: "A177"
179	K	997221075	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dřeva zajištěného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
W	A179		"trávník" 100 kg
W	B179		"ostatní" 183.519
W	C179		"Celkem: "A179+B179"
	P	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
10	K	10001	územní vlivy (zřízení dopravní podmínky, práce na láčce přístupných místech)
11	K	10002	práce vlivy (práce investora, zřízení stání provozu, umístění stavení s prostorovým omezením)

přesná cena změny se bude odvíjet od:

jestli při zahloubení nebude zastřešeno lůžko horniny, než předpokládá PD
jestli vlivem změny nebude nutné již vyrobené a dodané šachtové dno Š25 x 11

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně				FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY				PoZ č. 19	
PoZ vystavil:			Datum:		
PoZ č. na NOZ č. 19			na jiný dokument:		
Odesláno/ předáno:				osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007746/2023 jsou ve smyslu § 222 odst. 6) zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 533 743,10-Kč bez DPH tj. 1,37%, odpočty činí: 0,00-Kč bez DPH tj. 0,00%, připočty činí: 533 743,10-Kč bez DPH tj. 1,37% ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny. Cena změny dle NoZ1, NoZ 2, NoZ3, NoZ4, NoZ5, NoZ6, NoZ 7, NoZ 8, NoZ 9, NoZ 10, NoZ 11, NoZ 12, NoZ 13, NoZ 14, NoZ 15, NoZ16, NoZ 17, NoZ 18, NoZ 19 je 7 900 515,41-Kč bez DPH tj. 20,27 % ceny díla bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací: 3 listy ZL č.19			Počet připojených výkresů:		
Změna ceny díla (bez DPH): 533 743,10-Kč			Změny lhůty dokončení díla: 0,5 měsíce		
Nová cena díla (bez DPH): 46 870 515,41-Kč			Nová lhůta dokončení díla: 20,0 měsíců		
Důvod ke změně: Skutečným uložením stávajících inženýrských sítí.					
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Poznámka:					
Dat					

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 20	
Komu: INV MHMP		Datum: 23.5.2024	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/08/007746/2023	
Odkazy: na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval: zhotovitel	
na jinou část smlouvy:			
kategorizace položek:			
03 – SO 03 Komunikace – nivelita nového chodníku na jižní straně větve 3 komunikace jde podél plotové zdi č.p. 293 pod úroveň stávajícího terénu, přičemž zeď nemá žádný základ. Dále jsou souběžně se zdí mělce uložené kabely NN. Zeď, která je v havarijním stavu, je třeba v délce 21 m zbourat, kabely v délce 10 m podkopat a spustit níže, vytvořit zadní opěru dlažby chodníku a dále je třeba na rohu ulice Ve Žlábku x větev 3 provést úpravu nivelity stávajícího chodníku v ulici Ve Žlábku v délce 6 m. 03 – SO 3 Komunikace na základě požadavku MČ a dle změny projektu stavby před dokončením je třeba na větví 2 v její jižní části vytvořit v místě začátku obytné ulice zpomalovací retardér, dále u vjezdů č.p.301 a č.p. 298 doplnit obrubu, aby bylo o co opřít dlažbu vjezdů a na větví 1 doplnit svislé dopravní značení stání pro invalidy i vodorovným dopravním značením 02.1 – SO 02.1 Přípojky odvodnění – na větví 3 komunikace budou přípojky UV 1-3 až UV 3-3 mělko uložené, z tohoto důvodu se místo pískového obsypu provede kompletní obetonování a tím se sníží riziko jejich poškození/zničení při náhodném najetí OA, TNV, při údržbě pozemků, při pokračující výstavbě atd.			
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: skutečným stávajícím stavem, požadavkem SÚ			
Datum:			
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).			

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně				FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY				NOZ č.20											
NOZ zpracoval: [REDACTED]				Datum: 23.5.2024											
NOZ č. 20 navazuje na:		OZ č. 20	PZ č.	Pl. č.:											
Odesláno/ předáno:		osobně		osobně											
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007746/2023 předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny díla zpracované v návaznosti na rozpočtové podklady: Příloha k NOZ č.20 – Soupis prací Cena stavebních prací <table> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>249 850,03,-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>- 12 228,67-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>237 621,36-Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>49 900,48-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>287 521,84-Kč</td> </tr> </table> V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. /21/08/007746/2023 Zhotovitel provedl Neodkladnou změnu dle čl.5 , zpracoval a předložil Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provedl kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD. Počet listů příloh: 7 listů ZL č.20						Cena přípočty	249 850,03,-Kč	Cena odpočty	- 12 228,67-Kč	Cena celkem	237 621,36-Kč	DPH 21 %	49 900,48-Kč	Cena včetně DPH	287 521,84-Kč
Cena přípočty	249 850,03,-Kč														
Cena odpočty	- 12 228,67-Kč														
Cena celkem	237 621,36-Kč														
DPH 21 %	49 900,48-Kč														
Cena včetně DPH	287 521,84-Kč														
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:												
237 621,36- Kč (dvěstěťčicetsedmtisícšestdvacetjednakoruntřicet šesthalířů) (bez DPH)			0,25 měsíce												
003- 102- 867- 110- 3/20															
Datum: 27.6.23		Datum: []		Datum: []											

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 20

Číslo listu

37y Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně, opr.3

Číslo kč

Změnový list č.20

Místo: Praha 9 Horní Počernice, V Slavětíně

Datum: 23.05.2024

Objednatel:

HLM Praha INV

Zhotovitel:

EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel: Zwlener

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Připočty

Odpočty

Naklady celkem bez DPH

Naklady celkem bez DPH - připočty

Naklady celkem bez DPH - odpočty

03 - SO 03 Komunikace - úprava nivelety stávajícího chodníku na rohu č.p. 293, opěra pro dlažbu jižního chodníku větev 3 podél pozemku č.p. 293

03 - SO 03 Komunikace - přeložka stávajících silových kabelů na rohu č.p. 293

03 - SO 03 Komunikace - zbourání části zdi v havarijním stavu

03 - SO 03 Komunikace-změna stavby před dokončením větev 2 komunikace jižní polovina

02.1 - SO 02.1 Přípojky odvodnění -obetonování potrubí přípojek UV 1-3 až UV 3-3

237 621,36

249 850,03

-12 228,67

105 736,40

26 049,68

51 692,62

23 371,20

30 771,46

249 850,03

-12 228,67

105 736,40

26 049,68

51 692,62

26 667,60

39 703,73

0,00

0,00



0,00

-3 298,40

-8 932,27

237 621,36

VV	B101	„Asfalt“		
VV	B102	„Asfaltový beton“		
VV	B103	„Asfaltový beton“		
106	K	99/221668	Poplatek ZKD 1 km u vodotěsné dopravy suti z kusových množství	T
		999	„Skladkovně“	
107	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kámen na rozkladě skel (skladkovně) kdt odpadu 17 03 02	T
VV	A107		„1.01“	
108	K	99/221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na rozkladě skel (skladkovně) z povrchu betonu suti kdt 17 01 01	T
VV	C108		„Asfalt“ 21 999	
VV	E108		„Asfalt“ 21 999	
110	K	99/221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na rozkladě skel (skladkovně) skel kdt 17 03 02	T
VV	A110		„Asfalt“ 21 999	
VV	B110		„Asfalt“ 21 999	

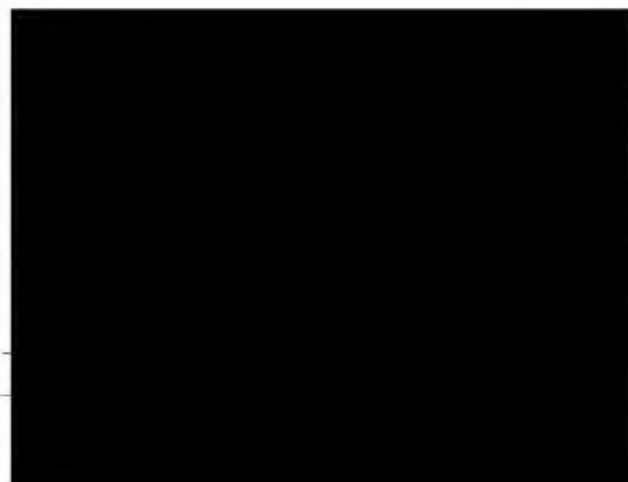

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TV Horní Počernice, V Slavětíně, přeložka stávajících silových kabelů na rohu č.p. 293

Místo:

Datum: 19.04.2024

Zadavatel:

Hl.m. Praha INY

Zhotovitel:

EKIS, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel: Zwiener

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							26 049,58	

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
K		119001421	Dobasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů					
K		132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných huminách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně					
			10*0,8*0,8					
K		139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení					
K		167111104	Nakládání vykopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně					
7		K 162751117	Vodorovné přemíslení přes 8 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 "přesýtebný vykopak na akordu"					
22		K 17201231	Příplatek za uložení zeminy a kamenní na recyklační skládce (skládkové) kód opadu 17 05 04					
			("1.B.)					
			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním ručně					
			výkop - obsyp					
			Obsypání potrubí ručně sypáním bez protočení, uloženo do 3 m					
			10*0,8*0,4					
M		58331359	kamenivo těžané draběné frakce 0/4					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně, opr.3

3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 - zbourání části zdi v havarijním stavu

Místo:

Zadavatel:

HL.m.Praha INV

Datum:

23.05.2024

Zhotovitel:

EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel: Zwiener

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

základy soupisu celkem

51 692,62

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
K	1962032241		Bourání zdiva badzákodového smíšeného na MC přes 1 m3	m3				
			21*1,8*0,3					
D	997		Přesun sutě					
K	997321611		Nakládání sutě a vybouraných hmot	t				
K	997013501		Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
K	997013509		Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
K	997013571		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do katalogu odpadů 170102	t				

zede je 1,8m vysoká, tloušťka zdi je cca 0,3m, z toho betonové zhlaví má tl. 0,1m
nebourala by se nika s HUP
zede je ze smíšeného zdiva, omílka v některých místech a perlinkou

Datum:	24.05.2024
Projektant:	Projekt IV
Zpracovatel:	Zviener

[illegible]

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně				FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY				PoZ č. 20	
PoZ vystavil:			Datum:		
PoZ č. na NOZ č. 20			na jiný dokument:		
Odesláno/ předáno:				osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007746/2023 jsou ve smyslu § 222 odst. 6) zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 237 621,36-Kč bez DPH tj. 0,61%, odpočty činí: -12 228,67-Kč bez DPH tj. -0,03%, připočty činí: 249 850,03-Kč bez DPH tj. 0,64% ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny. Cena změny dle NoZ1, NoZ 2, NoZ3, NoZ4, NoZ5, NoZ6, NoZ 7, NoZ 8, NoZ 9, NoZ 10, NoZ 11, NoZ 12, NoZ 13, NoZ 14, NoZ 15, NoZ16, NoZ 17, NoZ 18, NoZ 19 , NoZ 20 je 8 138 136,77-Kč bez DPH tj. 20,88 % ceny díla bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací: 7 listů ZL č.20			Počet připojených výkresů:		
Změna ceny díla (bez DPH): 237 621,36-Kč			Změny lhůty dokončení díla: 0,25 měsíců		
Nová cena díla (bez DPH): 47 108 136,77-Kč			Nová lhůta dokončení díla: 20,25 měsíců		
Důvod ke změně: Skutečným stávajícím stavem, požadavkem SÚ.					
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Poznámka:					
