

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 18.03.2024
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever, na základě plné moci

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/3089 Smiřice včetně mostu ev. č. 3089-1**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (15.04.2024)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	19 týdnů od termínu určeného zadavatelem (22.09.2024)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (03.11.2024)
Přerušení prací		15.04.2024 – 12.05.2024
Doba realizace Díla		19 týdnů + 6 týdnů

Číslo stavby: 32932, 32935

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	32932, 32935
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	18.03.2024

1

Název stavby :

III/3089 včetně mostu ev.č. 3089-1 Smiřice

Název objektu :

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Ing. Martin Stejskal, ČKAIT 1006185, M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956, 500 02 Hradec Králové, IČ 0561415, DIČ: CZ0561415
Ing. Jiří Ehrenberger, ČKAIT 0501067, M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956, 500 02 Hradec Králové, IČ 0561415, DIČ: CZ 0561415

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 261 77 005, DIČO: CZ26177005

Popis a zdůvodnění změny :

Na základě Výzvy k provádění prací ze dne 19.03.2024 byl datum zahájení prací stanoven na 15.04.2024. Z důvodu neočekávaných problémů při projednávání uzavírky silnice III/3089 s dotčenými obcemi a vlastníky komunikací dotčenými objízdnou trasou bylo možné zahájit stavební práce 13.5.2024, viz. schválený HMG stavby. K tomuto termínu je vydána MM HK odborem dopravně správních agend pod č.j. MMHK/273508/2024 dne 6.5.2024 (termín od 13.5.2024 do 31.8.2024) Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy spočívající ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Smiřice, v k.ú. Hubíles a Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice III/3089 vydané MM HK odborem dopravně správních agend pod č.j. MMHK/273721/2024 dne 7.5.2024 (termín od 13.5.2024 do 31.8.2024).

Termín zahájení prací dle Výzvy k provedení Díla: 15.04.2024

Přerušení prací do doby Rozhodnutí o uzavírce silnice III/3089 ze dne 7.5.2024, č.j. MMHK/273721/2024: 15.04.2024 - 12.05.2024

Termín zahájení prací: 13.5.2024

Termín dokončení prací: 22.9.2024

Termín dokončení díla: 03.11.2024

Doba realizace stavby: 19 týdnů + 6 týdnů

Přílohy evidenčního listu :

1.	Aktualizovaný HMG stavby
2.	k.ú. Hubíles, vydané MM HK odborem dopravně správních agend pod č.j. MMHK/273508/2024 dne 6.5.2024 (termín od 13.5.2024 do 31.8.2024)
3.	Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice III/3089 vydané MM HK odborem dopravně správních agend pod č.j. MMHK/273721/2024 dne 7.5.2024 (termín od 13.5.2024 do 31.8.2024).

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídkce:
		méněpráce	vícepráce		
23 691 800,00 Kč	23 691 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 691 800,00 Kč	0,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s.	Jiří Kava		

Projektant (autorský dozor) :	M-PROJEKCE s.r.o.	x		
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	x		
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Bc.Libor Kabele		
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Martin Dvořáček		
Asistent technického dozora:				



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 17.7.2024

SPIS. ZN.: SZ MMHK/416913/2024 OD1/Rou
MMHK/449362/2024

OPRÁVNĚNÁ

ÚŘEDNÍ OSOBA: Miroslav Roubínek

TEL.:

E-MAIL:

COLAS CZ, a.s., IČO 26177005

Rubeška 215

190 00 Praha

v zastoupení

Jaroslav Michek – DIOZ, IČO 68461135

Polizy 4

503 26 Osice

DATUM: 30.7.2024

I. Oznámení o zahájení správního řízení

Magistrát města Hradec Králové – odbor dopravně správních agend, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 4 písmeno a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“), **oznamuje** v souladu s § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), **zahájení správního řízení** ve věci

povolení úplné uzavírky silnice III/3089 na správním území Města Smiřice a obce Smržov,

z důvodu opravy komunikace a mostu ev. č. 3089-1 „**silnice III/3089 v úseku od křižovatky se silnicí III/2999 až po křižovatku se silnicí III/2997 k.ú. Smiřice, Hubíles**“

Celkový termín uzavírky: od 1.9.2024 - 30.9.2024 (prodloužení stávající uzavírky)

Organizace uzavírky:

- termín od 1.9.2024 - 30.9.2024
- úplná uzavírka silnice
- oprava povrchu silnice III/3089 a mostu ev. č. 3089-1 (viz harmonogram stavebních prací)

Objízdná trasa po celou dobu realizace

Objízdná trasa do 36t bude po silnici III/2999, III/2997 - obousměrně.

Úsek uzavírky a objízdná trasa jsou vyznačeny v situaci, která je přílohou tohoto oznámení.

O uzavírku požádala dne 17.07.2024 fa COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, Rubeška 215, 190 00 Praha v zastoupení Jaroslav Michek - DIOZ, IČO 68461135, Polizy 4, 503 27 Osice.

Dnem podání návrhu bylo zahájeno správní řízení ve věci obecného omezení uzavírkami a objížděnkami ve smyslu § 24 zákona o PK.

II. Projednání dle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích

Magistrát města Hradec Králové – odbor dopravně správních agend, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 4 písmeno a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v souladu s ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích tímto vyrozuměním **projednává žádost:**

- a) s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, s vlastníky pozemních komunikací, po kterých je vedena objízdná trasa
- b) s obcemi, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka
- c) s provozovateli dráhy – železniční přejezdy na objízdné trase
- d) s Policií ČR z hlediska vedení objízdné trasy.

V souladu s § 39 odst. 1 správního řádu Vám sdělujeme, že se **k uvedenému návrhu můžete vyjádřit do 7 dnů ode dne doručení tohoto oznámení**. Pokud v této lhůtě neobdržíme žádnou odpověď, bere se za to, že s předloženým návrhem souhlasíte.

III. Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

Magistrát města Hradec Králové – odbor dopravně správních agend, jako příslušný silniční správní úřad Vám dále sděluje, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost nahlédnout do spisového materiálu a **vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí**. K tomu stanovujeme lhůtu **3 pracovní dny od ukončení výše uvedené lhůty** pro podání vyjádření. Po uplynutí této 3denní lhůty správní orgán ve věci rozhodne. Správní úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato 3denní lhůta slouží pouze k seznámení se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění připomínek k předloženému návrhu.

Miroslav Roubínek

referent silničního správního úřadu
oprávněná úřední osoba

Parafa vedoucího oddělení:

Příloha: situační plánec s uzavírkou a objízdnou trasou

Doručí se:

účastníci (dodejky)

Jaroslav Michek, IDDS: dkuursc - zmocněnec

Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., IDDS: 6m8k8ey

Město SMÍŘICE, IDDS: nunbrcq

Obec Smržov, IDDS:

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Hradec Králové Dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti, IDDS: gcgbp3q

na vědomí

COLAS CZ, a.s., IDDS: 4indfqd

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3

Vypraveno dne:

ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 28.2.2024

SPIS. ZN.: SZ MMHK/144169/2024 OD1/Rou
MMHK/273721/2024

OPRÁVNĚNÁ

ÚŘEDNÍ OSOBA: Miroslav Roubínek

TEL.:

E-MAIL:

COLAS CZ, a.s., IČO 26177005

Rubeška 215

190 00 Praha

v zastoupení

Jaroslav Michek – DIOZ, IČO 68461135

Polizy 4

503 26 Osice

DATUM: 7.5.2024

R o z h o d n u t í

Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravně správních agend obdržel dne 28.2.2024 žádost, kterou podal COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, Rubeška 215, 190 00 Praha v zastoupení Jaroslav Michek - DIOZ, IČO 68461135, Polizy 4, 503 27 Osice, o povolení úplné uzavírky silnice III/3089 k.ú. Smiřice, Hubíles v úseku od křižovatky se silnicí III/2999 až po křižovatku se silnicí III/2997 z důvodu rekonstrukce silnice III/3089 a mostu ev. č. 3089-1.

Magistrát města Hradec Králové odbor dopravně správních agend jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v návaznosti na ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e


úplnou uzavírku silnice III/3089 k.ú. Smiřice, Hubíles v úseku od křižovatky se silnicí III/2999 až po křižovatku se silnicí III/2997 v termínu od 13.5.2024 - do 31.8.2024 z důvodu rekonstrukce silnice III/3089 a mostu ev. č. 3089-1.

Objízdná trasa do 36t bude po silnici III/2999, III/2997 - obousměrně.

Linková autobusová doprava:

Předmětným úsekem je vedena linka licence 662311 dopravce AUDIS BUS s.r.o.

Objížděná trasa pro autobusovou linku 311:

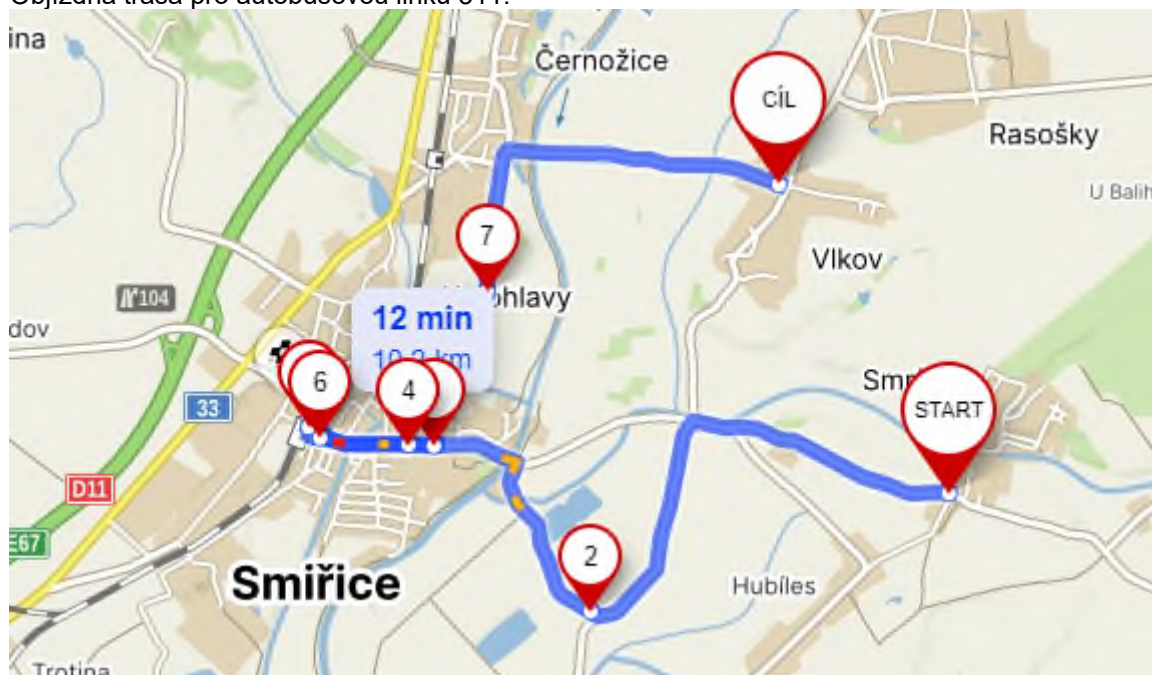

Pro spoje obsluhující Smiřice bude zastávka Vlkov přemístěna na komunikaci III/2998 – Zhotovitel umístí přenosný dopravní označník do místa schváleného DI PČR Náchod.

Bude vydán výlukový jízdní řád.

Dopravní úřad s výše uvedeným dopravním opatření souhlasí za následujících podmínek: Zhotovitel zajistí přenosný dopravní označník do Vlkova a umístí ho na místo schválené DI PČR Náchod. V jízdním řádu tyto zastávkové hrany budou označeny jako nástupiště č.3 a 4.

Uzavírka nezačne dříve než 10 dní od doručení tohoto vyjádření. Přesný termín uzavírky viz Rozhodnutí o uzavírce.

Odpovědný pracovník za organizování a zabezpečení akce: p. Jiří Kava, tel. 733 780 182 - COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, Rubeška 215, 119 00 Praha.

Podmínky:

1. Bude zajištěn přístup k okolním nemovitostem.
2. Budou osazeny dopravní značky a zařízení dle stanovení přechodné úpravy silničního provozu Magistrátem města Hradec Králové – odborem dopravně správních agend (SZ MMHK/144169/2024 OD1/Rou, MMHK/273508/2024) a budou udržovány po celou dobu uzavírky v řádném a provozuschopném stavu. Po skončení uzavírky (objíždky) budou neprodleně odstraněny.
3. Před zahájením funkce přechodného dopravního značení v rámci pracovního místa včetně označení uzavírky a objíždky bude Policií ČR Hradec Králové a silničním správním úřadem zkontrolováno, zda dopravní opatření je provedeno v souladu se stanovením dopravního značení vydaným Magistrátem města Hradec Králové - odborem dopravně správních agend.

4. Silniční správní úřad spolu s Policií ČR Hradec Králové mají vyhrazené právo v případě konstatování nedostatečné intenzity provádění prací nebo neplnění podmínek tohoto rozhodnutí posuzovat toto jako porušení předpisů o uzavírce.
5. Dotčené obce budou informovat o uzavírce a nařízení o objížděce způsobem v místě obvyklým.
6. Toto rozhodnutí bude po dobu uzavírky k dispozici na staveništi ke kontrole osobám pověřeným výkonem státního dozoru na silnicích.
7. Před zahájením uzavírky a po jejím ukončení bude provedena (na výzvu zhotovitele) prohlídka stavu objízdné trasy za účasti investora, zhotovitele, vlastníků dotčených komunikací a zástupců dotčených obcí. Škody způsobené uzavírkou a objížděkou budou neprodleně odstraněny a komunikace budou uvedeny do původního stavu. Náhrada případných škod vzniklých vlivem uzavírky a objížděky se uskuteční na náklad žadatele o uzavírku.
8. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka povolena.
9. Pro spoje obsluhující Smiřice bude zastávka Vlčkov přemístěna na komunikaci III/2998 – Zhotovitel umístí přenosný dopravní označnický do místa schváleného DI PČR Náchod.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 a 2 správního řádu):

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215, 190 00 Praha

Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Na Okrouhlíku 1371, 500 02 Hradec Králové

Město SMÍŘICE, Palackého 106, 503 03 Smiřice

Odůvodnění:

COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, Rubeška 215, 190 00 Praha v zastoupení Jaroslav Michek, IČO 68461135, Polizy 4, 503 27 Osice požádala dne 28.2.2024 zdejší odbor o úplnou uzavírku silnice III/3089 k.ú. Smiřice, Hubíles v úseku od křižovatky se silnicí III/2999 až po křižovatku se silnicí III/2997 v termínu od 13.5.2024 - do 31.8.2024 z důvodu rekonstrukce silnice III/3089 a mostu ev. č. 3089-1. Žádost o uzavírku a objízdnou trasu byla projednána se Správou silnic Královéhradeckého kraje p.o. zastupující vlastníka silnice III.třídy, Policií ČR Hradec Králové (Č. j.: KRPH-34904-2/ČJ-2024-050206), Krajským úřadem Královéhradeckého kraje – ODaSH, oddělení dopravní obslužnosti, Městem Smiřice. Magistrátem města Hradec Králové – odborem dopravně správních agend (SZ MMHK/144169/2024 OD1/Rou, MMHK/273508/2024) byla stanovena přechodná úprava silničního provozu. Dále byl doložen harmonogram stavebních prací.

Silniční správní úřad posoudil žádost a předložené doklady a neshledal důvody, které by bránily povolení úplné uzavírky silnice III/3089 k.ú. Smiřice, Hubíles v úseku od křižovatky se silnicí III/2999 až po křižovatku se silnicí III/2997 v termínu od 13.5.2024 - do 31.8.2024 z důvodu rekonstrukce silnice III/3089 a mostu ev. č. 3089-1 dle žádosti. Požadavky a podmínky byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Při svém rozhodování dbal silniční správní úřad v souladu s § 24 odst. 4 zákona také na to, aby uzavírka byla omezena na nejkratší možnou dobu. Dle sdělení zhotovitele je požadovaný termín uzavírky takto určen.

Po posouzení žádosti byla povolena úplná uzavírka silnice III/3089 k.ú. Smiřice, Hubíles v úseku od křižovatky se silnicí III/2999 až po křižovatku se silnicí III/2997 tak, jak ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové - odboru dopravy a silničního hospodářství. Odvolání se podává (zasílá) u Magistrátu města Hradec Králové - odboru dopravně správních agend. Podle § 24

odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Miroslav Roubínek

referent silničního správního úřadu
oprávněná úřední osoba

Parafo vedoucího oddělení:

Příloha: situační plánec

Doručí se:

účastníci (dodejky)

Jaroslav Michek, IDDS: dkuursc - zmocněnec

Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., IDDS: 6m8k8ey

Město SMÍŘICE, IDDS: nunbrcq

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Hradec Králové Dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti, IDDS: gcgbp3q

na vědomí

COLAS CZ, a.s., IDDS: 4indfqd

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, IDDS: 2pemvrd

Fakultní nemocnice, středisko DZS, IDDS: v7zqi84

AUDIS BUS s.r.o., IDDS: wbin67v

Obec Černožice, IDDS: jnua7ei

OBEC HOLOHLAVY, IDDS: yera6r3

OBEC SMRŽOV, IDDS: 6fna6dn

OBEC VLKOV, IDDS: i36a6i7

Vypraveno dne:

Název Díla: III/3089 Smiřice včetně mostu ev.č. 3089-1

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

[illegible]

Datum zahájení prací
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
Doba realizace Díla:

13.05.2024
22.09.2024
03.11.2024
19 týdnů + 6 týdnů

Zhotovitel COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Schválil (jméno a podpis)
