

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2024/02/117/Du, uzavřené dne 10.06.2024

(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa:

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

zastoupeno:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic

IČO:

00297313

DIČ:

CZ00297313

Bankovní spojení:

č. účtu:

dále jen „objednatel“

a

2. Strojírny a stavby Třinec, a. s.

sídlem:

Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO:

47674539

DIČ:

CZ47674539

e-mail:

Bankovní spojení:

č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Preamble

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2024/02/117/Du, uzavřené dne 10.06.2024 (dále jen „smlouva“) pod názvem „Parkoviště ul. Dukelská, Třinec, od čp. 761 - 771“, a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce i méněpráce. Soupis těchto víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které by měly být realizovány. Po uzavření tohoto dodatku dojde k navýšení ceny díla o 441.051,50 Kč bez DPH. Procentuální změna závazku učiněná tímto dodatkem oproti původní hodnotě závazku ze smlouvy činí 6,74 %.
3. Na základě výše zmíněného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy uzavřením tohoto dodatku, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. Změna smlouvy

1. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>8.428.449,84 Kč</i>
<i>Následná péče 1. rok</i>	<i>185.356,93 Kč</i>
<i>Následná péče 2. rok</i>	<i>301.120,10 Kč</i>
<i>Následná péče 3. rok</i>	<i>147.671,33 Kč</i>
<i>Následná péče 4. rok</i>	<i>237.681,40 Kč</i>
<i>Následná péče 5. rok</i>	<i>124.862,83 Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>9.425.142,43 Kč</i>

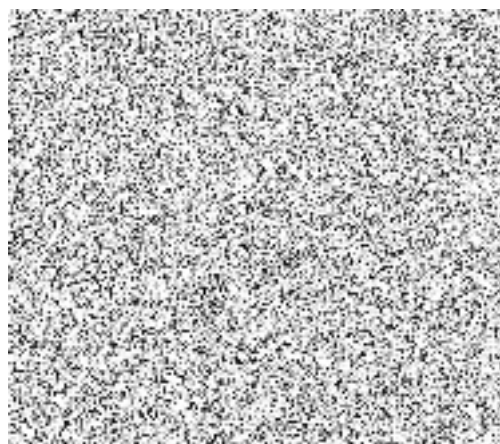

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“










III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/1799 ze dne 05.08.2024.

V Třinci

V Třinci



ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 2											
Zhotovitel:	Strojírny a stavby, a.s., Průmyslová 1038, 739 61 Třinec												
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	24.07.2024										
Název akce:	Parkoviště ul. Dukelská, Třinec, od čp. 761 - 771												
Předmět změny: Při přípravě území v úseku pod nově navrženým parkovištěm byly odkopány stávající betonové plochy, s kterými nebylo v projektové dokumentaci počítáno. Tyto stávající betonové konstrukce je nutno odstranit, a to jednak z důvodu zachování vsakovací schopnosti povrchu a také z důvodu zamezení možnosti následného sedání povrchu parkoviště v budoucnosti. Tuto okolnost nebylo možno v rámci projektové přípravy předpokládat. Na základě dodatečného požadavku na zajištění trvalého osvětlení stavby je nutno provést provizorní napojení veřejného osvětlení. V rámci projektové přípravy byla navržena pouze výšková úprava poklopů vpustí. Při odkopání stávajících vpustí bylo shledáno, že stav uličních vpustí je horší, než bylo předpokládáno na základě vizuální prohlídky v rámci projektové přípravy. Z tohoto důvodu je nutno v rámci realizace stavby vyměnit stávající vpusti za nové. Dále bylo zjištěno, že uložení stávajících sítí společností ČEZ a Silesnet je provedeno nestandardně v nedostatečné hloubce a z tohoto důvodu musely být kabely přeloženy do hloubky dle platných norem a standardů. Ve výkazu výměr zpracovaném v rámci projektové dokumentace pro provedení stavby došlo k administrativní chybě a pod konstrukční vrstvou vozovky byla počítána pouze jedna vrstva šterkodrtě, namísto dvou. Tyto vícepráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 517.926, 80 Kč. V rámci realizace stavby došlo i k méněpracím. V projektové dokumentaci byla pod chodníkem navržena sanace podloží v tl. 40 cm. Po provedení první vrstvy v tl. 20 cm bylo na základě měření únosnosti pláně zjištěno, že sanace podloží v tloušťce 20 cm je dostačující. Tyto méněpráce si vyžádaly snížení ceny díla o 76.875,30 Kč Po celkové rekapitulaci víceprací a méněprací dojde k navýšení ceny díla o 441.051, 50 Kč.													
Cena méněprací bez DPH: -76 875,30 Kč		Cena víceprací bez DPH: 517 926,80 Kč											
Výsledná změna ceny bez DPH: 441 051,50 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:											
Cena dle SOD vč. D1 bez DPH: 8 984 090,93 Kč		Nová cena bez DPH: 9 425 142,43 Kč											
<table border="1"> <tr> <td><u>schválil (Dodavatel):</u></td> <td></td> <td><u>podpis:</u></td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td><u>schválil (TDS):</u></td> <td></td> <td><u>podpis:</u></td> </tr> <tr> <td><u>schválil (Objednatel):</u></td> <td></td> <td><u>podpis:</u></td> </tr> </table>				<u>schválil (Dodavatel):</u>		<u>podpis:</u>		<u>schválil (TDS):</u>		<u>podpis:</u>	<u>schválil (Objednatel):</u>		<u>podpis:</u>
<u>schválil (Dodavatel):</u>		<u>podpis:</u>											
<u>schválil (TDS):</u>		<u>podpis:</u>											
<u>schválil (Objednatel):</u>		<u>podpis:</u>											

Změnový list č.02

Stavba: Parkoviště ul. Dukelská, Třinec, od čp. 761 - 771

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Strojírny a stavby, a.s., Průmyslová 1038, 739 61 Třinec

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
		<i>SO 001: Příprava území</i>	163 860,80 Kč
		<i>SO 101: Oprava komunikace</i>	217 496,00 Kč
		<i>SO 110: Ostatní úpravy - obruby, šachty</i>	75 520,00 Kč
		<i>SO 401: Veřejné osvětlení</i>	61 050,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			517 926,80 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ			
		<i>SO 103: Nový chodník</i>	- 76 875,30 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- 76 875,30 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			441 051,50 Kč
-----------------------------------	--	--	---------------

Parkoviště ul. Dukelská, Třinec, od čp. 761 - čp. 771 - SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena
Stavba Objekt Skupina Oddíl					
22116: Parkoviště ul. Dukelská, Třinec, od čp. 761 - 771 SO 001: Příprava území HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce					
13	SUB	130901121	Bourání konstrukcí z prostého betonu ve vykopávkách	m3	517 926,80
997: Přesun sutě					
17	SUB	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	32 260,80
18	SUB	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	9 926,40
19	SUB	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	5 790,40
SO 101: Oprava komunikace HSV: Práce a dodávky HSV 5: Komunikace pozemní					
12	SUB	564861114	Podklad ze šléřkorditě ŠD plochy přes 100 m2 tl 230 mm	m2	217 496,00
Objekt Skupina Oddíl					
SO 110: Ostatní úpravy - obruby, šachty HSV: Práce a dodávky HSV 8: Trubní vedení					
7	SUB	RX001	Vybourání stávajících uličních vpustí	ks	75 520,00
8	SUB	895941311	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB-50 vč.dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	75 520,00
9	SUB	899230111	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg vč.dodávky vtokové mříže 500x500mm, D400	kus	7 440,00
10	SUB	RX002	Napojení vpustí na stávající kanalizaci	kus	42 520,00
Objekt Skupina Oddíl					
SO 401: Veřejné osvětlení M: Práce a dodávky M 21-M: Elektromontáže					
22	SUB	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	61 050,00
23	SUB	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	61 050,00
24	SUB	210950201	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvámicových tras a kolektorů	m	37 242,00
25	SUB	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s oteplením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	8 250,00
26	SUB	210100252	Ukončení kabelů smířňovací záklolkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 25 mm2	kus	20 850,00
102	SUB	210010353	Rizvodka karabíková zemní spojka gelová vč.dodávky SH0525WS	kus	3 300,00
Objekt Skupina Oddíl					
46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích					
70	SUB	460742111	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsahu průměru do 10 cm	m	23 808,00
71	SUB	34571353	Korugovaná červená ohebná ochranná trubka HDPE/LDPE průměr 75mm s protahovacím lankem	m	11 550,00
83	SUB	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn krytý plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	6 750,00
98	SUB	460200143	Výkop kabelové rýhy 35/60cm hor.3 - ruční výkop	m	1 584,00
					3 924,00

Parkoviště ul. Dukelská, Třinec, od čp. 761 - čp. 771 - SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena
Stavba		22116: Parkoviště ul. Dukelská, Třinec, od čp. 761 - 771			
Objekt		SO 103: Nový chodník			
Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV			
Oddíl		1: Zemní práce			
1	SUB	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	-76 875,30
2	SUB	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	-76 875,30
3	SUB	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-76 875,30
4	SUB	171152121.1	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhuťných silnic a dálnic	m3	-15 640,00
5	SUB	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-18 796,80
6	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-10 560,00
					-1 584,00
					-28 512,00
					-1 582,50
