

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 28.03.2024**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen **„Objednatel“**)

a

DRŽÍK s.r.o.

se sídlem: Lidická 250/46a, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČ: 28657454

DIČ: CZ28657454

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 37413

jednající: Jan Chreno, jednatel

(dále jen **„Zhotovitel“**)

(společně jako **„Smluvní strany“**)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.3.2024, evidenční číslo 001/OVZ/24/020 – OD (dále jen **„Dodatek č.1“**).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 28.3.2024, 001/OVZ/24/020 – OD (dále jen **„Smlouva“**), jejímž předmětem je **„Stavební úpravy – rozšíření místnosti č. E332 – výměna angiolinky – ve 3. NP objektu Diagnostického komplementu Ústav radiodiagnostický“**.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen **„vícepráce“**) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen **„méněpráce“**). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla, a také posun termínu plnění.

Posun termínu plnění je zakomponován v oznámení o změně akce č. 3 a č. 5. V důsledku posunu termínu se dosavadní příloha č. 2 Smlouvy – Časový harmonogram výstavby ruší a nahrazuje novým Časovým harmonogramem výstavby, který nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy a tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

2. V návaznosti na provedení víceprací, méněprací a posun termínu plnění se dosavadní ustanovení článku III. **Termín plnění, odstavce 1** a ustanovení článku V. **Cena a platební podmínky, odstavce 1**, Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

III. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet termín uvedený v následující tabulce:

Termín předání a převzetí staveniště:	do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak)
Termín zahájení plnění díla:	bezprostředně po předání staveniště
Termín pro dokončení, předání a převzetí díla:	předání díla k řádnému užívání do max. 9.10.2024

V. Cena a platební podmínky

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisu, se smluvní strany dohodly na ceně:

Celková cena bez DPH	11 922 575,25 Kč
DPH ve výši	2 503 740,80 Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	14 426 316,05 Kč

3. Přesná specifikace víceprací a méně prací, navýšení ceny o 2.156.701,06 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 83.125,81 Kč bez DPH je zaznamenáno v oznámeních o změně akce č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Příloha č.1“). Časový harmonogram výstavby poté tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Příloha č. 2“).
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „Registr smluv“).
2. Dodatek č. 1 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.

3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Oznámení o změně akce č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a Příloha č. 2 – Časový harmonogram výstavby.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. I přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Oznámení o změně akce č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7
Příloha č. 2 – Časový harmonogram výstavby

V Ostravě dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2024.09.06
12:43:50 +02'00'

Objednatel
MUDr. Jiří Havrlant, MHA
Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

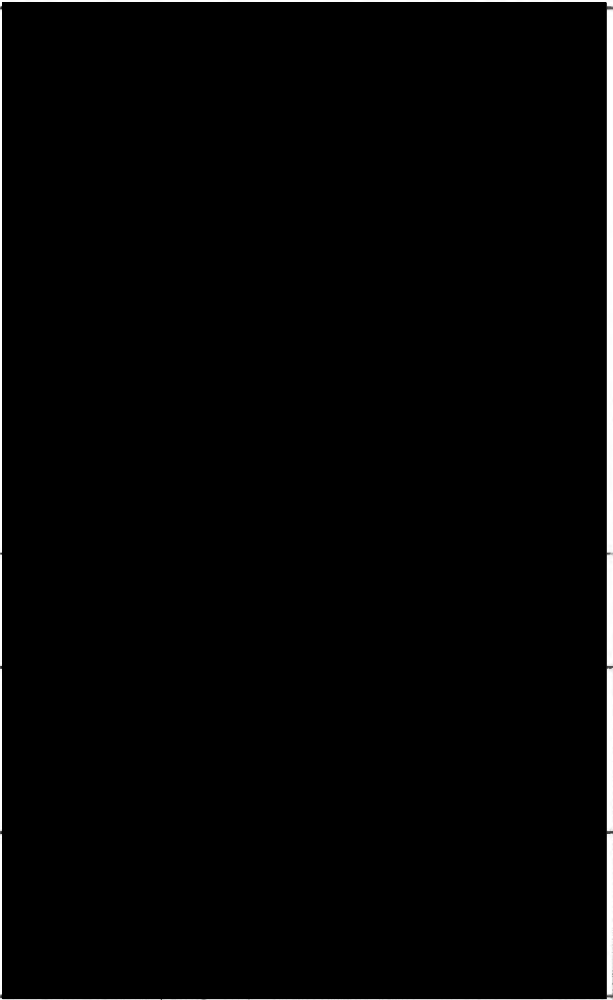
V Ostravě dne _____

Jan Chreno
Digitálně podepsal Jan Chreno
Datum: 2024.09.05 22:39:33
+02'00'

Zhotovitel
Jan Chreno
jednatel
DRŽÍK s.r.o.



Změnový list č 1. - Změny ZTI

Identifikační údaje akce			
Název	ZPŘ-03/24		
Stavební úpravy-rozšíření místnosti č. E332 výměna angiolinky ve 3.NP objektu Diagnostické centrum			
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	DRŽIK s.r.o., IČ: 286 57 454		
Adresa	Lidická 250/46a, Ostrava – Vítkovice 703 00		
Oznámení vystavil:			
Navrhované změny akce			
V rámci tohoto změnového listu jsou řešené změny v profesi ZTI.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
<p>1) Upřesnění rozsahu výměny stoupacích vedení. V rámci zpracování PD byl stanoven rozsah prací na základě konzultací se zástupci údržby a zadavatele. Zejména s ohledem na další plánované investiční akce byl v průběhu realizace rozsah upřesněn a trasy stoupacích vedení prodloužené tak, aby nedocházelo v budoucnu k zásahům do již zrekonstruovaných prostor.</p> <p>2) Výměna vnitřních rozvodů. V rámci bouracích prací bylo s ohledem na stav přípojovacích potrubí rozhodnuto o jejich výměně.</p> <p>3) Zařizovací předměty. Na základě požadavku uživatele z důvodu zlepšení a urychlení hygieny v rámci zákroku došlo k záměně umývadel s bateriemi za nerezový lékařský mycí žlab.</p>			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 29 556,00 Kč		385 607,36 Kč	

Výsledná cena změn bez DPH:	
	356 051,36 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	74 770,79 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	430 822,15 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Na termín dokončení díla nemá vliv.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<i>Lo. J. Kolář</i>	
Stanovisko TDI:	
<i>SOUHLASIM</i>	
Stanovisko projektanta stavby:	
<i>Suklová</i>	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací	


Změnový list č 2. - Rozvody silnoproudu a slaboproudu

Identifikační údaje akce			
Název		ZPŘ-03/24	
Stavební úpravy-rozšíření místnosti č. E332 výměna angiolinky ve 3.NP objektu Diagnostické centrum			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		DRŽIK s.r.o., IČ: 286 57 454	
Adresa		Lidická 250/46a, Ostrava - Vítkovice 703 00	
Oznámení vystavil:			
Navrhované změny akce			
Změny v rozvodech silnoproudu a slaboproudu			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
<p>Po demontáži stávající technologie ve vyšetřovně a odkrytí podhledových konstrukcí byly odhaleny trasy slaboproudu, které nebyly součástí archivních PD a nebyly zmapované ani strany IT oddělení zadavatele. Tyto trasy byly v kolizi s nově instalovanou technologií a bylo je tedy nutno přeložit. Zároveň je v tomto ZL řešena skutečná délka silnoproudé kabeláže oproti předpokladu z PD.</p> <p>Tato změna a s tím související vzniklé vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.</p>			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 0,00 Kč		165 646,76 Kč	

Výsledná cena změn bez DPH:	
	165 646,76 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	34 785,82 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	200 432,58 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Na termín dokončení díla nemá vliv.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Stanovisko TDI: SOUHLASIM	
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasim	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací	







Změnový list č 3. - MTF panel

Identifikační údaje akce			
Název	ZPR-03/24		
Stavební úpravy-rozšíření místnosti č. E332 výměna angiolinky ve 3.NP objektu Diagnostické centrum			
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	DRŽIK s.r.o., IČ: 286 57 454		
Adresa	Lidická 250/46a, Ostrava - Vítkovice 703 00		
Oznámení vystavil:			
Navrhované změny akce			
Doplnění panelu na řízení a monitorování technologií – MTF panel			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
<p>Na základě požadavku uživatele a objednatele bylo přistoupeno s ohledem na rychlejší a efektivnější ovládání a monitorování jednotlivých technologií k instalaci MTF panelu. Toto řešení by nebylo možno v budoucnu doplnit bez větších zásahů do jednotlivých technologií a stavby. Tento systém umožňuje mimo jiné i řízení světel a ve ZL je tedy proveden i odpočet původně navrženého kontroleru DALI.</p>			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 23 703,53 Kč		459 613,50 Kč	

Výsledná cena změn bez DPH:	
	435 909,97 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	91 541,09 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	527 451,06 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Ke dni 9.10.2024	
Požadavek na instalaci MTF panelu vznikl až v průběhu stavebních prací, v polovině 6/2024 byly upřesněny dodavatelem technologie podmínky pro stavební připravenost instalace, termín dodání v 8/2024. MTF panel je možné instalovat až po ukončení instalace svítidel v zákrovovém sále.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
	<p><i>L. J. Ložý</i></p> <p><i>L. J. Ložý</i> vedoucí</p> <p><i>L. J. Ložý</i> náměstek</p>
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Stanovisko TDI:	Podpis TDI:
<i>SOUHLASÍM</i>	<i>L. J. Ložý</i>
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta stavby:
<i>Souhlasím</i>	<i>L. J. Ložý</i>
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací / méněprací	



Změnový list č 4. - Změny ve stavební části

Identifikační údaje akce			
Název	ZPŘ-03/24		
Stavební úpravy-rozšíření místnosti č. E332 výměna angiolycky ve 3 NP objektu Diagnostické centrum			
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	DRŽIK s.r.o., IČ: 286 57 454		
Adresa	Lidická 250/46a, Ostrava – Vítkovice 703 00		
Oznámení vystavil:			
Navrhované změny akce			
Změny ve stavební části dle níže uvedeného zdůvodnění.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
V průběhu stavby bylo potřeba s ohledem na provozní a hygienické požadavky vyplývající z příslušných norem provést tyto dodatečné práce a dodávky spočívající v:			
<ol style="list-style-type: none"> 1) záměně stíněných otevíracích dveří do umývárny lékařů za automatické stíněné posuvné dveře včetně bezdotykového ovládní a s tím souvisejících stavebních a technologických úprav 2) doplnění automatického pohonu ke stíněným dveřím do ovladovny včetně nezbytných stavebních úprav a elektropřípravy 3) zvětšení rozsahu keramických obkladů 4) větším rozsahu ochranných prvků 5) doplnění fermacellové podlahy do místnosti vyšetřovny 			
Tato změna a s tím související vzniklé vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	

- 29 866,28 Kč	630 393,61 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	600 527,33 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	126 110,74 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	726,638,07 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Na termín dokončení díla nemá vliv.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
	 <i>L. J. Ložný</i> vedoucí od  <i>L. J. Ložný</i> vedoucí od  <i>L. J. Ložný</i> náměstek ře
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<i>L. J. Ložný</i>	
Stanovisko TDI:	Podpis TDI:
SOUHLASÍM	 <i>L. J. Ložný</i>
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta stavby:
Souhlasím	 <i>L. J. Ložný</i>
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací	

Změnový list č 5. - Doplnění osvětlení ve vyšetřovně

Identifikační údaje akce			
Název	ZPŘ-03/24		
Stavební úpravy-rozšíření místnosti č. E332 výměna angiolinky ve 3.NP objektu Diagnostické centrum			
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	DRŽIK s.r.o., IČ: 286 57 454		
Adresa	Lidická 250/46a, Ostrava – Vitkovice 703 00		
Oznámení vystavil:			
Navrhované změny akce			
Doplnění osvětlení v místnosti vyšetřovny.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
<p>Po odkrytí stavebních konstrukcí v místnosti vyšetřovny bylo zpracováno dodavatelem technologie upravené konstrukční řešení pro ukotvení technologie. Toto řešení znamenalo značné stísněné prostory pro vedení instalací zajišťovaných stavbou. S ohledem na lepší koordinaci a vzájemné vazby bylo rozhodnuto o zajištění dodávky a montáže svítidel stavbou. Dodávána svítidla musela být navíc řešená s omezenou konstrukční výškou.</p> <p>Tato změna a s tím související vzniklé vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.</p>			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 0,00 Kč		179 178,10 Kč	

Výsledná cena změn bez DPH:	
	179 178,10 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	37 627,40 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	216 805,50 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Ke dni 9.10.2024	
Typ svítidel určený dodavatelem technologie s ohledem na nutnost snížit stropní konstrukci a pohled nebyl možný instalovat, z tohoto důvodu vyvstala nutnost zajistit dodávku vhodných svítidel, termín dodání 9/2024.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	 <i>Lo. J. Kodý</i> <i>Lo. J. Kodý</i> c vedoucí o <i>Lo. J. Kodý</i> náměstek
Podpis zmocněnce	 <i>Lo. J. Kodý</i>
Stanovisko TDI:	Podpis TDI:
<i>SOUHLASÍM</i>	<i>Lo. J. Kodý</i>
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta
<i>Souhlasím</i>	<i>Lo. J. Kodý</i>
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací	

Změnový list č 6. - Inspekční pokoj - výměna silnoproudých a slaboproudých rozvodů

Identifikační údaje akce			
Název	ZPR-03/24		
Stavební úpravy-rozšíření místnosti č. E332 výměna angliolinky ve 3.NP objektu Diagnostické centrum			
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	DRŽIK s.r.o., IČ: 286 57 454		
Adresa	Lidická 250/46a, Ostrava – Vítkovice 703 00		
Oznámení vystavil:			
Navrhované změny akce			
Výměna silnoproudých a slaboproudých rozvodů v inspekčním pokoji.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
<p>Na základě požadavků provozu elektro z důvodu zvýšení spolehlivosti, bezpečnosti a provozuschopnosti došlo k doplnění slaboproudých a silnoproudých rozvodů v místnostech č. E313 a F324 a dozbrojení chráničů v rozvaděči 3RM O 1/5.</p> <p>Vzniklé vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické</p>			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 0,00 Kč		179 055,86 Kč	

Změnový list č 7. - Požární opatření v místnosti UPS

Identifikační údaje akce			
Název	ZPŘ-03/24		
Stavební úpravy-rozšíření místnosti č. E332 výměna angiolinky ve 3.NP objektu Diagnostické centrum			
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	DRŽIK s.r.o., IČ: 286 57 454		
Adresa	Lidická 250/46a, Ostrava – Vítkovice 703 00		
Oznámení vystavil:			
Navrhované změny akce			
Doplnění požárních opatření v místnosti UPS.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
<p>Oproti předpokladu z projektové dokumentace došlo ke změně umístění UPS do stávající místnosti se záložními zdroji. Tato místnost nespĺňovala požadavky vyplývající z PBŘ a muselo tedy dojít k doplnění protipožárních opatření. Jedná se zejména o doplnění protipožárního podhledu, ucpávek, výměně dveří a úpravě silnoproudých a slaboproudých rozvodů včetně následných stavebních úprav.</p> <p>Tato změna a s tím související vzniklé vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.</p>			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 0,00 Kč		157 205,87 Kč	

Výsledná cena změn bez DPH:	
	157 205,87 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	33 013,23 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	190 219,10 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Na termín dokončení díla nemá vliv.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
	<p><i>L. J. Lody</i></p> <p><i>L. J. Lody v. z.</i> vedoucí odb</p> <p><i>L. J. Lody</i> náměstek řed</p>
Podpis zmocněnce zho	<i>L. J. Lody</i>
Stanovisko TDI:	Podpis TDI:
<i>SOUHLASÍM</i>	<i>L. J. Lody</i>
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektar
<i>Souhlasím</i>	<i>L. J. Lody</i>
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací	
