

DODATEK Č. 1

PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO – ČÁST 1 – STANDARDIZOVANÝ POSTUP

MŽP – OG – 17/24/SDD

k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie
IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, číslo účtu 7628001/0710
kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů
tel. + 420 267 122 667, email: petr.uldrych@mzp.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Společnost „Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1“

Vedoucí účastník: **DIAMO, státní podnik**
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Zastoupený: Ing. Ludvíkem Kašparem, ředitelem státního podniku
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem, číslo účtu:7536123000/5500

a

účastník: **GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.**
se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
zastoupená: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem společnosti
IČO: 49196375
DIČ: CZ49196375 plátce DPH
Bankovní spojení: Raiffeisenbank im Stiftland eG, Plzeň
číslo účtu: 505930/8030
zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4319
Za společnost jedná: Ing. Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku

Kontaktní osoba:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Prováděcí smlouvy o dílo č. MŽP-OG-17/24/SDD

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

(dále jen „Rámcová dohoda“)

Tímto Dodatkem č. 1 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

I. Změny Prováděcí smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 1 se znění čl. 3 mění a nově zní:

Čl. 3

Doba, místo a podmínky plnění

Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. dokončit ho a předat Objednateli nejpozději do 30. 11. 2025. (dodací lhůta).

II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

III. Závěrečná ujednání

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:
 - a) Zápis z kontrolního dne č. 2
 - b) Zápis z kontrolního dne č. 3
 - c) Žádost Zhotovitele o uzavření dodatku č. 1.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a Objednatel 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném znění včetně Ceny díla a veškerých metadat v souladu s příslušnými právními předpisy, které se na uveřejnění tohoto Dodatku vztahují, tj. zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Podle dohody Smluvních stran uveřejnění tohoto Dodatku provede Objednatel.
4. Tento dodatek Prováděcí smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle odst. 3. tohoto článku.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy

Objednatel

V Praze, dne 30.9.2024



Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí
RNDr. Martin Holý
ředitel odborů geologie

Zhotovitel

Ve Stráži pod Ralskem, dne



ing. Ludvík Kaspar
ředitel státního podniku
DIAMO, státní podnik
vedoucí společník Společnosti
„Likvidace SDD – PKÚ +GIS – Oblast 1“





DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice
716 00 Ostrava

Centrální podatelna MŽP



B002663148

Ev. č.: **ENV/2024/334738**

Listy/příl.: 1/3 Došlo: 26.9.2024 8:10

Číslo jednací: **MŽP/2024/720/363**

ZN/ MŽP/2024/660/69

Vaše značka/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/Tel.

ZBZS Libušín

Ing. Šarboch/312814149

Libušín

2024-09-12

Dovolujeme si Vás požádat o uzavření Dodatku č. 1 k prováděcí smlouvě o dílo MŽP-OG-17/24/SDD ze dne 8. 2. 2024, jejímž předmětem je Zabezpečení SDD „Hugo“ (ID 2914) v k. ú. Velké Svatoňovice (dále jen Smlouva) s termínem plnění do 30. 09. 2024.

Důvodem je neočekávané prodloužení dodací lhůty u obtížně dostupného stavebního materiálu (litinové potrubí), které bychom měli mít od dodavatele k dispozici až na konci měsíce září 2024. Ostatní práce na realizaci probíhají dle schváleného harmonogramu. Z uvedeného důvodu nemohou být zabezpečovací práce dokončeny v dohodnutém termínu do 30. 9. 2024.

Dovolujeme si Vás proto požádat o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy, jehož předmětem by bylo prodloužení dodací lhůty uvedené v článku 3, odst. 1, a to do 30. 11. 2024.

Věříme, že žádosti budete moci vyhovět.

Za Společnost
„Likvidace SDD – PKU + GIS – Oblast 1“

Ing. Petr Šarboch
na základě plně

Stanovisko GDO:

Za GEOTest, a. s.

Přílohy: 1. Podepsaný návrh dodatku ve třech vyhotoveních

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava

IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Tel.: +420 596 258 111
E-mail: HBZS@diamo.cz

Obchodní rejstřík: Krajský soud Ústí nad Labem
Oddíl AXVIII, vložka 520
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
č. ú. 217301293/0300



ZÁPIS

z provedené kontroly konané k 2. 9. 2024 (KD 2)

1. Kontrolovaná akce:

„Zabezpečení SDD „Hugo“ (ID 2914) v k. ú. Velké Svatoňovice“

Zhotovitel: Společnost „Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast I“, vedoucí účastník DIAMO, s. p., se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč

Přímý zhotovitel: DIAMO, s. p., odštěpný závod HBZS, Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava, středisko ZBZS Odolov – Strážkovice 70; 542 34 Malé Svatoňovice, projekční práce: odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč

Kontaktní osoba:



Číslo prováděcí smlouvy Zhotovitele/ze dne: MZP-OG-17/24/SDD ze dne 8. 2. 2024

Číslo jednací prováděcí smlouvy: ENV/2024/121908

K rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

Zahájení prací: 22. 02. 2024 Výzvou GDO

Termín ukončení prací: 30. 09. 2024 dle PS

Číslo oblasti: I

K výše uvedené kontrole jsou uzavřeny následující dodatky: nejsou

2. Kontrola dokumentace

V průběhu kontroly byla kontrolována následující dokumentace:

1. Plán zabezpečení SDD „Hugo“ (ID 2914) v k. ú. Velké Svatoňovice
2. Provozní (stavební) deník – bez připomínek, do deníku doplněn zápis z realizované kontroly



3. Kontrola pracovišť

Dne 4. 3. 2024 byla na lokalitě provedena za účasti zástupce Zhotovitele (Mgr. Dvořák, [REDACTED] a GDO (Ing. Macka) úvodní rekognoskace. Na základě zjištěných skutečností byl následně vypracován Plán zabezpečení SDD „Hugo“ (ID 2914) v k. ú. Velké Svatoňovice.

Dne 2. 9. 2024 na lokalitě uspořádán druhý kontrolní den za účasti za Zhotovitele Mgr. Dvořák, za GDO Ing. Macka. Pracoviště neobsazeno. Báňská část takřka hotova, zbývají závěrečné úpravy a navázání na další etapu – vodohospodářskou část. Viditelné práce bez připomínek a zjevných vad. Během kontroly základová spára sousední opravované nemovitosti suchá, zdá se tak, že cíl spočívající v eliminaci průsaků důlních vod byl naplněn. K ústí díla bude dále doplněna informační a zákazová tabulka. Báňsky vyhotovený závěrák klenby nebyl předmětem a byl plně zafinancován majiteli pozemku. Vodohospodářská část doposud nezačala pro aktuální obtížnou dostupnost litinových trub. Vzhledem k termínu realizace, 30. 9. 2024, je možné, že tento bude ohrožen. V tom případě Zhotovitel v dostatečné předstihu požádá o dodatek PS o dílo se změnou dodací lhůty s dokončením do konce tohoto roku.

4. Kontrola finančního plnění

Rozpočet byl schválen ze strany GDO ve třetí verzi dne 7. 8. 2024 s cenou realizace díla:

Celková cena díla navržená Zhotovitelem činí:

762 085,16 Kč bez DPH a 922 123,04 Kč vč. DPH s uplatněním indexu 42,3 % z cen ÚRS (1 593 023,28 Kč bez DPH a 1 927 558,16 Kč vč. DPH bez slevy z ÚRS)

Celková cena díla navržená Zhotovitelem a schválená GDO ve verzi 3a činí:

774 054,24 Kč bez DPH a 936 605,63 Kč vč. DPH s uplatněním indexu 42,3 % z cen ÚRS (1 700 541,63 Kč bez DPH a 2 057 655,37 Kč vč. DPH bez slevy z ÚRS)

5. Doporučení a opatření:

Zhotoviteli se doposud nepodařilo získat část materiálu potřebného pro další etapu prací, vodohospodářskou část – obtížně dostupné litinové potrubí. Pokud bude tímto ohrožen termín realizace, požádá Zhotovitel o dodatek PS o dílo s dokončením do konce tohoto roku, pokud problém přetrvá, bude muset být předložena alternativa.

Vyjádření Zhotovitele:

Bez připomínek.

Připomínky a poznámky zástupce GDO:

Bez připomínek.


Účastníci kontroly:

Za generální dozor objednatele:

Ing. Zdeněk Macka

Za Zhotovitele:

Mgr. Martin Dvořák

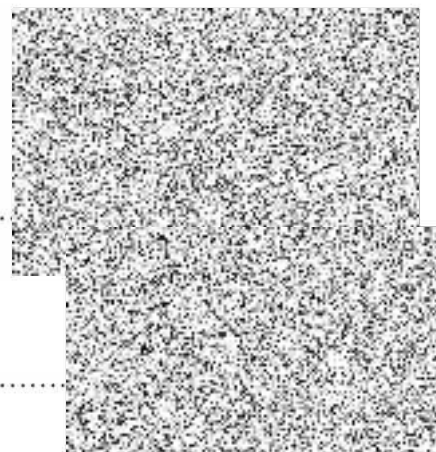

Přílohy:

Příloha č. 1: Fotodokumentace z KD č. 2



Příloha č. 1: Fotodokumentace z KD č. 2

„Hugo“ (ID 2914) v k. ú. Velké Svatoňovice

Obr. 1



Stav na lokalitě během KD č. 5, takřka hotová báňská část, viditelný vliv na podloží (suchá základová spára)

„Hugo“ (ID 2914) v k. ú. Velké Svatoňovice

Obr. 2



Stav na lokalitě během KD č. 2, detail ústí štolý Hugo

ZÁPIS

z provedené kontroly konané 12. 9. 2024 (KD 3)


1. Kontrolovaná akce:

„Zabezpečení SDD „Hugo“ (ID 2914) v k. ú. Velké Svatoňovice“

Zhotovitel: Společnost „Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast I“, vedoucí účastník
DIAMO, s. p., se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Přímý zhotovitel: DIAMO, s. p., odštěpný závod HBZS, Lihovarská 1199/10, Radvanice,
716 00 Ostrava, středisko ZBZS Odolov – Strážkovice 70; 542 34
Malé Svatoňovice, projekční práce: odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2,
403 39 Chlumeč

Kontaktní osoba: 

Za realizaci odpovídá: 

Číslo prováděcí smlouvy Zhotovitele/ze dne: MZP-OG-17/24/SDD ze dne 8. 2. 2024

Číslo jednací prováděcí smlouvy: ENV/2024/121908

K rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

Zahájení prací: 22. 02. 2024 Výzvou GDO

Termín ukončení prací: 30. 09. 2024 dle PS

Číslo oblasti: 1

K výše uvedené kontrole jsou uzavřeny následující dodatky: nejsou

2. Kontrola dokumentace

V průběhu kontroly byla kontrolována následující dokumentace:

1. Plán zabezpečení SDD „Hugo“ (ID 2914) v k. ú. Velké Svatoňovice
2. Žádost o dodatek k PS o dílo



3. Kontrola pracovišť

Dne 4. 3. 2024 byla na lokalitě provedena za účasti zástupce Zhotovitele (Mgr. Dvořák, [redacted] a GDO (Ing. Macka) úvodní rekognoskace. Na základě zjištěných skutečností byl následně vypracován Plán zabezpečení SDD „Hugo“ (ID 2914) v k. ú. Velké Svatoňovice.

Dne 2. 9. 2024 na lokalitě uspořádán druhý kontrolní den za účasti za Zhotovitele Mgr. Dvořák, za GDO Ing. Macka. Pracoviště neobsazeno. Báňská část takřka hotova, zbývají závěrečné úpravy a navázání na další etapu – vodohospodářskou část. Viditelné práce bez připomínek a zjevných vad. Během kontroly základová spára sousední opravované nemovitosti suchá, zdá se tak, že cíl spočívající v eliminaci průsaků důlních vod byl naplněn. K ústí díla bude dále doplněna informační a zákazová tabulka. Báňsky vyhotovený závěrák klenby nebyl předmětem a byl plně zafinancován majiteli pozemku. Vodohospodářská část doposud nezahájena pro aktuální obtížnou dostupnost litinových trub. Vzhledem k termínu realizace, 30. 9. 2024, je možné, že tento bude ohrožen. V tom případě Zhotovitel v dostatečně předstihu požádá o dodatek PS o dílo se změnou dodací lhůty s dokončením do konce tohoto roku.

Dne 12. 9. 2024 byla GDO doručena žádost o Dodatek č. 1 PS o dílo, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace díla, a to do 30. 11. 2024, z důvodu neočekávaného prodloužení dodací lhůty u obtížně dostupného stavebního materiálu (litinové potrubí), které by mělo být k dispozici od dodavatele až na konci měsíce září 2024. Bez části potrubí není možné zahájit práce na realizaci nahrazení nevyhovujícího potrubí. V době žádosti o dodatek práce nadále pokračují, probíhá příprava armování jímky (máchadla) a další možné přípravné práce. Na základě výše uvedeného důvodu GDO souhlasí prodloužením termínu realizace díla s tím, že práce budou dokončeny v letošním roce, nejpozději však 30. 11. 2024 se současným předložením předávací dokumentace.

4. Kontrola finančního plnění

Rozpočet byl schválen ze strany GDO ve třetí verzi dne 7. 8. 2024 s cenou realizace díla:

Celková cena díla navržená Zhotovitelem činí:

762 085,16 Kč bez DPH a 922 123,04 Kč vč. DPH s uplatněním indexu 42,3 % z cen ÚRS (1 593 023,28 Kč bez DPH a 1 927 558,16 Kč vč. DPH bez slevy z ÚRS)

Celková cena díla navržená Zhotovitelem a schválená GDO ve verzi 3a činí:

774 054,24 Kč bez DPH a 936 605,63 Kč vč. DPH s uplatněním indexu 42,3 % z cen ÚRS (1 700 541,63 Kč bez DPH a 2 057 655,37 Kč vč. DPH bez slevy z ÚRS)

5. Doporučení a opatření:

Zhotovitel žádá o prodloužení realizace díla, GDO souhlasí.

Práce jsou požadovány realizovat v letošním roce, v případě trvalé nedostupnosti výše uvedeného materiálu, litiny, bude vyžadována alternativa.

Vyjádření Zhotovitele:

Bez připomínek.

Připomínky a poznámky zástupce GDO:

Bez připomínek.


Účastníci kontroly:

Za generální dozor objednatele:

Ing. Zdeněk Macka

Za Zhotovitele:

Mgr. Martin Dvořák

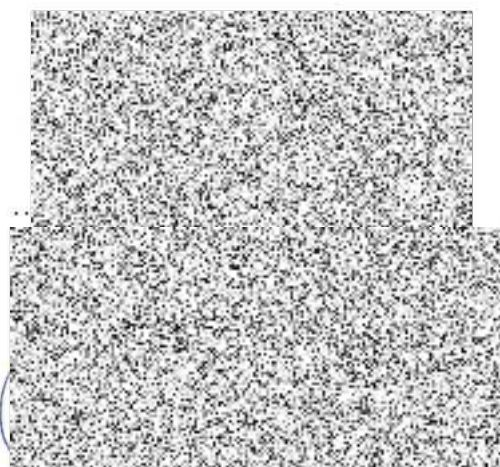

Přílohy:

Příloha č. 1: Fotodokumentace aktuálního stavu





Příloha č. 1: Fotodokumentace aktuálního stavu

„Hugo“ (ID 2914) v k. ú. Velké Svatoňovice


Obr. 1



Stav na lokalitě – příprava betonáže jímky (máchadla), zdroj: Zhotovitel

„Hugo“ (ID 2914) v k. ú. Velké Svatoňovice

Obr. 2

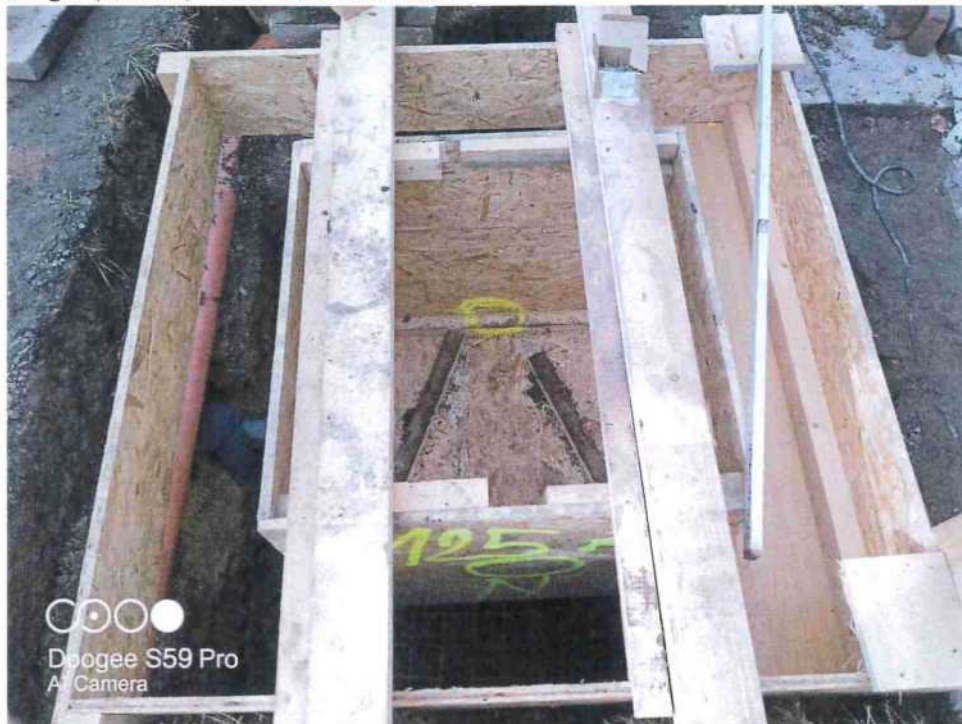

Stav na lokalitě, příprava betonáže jímky (máchadla), zdroj: Zhotovitel
