



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO – stavební práce
" Most ev.č. 198 38 - 1 Hostíčkov, rekonstrukce "**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001190

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele : 8500008800

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupena: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel. + [redacted],

e-mail: [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 08.04.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „Most ev.č. 198 38 - 1 Hostíčkov, rekonstrukce“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. Po geodetickém zaměření byl zjištěn větší objem výkopů, než bylo v projektové dokumentaci předpokládáno. Tato skutečnost se promítla i ve zvýšené kubatuře zpětných zásypů. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla a které nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. S ohledem na důvody uvedené v čl. III. odst. 3.1. tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 4.2. SOD, který je uzavřením tohoto dodatku platný a účinný v následujícím znění:

„Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 30.11.2024. Stavební práce však musí být dokončeny nejpozději do 31.10.2024 a následně poběží lhůta v délce (1) měsíce na předání dokladů požadovaných objednatelem.

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnovým listem č. 1), který byl zpracován ke stavebnímu objektu: SKB101 – Most ev.č. 193 38 - 1 . Změnový list vč. rozpočtu, zaměření kubatury, časový harmonogram a žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavby tvoří přílohy tohoto dodatku.

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 330 286,09 Kč bez DPH

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD,

bez DPH: 8 240 819,93 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 330 286,09 Kč bez DPH.

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 8 571 106,02 Kč

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinností stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.

- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel .
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 – Změnový list vč. rozpočtu**
- **Příloha č. 2 – Zaměření kubatury**
- **Příloha č. 3 – Časový harmonogram**
- **Příloha č. 4 – Žádost o prodloužení termínu**

objednatel :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák
jednatel komplementáře
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovila:  dne 25.09.2024



Změnový list č. 1

Předmět díla:	Most ev.č.198 38-1 Hostíčkov - rekonstrukce			
Objekt:	SKB101-Most ev.č. 198 38-1			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4			
TDS:	AVELS s.r.o.			
Projektant:	Ing. Daniela Škubalová			
Popis změny:				
Po geodetickém zaměření byl zjištěn větší objem výkopů, než bylo v projektové dokumentaci předpokládáno. Tato skutečnost se promítla i ve zvýšené kubatuře zpětných zásypů.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	dle ost. § 222 odst.6 zák. 134/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	Úprava RDS		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		330 286,09 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		69 360,08 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		399 646,17 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		8 240 819,93 Kč	
	Cena po přechchozích dodatcích bez DPH		8 240 819,93 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		8 571 106,02 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		10 371 038,28 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	330 286,09 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	330 286,09 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,75		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:	Prodloužení termínu dokončení stavebních prací do 31.10.2024, prodloužení lhůty pro předání dokladů do 30.11.2024.		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: [redacted]		[redacted]	
	TDS: [redacted]			
	Projektant: [redacted]			
	Objednatel: [redacted]			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1, protokol o zaměření kubatury			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:

Most ev.č.198 38-1 Hostičkov - rekonstrukce

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SKB101 - Most ev.č. 198 38-1

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
16	131251105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 <i>Výpočet: 1256 m3 - 204 m3 - 154m3= 898m3 (výměra odpovídá celkovému množství odtěženého materiálu ve výkopu dle geodetického zaměření po odečtení množství objemu uvedených v položkách č.14 (sanace) a č.131 (mostní konstrukce) rozpočtu</i>	m3	469,500	898,00	428,500	204,120	95 834,34	183 299,76	87 465,42
27	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	681,660	1 110,160	428,500	105,840	72 146,89	117 499,33	45 352,44
28	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	3 408,300	5 550,800	2 142,500	2,484	8 466,22	13 788,19	5 321,97
30	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 226,988	1 998,288	771,300	58,320	71 557,94	116 540,16	44 982,22
31	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	681,660	1 110,160	428,500	31,320	21 349,59	34 770,21	13 420,62
32	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	60,000	488,500	428,500	312,120	18 727,20	152 470,62	133 743,42
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										330 286,09



TECHNICKÁ ZPRÁVA

protokol č. 02/2024-260

Zakázka: *Oprava mostu ev.č. 19838-1 u Hostíčkova*

Číslo zak.: *2024-260*

Katastr. území: *Hostíčkov*

Objednatel: *ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha 4*

PŘEDÁVACÍ PROTOKOĽ

číslo předávacího protokolu: 02/2024-260

datum provedení prací: 12.9.2024

Oprava mostu ev.č. 19838-1 u Hostíčkova

Druh zeměměřických prací: Zaměření a výpočet kubatury výkopu dle požadavku objednatele.

Polohové bodové pole: vytyčovací síť pro stavbu
Výškové bodové pole: vytyčovací síť pro stavbu
Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv
Přesnost zaměření: 3. třída přesnosti
Použitý SW: Microstation V8, Groma v.12
Použitý měřický přístroj: GNSS TRIMBLE R2 (v.č.6109S16604), TS Trimble S6 (v.č.92620241)
Podklady: projekt zasláný elektronicky 28.5.2024: Ing. Škubalová
Způsob stabilizace: -

Popis provedených prací:

Dne 12.9.2024 bylo provedeno zaměření kubatury výkopu (odebrané zeminy) dle požadavku objednatele. Ze zaměření byl proveden výpočet kubatury odebrané zeminy.

Pomocné body vytyčovací sítě byly připojeny metodou RTK GNSS přístrojem TRIMBLE R2 s připojením na síť VRS NOW s použitím schváleného globálního klíče.

Zaměření podrobných bodů bylo provedeno metodou přesné tachymetrie za použití totální stanice TS Trimble S6 z pomocných bodů vytyčovací sítě.

Kubatura výkopu (odebrané zeminy): 1256 m³

Přílohy: výpočet kubatury
grafické znázornění

Měřické práce provedl: [REDACTED]

Měřické práce připravil: [REDACTED]


Nálezitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

AZI: [REDACTED]

Číslo ověřené listiny: 2024-559


Razítko a podpis: 16.09.2024

Převzal dne:



Hostíčkov - most

Geodetické zaměření a výpočet kubatury výkopu M1:200

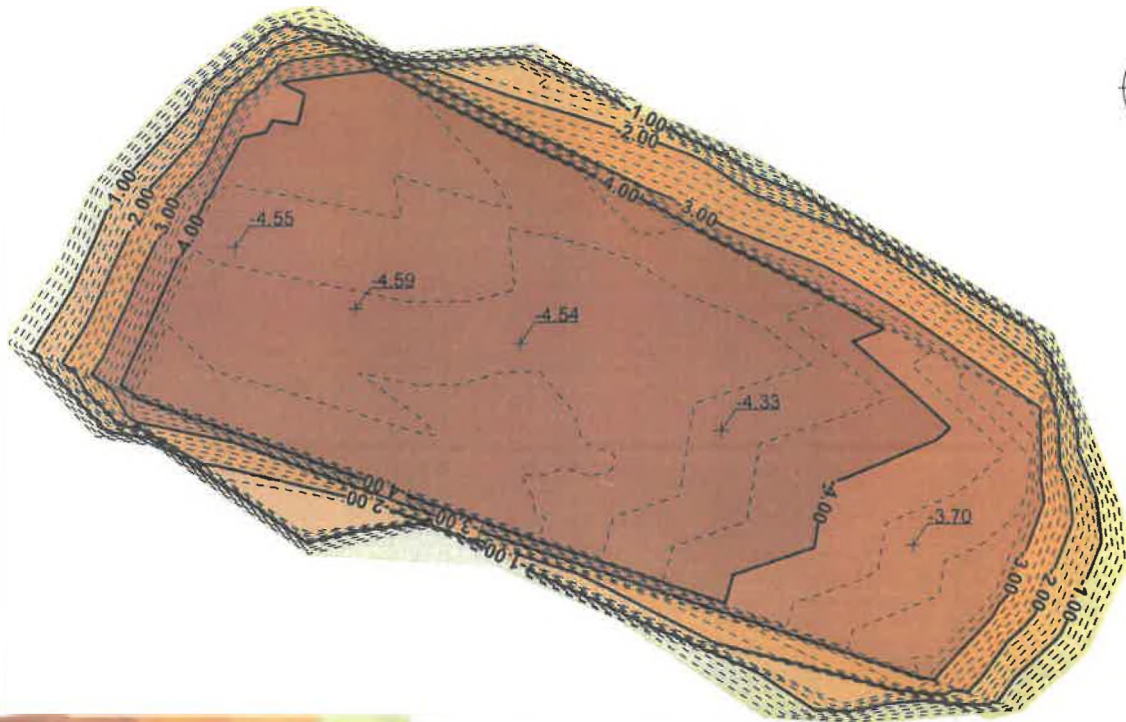

-5.00 -4.00 -3.00 -2.00 -1.00 0.00

Legenda hypsometrie

Kubatura výkopu = -1256 m³
Plocha výkopu = 379 m²

Metoda výpočtu : trojúhelníková síť

Hlavní model : "P:\..\DOLNÍ PLOCHA"
Srovnávací model : "P:\..\HORNÍ PLOCHA"

VÝSLEDNÝ OBJEM :

V[+] =	0.00
V[-] =	-1255.56
V[+] + V[-] =	-1255.56
abs(V[+]) + abs(V[-]) =	1255.56

CELKOVÁ PLOCHA :

A[+] =	0.00
A[-] =	378.54
A[0] =	0.00

	378.54

POVRCH MODELU :

Hlavní m. S[celk] =	484.36
Srovnávací m. S[celk] =	463.77




ROBSTAV k.s.

SÍDLLO: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4, IČO: 27430774, DIČ CZ 27430774

Kontaktní a zasilací adresa faktur: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Plzeň, č.ú. 35-6257230247/0100

Tel: [REDACTED]



Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.

Koterovská 462/162

326 00 Plzeň

V Plzni dne 17.09.2024

Vyřizuje: [REDACTED]

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Veřejná zakázka: „Most ev.č. 198 38-1 Hostíčkov, rekonstrukce“

Vážení,

Obracíme se na Vás touto cestou s žádostí o prodloužení termínu plnění na výše uvedené akci.

Na tuto akci byla uzavřena smlouva o dílo dne 08.04.2024 s termínem dokončení stavebních prací díla do 4 měsíců od předání stavby, tedy do 05.10.2024. Další jeden měsíc běží lhůta pro předání dokladů požadovaných objednatelem. Konečný termín pro dokončení kompletního díla je 5 měsíců, tedy do 05.11.2024.

Žádáme o prodloužení termínu díla z důvodu zvýšeného objemu zemních prací. Po geodetického zaměření bylo zjištěno, že objem výkopů je větší než předpokládala projektová dokumentace.

Tato skutečnost se promítne i ve zvýšené kubatuře zpětných zásypů.

Vzhledem k výše uvedenému žádáme o prodloužení termínu s termínem dokončení stavebních prací do 31.10.2024 a konečným termínem pro dokončení kompletního díla (tzn. vč. dodání dokladů) do 30.11.2024 a vytvoření dodatku, jehož součástí je i navýšení ceny dle ZBV.

Za kladné vyjádření předem děkuji.

[REDACTED]
Vedoucí OTU

ROBSTAV k.s.
