

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 5/24/OST ze dne 29.02.2024

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Vizovice

Adresa: Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice

Zastoupeno: Bc. Silvie Dolanská, starostka města

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Bc. Silvie Dolanská, starostka města
- ve věcech technických: 

IČ: 00284653

DIČ: CZ00284653

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: SPOLEČNOST STAVBY SR – CYKLOSTEZKA VIZOVICE

Vedoucí společnosti: STAVBY SR group s.r.o.

IČO: 092 24 289

DIČ: CZ 092 24 289

se sídlem: Pančava 128, 760 01 Zlín

Zastoupena: Bc. Eliška Nádvorníková, jednatelka,

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně odd. C, vložka 117918

Společník č. 1: REMAT PLUS Zlín, s.r.o.

IČ: 253 04 259

DIČ: CZ 253 04 259

se sídlem: Pančava 128, 760 01 Zlín

Zastoupena: Ing. Ondřej Nádvorník, jednatel,

Ing. Josef Šopík, jednatel

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně odd. C, vložka 23585

- ve věcech smluvních: Bc. Eliška Nádvorníková

- ve věcech technických: 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 299284772/0300

(dále jen **zhotovitel**)

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 29.02.2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. 5/24/OST na provedení stavebních prací **stavby „Cyklostezka Vizovice Etapa I“** (dále jen „Smlouva“) a to jako veřejnou zakázku na stavební práce.
2. Smluvní strany se s ohledem na změnu rozhodných okolností vzniklých v průběhu realizace díla dohodly na této změně sjednané smlouvy:
 - a) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se poníží o položky uvedené v příloze č. 1) k tomuto dodatku, neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich provedení je

nadbytečné (méněpráce). O cenu těchto položek se pak snižuje celková sjednaná cena díla. Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1) Smlouvy snižuje o **121.945,66 Kč bez DPH**.

- b) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se rozšiřuje o položky uvedené v příloze č. 2) k tomuto dodatku (vícepráce), neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich provedení je k řádnému provedení a dokončení díla nezbytné. O cenu těchto položek se pak zvyšuje celková sjednaná cena díla. Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1) Smlouvy zvyšuje o **347.205,68 Kč bez DPH**.

Celková cena díla po snížení a zvýšení tímto dodatkem činí **14.593.260,02 Kč bez DPH**, tedy **17.657.844,62 Kč včetně DPH**.

3. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo nezměněna.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a bude opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
7. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č. 38/342/2024 ze dne 30.09.2024.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a že ho uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že dodatek odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní.

Ve Vizovicích, dne

Za objednatele:

město Vizovice

Bc. Silvie Dolanská

Starostka

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Bc. Silvie Dolanská
Organizace:	Město Vizovice
Sériové č. cert.:	23049652
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	14.10.2024 12:24:28
Důvod:	
Místo:	

Za zhotovitele:

Eliška

Nádvorníková

Digitally signed by Eliška
Nádvorníková
Date: 2024.10.14 09:17:04
+02'00'

STAVBY SR group s.r.o.

Bc. Eliška Nádvorníková, jednatelka

Ing. Ondřej

Nádvorník

Digitally signed by Ing.
Ondřej Nádvorník
Date: 2024.10.14
09:17:20 +02'00'

REMAT PLUS Zlín, s.r.o.

Ing. Ondřej Nádvorník, jednatel

Ing. Josef
Šopík

Digitally signed by
Ing. Josef Šopík
Date: 2024.10.14
09:17:32 +02'00'

REMAT PLUS Zlín, s.r.o.

Ing. Josef Šopík, jednatel

Příloha:

- 1) Změnový list - Přehled méněprací
- 2) Změnový list – přehled víceprací

	Cyklotezka Vizovice Etapa I
	Změna č. 1_Záměna dlažby za ASF v úseku 0,042 - 0,099 km

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1.1	Zemní práce - odvodnění				

41	565151211R0	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 70 mm				
----	-------------	---	--	--	--	--

s rozprostřením a zhuštěním

cyklotezka - živice :

v místě kabelu: 162m

43	573231142R0	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,20 kg/m2				
----	-------------	--	--	--	--	--

bez posypu kamenivem

cyklotezka - živice :

v místě kabelu: 162m

44	577132211R0	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2				
----	-------------	--	--	--	--	--

cyklotezka - živice :

v místě kabelu: 162m

45	596215040R0	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm				
----	-------------	---	--	--	--	--

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

cyklotezka - dlažba :

v místě kabelu: 162m

48	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm				
----	------------	---	--	--	--	--

162*1,01

Cena celkem					16 454,34
--------------------	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

	Cyklostezka Vizovice Etapa I
	Změna č. 2 _Nátěr OK mostů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Původní položky:

Díl:	783	Nátěry				
	2	783201821R0	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním			
	3	783225100R0	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,			

Včetně nosníků: $12 \cdot (1,0 \cdot 2 + 0,25 \cdot 4) \cdot 2 +$ zavětrování $0,1 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 2 + 6 \cdot 2 \cdot 0,1 \cdot 4$ = 86,4 m2

Nové položky:

Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
	1	938543OA0	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ			
Díl:	783	Nátěry				
	4	783121OA0	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN			
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
	75	941955004R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m			

Cena celkem	134 539,51
--------------------	-------------------

Položkový rozpočet

	Cyklostezka Vizovice Etapa I
	Změna č. 3_Provedení palisád u mostu ul. Zahradní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	1.1	Zemní práce - odvodnění
-------------	------------	--------------------------------

9	132201211R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně
10	132201219R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,
11	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
12	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
13	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4
14	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu


16	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
----	-------------	--

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce
-------------	----------	--------------------------------------

17	338920023R0	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm
----	-------------	--

Díl:	0	Nepřiřazený díl
-------------	----------	------------------------

25	59228492R	Palisáda PADOVA PA - 3/120 - v. 1200 x 120 x 165 mm přírodní
35	275313711R0	Beton základových patek prostý třídy C 25/30

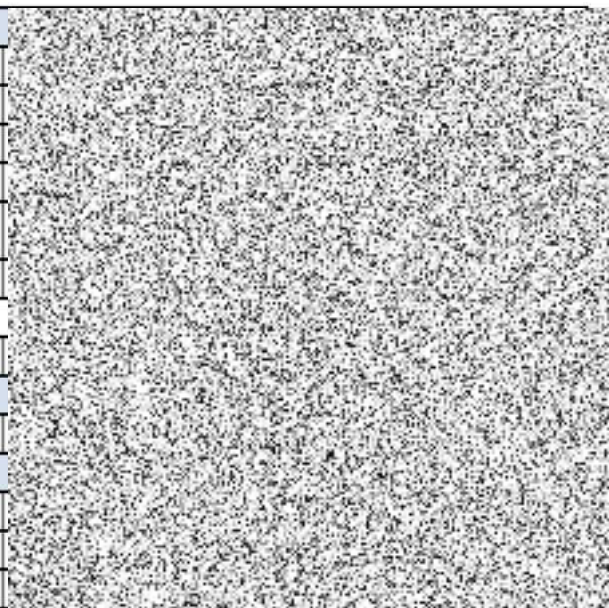

Cena celkem

74 266,17
