

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2024/01
na provedení prací (dále jen „smlouva“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Občanský zákoník**“)

Smluvní strany

Objednatel:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupené:

telefon:

email:

ID Datové schránky:

Město Bílina

Břežánská 50/4, 418 01 Bílina

00266230

CZ00266230

Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města

417 810 811

ePodatelna@bilina.cz

qdtb7vx

zastoupení ve věcech
technických:



(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel:

sídlo:

IČ:

DIČ:

ID Datové schránky:

NCL.CZ ENGINEERING, s. r. o.

Gorkého 1613, 436 01 Litvínov

286 83 218

CZ28683218

uuppr64


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
odd. C vl. 26738

Zastoupené ve věcech smluvních: Zdeněk Hába, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické:

telefon:

email:

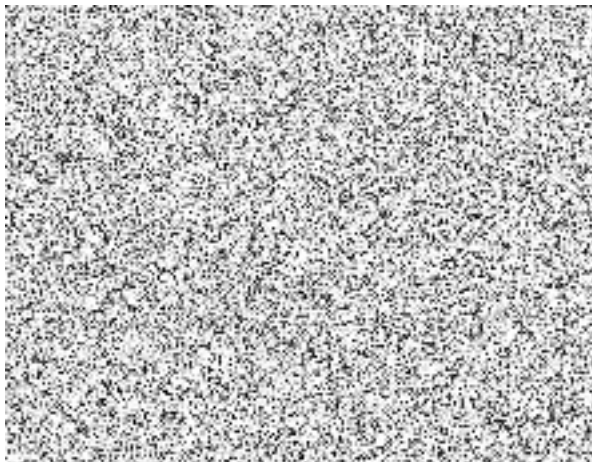

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. INV/2024/01 o dílo na provedení prací uzavřené dne

19. 02. 2024

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. INV/2024/01 uzavřené dne 19. 02. 2024, jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „**Vzduchotechnika a zateplení půdních prostor městského divadla v Bílině, a to včetně přípravy projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti formou Design & Build**“

II.

Smluvní strany se v souladu se čl. 4.4. Smlouvy o dílo dohodly, na následující změně Smlouvy o dílo, čl. 4.3, z důvodu, který je podrobně uveden v příloze č. 1 této smlouvy s názvem „Žádost o změnu termínu plnění ze smlouvy o dílo INV/2024/01“ ze dne 18. 09. 2024.

Původní změni čl. 4.3. Smlouvy o dílo zní následovně:

*4.2. Zahájení realizace díla: převzetím staveniště
Kompletní dokončení díla: nejpozději do 30. 09. 2024*

Nové změni čl. 4.2. Smlouvy o dílo zní tímto dodatkem následovně:

*4.2. Zahájení realizace díla: převzetím staveniště
Kompletní dokončení díla: nejpozději do 22. 11. 2024*

VI.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. INV/2024/01 na provedení stavebních prací ze dne 19. 02. 2024.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto dodatku č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento dodatek č. 1 níže vlastnoručně podepisují.

VII.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno radou Města Bílina dne 1.10.2024 usnesením č.1132.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Žádost o prodloužení a úpravu termínu dokončení

V Bílině, dne 11.10.2024
Město Bílina

V Litvínově, dne 11.10.2024
NCI.CZ ENGINEERING, s.r.o.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

Zdeněk Hába
jednatel společnosti

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Gorkého 1613
434 01 Most

Město Bílina
Břežanská 50/4
418 31 Bílina

Vaše značka

Vyřizuje:



Naše značka

014/24O

Litvínov

18.09.2024

Věc: Žádost o změnu termínu plnění ze smlouvy o dílo INV/2024/01

„Vzduchotechnika a zateplení půdních prostor městského divadla v Bílině“

Tímto zdvořile žádáme o změnu termínu plnění lhůty pro provedení díla, vyplývající z čl. IV, odst. 4.3., výše uvedené smlouvy.

Důvodem je fakt, že po realizaci projekčního návrhu došlo ze strany zástupce objednatele k úpravám umístění vzduchotechnické jednotky pro větrání prostoru Foyer, což způsobilo její pozdější dodání na stavbu a zároveň zvýšilo pracnost provedení – vytvořen nový požární úsek = strojovna Vzduchotechniky v 1.NP, místnost 111. Vnitřní prostory divadla, tedy prostor Foyer a divadelního sálu budou připraveny do zaslavněného termínu. Veškeré práce, které budou prováděny po 30.09.2024, se týkají výhradně venkovních prostorů a v prostoru nově vytvořené strojovny vzduchotechniky.

Níže je plánovaný týdenní harmonogram prací po zaslavněném termínu plnění, tedy po 30.09.2024:

- 40. týden – Propojování vzduchotechnického potrubí s centrální jednotkou pro hlavní sál ve venkovním prostředí, práce elektro a M+R pro centrální jednotku hlavního sálu.
- 41. týden – Montování PUR panelů na ocelovou konstrukci.
- 42. týden – 16.10.2024 dodávka vzduchotechnické jednotky pro větrání prostoru Foyer – v koordinaci s divadlem budou naplánovány práce mezi představeními, vybourání dveří do strojovny, nastěhování vzduchotechnické jednotky, zazdění otvorů do strojovny vzduchotechniky a osazení dveří. Dopojení vzduchotechnického potrubí k jednotce pro větrání Foyer a její zkušební provoz.
- 46. – 47. týden – Dokončovací práce na fasádě objektu, izolování vzduchotechnického potrubí ve venkovním prostředí, kompletace, úklid.

Z tohoto důvodu Vás žádáme o prodloužení termínu konečného plnění na 47. týden roku 2024 – tedy na 22.11.2024. Předem děkujeme za vyřízení naší žádosti.

S pozdravem



Zdeněk Hába
Jednatel společnosti

