

Změnový list pro změny dle § 100 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

Stavba: Most S040, NN3778, Vokovice, P6 – stavební údržba

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS:

201/1

Číslo ZBV:

1

Strany smlouvy o dílo 3/24/5600/036 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 10.04.2024

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE, se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

Přílohy změnového listu:

1. Rozpis ocenění změn položek
2. Přehled změn stavby
3. Soupis prací po všech změnách
4. Zápisy ve stavebním deníku 2x
5. Fotodokumentace
6. Vyjádření AD
7. Vyjádření TDS

Dodavatel

Příjemce

**Údržba mostů –
FIRESTA +
SUPER-KRETE,**
se sídlem
Mlýnská 388/68,
Trnitá, 602 00
Brno
IČ 25317628
DIČ CZ25317628

TSK a.s.
Veletržní 1623/24
170 00 Praha 7
IČ 03447286
DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel: Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE, se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno


Popis a zdůvodnění Změny:


- 1) Byly provedeny zkoušky PAU vyfrézovaných živičných vrstev a dle výsledku zkoušky došlo k překvalifikování odpadu a změně položky likvidace asfaltových vrstev z kontaminované na nekontaminované (pol. č. 5 a pol. č. 6).
- 2) Šířka chodníku neumožňovala pokládku nového asfaltu pomocí silničního finišeru, proto po dohodě s investorem, AD a TDS byl asfaltový koberec nahrazen litým asfaltem s ruční pokládkou (pol. č. 102 a pol. č. 103).
- 3) Projektová dokumentace neuvažovala s odvodněním rubu opěr – chyba projektu, po dohodě s investorem, AD a TDS bylo realizováno odvodnění rubu opěr (pol. č. 63, 135).
- 4) Bylo provedeno upřesnění výměr realizovaných položek dle skutečnosti (pol. č. 52, 59, 117, 196, 197, 198, 199 a 200).


Údaje v Kč bez DPH:


Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena neprovedených prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 102 522,66 Kč	182 093,02 Kč	79 570,36 Kč


Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:				
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno		datum podpis	
Ředitel úseku správy mostních a speciálních objektů TSK hl. m. Prahy	jméno		Datum podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (TSK hl. m. Prahy) Místopředseda představenstva TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Josef Richtr	Datum, podpis	Ing. Josef Richtr  Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2024.09.27 16:16:52 +02'00'
Zhotovitel: Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE, se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno				
ředitel OZ Čechy	Jméno		Datum, podpis	
jednatel	Jméno		Datum, podpis	
				Číslo paré: 1












XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4

↓ ZDE OOTRNEIR

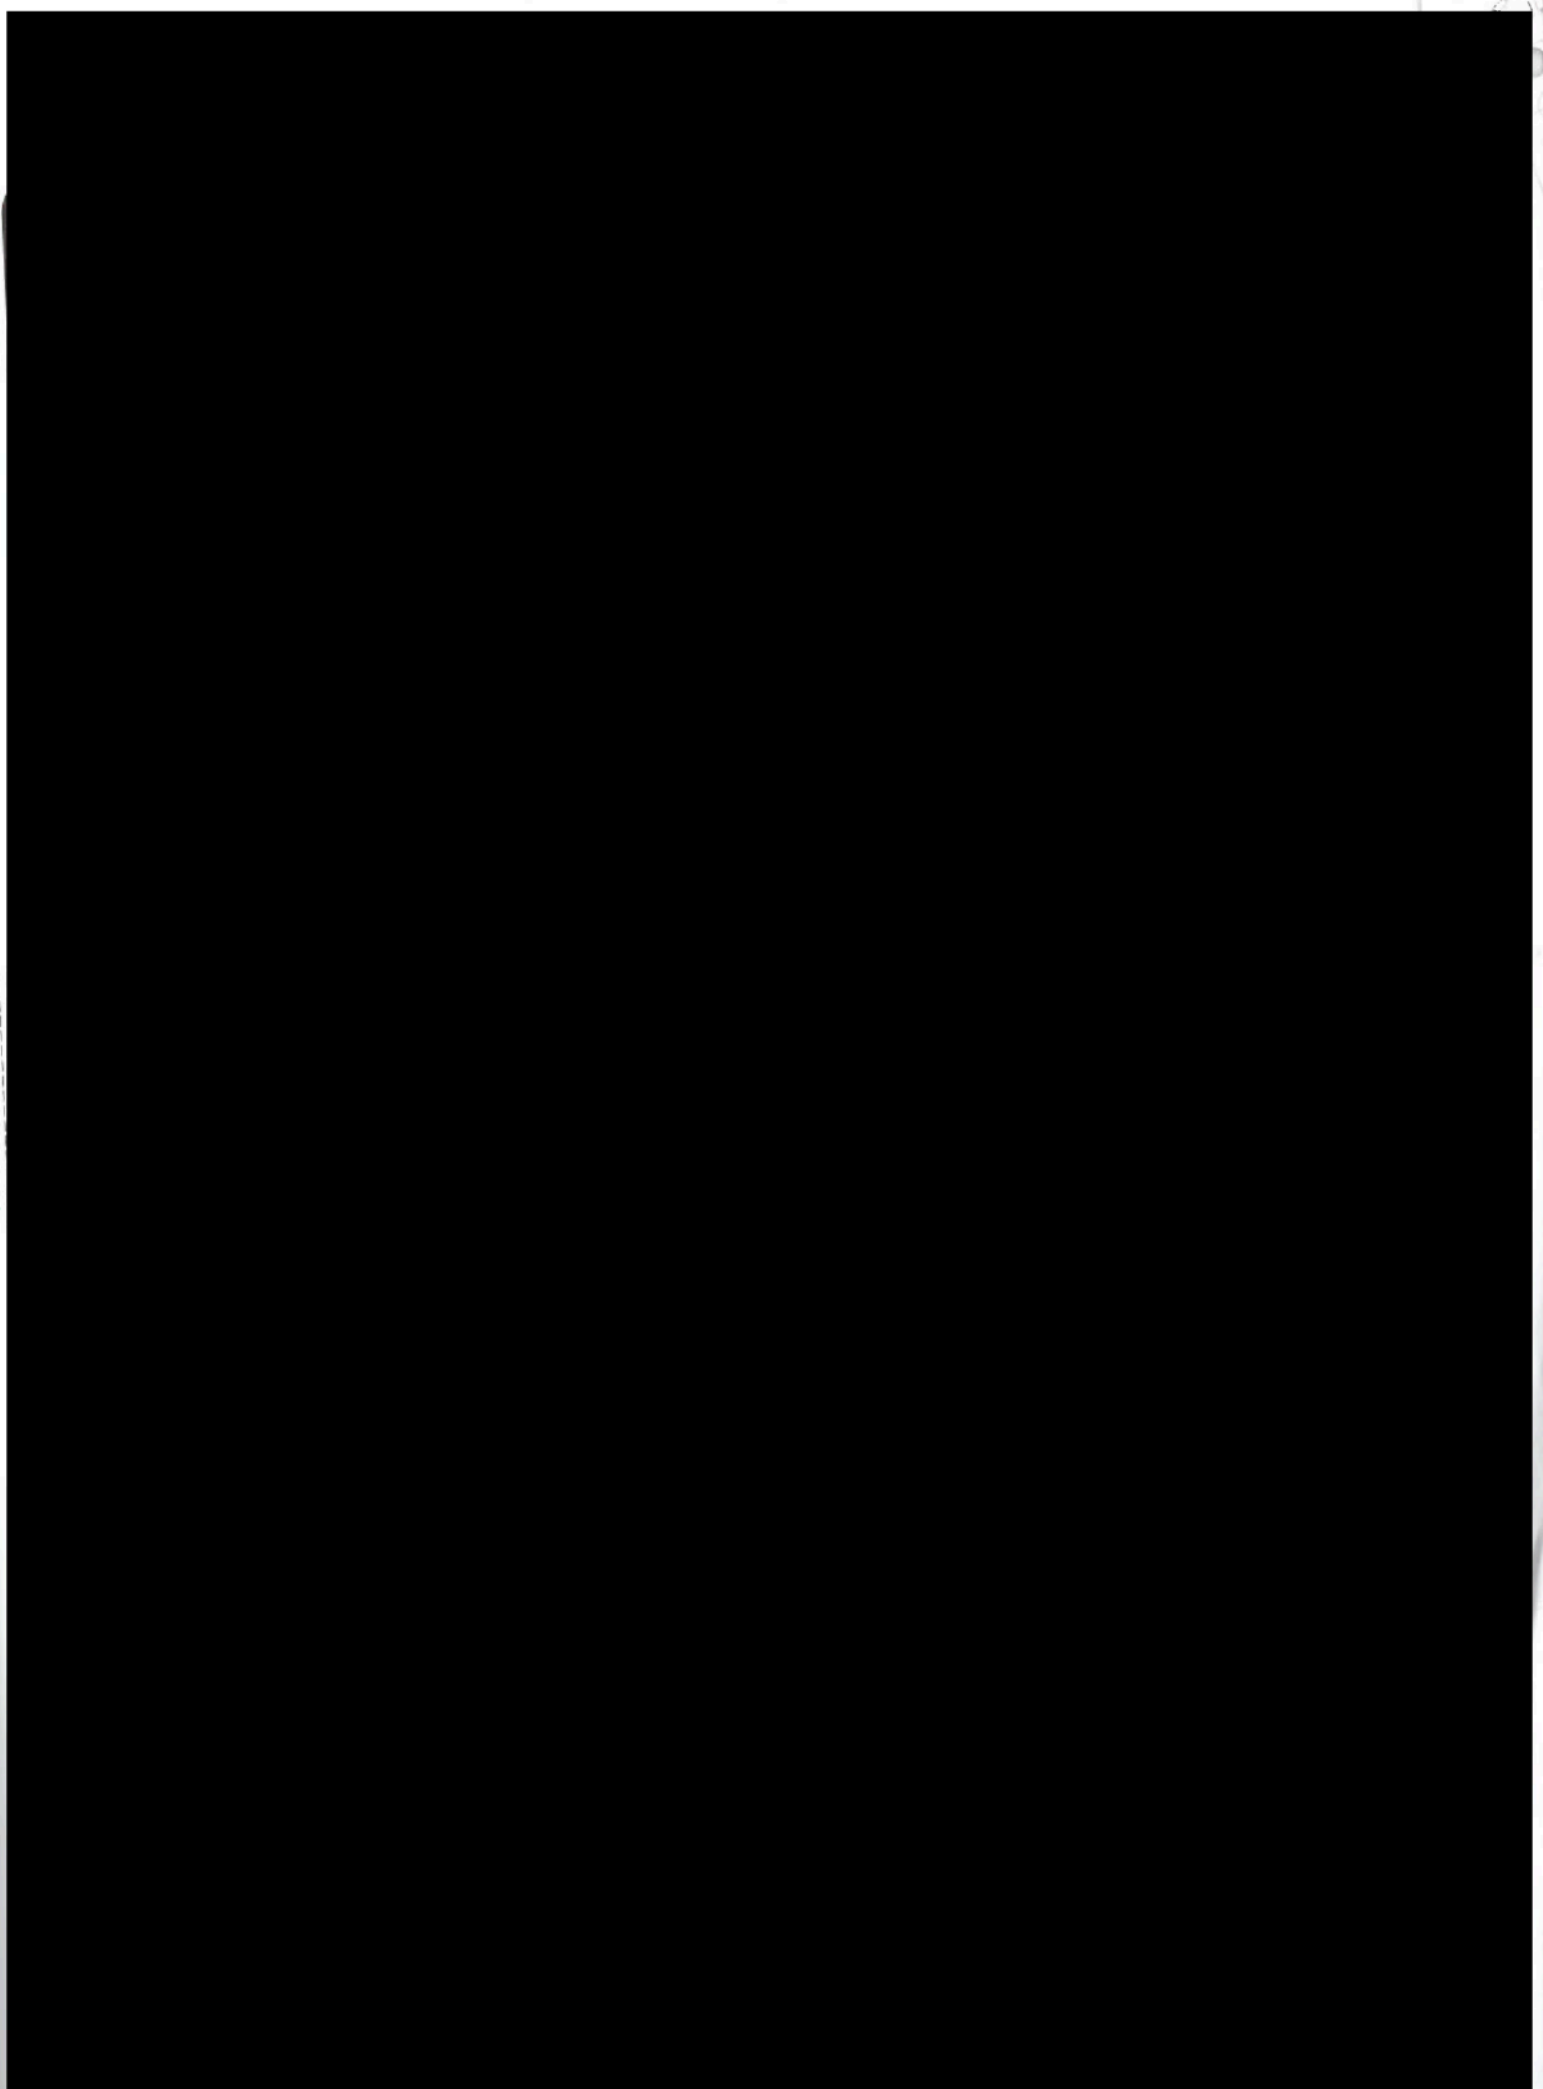

12/11









+ 0.25

+ 0.20

