

Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**Občanský zákoník**“), (dále jen „**Dodatek č. 5**“)

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Nymburk

se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

ve věcech technických oprávněn/a jednat:

....., vedoucí Odboru rozvoje a investic,

e-mail: [.....](#), mob.:

....., e-mail: [.....](#), mob.:

IČO: 002 39 500

DIČ: CZ00239500

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-504359359/0800

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ: 150 00 Praha 5

zastoupený: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva

Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva

ve věcech technických oprávněn/a jednat:

..... e-mail: [.....](#), tel.:

IČO: 466 78 468

DIČ: CZ46678468

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 1491516064/2700

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6229

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

Článek II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Bazén Nymburk**“ (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P22V00000037**) (dále jen „**Veřejná zakázka**“) uzavřely dne 10. 5. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen

„Smlouva o dílo“).

2. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dalších změn, jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku, a tudíž ani ve Smlouvě o dílo.
3. Smluvní strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy o dílo, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádná ze Smluvních stran vlastním zaviněním nepříčinila. Smluvní strany se tak ve smyslu čl. XI. odst. 3 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5.
4. Veškeré změny Smlouvy o dílo, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 5 byly posouzeny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) a jsou s tímto Zákonem o zadávání veřejných zakázek v souladu.

Článek III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany přistupují k upřesnění ceny Díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo. Upřesnění ceny Díla představuje celkem částku **467.554,16 Kč bez DPH** (slovy: čtyři sta šedesát sedm tisíc pět set padesát čtyři korun českých šestnáct haléřů bez DPH). Dílčí změny jsou specifikovány následovně:
 - 1.1. Změnový list č. 035 s názvem Doplnění sociálního zařízení do místnosti č. 128 upravuje změnu, která spočívá v doplnění sociálního zařízení do místnosti č. 128. Hodnota tohoto změnového listu je **179.700,07 Kč**. Změnový list č. 035 bude tvořit Přílohu č. 1a) tohoto Dodatku č. 5.
 - 1.2. Změnový list č. 036 s názvem Doplnění svislé hydroizolace obvodových stěn upravuje změnu, která spočívá ve vytažení svislé hydroizolace nad terén v místě přechodu základové desky a obvodového zdiva. Hodnota tohoto změnového listu je **65.083,11 Kč**. Změnový list č. 036 bude tvořit Přílohu č. 1b) tohoto Dodatku č. 5.
 - 1.3. Změnový list č. 037 s názvem Základy tobogánu upravuje změnu, která spočívá ve zvýšení tloušťky základů pro tobogán tak aby bylo možné zavázat výztuž pilot do výztuže jednotlivých základů. Hodnota tohoto změnového listu je **95.954,85 Kč**. Změnový list č. 037 bude tvořit Přílohu č. 1c) tohoto Dodatku č. 5.
 - 1.4. Změnový list č. 039 s názvem Úprava dveří na únikové cestě upravuje změnu, která spočívá v úpravě únikových dveří tak, aby tyto splnily požadavek požárně bezpečnostního řešení stavby. Úprava se týká dveří 009P, 009L, 010, 023. Hodnota tohoto změnového listu je **61.904,51 Kč**. Změnový list č. 039 bude tvořit Přílohu č. 1d) tohoto Dodatku č. 5.
 - 1.5. Změnový list č. 042 s názvem Výztuž přístřešku pro kola upravuje změnu, která spočívá v opravě chybějících položek výztuže. Změnový list č. 042 byl zpracován na základě vydané revize PD. Hodnota tohoto změnového listu je **14.439,29 Kč**. Změnový list č. 042 bude tvořit Přílohu č. 1e) tohoto Dodatku č. 5.
 - 1.6. Změnový list č. 043 s názvem Bezpečnostní uzamykatelné schránky upravuje změnu, která spočívá v dodávce a montáži 10 kusů bezpečnostních skříněk s rozměry na uložení notebooku se zámky na klíč. Hodnota tohoto změnového listu je **50.472,33 Kč**. Změnový list č. 043 bude tvořit Přílohu č. 1f) tohoto Dodatku č. 5.

Článek IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, podepsán uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
3. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 kalendářních dnů od podpisu Dodatku č. 5 oběma Smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.
6. Dodatek č. 5 byl schválen usnesením Rady města č. 479 ze dne 18.9.2024
7. Přílohy č.: 1a) Změnový list č. 035
 - 1b) Změnový list č. 036
 - 1c) Změnový list č. 037
 - 1d) Změnový list č. 039
 - 1e) Změnový list č. 042
 - 1f) Změnový list č. 043

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 5 jsou u Přílohy č. 1 písm. 1a) až 1f) pouze krycí listy předmětných změnových listů, zbylé části změnových listů vzhledem k jejich rozsahu jsou neoddělitelnou součástí Dodatku č. 5, ale nejsou s tímto Dodatkem č. 5 fyzicky svázány. Obě Strany potvrzují, že mají jedno kompletní originální vyhotovení předmětných změnových listů k dispozici.

/PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE/

/PODPISOVÁ STRANA/

V Nymburce dne: dle el. podpisu

V Praze dne: dle el. podpisu

za Objednatele
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města

za Zhotovitele
David Alonso Rodríguez
člen představenstva

Změnový list č: 035 - Doplnění sociálního zařízení do místnosti č.1.28

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk		
	se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s.		
	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Doplnění sociálního zařízení do místnosti č.128. ZL je zpracován na základě revizí PD ve výkresech stavebních kci, elektro, Kanalizace, voda, VZT. V době oznámení záměru na změnu byla stavba v pokročilém stádiu viz. fotodokumentace příloha č.2. Součástí tohoto ZL není úprava prosklených stěn, které nejsou v tuto chvíli dořešeny.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Požadavek objednatele na vybudování sociálního zázemí na základě předpisů NSA.		
Technické řešení	Původní řešení Místnost plavčíka původně bez sociálního zařízení.		
	Nové řešení Doplnění sociálního zařízení do místnosti č.128. - Vytvoření nové místnosti se záchodem a umyvadlem, v místnosti č.1.28 také dochází k obezdění sloupu které bude obložené obkladem		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	189 919,55 Kč	-10 219 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		179 700,07 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Fotodokumentace stavu ke dni oznámení změny PD		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:	
Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření: [signature] Podpis: [redacted] Datum: 12.8.24
	Za TDS: [redacted] Vyjádření: [signature] Podpis: [redacted] Datum: 12.8.24
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření: Souhlasím [redacted] Další vyjádření: Podpis: Datum: 12.08.2024
	Za zhotovitele: [redacted] Datum: 12.8.2024
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :	
Cena:	Změna termínu:
SoD - 388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč	
Dodatek č.2 464 111,00 Kč	
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč	
ZL 035 - 179 700,07 Kč	


ZL 035 - Doplnění sociálního zařízení do místnosti č. 1.28

Bazén Nymburk	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01 Bazén
ČÁST STAVEBNÍHO OBJEKTU:	2.1 Stavebně konstrukční řešení

[illegible]

0,00	0,00	179 700,07
------	------	------------

171 579,70	Vícepráce - stávající položky
18 339,85	Vícepráce - nové položky
-10 219,48	Méněpráce

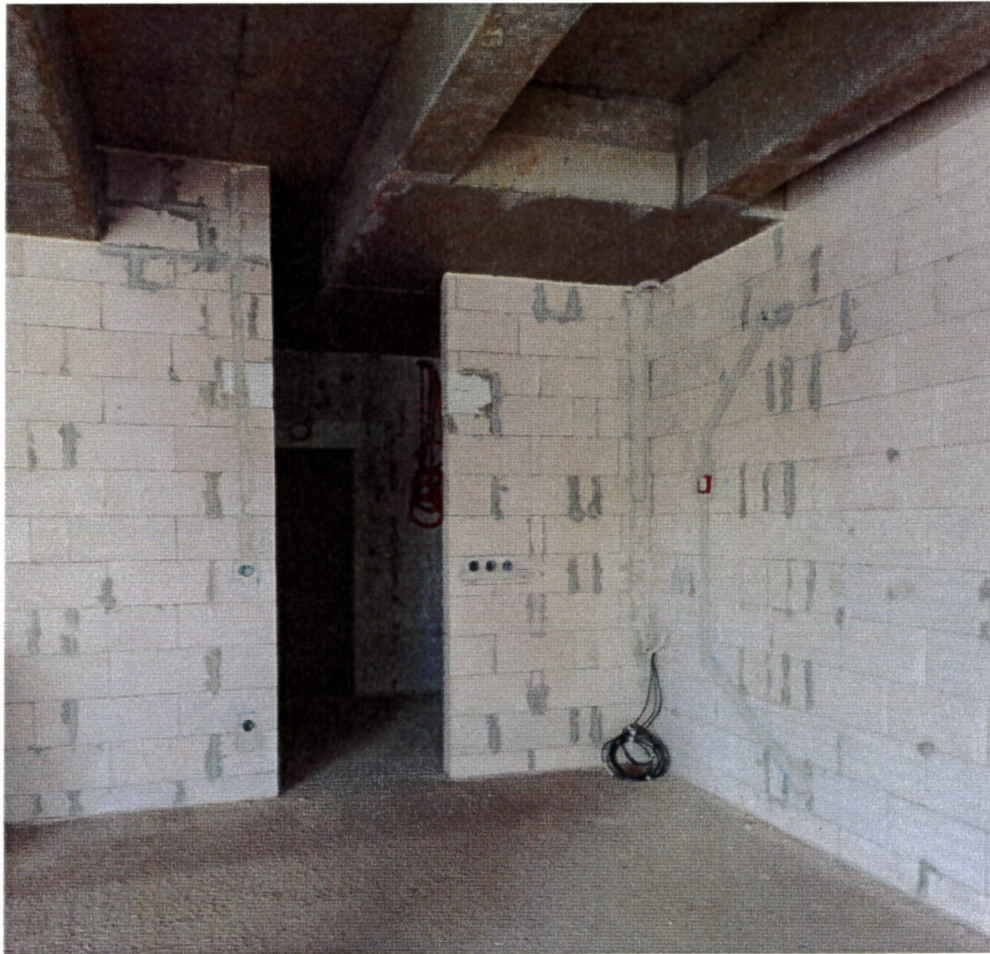



Změnový list č: 036 - Doplnění svislé hydroizolace obvodových stěn

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Jedná se o vytažení svislé hydroizolace nad terén v místě přechodu základové desky a obvodového zdiva, aby bylo možné provést tento detail bylo nutné na přechodu základové desky a zdiva provést betonové fabiony. Vytažení hydroizolace nad terén nebylo v dokumentaci řešeno		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Vytažení izolace nad terén je nutné provést aby došlo k zabránění pronikání vody v místě styku obvodového zdiva a základové desky		
Technické řešení	Původní řešení Nebylo řešeno v PD		
	Nové řešení V místech styku obvodového zdiva a základové desky nutné provést betonové fabiony aby bylo možné provést zpětný spoj izolace a natavení hydroizolačních pásů v šířce 80mm		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	65 083,11 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		65 083,11 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Fotodokumentace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Vyjádření:	Za AD: [redacted]	
	Vyjádření	[signature] [redacted]
	Podpis:	Datum: 12.8.24
	Za TDS: [redacted]	
	Vyjádření	[signature] [redacted]
	Podpis:	Datum: 12.8.24
	Za objednatele: [redacted]	
	Vyjádření	[signature] [redacted]
	Další vyjádření:	
	Podpis:	Datum: 12.08.2024
Za zhotovitele: [redacted]	[redacted]	Datum: 12.08.2024
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :		
Cena:		Změna termínu:
SoD - 388 842 658,00 Kč		Jiná ujednání:
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč		
Dodatek č.2 464 111,00 Kč		
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč		
ZL 036 - 65 083,11 Kč		

Příloha č.1

ZL 036 - Doplnění svislé hydroizolace obvodových stěn

Bazén Nymburk	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01 Bazén
ČÁST STAVEBNÍHO OBJEKTU:	2.1 Stavebně konstrukční řešení

číslo položky	kód položky	Popis	MJ	Dle SoD		Nové	rozíl	J. cena	Dle SoD		Nová	Hodnota ZL	Poznámka	Nh	čas (hod)
				Množství	Množství	Množství	Množství		Celková cena	Původní	Celková cena				
214	711142559RZ4	izolace proti tlakové vodě svislá pásy přilnavitím, 2 vrstva - včetně dodávky hydroizolačních pásů	m2	1 206,76	1 201,84	55,08	55,08	832,29	1 004 374,28		1 050 216,81	45 842,53			
215	711191172RT2	Provedení veškerých detailů pro hydroizolace, včetně dodávky veškerého materiálu pro detaily	m2	3 786,57	3 841,05	55,08	55,08	115,75	438 295,17		444 670,68	6 375,51			
216	711212106R00	Penetrace asfaltovým nátěrem systémem, před provedením hydroizolace	m2	556,37	611,45	55,08	55,08	99,32	55 259,07		60 729,61	5 470,55			
50	273313611R00	Beton základových desek postý C 16/20	m3	245,76	247,14	1,38	1,38	4 623,74	1 136 332,52		1 142 099,41	6 366,89			
220	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	54,44	55,09	0,65	0,65	1 745,68	67 814,38		68 623,32	808,94			
221	998711153R00	Příplatek zvláš. přesun, izol. proti vodě do 500 m	t	54,44	55,09	0,65	0,65	336,77	18 333,04		18 552,34	218,70			
												65 083,11			

0,00

0,00

65 083,11

65 083,11

Vícepráce - stávající položky
Vícepráce - nové položky
Méněpráce

Změnový list č: 037 - Základy tobogánu

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Zvýšení tloušťky základů pro tobogán tak aby bylo možné zavázat výztuž pilot do výztuže jednotlivých základů		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: požadavek statika na provázání výztuže pilot a základů		
Technické řešení	Původní řešení nedostatečná tloušťka základů aby bylo možné ohnout výztuž pilot a zavázat do základů		
	Nové řešení Zvýšení tloušťky základů o 150 mm		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	95 954,85 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		95 954,85 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Výkresy a fotodokumentace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD: [redacted]	
	Vyjádření	[redacted] Souhlasím
	Podpis:	[redacted] Datum: 12.8.24
	Za TDS: [redacted]	
	Vyjádření	[redacted]
	Podpis: Souhlasím	Datum: 12.8.24
	Za objednatele: [redacted]	
	Vyjádření	[redacted] Souhlasím
	Další vyjádření:	
	Podpis:	Datum: 12.08.2024
Za zhotovitele: [redacted]		Datum: 12.08.2024
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v př[redacted] ustanoveních mění následovně :		
Cena:		Změna termínu:
SoD - 388 842 658,00 Kč		Jiná ujednání:
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč		
Dodatek č.2 464 111,00 Kč		
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč		
ZL 037 - 95 954,85 Kč		

ZL 037 - základy tobogánu

[illegible]

Vícepráce - stávající položky	30 639,49
Vícepráce - nové položky	65 315,36
Méněpráce	

BOURÁNÍ ZNAKŮ PÍLOŮ



ŠTERKOVÝ ROOST





Změnový list č: 039 - Úprava dveří na únikové cestě

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Jedná se o úpravu únikových dveří tak aby splnily požadavek PBŘ na mininální šířku nechráněné únikové cesty 1100 mm, úprava se týká dveří 009P, 009L, 010, 023.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Nutná úprava dveří aby byl splněn požadavek PBŘ na únikové cesty.		
Technické řešení	Původní řešení Naprojektované dveře nesplňovaly minimální průchozí šířku 1100mm.		
	Nové řešení Nutná úprava dveří aby byl splněn požadavek PBŘ na únikové cesty Pro dveře 023 do m.č. 1.34 bude nutné rozšířit otvor v železobetonové stěně a u dveří 009 P z m.č. 1.11 bude rozšířen otvor ubouráním zděnné stěny. Zbylé dveře budou po dohodě předsazené.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	61 904,51 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		61 904,51 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2:		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Vyjádření:

Za AD: [redacted]

Vyjádření

Souhlasím

Podpis:

Datum:

12.8.24

Za TDS: [redacted]

Vyjádření

Souhlasím

Podpis:

Datum:

12.8.24

Za objednatele: [redacted]

Vyjádření

Souhlasím

Další vyjádření:

Podpis:

Datum:

12.8.2024

Za zhotovitele: [redacted]

Datum:

12.08.2024

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

Změna termínu:

SoD - 388 842 658,00 Kč
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč
Dodatek č.2 464 111,00 Kč
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč
ZL 039 - 61 904,51 Kč

Jiná ujednání:

Úprava dveří na únikové cestě

[illegible]

5,57	Vícepráce - stávající položky
51 898,94	Vícepráce - nové položky
	Méněpráce

Změnový list č: 042 - Výztuž přístřešku pro kola

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk		
	se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s.		
	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Oprava chybějících položek výztuže. ZL zpracován na základě vydané revize PD ke dni 27.5.2024 - výkres č 2.015		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: V PD byla špatně vykázána výztuž přístřešku pro kola, byla vydána revize PD ke dni 27.5.2024 - výkres č 2.015 kde je opraveno množství vykázané výztuže		
Technické řešení	Původní řešení výkres NYMB_ARMOZ04_00		
	Nové řešení Vydána revize 01 ke dni 27.5.2024 - výkresu č 2.015		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	14 439,29 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		14 439,29 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Fotodokumentace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD: [redacted]	
	Vyjádření [signature]	
	Podpis: [redacted]	Datum: 12.8.24
	Za TDS: [redacted]	
	Vyjádření [signature]	
	Podpis: [redacted]	Datum: 12.8.24
	Za objednatele: [redacted]	
	Vyjádření [signature]	
	Další vyjádření:	
	Podpis:	Datum: 12.08.2024
Za zhotovitele: [redacted]	[redacted]	Datum: 12.08.2024
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :		
Cena:		Změna termínu:
SoD - 388 842 658,00 Kč		Jiná ujednání:
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč		
Dodatek č.2 464 111,00 Kč		
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč		
ZL 042 - 14 439,29 Kč		

Příloha č.1

ZI 042 - Výztuž přístřešku pro kola

Bazén Nymburk	SO 01 Bazén
STAVEBNÍ OBJEKT:	2.1 Stavebně konstrukční řešení
ČÁST STAVEBNÍHO OBJEKTU:	

číslo položky	kód položky	Popis	MJ	Dle SdD		Nové	rozdíly	J. cena	Dle SdD		Nová	Hodnota ZL	Poznámka	Rn	čas (hod)
				Množství		Množství	Množství		Callová cena		Callová cena				
98	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdl z betonářské oceli 10505 (R)	t	54,70		54,95	0,25	56 905,85	3 112 582,77		3 127 002,07	14 439,29			
												14 439,29			

0,00

0,00

14 439,29

14 439,29

Vícepráce - stávající položky
Vícepráce - nové položky
Méněpráce

Změnový list č: 043 - Bezpečnostní uzamykatelné schránky

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Ve výkazu výměr chybí položka O57 - bezpečnostní schránky, ačkoli v PD je navržena.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Zajištění bezpečnostních schránek pro veřejnost k uchovávání cenností. Dle požadavku objednatele dodávka a montáž 10 ks bezpečnostních skříněk s rozměrem na uložení notebooku se zámky na klíč.		
Technické řešení	Původní řešení Bezpečnostní skřínky v HPL provedení, v počtu 50ks, rozměr 20 x 20 x 20cm - nejsou součástí výkazu výměr.		
	Nové řešení Objednatel požaduje pouze 10 ks bezpečnostních skříněk s rozměrem 50 x 30 x 50 cm na uložení notebooku se zámky na klíč.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	50 472,33 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00
	Zvýšení:		50 472,33
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Výkres bezpečnostních schránek		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			
	Za AD: XXXXXXXXXX		

Vyjádření:	Vyjádření		
	Podpis:		Datum: 12.8.24
	Za TDS:		
	Vyjádření		
	Podpis:		Datum: 12.8.24
	Za objednatele:		
	Vyjádření		
	Další vyjádření:		
	Podpis:		Datum: 12.08.2024
	Za zhotovitele:		Datum: 12.08.2024
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v přílohách ustanoveních mění následovně :			
Cena:		Změna termínu:	
SoD - 388 842 658,00 Kč		Jiná ujednání:	
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč			
Dodatek č.2 464 111,00 Kč			
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč			
ZL 043 - 50 472,33 Kč			

Změnový list č. 040 - Bezpečnostní uzamykatelné schránky

[illegible]

Vícepráce - stávající položky	
Vícepráce - nové položky	50 472,33
Méněpráce	

Příloha č. 2:



BEZPEČNOSTNÍ PŘE*
SCHRÁNKY 50KS
HPL 200x200x200

