

Číslo jednací Prováděcí smlouvy: ENV/2024/238834

Číslo jednací dodatku č. 1. Prováděcí smlouvy: ENV/2024/ 343590

Číslo smlouvy zhotovitele: VUAS/2024/96



DODATEK Č. 1

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO

MŽP – OG - 37/24/SDD

k Rámcové smlouvě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie
IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
číslo účtu: 7628001/0710

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Vršanská uhelná a.s.

se sídlem: Václava Řezáče 315, 434 01, Most
zastoupená: Ing. Petrem Lencem, místopředsedou představenstva
Ing. Petrem Procházkou, členem představenstva
IČO: 286 78 010
DIČ: CZ 699 00 3245
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6
číslo účtu: 2023830030/6000

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1

(dále jen „Dodatek č. 1“)



Prováděcí smlouvy o dílo č. MŽP – OG - 37/24/SDD

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

k Rámcové smlouvě o dílo – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

(dále jen „Rámcová smlouva“).

Tímto Dodatkem č. 1 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

I. Změny Prováděcí smlouvy

- I. 1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 1 se znění čl. 3 Prováděcí smlouvy mění a nově zní:

Čl. 3

Doba, místo a podmínky plnění

Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli nejdéle do 30. 6. 2025 (dodací lhůta).

II. Ostatní ujednání

- II. 1 Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

III. Závěrečná ujednání

- III. 1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha:
- a) Žádost Zhotovitele o uzavření dodatku;
- III. 2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
- III. 3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Podle dohody Smluvních stran uveřejnění tohoto dodatku Prováděcí smlouvy provede Objednatel.

Číslo jednací Prováděcí smlouvy: ENV/2024/238834
Číslo jednací dodatku č. 1. Prováděcí smlouvy: ENV/2024/
Číslo smlouvy zhotovitele: VUAS/2024/96



Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Praze, dne 21.40.2024



Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí

RNDr. Martin Holý, ředitel odboru geologie

Zhotovitel

V Mostě, dne



Vršanská uhelná a.s.

Ing. Petr Lenc

místopředseda představenstva



Vršanská uhelná a.s.

Ing. Petr Procházka
člen představenstva

Vršanská uhelná a.s.

Václava Řezáče 315, 434 01 Most
tel.: +420 478 002 511, dat. schránka: z54gnfy
Váš dopis značky ze dne:
Naše značka: VUAS/713/2024 - OD
Vyřizuje / linka: Ing Radim Slabák /478008751
Místo a datum odeslání: Most, 15. 10 2024

Ministerstvo životního prostředí
RNDr. Martin Holý,
ředitel odboru geologie
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Vážený pane řediteli,

žádám Vás o prodloužení termínu dodací lhůty realizovaného díla: **Realizace zabezpečení dvou SDD „Hilfe Gottes“ (č.o. 177) a „Bartolomeus“ (č.o. 179) a dále průzkum a případné zabezpečení dvou SDD „Urselschacht“ (č.o. 182) a „JV Versuchschacht“ (č.o. 601) v k.ú. Cínovec.** Realizace tohoto díla je předmětem Prováděcí smlouvy ENV/ 2024/238834 ze dne 23. 3. 2024 k Rámcové smlouvě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES 190 070.

Důvodem opoždění prací bylo vyřešení střetů zájmů – problematická a časově náročná komunikace, ohledně získání souhlasného stanoviska se způsobem zajištění a vstupem na pozemek SDD „Hilfe Gottes“ (č.o.177) a vstupem na pozemek SDD „JV Versuchschacht“ (č.o. 601) s majitelem pozemků, na kterých se předmětná SDD nacházejí.

Vyjádření GDO Ing. Prečuch Daniel: V rámci KD č. 2. ze dne 7. 10. 2024 byla provedena kontrola realizace prací. S ohledem na zpoždění prací z objektivních důvodů GDO doporučuje podat žádost o dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě ENV/2024/238834 ze dne 23. 3. 2024 s návrhem posunutí termínu realizace do 30. 6. 2025

Děkuji za pochopení a s pozdravem



Ing. Radim Slabák
ředitel HBZS Most

Příloha č. 1: Zápis z provedené kontroly KD č. 2 ze dne 7. 10. 2024

č. 2: Návrh dodatku č. 1 k prováděcí smlouvě ENV/ 2024/238834 ze dne 23. 3. 2024



Centrální podatelna MŽP



8002674933

Ev. č.: **ENV/2024/343690**

Listy/příl.: 1/4 Došlo: 15.10.2024 12:16

Číslo jednací: *129/2024/720/434*

2N/1728/2024/660/189

ZÁPIS

z provedené kontroly (KD č. 2.) konané dne 7. 10. 2024

1. Kontrolované akce:

Název akce dle PS: Realizace zabezpečení dvou SDD „Hilfe Gottes“ (č.o. 177) a „Bartolomeus“ (č.o. 179) a dále průzkum a případné zabezpečení dvou SDD „Urselschacht“ (č.o. 182) a „JV Versuchschacht“ (č.o. 601) v k.ú. Cínovec.

Zhotovitel:

Vršanská uhelná a.s.

se sídlem: Václava Řezáče 315, 434 01, Most

zastoupená: Ing. Petrem Lencem, místopředsdou představenstva

Ing. Petrem Procházkou, členem představenstva

IČO: 286 78 010

DIČ: CZ 699 00 3245

bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6

číslo účtu: 2023830030/6000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1987

Číslo prováděcí smlouvy Zhotovitele/ze dne: MŽP-OG-37/24/SDD ze dne 22. 3. 2024

Číslo jednací prováděcí smlouvy: ENV/2024/238834

K rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

Termín zahájení prací: 29. 3. 2024 – ohlášení OBÚ Most

Termín ukončení prací: dle PS 30. 11. 2024

Číslo oblasti: 1

K výše uvedené kontrole jsou uzavřeny následující dodatky: dodatky nejsou

2. Kontrola dokumentace

V průběhu kontroly byla kontrolována následující dokumentace:

Návrh Plánu průzkumu a zajištění SDD: Tato projektová dokumentace byla zpracována na základě uzavření prováděcí smlouvy je členěna dle vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 sb., příloha 11.

Realizace zabezpečení dvou SDD „Hilfe Gottes“ (č.o. 177) a „Bartolomeus“ (č.o. 179) a dále průzkum a případné zabezpečení dvou SDD „Urselschacht“ (č.o. 182) a „JV Versuchschacht“ (č.o. 601) v k.ú. Cínovec.

Na závěr KD č. 2 byla rozpočtová část shledána vyhovující s malými připomínkami. Rozpočtová část plánu zajištění byla zástupcem GDO připomínkována, s tím, že byly provedeny úpravy dle připomínek GDO. Rozpočet byl předběžně schválen s použitím kritéria 45,2% z ceníku URS

Cínovec - vyhledání a průzkum SDD Urselschacht a JV Versuchschacht – předschválený rozpočet

První návrh rozpočtu Zhotovitele	3 250 719,27 Kč bez DPH
Rozpočet Zhotovitele dále připomínkový GDO	1 965 282,27 Kč bez DPH

a bez uplatnění slevy zhotovitele z ceníku URS dle RD (45,200%)

První návrh rozpočtu Zhotovitele	6 741 392,97 Kč bez DPH
Rozpočet Zhotovitele dále připomínkový GDO	3 963 263,99 Kč bez DPH
1. Stavební deník – veden řádně	
2. Kontrola položek obsažených v plnění RD – bez připomínek	
3. Kontrola řešení střetu zájmů – vyřešeny	

3. Kontrola pracovišť

Pracoviště obsazeno. Přístupové cesty upraveny - sjízdné a schůdné. Probíhají průzkumné vrtné práce. V rámci KD č. 2. ze dne 7. 10. 2024 byla provedena kontrola realizace prací. S ohledem na zpoždění prací z objektivních důvodů GDO doporučuje podat žádost o dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě ENV/2024/238834 ze dne 23. 3. 2024 s návrhem posunutí termínu realizace do 30. 6. 2025. Byla pořízena fotodokumentace. Pracoviště ohrazeno výstražnou páskou a zákazovými tabulkami.

4. Kontrola finančního návrhu zajišťovacích prací (rozpočet):

Celková předložená projektová cena zhotovitel díla činila v rozpočtu předloženého dne 17. 6. 2024 – 6 741 392,97 Kč bez DPH; 8 157 085,49 Kč vč. DPH (bez použití kritéria 45,200 % z URS). Po použití kritéria 45,200 % je cena předložená na tomto KD č. 2. – 3 250 719,27 Kč bez DPH a 3 933 370,31 Kč vč. DPH. Po zapracování připomínek GDO v srpnu 2024 do rozpočtové části Plánu zajištění je předschválená cena kontrolované akce 3 963 263,99 Kč bez DPH a 4 789 514,27 Kč vč. DPH (bez použití kritéria 45,200 % z URS).

Doporučení a opatření:

V rámci KD č. 2. ze dne 7. 10. 2024 byla provedena kontrola realizace prací. S ohledem na zpoždění prací z objektivních důvodů GDO doporučuje podat žádost o dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě ENV/2024/238834 ze dne 23. 3. 2024 s návrhem posunutí termínu realizace do 30. 6. 2025

Vyjádření Zhotovitele: souhlasné stanovisko

Připomínky a poznámky zástupce GDO: předložit písemný návrh žádosti o dodatek č. 1 k PS
Důvodem opoždění prací bylo vyřešení střetů zájmů – problematická a časově náročná komunikace, ohledně získání souhlasného stanoviska se způsobem zajištění a vstupem na

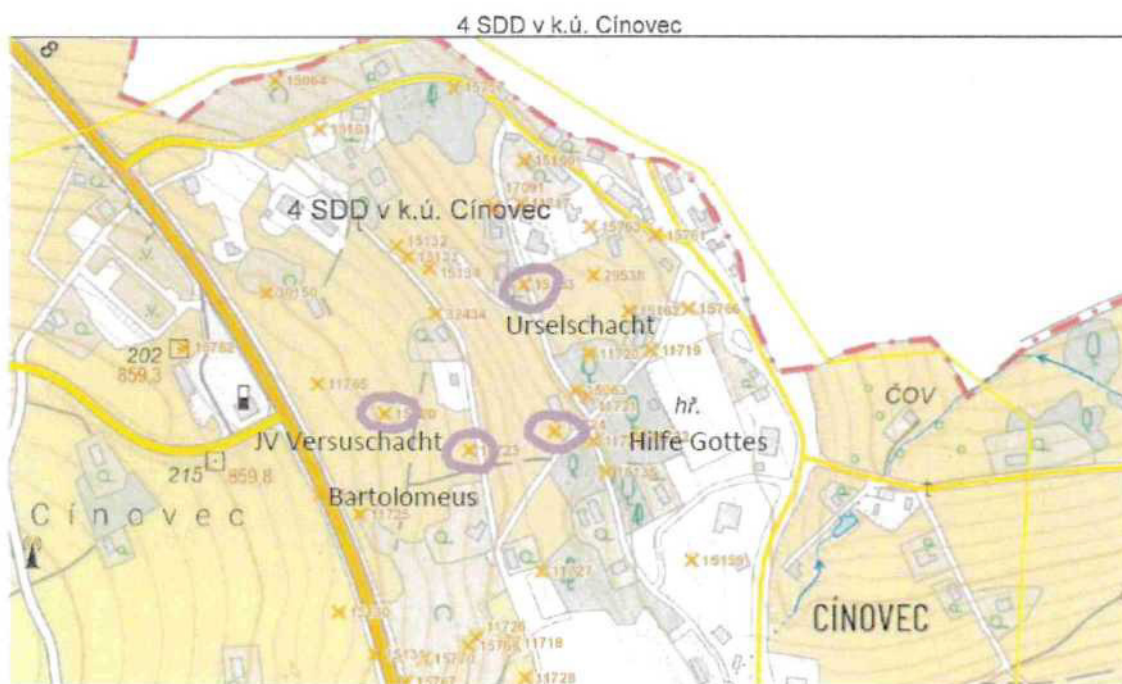
pozemek SDD „Hilfe Gottes“ (č.o.177) a vstupem na pozemek SDD „JV Versuchschacht“ (č.o. 601) s majitelem pozemků, na kterých se předmětná SDD nacházejí.

Účastníci kontroly:

Za generální dozor objednatele: jméno a funkce Ing. Daniel Prečuch – vykonavatel GDO
firmy GEOtest, a.s.



Za zhotovitele: Vršanská uhelná a.s. jméno a funkce: Ing. Radim Slabák závodní dolu HBZS

Přílohy: fotodokumentace

Polohy řešených SDD dle registru ČGS



Foto č. 1 Odkrývání ohlubně jámy Bartolomeus



Foto č. 2 Průzkumné práce SDD jámy Urselschacht vrtnými sondami



Foto č. 3 Průzkumné práce SDD jámy Urselschacht vrtnými sondami
