

DODATEK č. 1 - NPU-450/91283/2024

ke smlouvě o dílo **NPU-450/77475/2024** ze dne 3.9.2024
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01

jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži

Zástupce pro věcná jednání:

██████████ SZ Jánský Vrch; ██████████,

Zástupce pro věci technické:

██████████ investiční technik; ██████████

Bankovní spojení: ČNB, č.ú. 500005-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,

(dále jen „Objednatel“)

a

A.Q. Attentus Qualitatis s.r.o.

IČO: 27707911,

se sídlem: Tišnovská 266, Lomnice 679 23

Zastoupena: ██████████

Kontaktní osoba: ██████████ e-mail: ██████████ tel. ██████████

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53544

Bankovní spojení: ██████████

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany konstatují, že dne 3.9.2024 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem **je provedení restaurátorských prací v rámci obnovy zatečením poškozeného stropu místnosti č.39 na památkovém objektu SZ Jánský Vrch, (dále jen „Smlouva“).**
2. Zhotovitel informoval objednatele, že z důvodu nefungující infrastruktury v místě realizace díla, způsobené živelnou pohromou, nelze provést práce v termínu podle smlouvy.
3. Vlivem extrémní povětrnostní situace s rekordními srážkovými úhrny od 13.9.2024 a silným větrem, nastala v regionu Jesenicka povodňová situace se zásadními dopady na infrastrukturu (dopravu, komunikace, dodávky elektřiny a vody), což lze definovat jako mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti smlouvy č.j. NPU-450/77475/2024 ze dne 3.9.2024, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny. Jedná se o živelnou pohromu neumožňující realizaci díla.
4. Odklad prací o 5 týdnů odsunuje provádění restaurátorských prací do klimatologicky nevhodného období (nízké teploty, vysoká vlhkost), které je technologicky nevhodné k dokončení restaurátorských prací, které jsou předmětem díla.
5. Smluvní strany se dohodly na **prodloužení doby na zhotovení díla do 31.5.2025.**


6. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel má nárok na úhrady dílčích plateb Smluvní ceny po dokončení prací specifikovaných oceněným rozpočtem, podle přílohy smlouvy. Úhrada platby Smluvní ceny, bude provedena po předání a převzetí části díla, na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.
7. Všechna ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, a prohlašují že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.
3. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Kroměříži dne 17.10. 2024

objednatel

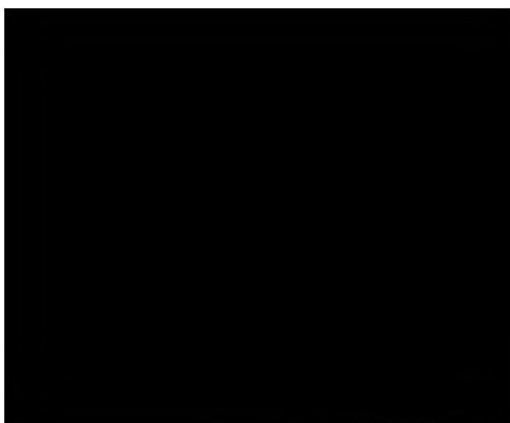

V Lomnici, dne 17.10. 2024

zhotovitel

