

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo

ID: 171468 na akci:

**„Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a
parkovací dům, rozšíření venkovního parkoviště“**

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje

Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina

+420 564 602 419

708 90 749

Komerční banka, a.s.

123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel./email:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Dvořáková – stavební firma s.r.o.

Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod - Kyjov

Iva Dvořáková, jednatel

Iva Dvořáková

Ing. David Sochor, Vlastimil Dvořák

Ivo Toman

+420 569429239/info@stavby-dvorakova.cz

08775270

CZ8776270

Komerční banka a.s.

123-989160267/0100

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 45069

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 07. 2024 (dále jen „Smlouva“):

1) V Čl. 1 Smlouvy na straně objednatele zástupcem pro věci technické bude nadále uveden pouze Ing. Jan Kalina.

2) Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve **Změnových listech č. 1. až 5.**, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Potřeba změn vznikla v průběhu realizace díla a jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

3) Čl. 4 Cena za dílo, odst. 4.2 se mění a nově zní takto:

4.2 Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 32 479 911,65 Kč

slovy: třicet dva milionů čtyři sta sedmdesát devět tisíc devět set jedenáct korun českých šedesát pět haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1 bez DPH: 25 503 990,27 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH 8 695 371,42 Kč

Cena méněprací bez DPH -1 719 450,04 Kč

Cena více-méněprací bez DPH 6 975 921,38 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1

Cena díla bez DPH 32 479 911,65 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

3.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky s elektronickými podpisy.

Přílohy: Změnové listy č. 1 až 5

za zhotovitele:

Iva

Dvořáková

Digitálně podepsal

Iva Dvořáková

Datum: 2024.11.01

10:27:04 +01'00'

Iva Dvořáková
jednatelka firmy

za objednatele:

Mgr. Vítězslav

Schrek MBA

Digitálně podepsal Mgr.

Vítězslav Schrek MBA

Datum: 2024.11.03

13:31:04 +01'00'

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA,
hejtman kraje

Cena dle SoD

25 503 990,27 Kč bez DPH

Rekapitulace víceprací a méněprací ZL

Změna č.	Název	méněpráce (bez DPH)	vícepráce (bez DPH)	Cenový dopad změny celkem (bez DPH)
ZL 1	Likvidace skládky komunálního odpadu	-414 162,45	3 699 521,10	3 285 358,65
ZL 2	Sanace podloží komunikace a parkovišť	-953 556,97	4 984 120,68	4 030 563,71
ZL 3	Odpčet přeložky jednotné kanalizace stoka C	-106 052,83	0,00	-106 052,83
ZL 4	Odpčet krajníku silničního	-244 494,32	0,00	-244 494,32
ZL 5	Skutečné počty svítidel a výložníků	-1 183,47	11 729,64	10 546,17
CELKEM		-1 719 450,04	8 695 371,42	6 975 921,38

Cena díla po Dodatku č.1

32 479 911,65 Kč bez DPH

Iva
Dvořáková

Digitálně podepsal
Iva Dvořáková
Datum: 2024.11.01
10:28:16 +01'00'

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

11

Kulm

Salm

Název akce: Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům, rozšíření venkovního parkoviště

STRUČNÝ POPIS:

Likvidace stavebního a komunálního odpadu z plochy parkoviště č. 1 (u UNIHOBBY)**POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:**

Po vykácení zeleně a shrnutí orniční vrstvy byl odkryt stavební a komunální odpad zde historicky uložený. Jedná se o nepředpokládaný stav, který tento změnový list dává do souladu se skutečností. Dále bylo dohodnuto, že stávající val nebude likvidován, neboť slouží jako protihluková bariera areálu nemocnice.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ:

Projektová dokumentace nepředpokládala, že se pod náletovými dřevinami nachází směsný stavební odpad (kód 17 09 04) a komunální odpad. Val měl být zlikvidován.

NOVÉ ŘEŠENÍ:

Odhalený odpad bude převezen na meziskládku, zde roztríděn, budou separovány jednotlivé druhy odpadů a ty pak zlikvidovány na příslušných skládkách. Skutečný poměr jednotlivých odpadů bude doložen vážními listky. Val zůstane na místě.

DOPAD DO CENY:

Vícepráce: + 3.699 521,10 Kč bez DPH
Méněpráce: - 414 162,45 Kč bez DPH
Suma: +3.285 358,65 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH:

- Příloha č. 1 – Položkové rozpočty změn
- Příloha č. 2 – Fotodokumentace
- Příloha č. 3 – Vážní listky

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení stavby.

Datum:

30.10.2024

Jméno:

SOCHOR DAVID

Podpis:

VYJÁDRĚNÍ AD PROJEKTANTA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

30/10 2024

Jméno:

KREJČÍ JAROSLAV

Podpis:

SOUHLAS OBJEDNATELE:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

30.10.2024

Jméno:

KALINA JKV

Podpis:

KONTROLA TDS:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

30.10.2024

Jméno:

HAVLÍČEK
OLDOŠ ČM

Podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následně a geriatrické péče a parkovací
dům – rozšíření venkovního parkoviště

Objekt:

D2.01 - Zpevněné plochy - Likvidace skládky komunálního odpadu - PŘÍPOČET

Místo:

Jihlava

Datum:

12.08.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 699 521,10	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 699 521,10	
D	1		Zemní práce				140 967,00	
1	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	939,780	150,00	140 967,00	položka ze smluvního rozpočtu
Ověřeno PSC			http://www.mps.cz/portal/1/160_1018_162751116.pdf					
Mě:			Převezení na třídící středisko					
Mě:			496.88+442.90					
					939,780			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 558 554,10	
D	99		Přesuny hmot a suti				3 558 554,10	
3	K	997006002	Strojové třídění stavebního odpadu	t	1 785,580	175,00	312 476,50	CS ÚRS 2024 02
4	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	446,400	462,00	206 236,80	CS ÚRS 2024 02
5	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 785,580	300,00	535 674,00	položka ze smluvního rozpočtu
Ověřeno PSC			http://www.mps.cz/portal/1/160_1018_997221612.pdf					
6	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu	t	19,580	2 460,00	48 166,80	CS ÚRS 2024 02
Mě:			Skutečné množství 1.1%					
					19,580			
7	K	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1 228,000	2 000,00	2 456 000,00	položka ze smluvního rozpočtu
Ověřeno PSC			http://www.mps.cz/portal/1/160_1018_469973116.pdf					
Mě:			Skutečné množství 68.8%					
					1 228,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následně a geriatrické péče a parkovací
dům – rozšíření venkovního parkoviště

Objekt:

D2.01 - Zpevněné plochy - Likvidace skládky komunálního odpadu - ODPOČET

Místo:

Jihlava

Datum:

12.08.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-414 162,45	
D HSV Práce a dodávky HSV							-414 162,45	
D 1 Zemní práce							-414 162,45	
2	K	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-1 251,750	65,00	-81 363,75	položka ze smluvního rozpočtu
Online PSC NA Vý Viz geodetické zaměření hromady -1251,75				-1 251,750				
6	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-1 251,750	150,00	-187 762,50	položka ze smluvního rozpočtu
Online PSC NA Vý Viz geodetické zaměření hromady -1251,75				-1 251,750				
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-3 625,905	40,00	-145 036,20	položka ze smluvního rozpočtu
Online PSC NA Vý Vý Skutečné množství komunálního odpadu Skutečné množství stavebního směsného odpadu 17 09 04 Geodetické zaměření hromady				-19,580 -1 228,000 -2 378,325				







Příjemka - Průběžná evidence odpadů

přijímaných do zařízení pro nakládání s odpady způsobem R12a,
R12e, R5d, D13

Číslo zápisu:

Příjemce odpadu / provozovatel zařízení	ARDES s.r.o. Pávovská 62, 586 01 Jihlava	IČ: IČZ:	27739911 CZJ00738
Původce odpadu:	ARDES stavební s.r.o. Pávovská 62, 586 01 Jihlava	IČ:	19966288
Období:	8/2024	IČZ:	
Stavba:	Nemocnice Jihlava - parkoviště	ORP:	

Kód způsobu nakládání s odpadem:	B00	Kategorie odpadu:	O
----------------------------------	-----	-------------------	---

Název druhu odpadu a katalogové číslo											
Datum převzetí odpadu do zařízení	Beton	Beton +50 cm nebo příměsí	Cihly	Tašky a keramické výrobky	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výr. neuv. pod č. 170106	Asfaltové směsi neuv. pod číslem 170301	Asfaltové směsi +50 cm nebo příměsí neuv. pod číslem 170301	Zemina a kamení neuv. pod číslem 170503	Stavební materiály na bázi sádry neuv. pod č. 170801	Směsné stavební a demoliční odpady neuv. pod č. 170901, 170902 a 170903	Zemina a kameny
	17 01 01	17 01 01	17 01 02	17 01 03	17 01 07	17 03 02	17 03 02	17 05 04	17 08 02	17 09 04	20 02 02
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.								608			
9.								724			
10.											
11.											
12.								517		251	
13.								637		193	
14.								597		61	
15.								566		107	
16.								614		88	
17.											
18.											
19.								680			
20.								768		105	
21.								422		90	
22.										117	
23.										207	
24.											
25.											
26.								619		49	
27.								81		18	
28.								77			
29.											
30.								194		35	
31.											
Celkem/t	0	0	0	0	0	0	0	7104	0	1321	0



Příjemka - Průběžná evidence odpadů

přijímaných do zařízení pro nakládání s odpady způsobem R12a,
R12e, R5d, D13

Číslo zápisu:

Příjemce odpadu / ARDES s.r.o.		IČ: 27739911	
provozovatel zařízení Pávovská 62, 586 01 Jihlava		IČZ: CZJ00738	
Původce odpadu: ARDES stavební s.r.o.		IČ: 19966288	
Pávovská 62, 586 01 Jihlava		IČZ:	
Období: 9/2024		IČZ:	
Stavba: Nemocnice Jihlava - parkoviště		ORP:	

Kód způsobu nakládání s odpadem: B00	Kategorie odpadu: O
--------------------------------------	---------------------

Název druhu odpadu a katalogové číslo											
Datum převzetí odpadu do zařízení	Beton	Beton +50 cm nebo příměsí	Cihly	Tašky a keramické výrobky	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výr. neuved. pod č. 170106	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301	Asfaltové směsi +50 cm nebo příměsí neuvedené pod číslem 170301	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503	Stavební materiály na bázi sádry neuved. pod č. 170801	Směsné stavební a demoliční odpady neuved. pod č. 170901, 170902 a 170903	Zemina a kameny
	17 01 01	17 01 01	17 01 02	17 01 03	17 01 07	17 03 02	17 03 02	17 05 04	17 08 02	17 09 04	20 02 02
1.											
2.								640		133	
3.								342		209	
4.								681		141	
5.								488		139	
6.											
7.											
8.											
9.											
10.										173	
11.								65		168	
12.											
13.											
14.											
15.											
16.											
17.								715		88	
18.								662		63	
19.											
20.											
21.											
22.											
23.											
24.											
25.											
26.											
27.											
28.											
29.											
30.											
31.											
Celkem/t	0	0	0	0	0	0	0	3593	0	1114	0

Odběratel IČZ: CZJ00060
Příjemka č. S24-08595

Dodavatel IČP: 6105

zařízení / příjemce: SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. IČO: 60727772
plátce: ARDES s.r.o. IČO/RČ: 27739911
původce / odesílatel: ARDES s.r.o., Pávovská 5691/62, 58601 Jihlava
dopravce: ARDES s.r.o., Pávovská 5691/62, 58601 Jihlava

Henčov 62 58603 Jihlava 3
Pávovská 5691/62 58601 Jihlava


objednávka: VO200181124 zakázka:
RZ vozu: 6J6 2459
datum a čas: 05.09.2024 12:21:57 05.09.2024 12:30:07
hmotnost (příjezd/odjezd/náklad): 35360 / 15780 / 19580
fakturováno podle ceníku

sazba DPH	základ pro DPH	DPH
bez DPH:	24 475,00 Kč	
snížená:	0,00 Kč	0,00 Kč
základní:	23 202,30 Kč	4 872,48 Kč
k úhradě:		52 549,78 Kč

odpady příjemky:	kg	množství	jedn. cena	sazba DPH	zákl. cena	celkem bez DPH*
10 Směsný komunální odpad	O	19,58 t	1 040,00 Kč	21 %	20 363,20 Kč	47 677,30 Kč
Katalog. číslo 200301 Typ PO*: VO				PO*:	24 475,00 Kč	FR*: 2 839,10 Kč

*) Základ DPH tvoří pouze základní cena a finanční rezerva bez poplatků.

Základní poplatek (PO), rizikový poplatek (PN) a fin. rezerva (FR) podle § 45-§52 zákona č.185/2001 Sb.



Odpad převzal: _____

Odpad předal: _____

Název akce: Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům, rozšíření venkovního parkoviště

STRUČNÝ POPIS:

Sanace podloží pod konstrukčními vrstvami

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Z důvodu předem nepředvídatelného skutečného stavu únosnosti pláňe na navážce byly provedeny statické zatěžovací zkoušky nezávislou akreditovanou laboratoří. Zkoušky byly provedeny na pláni, kde nebyla prokázána dostatečná únosnost podloží požadovaná projektem, tedy 45 MPa. Byly provedeny opakované zkoušky na sanované vrstvě štěrku 0-125 výšky cca 50 cm, při této mocnosti vycházely zkoušky cca 51 MPa – viz. přiložené protokoly.

Předem nepředvídatelná neúnosnost pláňe bude v souladu s projektem sanována, řešení z projektu – výměna za zeminu bude nahrazeno štěrku 0-125 v celé ploše obou parkoviště a komunikace.

Dále z důvodu předem nepředvídatelného skutečného stavu zeminy ve vrstvě odkopávek pro sanační vrstvu, bude nutné část zeminy zlikvidovat jako Směsný stavební odpad (kód 17 09 04) vč. příslušného poplatku.

DOPAD DO CENY:	Méněpráce: - 953 556,97 Kč bez DPH
	Vícepráce: + 4.984 120,68 Kč bez DPH
	Suma: +4.030 563,71 Kč bez DPH


SEZNAM PŘÍLOH:

- Příloha č. 1 – Položkové rozpočty změn
- Příloha č. 2 – Protokoly ze statických zatěžovacích zkoušek
- Příloha č. 3 – Vážní listky


VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení stavby.

Datum: 30.10.2024	Jméno: SOEMER DAVID	Podpis: 
-------------------	---------------------	---

VYJÁDRĚNÍ AD PROJEKTANTA: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum: 30/10 2024	Jméno: KRÉJČÍ JAROSLAV	Podpis: 
-------------------	------------------------	---

SOUHLAS OBJEDNATELE: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum: 30.10.2024	Jméno: KALINA JAN	Podpis: 
-------------------	-------------------	---

KONTROLA TDI: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum: 30.10.2024	Jméno: HAVLÍČEK OLDŘICH	Podpis: 
-------------------	-------------------------	---

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následně a geriatrické péče a parkovací dum
- rozšíření venkovního parkoviště

Objekt:

D2.01 - Zpevněné plochy - Sanace podloží komunikace a parkovišť - PŘÍPOČET

Místo:

Jihlava

Datum:

15.08.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 984 120,68

D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 984 120,68	
D		1	Zemní práce				2 569 972,30	
1	M	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	5 029,300	511,00	2 569 972,30	CS ÚRS 2024 02
W		asfaltová vozovka a vozovka z betonové dlažby tl.80 mm						
W		(2875+2419)*0,5			2 647,000			
W		2647*1,9 'Přepočtené koeficientem množství			5 029,300			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 414 148,38	
D		99	Přesuny hmot a suti				2 414 148,38	
2	K	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1 207,074	2 000,00	2 414 148,38	položka ze smluvního rozpočtu
Online PČO		https://sebidniportal.mps.cz/CS/135/2024/01/469973116						
W		celkové odkopávky bez zaměřené skládky, deponie						
W		8173,66-1251,75-442,9-496,88			5 982,130			
W		5982,13*1,9 'Přepočtené koeficientem množství			11 366,047			
W		Skutečné množství 10,62%						
W		11366,047*0,1062			1 207,074			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následně a geriatrické péče a parkovací dům
– rozšíření venkovního parkoviště

Objekt: D2.01 - Zpevněné plochy - Sanace podloží komunikace a parkovišť - ODPOČET

Místo: Jihlava Datum: 15.08.2024
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: Dvořáková - stavební firma s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-953 556,97	
D HSV Práce a dodávky HSV							-953 556,97	
D 1 Zemní práce							-953 556,97	
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-1 207,074	40,00	-48 282,97	položka ze smluvního rozpočtu
Online PČC			Pracovní množství: 11366,047*0,1062 = 1206,606 m³					
WV			Skutečné množství směsného stavebního odpadu 10,62%					
WV			11366,047*0,1062					
					-1 207,074			
11	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	-5 029,300	180,00	-905 274,00	položka ze smluvního rozpočtu
WV			asfaltová vozovka a vozovka z betonové dlažby tl.80 mm					
WV			-(2875+2419)*0,5					
WV			-2647*1,9 *Přepočtené koeficientem množství					
					-2 647,000			
					-5 029,300			

PROTOKOL Č. DB24-557
Statická zatěžovací zkouška podle ČSN 72 1006 - příloha A

list 1/1

Zkoušeno dne : **02.08.24**

Stavba : **NEMOCNICE JIHLAVA PARKOVIŠTĚ Č.1**

Zkoušený materiál : **šterkodrt'**

Místo zkoušky : **PARKOVIŠTĚ zhutněná pláň SANACE ŠD BOD Č.1**


Podmínky zkoušky

Zatěžovací deska D mm : **300**

Teploty: vzduch **23 °C**

podklad **20 °C**

Zkouška

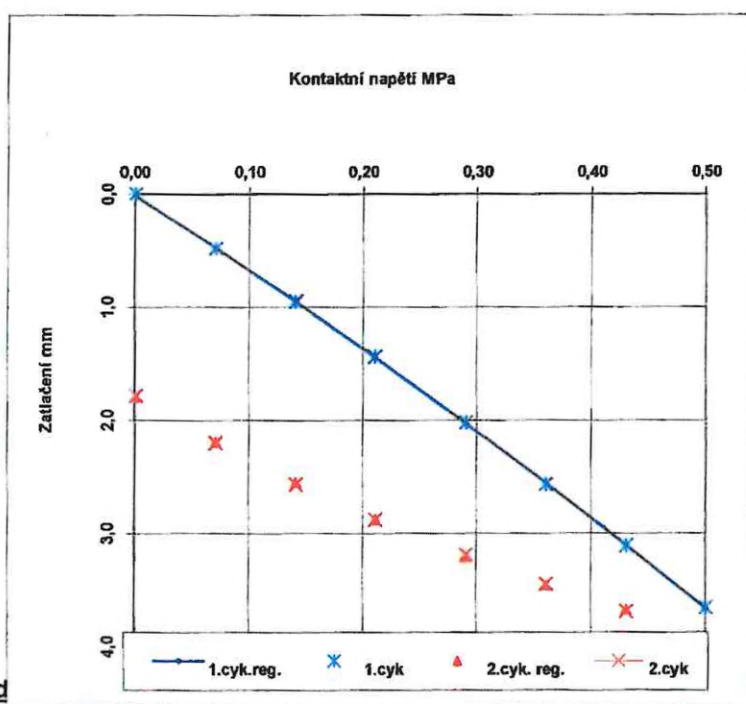

Výsledek

	požadované	stanovené
E_{def1}		30,8
E_{def2}	min. 45	51,4
E_{def2} / E_{def1}	max. 2,5	1,67

Požadavky jsou dány projektem.

Hodnoty regresního výpočtu	1. cyklus	2. cyklus
Konstanta	a_0 0,017	1,793
Koeficienty	a_1 6,437	5,924
	a_2 1,726	-3,590

Údaje o zkoušce

Objednatel zkoušky:

DVOŘÁKOVÁ - STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.

Zkoušel : **BELINA D.**

Schválil : **ing.BELINA D.**

Protokol uzavřen : **02.08.24**

Protokol může být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře
Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty

ZKUSÉBNÍ LABORATOŘ DB

Ing. Darius Belina

Král. vršek 56, 586 01 Jihlava

IČ: 47832851 DIČ: CZ5903012555

Mail: dbelina@seznam.cz

Tel.: 567 211 408 Mobil: 702 074 717

PROTOKOL Č. DB24-558
Statická zatěžovací zkouška podle ČSN 72 1006 - příloha A

list 1/1

Zkoušeno dne : **02.08.24**

Stavba : **NEMOCNICE JIHLAVA PARKOVIŠTĚ Č.1**

Zkoušený materiál : **hlínitopísčitá zemina**

Místo zkoušky : **PARKOVIŠTĚ zhutněná původní pláň BOD Č.2**


Podmínky zkoušky

Zatěžovací deska D mm : **300**

Teploty: vzduch **23 °C**

podklad **20 °C**

Zkouška

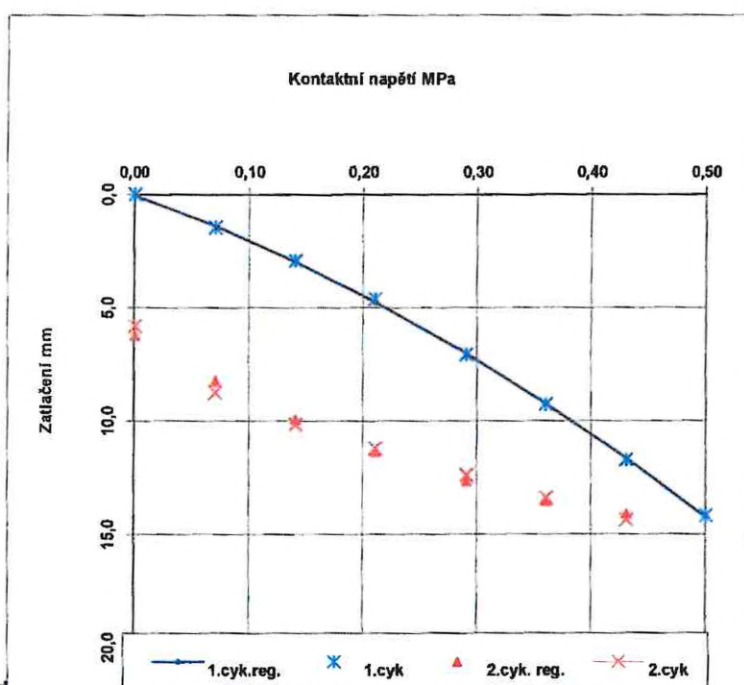

Výsled

Hodnoty (MPa)

požadované stanovené

E_{def1} **7,9**

E_{def2} **min. 45** **12,3**

E_{def2} / E_{def1} **max. 2,5** **1,55**

Požadavky jsou dány projektem.

Hodnoty regresního výpočtu	1.cykus	2.cykus
Konstanta	a_0 0,032	6,226
Koeficienty	a_1 18,120	30,329
	a_2 20,689	-27,842

Údaje o zkoušce

Objednatel zkoušky: **DVOŘÁKOVÁ - STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.**

Zkoušel : **BELINA D.**

Schválil : **ing.BELINA D.**

Protokol uzavřen : **02.08.24**

Protokol může být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře
Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ DB

Ing. Darius Belina

Král. vršek 56, 586 01 Jihlava

IČ: 47832851 DIČ: CZ5903012555

Mail: dbelina@seznam.cz

Tel.: 567 211 408 Mobil: 702 074 717



Příjemka - Průběžná evidence odpadů

přijímaných do zařízení pro nakládání s odpady způsobem R12a,
R12e, R5d, D13

Číslo zápisu:

Příjemce odpadu / provozovatel zařízení	ARDES s.r.o Pávovská 62, 586 01 Jihlava	IČ:	27739911
		IČZ:	CZJ00738
Původce odpadu:	ARDES stavební s.r.o. Pávovská 62, 586 01 Jihlava	IČ:	19966288
Období:	8/2024	IČZ:	
Stavba:	Nemocnice Jihlava - parkoviště	ORP:	

Kód způsobu nakládání s odpadem: B00	Kategorie odpadu: O
--------------------------------------	---------------------

Datum převzetí odpadu do zařízení	Název druhu odpadu a katalogové číslo										
	Beton	Beton +50 cm nebo příměsí	Cihly	Tašky a keramické výrobky	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výr. neuved. pod č. 170106	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301	Asfaltové směsi +50 cm nebo příměsí neuvedené pod číslem 170301	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503	Stavební materiály na bázi sádky neuved. pod č. 170801	Směsné stavební a demoliční odpady neuved. pod č. 170901, 170902 a 170903	Zemina a kameny
	17 01 01	17 01 01	17 01 02	17 01 03	17 01 07	17 03 02	17 03 02	17 05 04	17 08 02	17 09 04	20 02 02
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.								608			
9.								724			
10.											
11.											
12.								517		251	
13.								637		193	
14.								597		61	
15.								566		107	
16.								614		88	
17.											
18.											
19.								680			
20.								768		105	
21.								422		90	
22.										117	
23.										207	
24.											
25.											
26.								619		49	
27.								81		18	
28.								77			
29.											
30.								194		35	
31.											
Celkem/t	0	0	0	0	0	0	0	7104	0	1321	0



Příjemka - Průběžná evidence odpadů

přijímaných do zařízení pro nakládání s odpady způsobem R12a,
R12e, R5d, D13

Číslo zápisu:

Příjemce odpadu / ARDES s.r.o.

provozovatel zařízení

Pávovská 62, 586 01 Jihlava

IČ: 27739911

IČZ: CZJ00738

Původce odpadu: ARDES stavební s.r.o.

Pávovská 62, 586 01 Jihlava

IČ: 19966288

Období: 9/2024

IČZ:

Stavba: Nemocnice Jihlava - parkoviště

ORP:

Kód způsobu nakládání s odpadem:

B00

Kategorie odpadu:

O

Název druhu odpadu a katalogové číslo

Datum převzetí odpadu do zařízení	Beton	Beton +50 cm nebo příměsí	Cihly	Tašky a keramické výrobky	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výr. neuved. pod č. 170106	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301	Asfaltové směsi +50 cm nebo příměsí neuvedené pod číslem 170301	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503	Stavební materiály na bázi sádky neuved. pod č. 170801	Směsné stavební a demoliční odpady neuved. pod č. 170901, 170902 a 170903	Zemina a kameny
	17 01 01	17 01 01	17 01 02	17 01 03	17 01 07	17 03 02	17 03 02	17 05 04	17 08 02	17 09 04	20 02 02
1.											
2.								640		133	
3.								342		209	
4.								681		141	
5.								488		139	
6.											
7.											
8.											
9.											
10.										173	
11.								65		168	
12.											
13.											
14.											
15.											
16.											
17.								715		88	
18.								662		63	
19.											
20.											
21.											
22.											
23.											
24.											
25.											
26.											
27.											
28.											
29.											
30.											
31.											
Celkem/t	0	0	0	0	0	0	0	3593	0	1114	

ARDES s.r.o.

Pávovská 62, 586 01 Jihlava

IČO: 27739911

Tel.: 603 321 666

Název akce: Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům, rozšíření venkovního parkoviště

STRUČNÝ POPIS:

Odpočet přeložky kanalizace C

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Z důvodu skutečnosti zjištěných při realizaci akce není potřeba realizovat přeložku kanalizace C, neboť podchycení odpadních vod od jídelny již bylo vyřešeno v rámci jiného projektu.

DOPAD DO CENY:

Méněpráce: - 106 052,83 Kč bez DPH

Suma: - 106 052,83 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH:

- Příloha č. 1 – Položkové rozpočty změn

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení stavby.

Datum:

30.10.2024

Jméno:

SOCHOR DAVID

Podpis:



VYJÁDŘENÍ AD PROJEKTANTA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

30.10.2024

Jméno:

KREJČÍK JAROSLAV

Podpis:



SOUHLAS OBJEDNATELE:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

30.10.2024

Jméno:

KALINA JAN

Podpis:



KONTROLA TDI:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

30.10.2024

Jméno:

HAULÍČEK
OLDŘICH

Podpis:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následně a geriatrické péče a parkovací dům – rozšíření venkovního parkoviště

Objekt:

D2.02 - Areálová kanalizace - Odpočet přeložky jednotné kanalizace stoka C

Místo:

Jihlava

Datum:

02.04.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Ukončení:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Avuk, Krejčí

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-106 052,83
D HSV Práce a dodávky HSV							-106 052,83
D 1 Zemní práce							-47 424,22
3	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-7,995	400,00	-3 198,00
Detail PSC Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ Změřeno v programu AutoCAD Zatřídění hornin: tř.3-40%, tř.4-40%, tř.5-20% Revizní šachty průměrná hloubka šachet 3,47 m 2,4*2,4*3,47*(-1)*0,4 -7,995							
6	K	131351201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	-7,995	500,00	-3 997,50
Detail PSC Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ Změřeno v programu AutoCAD Zatřídění hornin: tř.3-40%, tř.4-40%, tř.5-20% Revizní šachty průměrná hloubka šachet 3,47 m 2,4*2,4*3,47*(-1)*0,4 -7,995							
9	K	131451201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	-3,997	600,00	-2 398,20
Detail PSC Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ Změřeno v programu AutoCAD Zatřídění hornin: tř.3-40%, tř.4-40%, tř.5-20% Revizní šachty průměrná hloubka šachet 3,47 m 2,4*2,4*3,47*(-1)*0,2 -3,997							
11	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	-14,454	400,00	-5 781,60
Detail PSC Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ Změřeno v programu AutoCAD Zatřídění hornin: tř.3-40%, tř.4-40%, tř.5-20% Nová kanalizace (-7,5*1,1*4,38)*0,4 -14,454							
12	K	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	-14,454	400,00	-5 781,60
Detail PSC Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ Změřeno v programu AutoCAD Zatřídění hornin: tř.3-40%, tř.4-40%, tř.5-20% Nová kanalizace							

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(-7,5*1,1*4,38)*0,4		-14,454		
13	K	132454206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3	m3	-7,227	500,00	-3 613,50
			Online PSD Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ Změřeno v programu AutoCAD Zatřídění hornin: tř.3-40%, tř.4-40%, tř.5-20% Nová kanalizace (-7,5*1,1*4,38)*0,2		-7,227		
16	K	151101103	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	-53,870	10,00	-538,70
			Online PSD Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ Změřeno v programu AutoCAD Nová kanalizace -7,5*2*4,59		-53,870		
19	K	151101113	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	-53,870	5,00	-269,35
20	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-33,312	10,00	-333,12
			Online PSD Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ Změřeno v programu AutoCAD Revizní šachty průměrná hloubka šachet 3,47 m (2,4+2,4)*2*3,47*(-1)		-33,312		
21	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	-33,312	5,00	-166,56
22	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-18,299	65,00	-1 189,44
			Online PSD Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ Pro zpětný zásyp -45,746*0,4		-18,299		
23	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	-27,448	65,00	-1 784,12
			Online PSD Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ Pro zpětný zásyp -45,746*0,6		-27,448		
24	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-1,675	150,00	-251,25
			Online PSD Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ (-7,995)+(-14,454) -(-18,299)-(-4,95*0,4)-(-1,238*0,4)		-22,449 20,774		
25	K	162751136	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	-2,513	150,00	-376,95
			Online PSD Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ (-7,995)+(-3,997)+(-14,454)+(-7,227) -(-27,448)-(-4,95*0,6)-(-1,238*0,6)		-33,673 31,160		
27	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-18,299	40,00	-731,96
			Online PSD Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ Pro zpětný zásyp -45,746*0,4		-18,299		
28	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	-27,448	40,00	-1 097,92
			Online PSD Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ Pro zpětný zásyp -45,746*0,6		-27,448		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-8,209	40,00	-328,36
	Online PSC		Průběh projektování - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ				
	VW		"pol. 162751116:" (-1,675)*1,9		-3,183		
	VW		"pol. 162751136:" (-2,513)*2,0		-5,026		
30	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-45,746	21,40	-978,96
	Online PSC		Průběh projektování - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ				
	VW		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ				
	VW		Pro zpětný zásyp				
	VW		-45,746		-45,746		
31	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-45,746	200,00	-9 149,20
	Online PSC		Průběh projektování - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ				
	VW		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ				
	VW		Změřeno v programu AutoCAD				
	VW		Nová kanalizace				
	VW		-7,5*1,1*4,38		-36,135		
	VW		"Odpočet obsypů a podsypů:" (-4,95)*(-1,238)		6,188		
	VW		Revizní šachty				
	VW		2,4*2,4*3,47*(-1)		-19,987		
	VW		"odpočet šachet:" -0,62*0,62*3,14*3,47*(-1)		4,188		
32	K	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	-4,950	210,00	-1 039,50
	Online PSC		Průběh projektování - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ				
	VW		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ				
	VW		se zhutněním				
	VW		-7,5*1,1*0,6		-4,950		
33	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	-9,405	325,00	-3 056,63
	VW		-4,95*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		-9,405		
35	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	-1,238	1 100,00	-1 361,80
	Online PSC		Průběh projektování - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ				
	VW		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ				
	VW		se zhutněním				
	VW		frakce 0-8 mm				
	VW		-7,5*1,1*0,15		-1,238		
	D 8		Trubní vedení				-57 716,47
48	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	-7,500	193,00	-1 447,50
	Online PSC		Průběh projektování - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ				
49	M	28614214	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 315x3000mm SN10	m	-7,875	1 046,76	-8 243,24
	VW		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ				
	VW		Včetně tvarovek				
	VW		-7,5		-7,500		
	VW		-7,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		-7,875		
60	K	877370330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	-1,000	485,00	-485,00
	Online PSC		Průběh projektování - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ				
61	M	28612253	vložka šachtová kanalizační DN 315	kus	-1,000	760,24	-760,24
	VW		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ				
	VW		-1		-1,000		
67	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	-1,000	12 000,00	-12 000,00
	Online PSC		Průběh projektování - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ				
	VW		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ				
	VW		"RŠC-1:" -1		-1,000		
68	M	59224063	dno betonové šachtové DN 1000 100x100x15cm výtok 25-40cm	kus	-1,000	16 877,00	-16 877,00
	VW		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ				
	VW		včetně integrované šachtové vložky nebo gumového				
	VW		"RŠC-1:" -1		-1,000		
70	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	-1,000	1 894,55	-1 894,55
	VW		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ				
	VW		"RŠC-1:" -1		-1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	-1,000	1 096,90	-1 096,90
			Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ				
			"RŠC-1:" -1		-1,000		
74	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	-2,000	2 641,52	-5 283,04
			Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ				
			"RŠC-1:" -2		-2,000		
78	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	-4,000	193,08	-772,32
			Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ				
			"RŠC-1:" -4		-4,000		
85	K	899000_R	Kamerová zkouška, ověření ovality	m	-7,500	100,00	-750,00
			Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ				
			Změřeno v programu AutoCAD				
			-7,5		-7,500		
89	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	-1,000	1 100,00	-1 100,00
			Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ				
			Změřeno v programu AutoCAD				
			-1		-1,000		
91	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	-1,000	3 150,00	-3 150,00
			Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ				
			"RŠC-1:" -1		-1,000		
92	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	-1,000	3 856,68	-3 856,68
D	99		Přesun hmot				-912,14
109	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-19,003	48,00	-912,14

Název akce: Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům, rozšíření venkovního parkoviště

STRUČNÝ POPIS:**Odpočet krajníku silničního****POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:**

Projektantem zpracovaná dokumentace ve své textové části připouští variantní řešení nevyužití krajníku silničního u silniční obruby. Z tohoto důvodu bylo na KD odsouhlaseno jejich vypuštění a tedy i odečtení z rozpočtu.

DOPAD DO CENY:

Méněpráce: - 244 494,32 Kč bez DPH
Suma: - 244 494,32 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH:

- Příloha č. 1 – Položkové rozpočty změn

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení stavby.

Datum:

30.10.2024

Jméno:

SOCHOR DAVID

Podpis:

**VYJÁDRĚNÍ AD PROJEKTANTA:**

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

30/10 2024

Jméno:

KREJČÍ VIKTOR

Podpis:

**SOUHLAS OBJEDNATELE:**

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM


Datum:

30.10.2024

Jméno:

KALINA JAN

Podpis:

**KONTROLA TDI:**

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

30.10.2024

Jméno:

HAUŠÍČEK
OLDŘICH

Podpis:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následně a geriatrické péče a parkovací
dům – rozšíření veškovského parkoviště

Objekt: D2.01 - Zpevněné plochy - Odpočet krajníku silničního

Místo: JihlavaDatum: 15.08.2024

Zadavatel: Kraj VysočinaProjektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Dvořáková - stavební firma s.r.o.Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-244 494,32	
D HSV Práce a dodávky HSV							-244 494,32	
D 1 Zemní práce							-244 494,32	
94	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	-948,000	120,00	-113 760,00	CS ÚRS 2024 01
Cena B21								
95	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	-957,480	136,54	-130 734,32	CS ÚRS 2024 01
Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ								
					948,0		-948,000	
					948*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		-957,480	

**Název akce: Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační,
následné a geriatrické péče a parkovací dům, rozšíření
venkovního parkoviště**

STRUČNÝ POPIS:**Skutečné počty svítidel a výložníků****POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:**

V průběhu výstavby byl dospecifikován počet svítidel, výložníků jednoramenných a výložníků dvouramenných dle skutečného rozmístění. Podle toho jsou upraveny jednotlivé počty položek výkazu výměr.

DOPAD DO CENY:

Méněpráce: - 1 183,47 Kč bez DPH
Vícepráce: + 11 729,64 Kč bez DPH
Suma: + 10 546,17 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH:

- Příloha č. 1 – Položkové rozpočty změn
- Příloha č. 2 – Vysvětlení projektanta

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

**Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu
dokončení stavby.**

Datum: 30.10.2024

Jméno: SOCHOR DAVID

Podpis:

VYJÁDRĚNÍ AD PROJEKTANTA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum: 30/10 2024

Jméno: KREJČÍ VITOLAN

Podpis:

SOUHLAS OBJEDNATELE:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno: KALINA JAN

Podpis:

KONTROLA TDI:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum: 30.10.2024

Jméno: HAVLÍČEK
OLDŘICH

Podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací
dům – rozšíření venkovního parkoviště

Objekt: D2.07 - Venkovní osvětlení - SKUTEČNÉ POČTY - ODPOČET

Místo:	Jihlava	Datum:	16.10.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Dvořáková - stavební firma s.r.o.	Zpracovatel:	0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 183,47	
D D2.07 Venkovní osvětlení							-1 183,47	
D ELM Elektromontáže							-1 183,47	
33	M	10.036.097	Výložník přímý jednoramenný, vyložení W=750mm, výška L=200mm, na složár D=60mm, osazovací průměr 60mm, oboustranné žárově zinkovaný	kus	-1,000	915,67	-915,67	
Σ					-1	-1,000		
34	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	-1,000	267,80	-267,80	CS ÚRS 2024 01
Obrázek 330								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následně a geriatrické péče a parkovací dům - rozšíření venkovního parkoviště

Objekt: D2.07 - Venkovní osvětlení - SKUTEČNÉ POČTY - PŘÍPOČET

Místo: Jihlava Datum: 16.10.2024
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: Dvořáková - stavební firma s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 729,64	
D D2.07 Venkovní osvětlení							11 729,64	
D ELM Elektromontáže							11 729,64	
10	M	S50EXSD3	Uliční svítidlo "B" (bližší popis viz TP)	ks	1,000	9 650,07	9 650,07	
1					1,000			
11	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	1,000	267,80	267,80	CS ÚRS 2024 01
1					1,000			
35	M	10.045.550	Výložník přímý dvouramenný, 180°, vyložení W=750mm, výška L=200mm, na stožár D=60mm, osazovací průměr 60mm, oboustranně žárově zinkovaný	kus	1,000	1 482,17	1 482,17	
1					1,000			
36	K	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	1,000	329,60	329,60	CS ÚRS 2024 01
1					1,000			

David Sochor

Od: Jarda Krejčí <j.krejci@penta.ji.cz>
Odesláno: úterý 15. října 2024 7:10
Komu: filipa@nemji.cz; 'Ing. David Sochor'; kalina.j@kr-vysocina.cz; 'Oldřich Havlíček'
Předmět: Parkoviště nemocnice Jihlava

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Dobrý den,

Při kontrole počtu stožárů a svítidel VO v odevzdaném výkazu výměr (VV) jsem přišel na tuto chybu:

Ve VV je **5ks dvouramenných výložníků**, ve skutečnosti je jich **6ks**,
Naopak ve VV je **19ks jednoramenných výložníků** a ve skutečnosti je jich 18ks.
Dále je ve VV **29ks svítidel VO** (19+2x5) a ve skutečnosti je jich **30ks** (18+2x6ks)

Z toho plyne, že chybí:
1ks dvojramenného výložníku
1ks svítidla VO „B“

Naopak přebývá:
1ks jednoramenného výložníku

S pozdravem

Ing. Petr Zacha
projektant elektro

+420 567 312 451 | p.zacha@penta.ji.cz | www.pentaprojekt.cz

PENTA PROJEKT s.r.o.
Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

