

Příloha č. 1

Změnový list č. 1 ze dne: 29. 10. 2024

Název stavby:	NPO KŘP Kvk 17. listopadu 2673/32a, 350 02 Cheb
Číslo smluvního vztahu:	č. j. KRPK-97903-34/ČJ-2023-1900VZ
Název části stavby (PS, SO):	Změna termínu předání díla
Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje Zastoupený: [REDACTED] ředitel krajského ředitelství Sídlo: Karlovy Vary, Dvory, Závodní 386/100, PSČ 36006 IČO: 72051612 Bankovní číslo účtu: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] ID datové schránky: upshp5u	Zhotovitel: ColorMax s.r.o. Zastoupený: [REDACTED] Sídlo: Kasární náměstí 115/7, 350 02 Cheb IČO: 280 42 484 DIČ: CZ28042484 Bankovní číslo účtu: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] ID datové schránky: fxfv9zy Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22486
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Původní termín dokončení díla: 23. 12. 2024	
<u>Nové řešení:</u> Nový termín dokončení díla: 24. 3. 2025	

Zdůvodnění změny:

Při realizaci díla – výměny střešního pláště budovy - bylo zjištěno poškození dřevěného krovu střechy hnilobou. Poškozené krovy musely být demontovány a nahrazeny novými krovy a tím došlo k časovému posunu realizace dalších navazujících prací. Z toho důvodu žádám o prodloužení termínu dokončení díla o 3 měsíce, a to do 24. 3. 2025.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	19.844.001,98 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	0 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	23.12.2024
Nový termín dokončení díla:	24. 3. 2025

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 29.10.2024



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 29.10.2024



Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 29.10.2024


Podpis:



Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

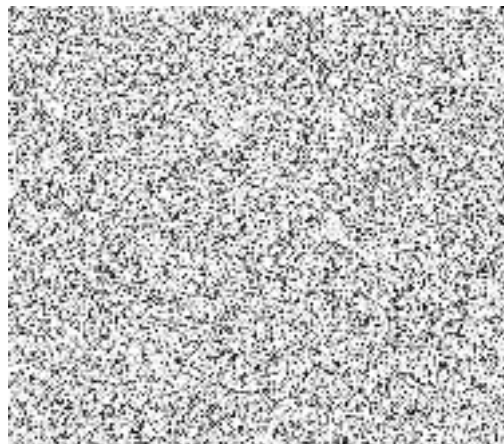

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: Není

Výpočet
