

DODATEK č. 7 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2747/2020/PAL**

ISPROFIN/ISPROFOND: **5213510018**

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem Praha 9 – Prosek, Žitenická 871/1, 190 00

IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 14336

zastoupená **Ing. Radkem Mrázkem, MBA**, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Trutnov – Střední Předměstí, Vodní 177, 541 01

číslo smlouvy Zhotovitele: **600/20/2761**

(dále jen „**zhotovitel**“)
společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20.7.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“ ve znění jejích dodatků č. 1-6 s účinností Smlouvy ke dni 27.7.2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky :

původní cena Díla 214 695 732,95 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě: 238 167 666,95 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě: 240 678 993,61 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 ke Smlouvě: 257 155 377,33 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 ke Smlouvě: 272 061 113,46 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 ke Smlouvě 284 305 115,18 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 ke Smlouvě 288 396 250,50 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 7 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **21.664.893,47 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla je v souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2023. Smluvní strany se dohodly na změně Smluvní ceny Díla z důvodu schválení valorizace Určením Správce stavby k předloženému Vyúčtování v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2023 ze dne 28.3. 2024. Úprava Smluvní ceny Díla je stanovena ke dni podpisu tohoto Dodatku.

Dalším důvodem je schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 14 v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, blíže specifikovaného ZL a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Smluvní ceny Díla.

Zároveň dochází k deklaratorní úpravě Doby pro dokončení v souvislosti s Určením správce stavby č. 4 ze dne 9.12.2022 a Určením správce stavby č. 6 ze dne 14.12.2023.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je 9,37 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 20 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 14 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 14 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 14 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 14 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 14 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 14 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 5 ZZV dle Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH +

c) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 14 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 14 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 14 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 6 ZZV dle Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 7:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila 214 695 732,95 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 bez DPH činila 288 396 250,50 Kč

Změna nákladů dle ZL č. 14 bez DPH + 2 642 966,92 Kč

Vyúčtování v důsledku změn nákladů +19 021 926,55 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 7 bez DPH činí 310 061 143,97 Kč

2) Článek 20 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 20 uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla dle Dopisu nabídky – ve znění Dodatku č. 7

Příloha č. 2 Oprávněné osoby

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - ve znění Dodatku č. 7

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 7, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, toto znění je zároveň nedílnou přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**
příloha č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy): **Harmonogram postupu prací**

Za Objednatele:

V Praze



28.10.2024 13:43
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.03
09:48:10 +02'00'

Ing. Radek Mrázek, MBA
Místopředseda představenstva
BAK stavební společnost a.s.

příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace cen dle Dopisu nabídky

[illegible]

příloha č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy): Harmonogram postupu prací

ID		Název úkolu	Dokončeno %	Zahájení podle směrného plánu	Dokončení podle směrného plánu	Zahájení podle směrného plánu	Dokončení podle směrného plánu	Doba trvání	2021 2022 2023 2024			
43	✓	Orientační systém	100%	19.1. 22	15.2. 22	5.12. 22	21.2. 24	28 dny?				
44	✓	Výtah	100%	2.2. 22	22.2. 22	2.2. 22	22.2. 22	21 dny?				
45	✓	Revize, atesty, zkoušky	100%	16.2. 22	1.3. 22	16.1. 23	30.6. 24	14 dny?				
46												
47	✓	Rekonstrukce objektu VB_ fáze 2 - WC pro veřejnost	100%	6.9. 21	10.1. 22	6.9. 21	10.1. 22	127 dny?				
48	✓	Hrubé rozvody	100%	6.9. 21	7.11. 21	6.9. 21	7.11. 21	63 dny?				
57	✓	Stěrkový podsyp_ 1.NP	100%	6.9. 21	22.10. 21	6.9. 21	22.10. 21	47 dny?				
58	✓	Desky HDPE	100%	6.9. 21	22.10. 21	6.9. 21	22.10. 21	47 dny?				
59	✓	Podkladní betony_ 1.NP	100%	6.9. 21	22.10. 21	6.9. 21	22.10. 21	47 dny?				
60	✓	Hydroizolace _ modifikovaný a sátlotový pás_ 1.NP	100%	8.9. 21	24.10. 21	8.9. 21	24.10. 21	47 dny?				
61	✓	Výplně otvorů vnější _ okna	100%	7.9. 21	23.10. 21	7.9. 21	23.10. 21	47 dny?				
62	✓	Omítky vnitřní	100%	15.9. 21	31.10. 21	15.9. 21	31.10. 21	47 dny?				
63	✓	Utý cementový potěr + tepelná izolace _ 1 NP_ zázemí	100%	22.9. 21	7.11. 21	22.9. 21	7.11. 21	47 dny?				
64	✓	Utý cementový potěr + tepelná izolace _ 1 NP_ hala	100%	22.9. 21	7.11. 21	22.9. 21	7.11. 21	47 dny?				
65	✓	Podhledy kazetové _ 2.NP - zázemí	100%	6.10. 21	19.12. 21	6.10. 21	19.12. 21	75 dny?				
66	✓	Keramické dlažby	100%	20.10. 21	9.1. 22	20.10. 21	9.1. 22	82 dny?				
67	✓	Malby a nátěry_ 1.NP	100%	27.10. 21	12.12. 21	27.10. 21	12.12. 21	47 dny?				
68	✓	Výplně otvorů vnitřní _ 1 NP	100%	3.11. 21	19.12. 21	3.11. 21	19.12. 21	47 dny?				
69	✓	Kompletace_ 1.N	100%	3.11. 21	19.12. 21	3.11. 21	19.12. 21	47 dny?				
70	✓	Revize, atesty, zkoušky	100%	10.11. 21	9.1. 22	10.11. 21	9.1. 22	61 dny?				
71	✓	Rekonstrukce objektu VB_ fáze 2 - WC pro veřejnost _ provedení	100%	1.12. 21	10.1. 22	1.12. 21	10.1. 22	41 dny?				
72												
73	✓	Rekonstrukce objektu VB_ fáze 3_ východ_ výpravní haly	100%	1.3. 22	31.12. 22	26.6. 22	30.6. 24	509 dny?				
74	✓	Bourací práce 1.PP	100%	1.3. 22	24.9. 22	11.1. 23	22.8. 23	223,38 dny?				
75	✓	Stěhování personálu ČD	100%	NEDEF	NEDEF	30.1. 23	30.1. 23	1 den?				
76	✓	Demontáž (ochrana) interierového vybavení, zařizovacích předmětů, výplní otvorů vnitřních	100%	1.3. 22	20.8. 22	31.1. 23	22.7. 23	173 dny?				
77	✓	Demontáž stávajících podhledů a obkladů, , podlahových krytin	100%	1.3. 22	27.8. 22	29.1. 23	27.7. 23	180 dny?				
78	✓	Odstranění znehodnocených omítek, bourání přiček	100%	15.3. 22	3.9. 22	6.2. 23	28.7. 23	173 dny?				
79	✓	Demontáž přístupných rozvodů	100%	29.3. 22	3.9. 22	16.3. 23	22.8. 23	159 dny?				
80	✓	Podlahové souvrství - odstranění	100%	1.3. 22	22.7. 22	29.1. 23	21.6. 23	144 dny				
81	✓	Demontáž výplní otvorů vnějších _ okna	100%	12.4. 22	24.9. 22	11.1. 23	5.4. 23	84,4 dny?				
82	✓	Demontáž výplní otvorů vnějších _ okna_ 1.PP	100%	12.4. 22	18.4. 22	14.3. 23	20.3. 23	7 dny?				
83	✓	Demontáž výplní otvorů vnějších _ okna_ 2.NP	100%	24.4. 22	14.5. 22	11.1. 23	25.3. 23	21 dny?				
84	✓	Demontáž výplní otvorů vnějších _ okna_ 1.NP	100%	11.9. 22	24.9. 22	1.2. 23	5.4. 23	14 dny?				
85	✓	Bourací práce střecha	100%	27.3. 22	15.5. 22	26.2. 23	16.4. 23	50 dny?				
86	✓	Odstranění souvrství střešního pláště nad 2.NP	100%	27.3. 22	23.4. 22	26.2. 23	25.3. 23	28 dny?				
87	✓	Odstranění souvrství střešního pláště nad 1.NP	100%	24.4. 22	15.5. 22	26.3. 23	16.4. 23	22 dny?				
88	✓	Souvrství střešního pláště	100%	24.4. 22	30.12. 22	26.3. 23	19.8. 23	147 dny?				
89	✓	Nové souvrství střešního pláště nad 2. NP	100%	24.4. 22	13.8. 22	26.3. 23	15.7. 23	112 dny?				
90	✓	Parozábrana	100%	24.4. 22	21.5. 22	26.3. 23	22.4. 23	28 dny?				
91	✓	Tepelná izolace	100%	22.5. 22	2.7. 22	23.4. 23	3.6. 23	42 dny?				
92	✓	Hydroizolační izolce	100%	3.7. 22	13.8. 22	4.6. 23	15.7. 23	42 dny?				

Projekt: HMG VB Beraun_MSP2
Datum: 1.12.23

Úkol
Rozdělení

Mínik
Souhrnný

Souhrn projektu
Vnější úkoly

Vnější mínik
Konkrétní termín

Průběh

ID	Název úkolu	Dokončeno %	Zahájení podle směrného plánu	Dokončení podle směrného plánu	Zahájení podle směrného plánu	Dokončení podle směrného plánu	Doba trvání	2021	2022	2023	2024
93	Nové souvrství střešního pláště nad 1.NP	100%	16.5. 22	28.6. 22	17.4. 23	28.5. 23	42 dny?				
94	Parozábrana	100%	16.5. 22	29.5. 22	17.4. 23	30.4. 23	14 dny?				
95	Termální izolace	100%	1.6. 22	14.6. 22	1.5. 23	14.5. 23	14 dny				
96	Hydroizolační folie	100%	15.6. 22	28.6. 22	15.5. 23	28.5. 23	14 dny?				
97	Hromosvod	100%	26.11. 22	30.12. 22	16.7. 23	19.8. 23	35 dny?				
98	Opláštění budovy	100%	19.4. 22	4.6. 22	11.1. 23	28.4. 23	107,43 dny?				
99	Výplně otvorů vnější -okna	100%	19.4. 22	4.6. 22	11.1. 23	28.4. 23	107,43 dny?				
100	Okna 2.NP	100%	15.5. 22	4.6. 22	1.2. 23	28.4. 23	21 dny?				
101	Okna 1.NP	100%	19.4. 22	9.5. 22	11.1. 23	25.4. 23	21 dny				
102	Fasádní kontaktní zateplovací systém _ nadstřešní část	100%	12.3. 22	7.10. 22	3.2. 23	31.8. 23	210 dny?				
103	Fasádní kontaktní zateplovací systém _ fáze 3_ sever	100%	27.8. 22	18.11. 22	21.7. 23	12.10. 23	84 dny?				
104	Fasádní kontaktní zateplovací systém _ fáze 3_ jih	100%	1.10. 22	23.12. 22	25.8. 23	16.11. 23	84 dny?				
105	Vnitřní prostory rekonstruovaných podlaží	100%	19.4. 22	5.9. 22	21.3. 23	5.8. 23	138 dny?				
106	Zadrživý okenních otvorů 1.NP	100%	19.4. 22	30.5. 22	21.3. 23	1.5. 23	42 dny?				
107	Stěrkový podsyp_ 1.NP	100%	23.7. 22	5.8. 22	22.6. 23	5.7. 23	14 dny?				
108	Desky HDPE	100%	23.7. 22	5.8. 22	22.6. 23	5.7. 23	14 dny?				
109	Podkladní betony_ 1.NP	100%	6.8. 22	19.8. 22	6.7. 23	19.7. 23	14 dny?				
110	Hydroizolace _ modifikovaný asfaltový pás_ 1.NP	100%	30.8. 22	5.9. 22	30.7. 23	5.8. 23	7 dny?				
111	Konstrukční úpravy - západ	100%	5.3. 22	30.9. 22	27.8. 22	27.7. 23	335 dny?				
112	Konstrukční úpravy nosných stěn_ 1.NP	100%	23.7. 22	12.8. 22	16.6. 23	6.7. 23	21 dny?				
113	Podchycení stropních panelů (VZT)_ 1.NP	100%	16.7. 22	29.7. 22	25.6. 23	9.7. 23	14 dny?				
114	Nosná konstrukce střešní jednotky VZT_ 3.NP	100%	5.3. 22	18.3. 22	20.2. 23	6.3. 23	14 dny?				
115	OK - Rámy pro předsazení okna haly_ 1.NP	100%	27.8. 22	9.9. 22	27.8. 22	9.9. 22	14 dny?				
116	Ocelová konstrukce vloženého patra (kavárna / terasa kavárny)	100%	10.9. 22	23.9. 22	7.7. 23	20.7. 23	14 dny?				
117	Ocelové schodiště 3	100%	17.9. 22	23.9. 22	14.7. 23	20.7. 23	7 dny?				
118	ŽB stropní deska	100%	24.9. 22	30.9. 22	21.7. 23	27.7. 23	7 dny?				
119	Základový pás prosklené i stěny vstupní haly	100%	9.7. 22	22.7. 22	8.6. 23	21.6. 23	14 dny?				
120	OK_ zajištění prosklené stěny vstupní haly _ montáž	100%	20.8. 22	2.9. 22	22.6. 23	5.7. 23	14 dny?				
121	Prosklená vstupní stěna	100%	27.8. 22	9.9. 22	28.6. 23	11.7. 23	14 dny?				
122	Předsazená okna haly	100%	8.10. 22	28.10. 22	8.10. 22	28.10. 22	21 dny?				
123	Příčky zděné	100%	1.3. 22	28.3. 22	31.1. 23	27.2. 23	28 dny?				
124	Hrubé rozvody	100%	1.3. 22	21.10. 22	26.6. 22	14.9. 23	446 dny?				
125	Hrubé rozvody VZT	100%	26.3. 22	21.10. 22	11.3. 23	12.5. 23	62 dny?				
126	Hrubé rozvody VZT_ 1.NP (zázemí)	100%	23.7. 22	5.8. 22	7.4. 23	21.4. 23	14 dny?				
127	Hrubé rozvody VZT_ 2.NP (hala)	100%	1.10. 22	21.10. 22	21.4. 23	12.5. 23	21 dny?				
128	Hrubé rozvody VZT_ 2.NP (zázemí)	100%	26.3. 22	8.4. 22	11.3. 23	25.3. 23	14 dny?				
129	Hrubé rozvody VZT_ 3.NP střešní rozvody, střešní jednotky	100%	2.4. 22	22.4. 22	17.3. 23	7.4. 23	21 dny?				
130	Zařízení pro chlazení	100%	26.6. 22	6.8. 22	26.6. 22	6.7. 23	375 dny?				
131	Ležatá kanalizace 1.NP_ hala	100%	17.7. 22	6.8. 22	9.4. 23	6.7. 23	21 dny?				
132	Hrubé rozvody kanalizace_ 1.NP	100%	26.6. 22	16.7. 22	26.6. 22	16.7. 22	21 dny				
133	Hrubé rozvody vodovodu	100%	1.3. 22	19.8. 22	14.2. 23	21.3. 23	35 dny?				
134	Hrubé rozvody vodovodu _ 1.NP_ páteřní rozvod	100%	1.3. 22	14.3. 22	14.2. 23	28.2. 23	14 dny?				

Projekt: HMG VB Beraun_MSP2
Datum: 1.12. 23

Úkol
Rozdělení

Mílník
Souhrnný

Souhrn projektu
Vnější úkoly

Vnější mílník
Konečný termín

Průběh

Stránka 3

ID	Název úkolu	Dokončeno %	Zahájení podle směrného plánu	Dokončení podle směrného plánu	Zahájení podle směrného plánu 5	Dokončení podle směrného plánu 5	Doba trvání												
								2021				2022				2023			
								p	v	i	l	o	m	v	i	l	o	m	v
135	Hrubé rozvody vodovodu 1.NP	100%	30.7.22	19.8.22	28.2.23	21.3.23	21 dny?												
136	Zařízení pro chlazení	100%	2.4.22	12.8.22	18.3.23	29.4.23	42 dny?												
137	Hrubé rozvody chlazení _ 2.NP	100%	2.4.22	22.4.22	18.3.23	8.4.23	21 dny?												
138	Hrubé rozvody chlazení _ 1.NP	100%	23.7.22	12.8.22	8.4.23	29.4.23	21 dny?												
139	Hrubé rozvody ÚT	100%	6.8.22	16.9.22	4.6.23	25.7.23	51,38 dny?												
140	Hrubé rozvody ÚT _ 1.NP - podlahové rozvody	100%	6.8.22	19.8.22	4.6.23	17.6.23	14 dny?												
141	Hrubé rozvody ÚT _ 1.NP - hala (podlahové vytápění)	100%	27.8.22	16.9.22	18.6.23	8.7.23	21 dny?												
142	Hrubé rozvody ÚT _ 2.NP - podlahové rozvody	100%	20.8.22	26.8.22	4.7.23	11.7.23	7 dny?												
143	Hrubé rozvody ÚT _ 3.NP _ střešní jednotky	100%	27.8.22	9.9.22	11.7.23	25.7.23	14 dny?												
144	Hrubé rozvody silnoproud	100%	9.4.22	14.10.22	31.12.22	2.5.23	122,2 dny?												
145	Hrubé rozvody _ elektro silnoproud _ 1.PP	100%	9.4.22	6.5.22	31.12.22	15.3.23	28 dny?												
146	Hrubé rozvody _ elektro silnoproud _ 2.NP _ zázemí	100%	7.5.22	3.6.22	28.1.23	21.3.23	28 dny?												
147	Hrubé rozvody _ elektro silnoproud _ 1.NP _ zázemí	100%	30.7.22	26.8.22	21.3.23	18.4.23	28 dny?												
148	Hrubé rozvody _ elektro silnoproud _ 1-2..NP _ hala	100%	1.10.22	14.10.22	18.4.23	2.5.23	14 dny?												
149	Hrubé rozvody _ elektro silnoproud _ 3.NP _ střešní jednotky	100%	10.9.22	16.9.22	18.4.23	25.4.23	7 dny?												
150	Hrubé rozvody slaboproud	100%	9.4.22	14.10.22	10.3.23	14.9.23	189 dny?												
151	Omitky vnitřní	100%	7.5.22	28.10.22	7.4.23	28.9.23	175 dny?												
152	Utý cementový potěr + tepelná izolace	100%	27.8.22	23.9.22	20.7.23	16.8.23	28 dny?												
153	Podhledy	100%	17.9.22	9.12.22	18.4.23	11.7.23	84 dny?												
154	Keramické obklady a dlažby	100%	24.9.22	30.12.22	25.4.23	1.8.23	98 dny?												
155	Malby a nátěry	100%	8.10.22	25.11.22	25.8.23	12.10.23	49 dny?												
156	Epoxidová stěrka	100%	22.10.22	4.11.22	17.8.23	30.8.23	14 dny?												
157	Podlahy dřevěné _ terasa kavárny	100%	26.11.22	9.12.22	13.10.23	26.10.23	14 dny?												
158	Podlahy poviakové _ PVC	100%	29.10.22	4.11.22	17.8.23	23.8.23	7 dny?												
159	Výplně otvorů vnitřní	100%	5.11.22	9.12.22	24.8.23	27.9.23	35 dny?												
160	Kompletace	100%	5.11.22	9.12.22	24.8.23	27.9.23	35 dny?												
161	Revize, atesty, zkoušky	100%	3.12.22	16.12.22	21.9.23	4.10.23	14 dny?												
162	Rekonstrukce objektu VB_ fáze 3_ východ výpravní haly_ provedení	100%	31.12.22	31.12.22	5.10.23	5.10.23	1 den?												
163																			
164	Rekonstrukce objektu VB_ fáze 4 _ administrativní objekt	100%	28.10.20	18.6.22	28.10.20	18.6.22	599 dny?												
165	Realizace	100%	29.6.21	29.6.21	29.6.21	29.6.21	0 dny												
166	Rekonstrukce objektu VB_ fáze 4 _ administrativní objekt I. - předání staveniště	100%	1.8.21	30.11.21	1.8.21	30.11.21	122 dny?												
167	Bourací práce	100%	1.8.21	16.8.21	1.8.21	16.8.21	16 dny?												
168	Demontáž interierového vybavení, zařizovacích předmětů, výplní otvorů vnitřních	100%	1.8.21	16.8.21	1.8.21	16.8.21	16 dny?												
169	Demontáž stávajících podhledů a obkladů, podlahových krytin	100%	1.8.21	16.8.21	1.8.21	16.8.21	16 dny?												
170	Odstranění znehodnocených omítek, bourání stěn a příček	100%	1.8.21	16.8.21	1.8.21	16.8.21	16 dny?												
171	Demontáž přístupných rozvodů mimo ÚT	100%	1.8.21	16.8.21	1.8.21	16.8.21	16 dny?												
172	Podlahová souvrství - odstranění	100%	1.8.21	16.8.21	1.8.21	16.8.21	16 dny?												
173	Demontáž výplní otvorů vnějších _ okna	100%	1.8.21	16.8.21	1.8.21	16.8.21	16 dny?												
174	Střecha	100%	1.8.21	29.9.21	1.8.21	29.9.21	60 dny?												
175	Skladba nad 4.NP _ skladba ST 2	100%	1.8.21	29.9.21	1.8.21	29.9.21	60 dny?												
176	Opláštění budovy	100%	1.8.21	9.10.21	1.8.21	9.10.21	70 dny?												

Projekt: HMG VB Beraun_MSP2

Datum: 1.12.23

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější měník

Konečný termín

Průběh

ID	Název úkolu	Dokončeno %	Zahájení podle směrného plánu	Dokončení podle směrného plánu	Zahájení podle směrného plánu	Dokončení podle směrného plánu	Doba trvání	2021 2022 2023 2024											
								I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
177	✓ Výplně otvorů vnější - okna	100%	1.8. 21	16.8. 21	1.8. 21	16.8. 21	16 dny?												
178	✓ Fasádní kontaktní zateplovací systém _	100%	22.8. 21	9.10. 21	22.8. 21	9.10. 21	49 dny?												
179	✓ Vnitřní prostory rekonstruovaných podlaží	100%	11.8. 21	29.11. 21	11.8. 21	29.11. 21	111 dny?												
180	✓ Konstrukční úpravy	100%	11.8. 21	11.9. 21	11.8. 21	11.9. 21	32 dny?												
189	✓ Zdivo vnitřní výplňové	100%	11.8. 21	1.10. 21	11.8. 21	1.10. 21	52 dny?												
190	✓ Hrubé rozvody	100%	15.8. 21	31.10. 21	15.8. 21	31.10. 21	78 dny?												
211	✓ Omítky a stěrky vnitřní	100%	25.9. 21	29.10. 21	25.9. 21	29.10. 21	35 dny?												
212	✓ Podlahy betonové	100%	30.9. 21	14.10. 21	30.9. 21	14.10. 21	15 dny?												
213	✓ Podhledy kazetové	100%	5.10. 21	29.10. 21	5.10. 21	29.10. 21	25 dny?												
214	✓ Keramické obklady, dlažby	100%	10.10. 21	3.11. 21	10.10. 21	3.11. 21	25 dny?												
215	✓ Malby a nátěry	100%	15.10. 21	3.11. 21	15.10. 21	3.11. 21	20 dny?												
216	✓ Podlahy plovákové _ PVC	100%	30.10. 21	24.11. 21	30.10. 21	24.11. 21	26 dny?												
217	✓ Výplně otvorů vnitřní	100%	16.11. 21	29.11. 21	16.11. 21	29.11. 21	14 dny?												
218	✓ Kompletace	100%	4.11. 21	29.11. 21	4.11. 21	29.11. 21	26 dny?												
219	✓ Revize, atesty, zkoušky	100%	14.11. 21	30.11. 21	14.11. 21	30.11. 21	17 dny?												
220																			
221	✓ Rekonstrukce objektu VB_ fáze 4 _ administrativní objekt II. - předání staveniště	100%	2.12. 21	30.3. 22	2.12. 21	30.3. 22	119 dny?												
222	✓ Bourací práce	100%	2.12. 21	13.12. 21	2.12. 21	13.12. 21	12 dny?												
223	✓ Demontáž interierového vybavení, zařizovacích předmětů, výplní otvorů vnitřních	100%	2.12. 21	13.12. 21	2.12. 21	13.12. 21	12 dny?												
224	✓ Demontáž stávajících podhledů a obkladů, podlahových krytin	100%	2.12. 21	13.12. 21	2.12. 21	13.12. 21	12 dny?												
225	✓ Odstranění znehodnocených omítek, bourání stěn a příček	100%	2.12. 21	13.12. 21	2.12. 21	13.12. 21	12 dny?												
226	✓ Demontáž přístupných rozvodů	100%	2.12. 21	13.12. 21	2.12. 21	13.12. 21	12 dny?												
227	✓ Podlahová souvrství - odstranění	100%	2.12. 21	13.12. 21	2.12. 21	13.12. 21	12 dny?												
228	✓ Demontáž výplní otvorů vnějších_ okna	100%	2.12. 21	13.12. 21	2.12. 21	13.12. 21	12 dny?												
229	✓ Opláštění budovy	100%	8.12. 21	2.1. 22	8.12. 21	2.1. 22	26 dny?												
230	✓ Výplně otvorů vnější - okna	100%	8.12. 21	18.12. 21	8.12. 21	18.12. 21	11 dny?												
231	✓ Fasádní kontaktní zateplovací systém _ sever	100%	14.12. 21	2.1. 22	14.12. 21	2.1. 22	20 dny?												
232	✓ Vnitřní prostory rekonstruovaných podlaží	100%	3.12. 21	30.3. 22	3.12. 21	30.3. 22	118 dny?												
233	✓ Konstrukční úpravy	100%	8.12. 21	18.12. 21	8.12. 21	18.12. 21	11 dny?												
234	✓ Konstrukční úpravy nosných stěn_ 1.PP	100%	8.12. 21	18.12. 21	8.12. 21	18.12. 21	11 dny?												
235	✓ Podchycení stropních panelů (VZT)_ 1.PP	100%	8.12. 21	18.12. 21	8.12. 21	18.12. 21	11 dny?												
236	✓ Podchycení stropních panelů (VZT)_ 4.NP	100%	8.12. 21	18.12. 21	8.12. 21	18.12. 21	11 dny?												
237	✓ Podchycení stropních panelů (VZT)_ 3.NP	100%	8.12. 21	18.12. 21	8.12. 21	18.12. 21	11 dny?												
238	✓ Podchycení stropních panelů (VZT)_ 2.NP	100%	8.12. 21	18.12. 21	8.12. 21	18.12. 21	11 dny?												
239	✓ Podchycení stropních panelů (VZT)_ 1.NP	100%	8.12. 21	18.12. 21	8.12. 21	18.12. 21	11 dny?												
240	✓ Konstrukční úpravy nosných stěn_ 1.NP	100%	8.12. 21	18.12. 21	8.12. 21	18.12. 21	11 dny?												
241	✓ Zdivo vnitřní výplňové	100%	7.12. 21	27.12. 21	7.12. 21	27.12. 21	21 dny?												
242	✓ Hrubé rozvody	100%	3.12. 21	30.3. 22	3.12. 21	30.3. 22	118 dny?												
243	✓ Hrubé rozvody VZT	100%	21.12. 21	8.1. 22	21.12. 21	8.1. 22	19 dny?												
244	✓ Hrubé rozvody kanalizace	100%	14.12. 21	11.1. 22	14.12. 21	11.1. 22	29 dny?												
245	✓ Hrubé rozvody vodovodu	100%	14.12. 21	30.3. 22	14.12. 21	30.3. 22	107 dny?												
246	✓ Hrubé rozvody vodovodu II.PP_ páteřní rozvod	100%	21.12. 21	11.1. 22	21.12. 21	11.1. 22	22 dny?												

Projekt: HMG VB Beraun_MSP2
Datum: 1.12. 23

Úkol  Milník 
Rozdělení  Souhrn 

Souhrn projektu  Vnější milník 
Vnější úkaly  Konečný termín 

Průběh 

ID	Název úkolu	Dokončeno %	Zahájení podle směrného plánu	Dokončení podle směrného plánu	Zahájení podle směrného plánu5	Dokončení podle směrného plánu5	Doba trvání												
								2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	6	7	8
289	✓ Výplně otvorů vnější -okna	100%	5.5. 22	21.5. 22	1.7. 22	17.7. 22	17 dny?												
290	✓ Fasádní kontaktní zateplovací systém _ s	100%	10.5. 22	15.6. 22	1.7. 22	6.8. 22	37 dny												
291	✓ Vnitřní prostory rekonstruovaných podlaží	100%	1.2. 22	30.8. 22	1.2. 22	19.10. 22	261 dny?												
292	✓ Konstruktivní úpravy	100%	5.5. 22	15.5. 22	1.7. 22	11.7. 22	11 dny?												
293	✓ Konstrukční úpravy nosných stěn _ 1.PP	100%	5.5. 22	15.5. 22	1.7. 22	11.7. 22	11 dny?												
294	✓ Podchycení stropních panelů (VZT)_ 1.PP	100%	5.5. 22	15.5. 22	1.7. 22	11.7. 22	11 dny?												
295	✓ Podchycení stropních panelů (VZT)_ 4.NP	100%	5.5. 22	15.5. 22	1.7. 22	11.7. 22	11 dny?												
296	✓ Podchycení stropních panelů (VZT)_ 3.NP	100%	5.5. 22	15.5. 22	1.7. 22	11.7. 22	11 dny?												
297	✓ Podchycení stropních panelů (VZT)_ 2.NP	100%	5.5. 22	15.5. 22	1.7. 22	11.7. 22	11 dny?												
298	✓ Podchycení stropních panelů (VZT)_ 1.NP	100%	5.5. 22	15.5. 22	1.7. 22	11.7. 22	11 dny?												
299	✓ Konstrukční úpravy nosných stěn _ 1.NP	100%	5.5. 22	15.5. 22	1.7. 22	11.7. 22	11 dny?												
300	✓ Zdivo vnitřní výplňové	100%	5.5. 22	21.5. 22	1.7. 22	17.7. 22	17 dny?												
301	✓ Hrubé rozvody	100%	1.2. 22	30.6. 22	1.2. 22	21.8. 22	202 dny?												
302	✓ Hrubé rozvody VZT	100%	1.2. 22	15.6. 22	1.2. 22	15.6. 22	135 dny?												
303	✓ Hrubé rozvody kanalizace	100%	1.2. 22	15.6. 22	1.2. 22	15.6. 22	135 dny?												
304	✓ Hrubé rozvody vodovodu	100%	1.2. 22	15.6. 22	1.2. 22	15.6. 22	135 dny?												
305	✓ Hrubé rozvody vodovodu 1.PP_ páteřní rozvod	100%	1.2. 22	15.6. 22	1.2. 22	15.6. 22	135 dny?												
306	✓ Hrubé rozvody vodovodu 1.PP_ připojení	100%	1.2. 22	15.6. 22	1.2. 22	15.6. 22	135 dny?												
307	✓ Hrubé rozvody vodovodu 1.PP_ výměňková stanice,	100%	1.2. 22	15.6. 22	1.2. 22	15.6. 22	135 dny?												
308	✓ Hrubé rozvody vodovodu 1.NP_ páteřní rozvod	100%	1.2. 22	15.6. 22	1.2. 22	15.6. 22	135 dny?												
309	✓ Hrubé rozvody vodovodu 1.NP_ připojovací potrubí	100%	1.2. 22	15.6. 22	1.2. 22	15.6. 22	135 dny?												
310	✓ Hrubé rozvody vodovodu 2.NP_ páteřní rozvod - stoupačky	100%	1.2. 22	15.6. 22	1.2. 22	15.6. 22	135 dny?												
311	✓ Hrubé rozvody vodovodu 3.NP_ páteřní rozvod - stoupačky	100%	1.2. 22	15.6. 22	1.2. 22	15.6. 22	135 dny?												
312	✓ Hrubé rozvody vodovodu 4.NP_ páteřní rozvod - stoupačky	100%	1.2. 22	15.6. 22	1.2. 22	15.6. 22	135 dny?												
313	✓ Zařízení pro chlazení	100%	31.5. 22	30.6. 22	1.7. 22	31.7. 22	31 dny?												
314	✓ Hrubé rozvody chlazení _ 1.PP - páteřní rozvod	100%	31.5. 22	30.6. 22	1.7. 22	31.7. 22	31 dny?												
315	✓ Hrubé rozvody chlazení _ 1.NP	100%	31.5. 22	30.6. 22	1.7. 22	31.7. 22	31 dny?												
316	✓ Hrubé rozvody chlazení _ 2.NP	100%	31.5. 22	30.6. 22	1.7. 22	31.7. 22	31 dny?												
317	✓ Hrubé rozvody chlazení _ 3.NP	100%	31.5. 22	30.6. 22	1.7. 22	31.7. 22	31 dny?												
318	✓ Hrubé rozvody chlazení _ 4.NP	100%	31.5. 22	30.6. 22	1.7. 22	31.7. 22	31 dny?												
319	✓ Strojovna chlazení _ 4.NP	100%	31.5. 22	30.6. 22	1.7. 22	31.7. 22	31 dny?												
320	✓ Hrubé rozvody ÚT	100%	16.5. 22	15.6. 22	1.7. 22	31.7. 22	31 dny?												
321	✓ Hrubé rozvody _ elektro - silnoproud	100%	12.5. 22	15.6. 22	1.7. 22	4.8. 22	35 dny?												
322	✓ Hromosvod	100%	15.6. 22	30.6. 22	6.8. 22	21.8. 22	16 dny?												
323	✓ Hrubé rozvody _ elektro - slaboproud	100%	12.5. 22	15.6. 22	1.7. 22	4.8. 22	35 dny?												
324	✓ Omítky a stěrky vnitřní	100%	15.6. 22	31.7. 22	4.8. 22	19.9. 22	47 dny?												
325	✓ Podlahy betonové	100%	20.6. 22	26.7. 22	1.8. 22	6.9. 22	37 dny?												
326	✓ Podhledy kazetové	100%	21.7. 22	25.8. 22	9.9. 22	14.10. 22	36 dny?												
327	✓ Keramické obklady, dlažby	100%	31.7. 22	20.8. 22	7.9. 22	27.9. 22	21 dny?												
328	✓ Malby a nátěry	100%	17.7. 22	22.8. 22	24.8. 22	29.9. 22	37 dny?												
329	✓ Podlahy plovákové _ PVC	100%	21.7. 22	15.8. 22	9.9. 22	4.10. 22	26 dny?												
330	✓ Výplně otvorů vnitřní	100%	31.7. 22	30.8. 22	19.9. 22	19.10. 22	31 dny?												


Projekt: HMG VB Beraun_MSP2
Datum: 1.12. 23

Úkol:  Milník
Rozdělení:  Souhrnný

Souhrn projektu:  Vnější milník
Vnější úkoly:  Konečný termín

Průběh: 

ID		Název úkolu	Dokončeno %	Zahájení podle směrného plánu	Dokončení podle směrného plánu	Zahájení podle směrného plánu	Dokončení podle směrného plánu	Doba trvání	
									2021 2022 2023 2024
331	✓	Kompletace	100%	31.7.22	30.8.22	19.9.22	19.10.22	31 dny?	
332	✓	Revize, atesty, zkoušky	100%	30.8.22	15.9.22	19.10.22	4.11.22	17 dny?	
333									
334	✓	Rekonstrukce objektu VB_ fáze 4 _ drážní objekt	100%	11.1.21	18.6.22	11.1.21	22.7.23	922,9 dny?	
335	✓	Bourací práce	100%	11.1.21	4.7.21	11.1.21	12.9.22	609,13 dny?	
336	✓	Demontáž interierového vybavení, zařizovacích předmětů, výplní otvorů vnitřních	100%	11.1.21	31.1.21	11.1.21	30.6.22	21 dny	
337	✓	Demontáž stávajících podhledů a obkladů, podlahových krytin	100%	3.5.21	30.5.21	3.5.21	12.9.22	22,4 dny	
338	✓	Odstranění znehodnocených omítek, bourání stěn a příček	100%	10.5.21	6.6.21	10.5.21	12.9.22	22,4 dny	
339	✓	Demontáž přístupných rozvodů	100%	10.5.21	6.6.21	10.5.21	12.9.22	21 dny	
340	✓	Podlahová souvrství - odstranění	100%	7.6.21	4.7.21	7.6.21	2.7.22	390,4 dny?	
341	✓	Demontáž výplní otvorů vnějších_ okna	100%	7.6.21	4.7.21	7.6.21	2.7.22	28 dny?	
342	✓	Střecha	100%	31.5.21	28.11.21	31.5.21	25.7.22	420,5 dny?	
343	✓	Skladba nad 4.NP	100%	31.5.21	4.7.21	31.5.21	18.7.22	35 dny?	
344	✓	Hromosvod	100%	15.11.21	28.11.21	15.11.21	25.7.22	14 dny?	
345	✓	Opláštění budovy	100%	21.6.21	27.2.22	21.6.21	28.11.22	526 dny?	
346	✓	Výplně otvorů vnější - okna	100%	21.6.21	18.7.21	21.6.21	2.7.22	28 dny?	
347	✓	Fasádní kontaktní zateplovací systém	100%	27.12.21	27.2.22	27.12.21	28.11.22	63 dny?	
348	✓	Vnitřní prostory nadzemních podlaží	100%	31.5.21	29.5.22	31.5.21	22.7.23	782,9 dny?	
349	✓	Konstrukční úpravy	100%	31.5.21	13.6.21	31.5.21	22.7.23	782,9 dny?	
350	✓	Podchycení stropních panelů (VZT)_ 1 NP	100%	31.5.21	13.6.21	31.5.21	22.7.23	14 dny?	
351	✓	Konstrukční úpravy nosných stěn_ 1.PP	100%	7.6.21	13.6.21	7.6.21	8.9.22	6,3 dny?	
352	✓	Podchycení stropních panelů (VZT)_ 1 PP	100%	7.6.21	13.6.21	7.6.21	19.7.23	7 dny?	
353	✓	Zdivo vnitřní výplňové	100%	19.7.21	15.8.21	19.7.21	4.7.22	28 dny?	
354	✓	Zateplení stropní konstrukce 1.PP	100%	30.8.21	19.9.21	30.8.21	2.7.22	21 dny?	
355	✓	Hrubé rozvody	100%	19.9.21	13.3.22	6.9.21	17.3.23	557,83 dny?	
356	✓	Hrubé rozvody VZT	100%	19.9.21	16.10.21	19.9.21	10.7.22	28 dny?	
357	✓	Hrubé rozvody kanalizace	100%	4.10.21	7.11.21	4.10.21	20.12.22	443 dny?	
358	✓	Hrubé rozvody vodovodu	100%	11.10.21	14.11.21	4.10.21	12.9.22	243,6 dny?	
359	✓	Zařízení pro chlazení	100%	25.10.21	21.11.21	6.9.21	19.12.22	435 dny?	
360	✓	Hrubé rozvody ÚT	100%	6.12.21	16.1.22	6.12.21	17.3.23	42 dny?	
361	✓	Hrubé rozvody _ elektro - silnoproud	100%	27.12.21	23.1.22	27.12.21	13.7.22	28 dny?	
362	✓	Hromosvod	100%	28.2.22	13.3.22	28.2.22	5.12.22	14 dny?	
363	✓	Hrubé rozvody _ elektro - slaboproud	100%	27.12.21	23.1.22	27.12.21	19.9.22	28 dny?	
364	✓	Omítky a stěrky vnitřní	100%	7.2.22	6.3.22	7.2.22	23.11.22	154,53 dny?	
365	✓	Podlahy betonové	100%	21.2.22	27.2.22	21.2.22	8.5.23	7 dny?	
366	✓	Podhledy kazetové	100%	7.3.22	30.3.22	20.7.22	5.12.22	24 dny?	
367	✓	Keramické obklady, dlažby	100%	14.2.22	25.3.22	14.2.22	14.5.23	40 dny?	
368	✓	Malby a nátěry	100%	20.8.21	1.5.22	20.8.21	17.1.23	255 dny?	
369	✓	Podlahy povlakové _ PVC	100%	25.4.22	8.5.22	12.7.22	11.5.23	14 dny?	
370	✓	Nátěr/ stěrka podlah	100%	2.5.22	15.5.22	8.5.23	22.5.23	14 dny?	
371	✓	Výplně otvorů vnitřní	100%	9.5.22	22.5.22	12.7.22	8.5.23	14 dny?	
372	✓	Kompletace	100%	9.5.22	29.5.22	18.1.23	7.2.23	21 dny?	

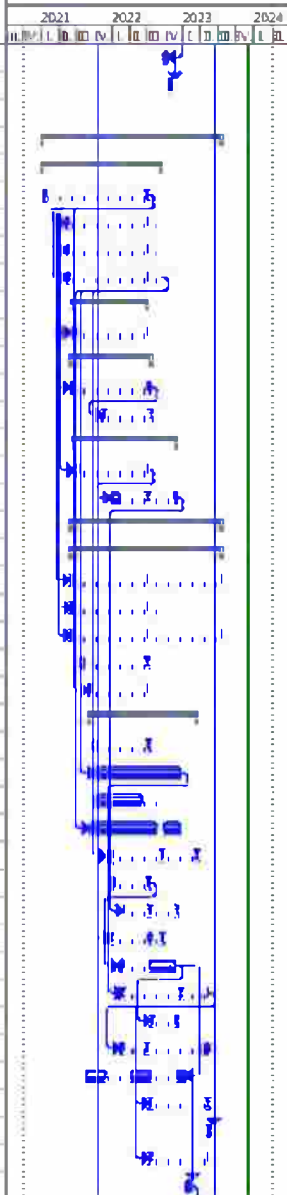

Projekt: HMG_VB_Beraun_MSP2
Datum: 1.12.23

Úkol
Rozdělení

Milník
Souhrnný

Souhrn projektu
Vnější úkoly

Vnější milník
Konečný termín

Průběh

ID	Název úkolu	Dokončeno %	Zahájení podle směrného plánu	Dokončení podle směrného plánu	Zahájení podle směrného plánu 5	Dokončení podle směrného plánu 5	Doba trvání	
373	✓ Revize, atesty, zkoušky	100%	30.5. 22	12.6. 22	8.2. 23	21.2. 23	14 dny?	
374	✓ Rekonstrukce objektu VB_ fáze 4 _ drážní objekt _ provedení	100%	13.6. 22	18.6. 22	22.2. 23	27.2. 23	6 dny?	
375								
376	✓ Testy při dokončení_ fáze 2	100%	15.12. 21	31.1. 22	19.7. 23	30.6. 24	111 dny?	
377	✓ Dílčí zkoušky	100%	15.12. 21	4.1. 22	19.7. 23	20.6. 24	21 dny?	
378	✓ Komplexní zkoušky	100%	4.1. 22	8.1. 22	6.10. 23	20.6. 24	5 dny?	
379	✓ Provozní zkoušky technologie	100%	9.1. 22	31.1. 22	15.10. 22	15.10. 23	23 dny?	
380								
381	✓ Testy při dokončení_ fáze 3	100%	15.11. 22	31.12. 22	20.8. 23	30.6. 24	47 dny?	
382	✓ Dílčí zkoušky	100%	15.11. 22	4.12. 22	20.8. 23	8.9. 23	20 dny?	
383	✓ Komplexní zkoušky	100%	4.12. 22	8.12. 22	8.9. 23	12.9. 23	5 dny?	
384	✓ Provozní zkoušky technologie	100%	9.12. 22	31.12. 22	13.9. 23	5.10. 23	23 dny?	
385								
386	Předání dokončeného díla	58%	15.11. 22	31.12. 22	28.9. 20	31.3. 24	301 dny?	
387	✓ Předpřijímka	100%	15.11. 22	4.12. 22	20.8. 23	31.3. 24	20 dny?	
388	✓ Odstranění vad a nedodělků předpřijímky	100%	4.12. 22	8.12. 22	8.9. 23	20.6. 24	5 dny?	
389	✓ Předání dokončeného díla	100%	9.12. 22	31.12. 22	13.9. 23	30.6. 24	23 dny?	
390								
391	Rekonstrukce objektu VB_ fáze 3 _ východ výpravní haly	56%	NEDEF	NEDEF	5.6. 23	30.6. 24	301 dny?	
392	✓ Práce dotčené změnou R3 a R4 stavební dokončení	100%	NEDEF	NEDEF	5.6. 23	31.3. 24	164 dny?	
393								
394	Rekonstrukce objektu VB- administrativní objekt	49%	NEDEF	NEDEF	5.6. 23	30.6. 24	301 dny?	
395	✓ Práce dotčené změnou R3 a R4 stavební dokončení	100%	NEDEF	NEDEF	5.6. 23	31.3. 24	138 dny?	
396								
397	Rekonstrukce objektu VB- drážní objekt	41%	NEDEF	NEDEF	5.6. 23	30.6. 24	301 dny?	
398	✓ Práce dotčené změnou R3 a R4 stavební dokončení	100%	NEDEF	NEDEF	15.6. 23	31.3. 24	108 dny?	
399								
400	Rekonstrukce objektu VB- sušecní prostory	33%	NEDEF	NEDEF	5.6. 23	30.6. 24	301 dny?	
401	✓ Práce dotčené změnou R3 a R4 stavební dokončení	100%	NEDEF	NEDEF	5.6. 23	31.3. 24	125 dny	
402								
403	Dokončení prostor po stěhování provozů	0%	NEDEF	NEDEF	10.1. 24	15.3. 24	66 dny?	
404	Propojení kabeláží do vystěhovaných prostor	0%	NEDEF	NEDEF	20.12. 23	10.3. 24	82 dny?	
405	Práce související se změnou stavby před dokončením	0%	NEDEF	NEDEF	15.1. 24	20.3. 24	66 dny?	
406	Práce na nájemní jednotce č.:5	0%	NEDEF	NEDEF	15.1. 24	25.3. 24	71 dny	
407	Spuštění technologie	0%	NEDEF	NEDEF	15.2. 24	25.3. 24	40 dny?	
408	Testy při dokončení	40%	NEDEF	NEDEF	15.10. 23	30.6. 24	169 dny?	
409	Dílčí zkoušky	92%	NEDEF	NEDEF	15.10. 23	20.6. 24	51 dny?	
410	Komplexní zkoušky	59%	NEDEF	NEDEF	20.11. 23	20.6. 24	19 dny?	
411	Provozní zkoušky technologie	70%	NEDEF	NEDEF	15.10. 23	20.6. 24	67 dny	
412								
413	Předání dokončeného díla	9%	NEDEF	NEDEF	15.11. 23	30.6. 24	138 dny?	
414	Předpřijímka	81%	NEDEF	NEDEF	15.11. 23	1.4. 24	20 dny?	

Projekt: HMG VB Beraun_MSP2
Datum: 1.12. 23

Úkol  Mílník 
Rozdělení  Souhrnný 

Souhrn projektu 
vnější úkoly 

Vnější mílník 
Konečný termín 

Průběh 

Všechny podpisy jsou platné.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 16.10.2024 12:10:00.713

Podepsal(a):

[REDACTED]

Čas podepsání: 03.10.2024 09:48:10

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 16.10.2024 12:10:00.713

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 13.11.2023 07:16:22

Platný do: 02.12.2024 07:16:22

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5005816

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c336fba0-7336-4ce5-882f-a25c1867c55c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.10.2024 12:10:02

Hash komponenty: c9f31696d0cac03fd99efb7ad19926bfad88a18b4f3e93020ba2d410f49545d0

Hashovací funkce: sha256Hex



c22623c5-e9d6-446c-8c5f-770bac1cec79
