

Číslo smlouvy Zhotovitele: D800/52000/00249/23/02

Číslo jednací Prováděcí smlouvy: ENV/2023/514489

Číslo jednací dodatku 1 Prováděcí smlouvy: ENV/2024/144432

Číslo jednací dodatku 2 Prováděcí smlouvy: *ENV/2024/258576*

DODATEK Č. 2

PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO

MZP-OG-55/23/SDD

k Rámcové dohodě – část 2 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 071

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie
IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, číslo účtu: 7628001/0710
kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů a zástupce
ředitele odboru geologie,
tel.: +420 267 122 667, e-mail: Petr.Uldrych@mzp.gov.cz
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Společnost „**Likvidace SDD – PKÚ + GIS + DS – Oblast 2**“

vedoucí účastník: **DIAMO, státní podnik**
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Zastoupený: Ing. Ludvíkem Kašparem, ředitelem státního podniku,
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem, číslo účtu: 7536123000/5500

a

účastník: **GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o.**
se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
IČO: 49196375
DIČ: CZ49196375
zastoupený: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank im Siftland eG, Plzeň, číslo účtu: 505930/8030
zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C4319

a

účastník: **After mining a.s.**
se sídlem: Záměstní 1240/41 Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČO: 64618650
DIČ: CZ64618650
zastoupený: Ing. Romanem Vláškem, předsedou správní rady



bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 50100501 00/5500
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 4513

Za společnost jedná: Ing. Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku

Kontaktní osoba:



dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

Prováděcí smlouvy o dílo č. MZP-OG-55/23/SDD

(dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

k Rámcové dohodě – část 2 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 071

(dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Tímto Dodatkem č. 2 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

I. Změny Prováděcí smlouvy

- I. 1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 2 se změní čl. 3 Doba, místo a podmínky plnění a nově zní:

Čl. 3

Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. dokončit ho a předat Objednateli nejpozději do 31. 5. 2025 (dodací lhůta).

II. Ostatní ujednání

- II. 1 Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění.

III. Závěrečná ujednání

- III. 1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je jeho příloha:

- a) Žádost Zhotovitele o uzavření dodatku;
- b) Zápis z Kontrolního dne č. 3 GDO ze dne 17. a 25. 10. 2024.

- III. 2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a Objednatel obdrží 2 vyhotovení.
- III. 3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Podle dohody Smluvních stran uveřejnění tohoto dodatku Prováděcí smlouvy provede Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Praze, dne 20.11.2024




Ceská republika – Ministerstvo životního
prostředí

RNDr. Martin Holý
ředitel odboru geologie

Zhotovitel

Ve Stráži pod Ralskem, dne



Ing. Ludvík Kašpar
ředitel státního podniku
DIAMO, státní podnik
vedoucí společník
„Likvidace SDD–PKÚ+GIS+DS – Oblast 2“





DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII
261 01 Příbram

Ministerstvo životního prostředí
RNDr. Martin Holý
ředitel odboru geologie
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Vaše značka/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/Tel.
ZBZS Libušín
Ing. Šarboch

Libušín
2024-11-01

Žádost o uzavření Dodatku č. 2

Vážený pane řediteli,

dovolujeme si Vás požádat o uzavření Dodatku č. 2 k prováděcí smlouvě o dílo č. MZP-OG-55/23/SDD ze dne 15. 9. 2023 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 2. 2024 jejímž předmětem je Zabezpečení dvou vrtů „KL 148“ v k. ú. Ženklaava a „NP 234“ v k. ú. Libhošť.

Důvodem změn je extrémní množství srážek v dotčeném regionu v průběhu měsíce září 2024 (zejména ve dnech 13. – 15. 9. 2024), které výrazně ovlivnilo hydrogeologické podmínky v okolí vrtu KL148. S přihlédnutím k rozsahu a charakteru rekultivačních prací s výsadbou trvalých porostů u vrtu KL148, se ukončení prací v termínu do 30. 11. 2024 dle Smlouvy o dílo nejeví reálně.

Generální dozor objednatele (GDO) bere na vědomí žádost o prodloužení termínu plnění ve smlouvě o dílo. Vzhledem k současnému stavu lokality a klimatickým podmínkám v jarních měsících běžného roku v tomto regionu, navrhuje GDO úpravu termínu plnění na 05/2025.

Dovolujeme si Vás proto požádat o uzavření Dodatku č. 2 prováděcí smlouvy o dílo, jehož předmětem by byla změna čl. 3 Doba, místo a podmínky plnění, a to na „Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. dokončit ho a předat Objednateli nejpozději do 31. 5. 2025 (dodací lhůta)“.

S pozdravem

Za Společnost
„Likvidace SDD – PKÚ + GIS + DS – Oblast 2“
Ing. Petr Šarboch
na základě plné mo




DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram

IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Tel.: +420 475 671 111
E-mail: diamo@diamo.cz

Obchodní rejstřík: Krajský soud Ústí nad Labem
Oddíl AXVIII, vložka 520
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
č. ú. 217725563/0300



Stanovisko GDO:



Přílohy

1. Podepsaný návrh dodatku ve třech vyhotoveních
2. Zápis z Kontrolního dne č. 3 GDO ze dne 17. a 25. 10. 2024

ZÁPIS

z provedené kontroly konané dne 17. a 25. 10. 2024 (KD 3)

1. Kontrolovaná akce:

Dílo: Zabezpečení dvou vrtů „KL 148“ v k. ú. Ženklava a „NP 234“ v k. ú. Libhošť (*)

Zhotovitel: Společnost „Likvidace SDD – PKÚ + GIS + DS – Oblast 2“, vedoucí účastník DIAMO, s. p., se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem.

Přímý zhotovitel: DIAMO, s. p., odštěpný závod Příbram, 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram, referát Hodonín, Plučárna 1, 695 01 Hodonín

Číslo prováděcí smlouvy Zhotovitele/ze dne: MZP-OG-55/23/SDD ze dne 15. 9. 2023

Číslo jednací prováděcí smlouvy: ENV/2023/514489

K rámcové dohodě – část 2 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 071

Termín zahájení prací: 12. 10. 2023 úvodní rekognoskací

Termín ukončení prací: 30. 11. 2024 dle PS

Číslo oblasti: 2

K výše uvedené kontrole jsou uzavřeny následující dodatky: Dodatek č. 1 PS o dílo č. j. ENV/2024/144432 ze dne 19. 2. 2024 v souvislosti s úpravou Čl. 1 Předmět Prováděcí smlouvy, kdy počet vrtů byl redukován ze tří na dva (*). Viz KD č. 1 ze dne 5. 1. 2024.

2. Kontrola dokumentace

V průběhu kontroly byla kontrolována následující dokumentace:

-

3. Kontrola pracovišť

Dne 12. 10. 2023 byla na lokalitě provedena úvodní rekognoskace.

Dne 17. 10. 2024 ve středisku Hodonín uspořádán kontrolní den za účasti zástupců Zhotovitele a zástupce poddodavatele relikvidačních prací (MND Drilling & Services a. s., Lužice, IČ 25547631). Zástupce GDO byl seznámen s aktuální přípravou na vlastní relikvidační práce. Vzhledem k aktuálnímu datu a také stavu terénu v místě sondy KL 148 v k. ú. Ženklaava (v době UR defacto prameniště) a předcházejícím deštům je ohrožen termín realizace daný PS, tj. 30. 11. 2024. Vlastní relikvidační práce by se stihnout měly, nicméně mohou být ohroženy rekultivační práce, kdy budou dotčené pozemky uvedeny po ukončení prací do řádného stavu a poté mohou být předány zpět majitelům. Vzhledem k nastalé situaci Zhotovitel vypracuje žádost o dodatek č. 2 PS o dílo měnící Čl. 3 Doba, místo a podmínky plnění – změna dodací lhůty, přičemž GDO navrhuje nový termín plnění 30. 5. 2025. Součástí bude návrh předmětného dodatku. Dokumenty Zhotovitel předloží GDO ke kontrole a k doplnění stanoviska.

Kontrola na lokalitách provedena dne 25. 10. 2024. U vrtu KL 148 prováděny přípravné práce – dokončeno odvodnění dotčené plochy, příprava komunikací takřka dokončena, dokončeny průklesty a položena panelová komunikace, zbývá drobné vyspravení účelové komunikace a místo pro otáčení vozidel při centrální ploše. Pažnice dohledána a připravena k relikvidaci, v místě pažnice bude položen „sklep“. Během kontroly dovoz a pokládka panelů. Navezení soupravy plánováno na cca 31. 10. 2024, spuštění 2. 11. 2024 dopoledne. Přípravné práce u vrtu NP 234 plánovány zahájit 4. 11. 2024, trvání do 14 dnů.

Dne 25. 10. 2024 předložen návrh žádosti o dodatek č. 2 PS o dílo, GDO vzhledem k výše uvedenému souhlasí.

4. Kontrola finančního plnění

Rozpočet byl schválen ve čtvrté verzi dne 27. 3. 2024 po zapracování připomínek ze strany GDO s cenou realizace díla:

Celková cena díla navržená Zhotovitelem činí:

35 793 003,57 Kč bez DPH a 43 309 534,32* Kč vč. DPH s uplatněním indexu 45 % z cen ÚRS (37 748 321,72 Kč bez DPH a 45 675 469,28* Kč vč. DPH bez slevy z ÚRS)

*ceny uvedené v rozpočtu (součet) neodpovídají sazbě DPH 21 % – opraveno

Celková cena díla schválená GDO ve verzi 4 činí:

34 958 835,66 Kč bez DPH a 42 300 191,15 Kč vč. DPH s uplatněním indexu 45 % z cen ÚRS (36 975 743,41 Kč bez DPH a 44 740 649,53 Kč vč. DPH bez slevy z ÚRS)

5. Doporučení a opatření:

Zhotovitel podá žádost o Dodatek č. 2 PS o dílo měnící Čl. 3 Doba, místo a podmínky plnění – změna dodací lhůty, a to na 30. 5. 2025.

Vyjádření Zhotovitele:

Bez připomínek.

Připomínky a poznámky zástupce GDO:

Příští KD ve středisku Hodonín je stanoven na čtvrtek 7. 11. 2024.

Účastníci kontroly:

Za generální dozor objednatele:

Ing. Zdeněk Macka

Za Zhotovitele:

p. Marek Vybíral

13

Přílohy:

Příloha č. 1: Zápis z kontrolního dne č. 1 Zhotovitele

Příloha č. 2: Fotodokumentace z KD č. 3

Příloha č. 1: Zápis z kontrolního dne č. 1 Zhotovitele



DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram, 28. října 184, Příbram VII, 26101 Příbram

Zápis z kontrolního dne č. 1 realizace projektu

„Zabezpečení dvou vrtů „KL148“ v k. ú. Ženklava a „NP234“ v k. ú. Libhošť“

Den konání: 17. 10. 2024

Místo konání: DIAMO, s. p., o. z. Příbram, referát Hodonín

Účast dle prezenční listiny:

DIAMO, s. p., o. z. Příbram –

DIAMO, s. p., o. z. Příbram, referát Hodonín –

GEOtest, a. s. (generální dozor objednatele) –

MND Drilling & Services a. s. (Zhotovitel) –

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva zhotovitele o postupu prací za sledované období 30. 9. - 17. 10. 2024
3. Zpráva zástupce generálního dozoru objednatele
4. Diskuze

1. Zahájení

Zástupce objednatele – pan Vybíral přivítal přítomné a přednesl program jednání. K přednesenému programu nebyly vzneseny námítky.

Smlouva o dílo mezi Objednatel a Zhotovitelem byla uzavřena dne 30. 9. 2024. Na základě výzvy Objednatele ze dne 1. 10. 2024 bylo protokolárně dne 2. 10. 2024 pracoviště předáno Zhotoviteli.

2. Zpráva zhotovitele

Zprávu zhotovitele o postupu prací ve sledovaném období přednesl

a) Inženýrská činnost

Ve sledovaném období probíhalo projednání podmínek vstupu na pozemky u obou vrtů.

b) Příprava panelových ploch pro relikvidaci sond

V rámci přípravných prací bylo u vrtu KL148 provedeno kácení lesního porostu a dále příprava, srovnání a odvodnění odlesněného prostoru pro budoucí panelovou plochu. Byly zahájeny prořezávky dřevin v trase plánované panelové komunikace.

c) Dohledání ústí starých sond

Ve sledovaném období bylo dohledáno ústí vrtu KL148.

d) Relikvidace sond

Ve sledovaném období nebyly provedeny žádné relikvidační práce.

e) Výhled prací

V následujícím období budou u vrtu KL148 probíhat přípravné práce – montáž panelové komunikace, montáž panelové plochy a budou započaty relikvidační práce.

U vrtu NP234 budou probíhat přípravné práce – zajišťování vstupů na pozemky, vytýčení, dohledání ústí vrtu (předpoklad říjen/listopad).

V následujícím období budou dokončeny přípravné práce u vrtu KL148, započeti relikvidačních prací je předpokládáno na přelomu měsíců října a listopadu. U vrtu NP234 budou probíhat přípravné práce – srovnání zemní pláně, příprava panelové komunikace, příprava panelové plochy a odkopání ústí vrtu.

Závěr

Průběh prací byl v souladu s prováděcí dokumentací.

Nutno konstatovat, že extrémní množství srážek v tomto regionu v průběhu měsíce září 2024 (zejména ve dnech 13. – 15. 9. 2024) výrazně ovlivnilo hydrogeologické podmínky v okolí vrtu KL148. S přihlédnutím k rozsahu a charakteru rekultivačních prací s výsadbou trvalých porostů u vrtu KL148, je zřejmé, že ukončení prací v termínu dle Smlouvy o dílo není reálné. V této souvislosti, požádal zástupce Zhotovitele  o prodloužení termínu plnění ve Smlouvě o dílo do 04/2025.

3. Generální dozor objednatele

Technický dozor objednatele bere na vědomí žádost o prodloužení termínu plnění ve smlouvě o dílo. Vzhledem k současnému stavu lokality a klimatickým podmínkám v jarních měsících běžného roku v tomto regionu, navrhuje úpravu termínu plnění na 05/2025. Souhlasí s dílčí fakturací za provedené činnosti a žádá o zasilání pravidelných reportů z relikvidačních prací.

4. Diskuze

- a) Zprávu Zhotovitele doplnil p. Vybíral. Na základě výsledků místního šetření, které bylo provedeno dne 3. 10. 2024 je nutno konstatovat, že přes náročnost terénu, klimatické, hydrogeologické a výškové podmínky v lokalitě přípravné práce probíhají v souladu s projektovou dokumentací, urgentně a bez prodlev. Kácení bylo provedeno šetrně a účelně, množství pokácených dřevin je rovněž v souladu s předpokladem dle projektové dokumentace.
- b) Zástupce Objednatele prověřil možnost přípravy dodatků smluv o dílo, a to v následujícím pořadí:
 - I. Možnost Dodatku č. 2 Prováděcí smlouvy o dílo k Rámcové dohodě mezi Objednatelem ČR – MŽP a Zhotovitelem společností „Likvidace SDD – PKÚ + GIS + DS – Oblast 2“. Předmětem dodatku bude změna termínu plnění – termínu předání kompletně dokončeného díla (Závěrečné zprávy) na 31. 5. 2025.
 - II. Možnost Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo mezi Objednatelem DIAMO s. p. a Zhotovitelem MND Drilling & Services a. s. Předmětem dodatku bude změna termínu plnění – termínu předání kompletně dokončeného díla (Závěrečné zprávy) na 30. 4. 2025 a dále změna v platebních

podmínkách a fakturaci, pro umožnění způsobu dílčí fakturace za provedené činnosti.

- c) Zástupce Objednatele oznámil splnění podmínky stanovené Rozhodnutím OBÚ Ostrava o povolení hornické činnosti – předložení projektu likvidace vrtů NP234 a KL148 provozovateli podzemního zásobníku plynu Štramberk k vyjádření. Hornická činnost může být zahájena až po odsouhlasení projektu (signaci) závodním provozovatele PZP.

Na dnešním kontrolním dni nebyly vzneseny žádné další náměty do diskuze.


Příští KD je stanoven na čtvrtek 7. 11. 2024 v 10:00 hodin.



Příloha č. 2: Fotodokumentace z KD č. 3

Zabezpečení dvou vrtů KL 148 a NP 234

Obr. 1

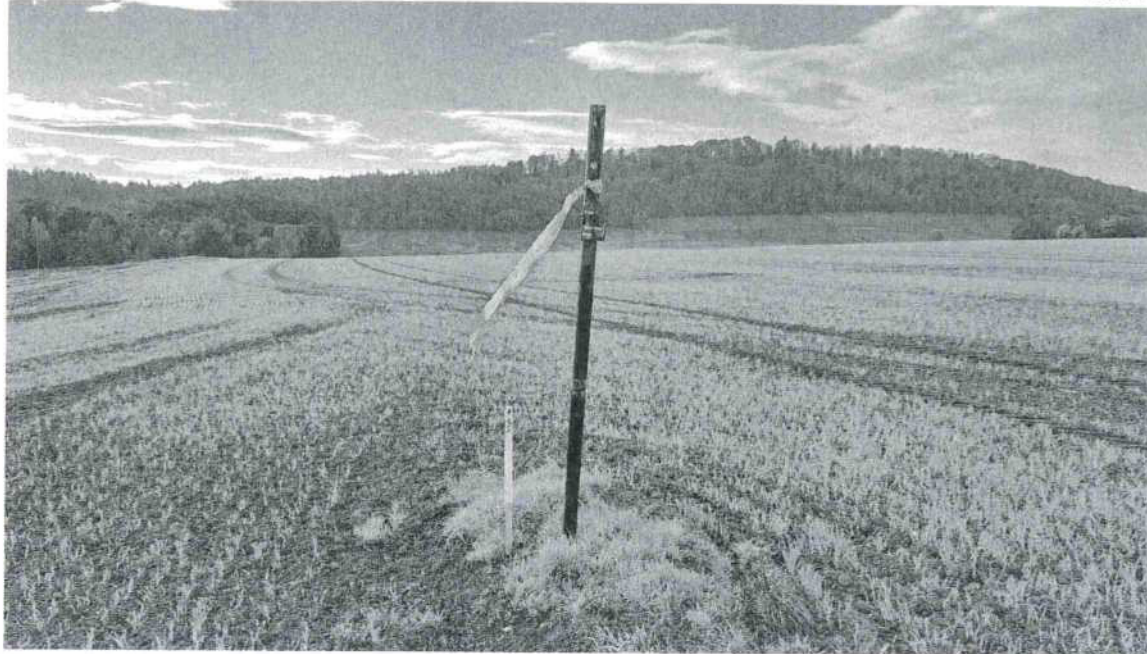

Stav na lokalitě během KD č. 3, vrt NP 234 Libhošť, před zahájením

Zabezpečení dvou vrtů KL 148 a NP 234

Obr. 2



Stav na lokalitě během KD č. 3, vrt KL 148 Ženkla, komunikace připravena na návoz mechanizace

Zabezpečení dvou vrtů KL 148 a NP 234

Obr. 3



Stav na lokalitě během KD č. 3, vrt KL 148 Ženklava, zbudovaná panelová komunikace, bypass na centrální plochu

Zabezpečení dvou vrtů KL 148 a NP 234

Obr. 4



Stav na lokalitě během KD č. 3, vrt KL 148 Ženklava, zbudovaná panelová komunikace, bypass na centrální plochu

Zabezpečení dvou vrtů KL 148 a NP 234


Obr. 5



Stav na lokalitě během KD č. 3, vrt KL 148 Ženklava, zbudovaná panelová komunikace, realizace centrální plochy

Zabezpečení dvou vrtů KL 148 a NP 234

Obr. 6

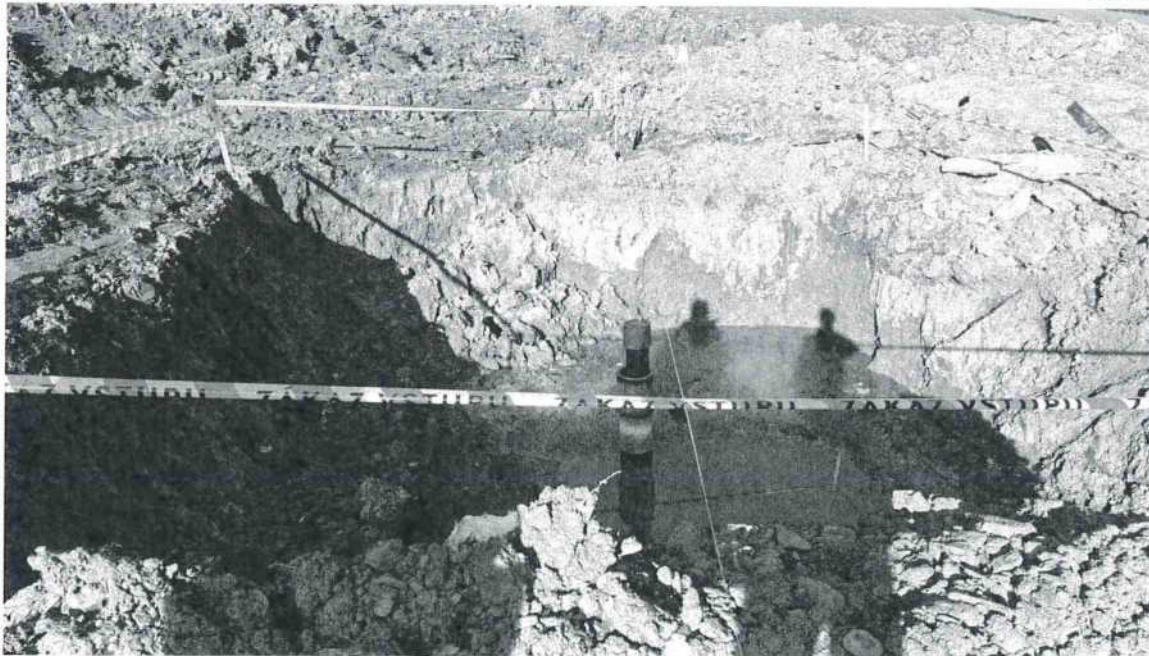

Stav na lokalitě během KD č. 3, vrt KL 148 Ženklava, dohledána pažnice vrtu, příprava na zbudování „sklepa“

