

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-10/1073/200/20/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RC/2021/215 (Správce společnosti)
2021/1014/0976 (Společník č. 2)

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 3“


ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy“

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace
Se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Kontaktní osoba: 
(dále jen „Objednatel“)

a

II. „Společnost Choceň – České Libchavy“

Správce společnosti: STRABAG a.s.

Zastoupená: Ing. Pavel Klas, prokurista
Ing. Karel Klofáč, prokurista
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

E-mail: vlasta.svobodova@strabag.com

Ing. Zdeněk Kaška – stavbyvedoucí a vedoucí PJ (tel. 731 549 496, zdenek.kaska@strabag.com)

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí Oblasti TB/ BI (tel. 602 188 868)

Ing. Vlasta Svobodová, ekonomický vedoucí oblasti TB/ BI (tel. 602 554 039)

Ing. Marek Hurych – asistent stavbyvedoucího (tel. 603 890 074, marek.hurych@strabag.com)

Petr Šrajer, DiS – asistent stavbyvedoucího (tel. 731 593 389, petr.srajer@strabag.com)

Lukáš Sekanina – asistent stavbyvedoucího (tel. 703 137 246, lukas.sekanina@strabag.com)

Společník č. 2: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupená: Petrem Janečkem, DiS, členem představenstva

Sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361,

DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 1441

bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 2106299978/2700

E-mail: ales.kroupa@cht-pce.cz

Zástupce zhotovitele: Petr Janeček, DiS, člen představenstva

Richard Čapek, prokura a ředitel divize silničních staveb

David Zlesák, výrobní náměstek

Ing. Lukáš Vondra – stavbyvedoucí (tel. 606 062 827, lukas.vondra@cht-pce.cz)

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 01.02.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.: SMLO-10/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy“ (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelům v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).
2. Součástí Smlouvy jsou Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelům (FIDIC FIRST EDITION 1999) - Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelům - Zvláštní podmínky (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, První vydání 2020) (dále jen „Smluvní podmínky“).
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jednotlivé změny, které jsou podkladem pro tento dodatek by neumožnily účast jiných dodavatelů ani by nemohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevedou ani k významnému rozšíření rozsahu plnění Veřejné zakázky.

II.

Smluvní strany prohlašují, že v důsledku jednotlivých ZBV, které jsou přílohou tohoto dodatku, došlo ke změně Smluvní ceny v odstavci 2 Smlouvy. Smluvní cena tak po započtení těchto změn činí:

Smluvní cena v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Smluvní cena včetně DPH 21 % v Kč
199 304 673,30	41 853 981,39	241 158 654,69

III.

Změna smluvní ceny se zvýšila celkem o 126.509,01 Kč bez DPH na základě dodatečných prací a vypuštěných prací. Odůvodnění jednotlivých změn a jejich zařazení podle § 222 ZZVZ je obsaženo v jednotlivých ZBV, které jsou přílohou tohoto dodatku.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zveřejní Objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz dodatku ke Smlouvě včetně příloh a metadat byly zveřejněny v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

ZBV č. 4, ZBV č. 7, ZBV č. 8, ZBV č. 9, ZBV č. 10 a ZBV č. 11 vč. odůvodnění.

[PODPISY SMLUVNÍCH STRAN NÁSLEDUJÍ NA DALŠÍ STRANĚ]

V Pardubicích dne

Za Objednatele:

Ing. Zdeněk Vašák
Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.11.20
15:31:04 +01'00'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

V Hradci Králové dne

Za Zhotovitele:

Ing. Pavel Klas
Podepsal Ing. Pavel Klas
DN: cn=Ing. Pavel Klas, c=CZ,
email=pavel.klas@strabag.com
Datum: 2024.11.22 13:07:46
+01'00'

Ing. Pavel Klas
prokurista
STRABAG a.s.

Ing. Karel Klofáč
Podepsal Ing. Karel Klofáč
DN: cn=Ing. Karel Klofáč,
c=CZ,
email=karel.klofac@email.cz
Datum: 25.11.2024

Ing. Karel Klofáč
prokurista
STRABAG a.s.



Digitálně podepsal
Petr Janeček, DiS.
Datum: 2024.11.26
13:54:33 +01'00'

Petr Janeček, DiS
člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.



Podepsal Ing.
Zdeněk Kaška

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	04
Evidenční číslo a název stavby:	Modernizace silnice II/312 Choceň - České Libchavy - Z2021-034900
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - km 0,000 00 - km 2,120 33
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 101 - km 0,000 00 - km 2,120 33
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	2 / 3	
Změnový list (§222, odst. (7))	1 / 5	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (7))	1 / 6	
Přehled změn stavby	1 / 7	
Soupis prací	41 / 8	
Přehled nových položek	1 / 49	
01_Návrh Variace - změna technologie	4 / 50	
02 Pokyn změna technologie	17 / 54	
05_Geodetické protokoly	30 / 71	
06_Foto	10 / 101	
07_Zkousky	26 / 111	
08_Zápis z kontrolního č.5	4 / 137	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy - Z2021-034900 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - km 0,000 00 – km 2,120 33	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 04
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 01.02.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice VII

Zhotovitel: Společnost Choceň - České Libchavy

Kačírkova 982/4, 15800 Praha 5

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

1

CDE

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tento změnový list obsahuje optimalizaci konstrukčních vrstev vlivem nedostatečného rozsahu provedeného průzkumu konstrukce vozovky, který nepodchytí skutečnou skladbu stávajících konstrukcí v některých úsecích stavby.

V km 0,000-0,098 byla po odfrézování dle PD objevena velká mocnost zbývajících asfaltových vrstev. Projekt v tomto úseku navíc navrhoval podélné narovnání nivelety. Proto po dohodě s investorem bylo rozhodnuto, že tento úsek z důvodu bezporuchového stavu a vizuálně mocné konstrukce nebude dle PD sanován a bude provedena pouze reprofilace recyklací za studena RS CA tl. 250 mm, aby byly rozebrány všechny zbývající asfaltové vrstvy a niveleta byla řádně reprofilována dle nového návrhu. Tento úsek komunikace byl dle historických map dodělán až dodatečně, proto zde nebylo objeveno ani štětové podloží a bohužel průzkum konstrukce vozovky v tomto úseku nebyl proveden.

V km 0,098-0,190 zhotovitel po odfrézování asfaltových vrstev objevil žulovou dlažbu na vrstvě ze štěrkopísku a štětovém podloží. Po domluvě s investorem byla dlažba vytěžena, očištěna a uložena na SÚS Běstovice. Stávají k-ce byla očištěna až na úroveň štětu a nové konstrukční vrstvy v tomto úseku byly provedeny dle PD.

Sanace krajů vozovky byly provedeny dle potřeby až od km 0,145 na levé straně komunikace, kde byl štět rozvolněn pracemi na zhotovení odvodnění. Na pravé straně komunikace až od km 0,250, kde již nebyl štět dostatečně široký pro budoucí vozovku, jak předpokládala PD. Únosnost štětu byla na několika místech ověřena SZZ. Sanace krajů dle PD byly provedeny až do km 1,670, od kterého je již řešena sanace podloží ZBV č. 12 - stabilizace podloží. Navíc se v průběhu stavby objevila i některá místa, kde nebyl štět dostatečně únosný a byla potřeba jeho sanace i v ose vozovky, toto ZBV řeší ZMĚNOVÝ LIST č. 08 - sanace štětu v ose.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 891 594,13 Kč	684 512,74 Kč	- 207 081,39 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek

TDS

AD

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba

Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk)

Zhotovitel

Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 04

Evidenční číslo a název stavby: Z2021-034900 - Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - km 0,000 00 – km 2,120 33								č. 01					
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - km 0,000 00 – km 2,120 33								Změna položek podle §222, odst. (6)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	12 419,324	11 895,944	-523,380	151,33 Kč	1 879 416,30 Kč	- 79 203,10 Kč	0,00 Kč	1 800 213,20 Kč	- 79 203,10 Kč	-4,21%
3	014121.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	1 409,300	1 238,400	-170,900	182,91 Kč	257 775,06 Kč	- 31 259,32 Kč	0,00 Kč	226 515,74 Kč	- 31 259,32 Kč	-12,13%
6	11332.1	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	4 633,488	4 365,108	-268,380	131,75 Kč	610 462,04 Kč	- 35 359,07 Kč	0,00 Kč	575 102,97 Kč	- 35 359,07 Kč	-5,79%
10	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	1 409,300	1 238,400	-170,900	523,42 Kč	737 655,81 Kč	- 89 452,48 Kč	0,00 Kč	648 203,33 Kč	- 89 452,48 Kč	-12,13%
13	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 731,740	1 998,240	266,500	647,59 Kč	1 121 457,51 Kč	0,00 Kč	172 582,74 Kč	1 294 040,25 Kč	172 582,74 Kč	15,39%
15	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	4 467,488	4 212,488	-255,000	181,16 Kč	809 330,13 Kč	- 46 195,80 Kč	0,00 Kč	763 134,33 Kč	- 46 195,80 Kč	-5,71%
22	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	4 856,660	4 601,660	-255,000	18,50 Kč	89 848,21 Kč	- 4 717,50 Kč	0,00 Kč	85 130,71 Kč	- 4 717,50 Kč	-5,25%
26	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	8 830,850	8 314,850	-516,000	10,32 Kč	91 134,37 Kč	- 5 325,12 Kč	0,00 Kč	85 809,25 Kč	- 5 325,12 Kč	-5,84%
34	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	4 435,425	4 177,425	-258,000	817,85 Kč	3 627 512,34 Kč	- 211 005,30 Kč	0,00 Kč	3 416 507,04 Kč	- 211 005,30 Kč	-5,82%
35	21461E	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2	M2	516,000	0,000	-516,000	73,85 Kč	38 106,60 Kč	- 38 106,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 38 106,60 Kč	-100,00%
42	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	15 083,430	14 161,430	-922,000	204,75 Kč	3 088 332,29 Kč	- 188 779,50 Kč	0,00 Kč	2 899 552,79 Kč	- 188 779,50 Kč	-6,11%
43	56330.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	821,108	765,508	-55,600	917,43 Kč	753 309,11 Kč	- 51 009,11 Kč	0,00 Kč	702 300,00 Kč	- 51 009,11 Kč	-6,77%
44	56330.2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	2 110,188	1 981,188	-129,000	861,87 Kč	1 818 707,73 Kč	- 111 181,23 Kč	0,00 Kč	1 707 526,50 Kč	- 111 181,23 Kč	-6,11%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						14 923 047,50 Kč	- 891 594,13 Kč	172 582,74 Kč	14 204 036,11 Kč	- 719 011,39 Kč	

Nové položky

	113482.N	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO ŽKM	M3	0,000	64,300	64,300	620,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	39 866,00 Kč	39 865,00 Kč	39 866,00 Kč	100,00%
	567554.N	VRST PRO OBNOVU A OPR. RECYK ZA STUD. CEM. A ASF. EM. TL. DO 250MM	M2	0,000	922,000	922,000	512,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	472 064,00 Kč	472 064,00 Kč	472 064,00 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	511 930,00 Kč	511 930,00 Kč	511 930,00 Kč	
		Celkem za všechny položky						14 923 047,50 Kč	- 891 594,13 Kč	684 512,74 Kč	14 715 966,11 Kč	- 207 081,39 Kč	
		Celkem za stavební objekt						32 708 416,21 Kč	- 891 594,13 Kč	684 512,74 Kč	32 501 334,82 Kč	- 207 081,39 Kč	

		Celkem za stavební objekt po všech změnách						32 708 416,21 Kč	- 2 301 430,56 Kč	2 041 240,42 Kč	32 448 226,07 Kč	- 260 190,14 Kč	
--	--	---	--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	-----------------	---------------------	-----------------	--

Za Zhotovitele: Ing.
Zdeněk
Kaška

Digitálně podepsal
dne: 16.11.2023
15:26:26

Za Objednatele:

Datum:

Datum: Ing.
Radim
Malát

Digitálně podepsal
Ing. Radim Malát
Datum: 2023.11.28
15:27:21 +01'00'

Změnový list změny dle §222, odst. (7) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy - Z2021-034900 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - km 0,000 00 – km 2,120 33	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 04
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 01.02.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice VII
Zhotovitel: Společnost Chuceň - České Libchavy Kačírkova 982/4, 15800 Praha 5

Přílohy změnového listu:

Paré č.	Příjemce
1	CDE

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tento změnový list obsahuje zhotovitelem podaný návrh na zlepšení, který obsahoval záměnu MZK za vrstvu recyklace za studena RS CA, tento návrh byl přijat a v úseku km 0,400-1,230, kde to úroveň štětových vrstev dovolila byla tato změna provedena. Konkrétně se jedná o položky:

odpočet:

014121.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)
56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM

záměna za:

12843 N PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II
567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM

Kromě finanční úspory tato změna zmenšila i skládkované množství materiálu, což má pozitivní vliv na udržitelnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 1 409 836,43 Kč	1 356 727,68 Kč	- 53 108,75 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek

TDS

AD

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba

Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk) jméno

Zhotovitel jméno

Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	07
Evidenční číslo a název stavby:	Modernizace silnice II/312 Choceň - České Libchavy - Z2021-034900
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - km 0,000 00 - km 2,120 33
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 101 - km 0,000 00 - km 2,120 33
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / 02

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	42 / 5	
Korespondence ohledně Variace	17 / 47	
foto pdf	8 / 64	
geod. zaměření drenáže Choceň	3 / 72	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy - Z2021-034900 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - km 0,000 00 – km 2,120 33	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 02	Číslo ZBV: 07
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 01.02.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice VII

Zhotovitel: Společnost Choceň - České Libchavy

Kačírkova 982/4, 15800 Praha 5

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

1

CDE

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci provádění výkopových prací v km 0,500 - 0,700 byl zjištěn vývěr vody. V návaznosti na tuto skutečnost, která byla oznámena Správci stavby dopisem, byl vydán pokyn k Variaci. Bylo navrženo provedení podélných drenáží pod úrovní parapláně v úseku cca km 0,500 - 0,700 LS a km 0,450 - 0,700 PS a nahrazení spodních 25 cm sanace AZ HDK frakcí 63/125. Provedením této Změny dojde k zajištění odtoku spodních vod do drenáží a funkčnosti konstrukčních vrstev bez ohrožení vodou.

Tato Změna byla zjištěna po provedení stavebních prací v předmětném úseku, PDPS s touto skutečností neuvažovala, jelikož podklady pro její zpracování nenaznačovaly výskyt tohoto zvodnělého místa. Jedná se o Změnu, kterou Zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat a z tohoto důvodu se jedná o Změnu zařazenou podle odst. 6 § 222 ZZVZ Změny z nepředvídaných důvodů.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 169 192,72 Kč	427 353,19 Kč	258 160,47 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek

TDS

AD

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatele dle Interní směrnice SÚS
Pk)

Zhotovitel

Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	08
Evidenční číslo a název stavby:	Modernizace silnice II/312 Choceň - České Libchavy - Z2021-034900
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - km 0,000 00 - km 2,120 33
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 101 - km 0,000 00 - km 2,120 33
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / 03

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	42 / 5	
0026_Oznámení_SO 101 _ RCRV	3 / 47	
Korespondence ohledně variace	2 / 50	
Foto	8 / 52	
Geodetické zaměření - sanace stětu	4 / 60	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy - Z2021-034900 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - km 0,000 00 – km 2,120 33	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 03	Číslo ZBV: 08
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 01.02.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice VII

Zhotovitel: Společnost Choceň - České Libchavy

Kačírkova 982/4, 15800 Praha 5

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

1

CDE

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tento změnový list vychází z nepředpokládaného zastižení porušeného štětového souvrství v ose komunikace. Dle zadávací dokumentace měla být provedena pouze sanace obou krajů komunikace v šíři 2,0-2,5m a středový štětový pás šířky 3,0-4,0m měl být zachován. Zhotovitel však v několika místech objevil tyto štětové vrstvy ve středovém pásu porušené, nebo jejich nevhodnou polohu. Z těchto dvou důvodů zhotovitel přistoupil k sanaci štětových vrstev i v ose komunikace, což je obsah tohoto ZBV.

Celkem se jednalo o 1 úsek v cca km 0,500 a 4 úseky v km 1,200-1,650.

Všechny úseky byly vysanovány stejnou technologií jako kraje vozovky. Odkop až po úroveň parapláňe, sanace AZ drceným kamenivem a doplnění konstrukční vrstvy ze ŠD 0/63. Všechny práce byly nafočeny a geodeticky zaměřeny.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	259 007,40 Kč	259 007,40 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek

TDS

AD

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba

Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)

Zhotovitel

Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	09
Evidenční číslo a název stavby:	Modernizace silnice II/312 Choceň - České Libchavy - Z2021-034900
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102.2 - km 2,753 00 - km 4,182 16
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 102.2 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	3 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	2 / 5	
Přehled změn stavby	1 / 7	
Soupis prací	42 / 8	
Přehled nových položek	1 / 50	
0027_Oznámení_SO 102.2 _ RCRV	2 / 51	
0032_Oznámení_SO 102.2 _ RCRV	6 / 53	
230906_Pokyn Správce stavby - kan. Mostek	2 / 59	
RDS km 3,100 00 - km 3,350 00	1 / 61	
RDS km 3,350 00 - km 3,550 00	1 / 62	
foto pdf	14 / 63	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy Z2021 034900	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.2 / 01	Číslo ZBV: 09
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102.2 - km 2,753 00 – km 4,182 16		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 01.02.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice VII

Zhotovitel: Společnost Choceň - České Libchavy

Kačírkova 982/4, 15800 Praha 5

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

1

CDE

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tento změnový list řeší opravu odvodnění v obci Mostek, kde se nepotvrdily předpoklady PD a bylo nutné v opravě odvodnění postupovat jinak.

1. První řešený úsek je v km 3,200-3,300PS, kde projekt dle informací od místních předpokládal propadnutou kanalizaci, jelikož se v minulosti v těchto místech pravidelně propadal a byl zasypán příkop, z tohoto důvodu AD navrhl výměnu kanalizace DN300 v délce 41m a zhotovení 3ks nových šachet.

Zhotovitel při realizaci otevřel dešťovou kanalizaci a zjistil, že je kompletně zanesená. Proto přistoupil k pročištění a kamerové prohlídce potrubí pro zjištění aktuálního stavu.

Při této kamerové prohlídce bylo zjištěno, že kanalizace je v poměrně dobrém stavu odpovídajícím její stáří, lokálně do ní sice prorůstají vlasečnicové kořeny, ale korespondencí s TDI, AD a TDS bylo dohodnuto, že je stav vyhovující a není potřeba její výměna. Nevýhovující stav byl však zjištěn v místě křížení s novou splaškovou kanalizací obce, provedenou v předešlých letech, kdy realizační firma tuto dešťovou kanalizaci v místě střetu zaslepila a pár let byl tento úsek kanalizace nucen fungovat jako vsak. To bylo pravděpodobně i důvodem velmi mokrého podloží a častých propadů, jelikož se pohybujeme v jílovitém podloží. Při kamerové prohlídce potrubí byly navíc objeveny i další zasypané revizní šachty kanalizace, které díky zaslepení pouze netěsnými PZD deskami mohly také způsobovat propady příkopu. Tyto šachty byly odhaleny a jejich oprava je řešena v rámci souběžné akce pro obec Mostek - Chodník podél II/312 Mostek.

Nakonec tedy z opravy kanalizace zůstala pouze potřeba rekonstrukce dešťové kanalizace DN300 v úseku pod křižovatkou km 3,270, kde bylo dohodnuto vybourání cca 8m stávající porušené betonové kanalizace a vybudování propojení šachet v km 3,265PS a 3,275LS dl. 15m. Kanalizace do těchto stávajících šachet byla napojena stávajícími otvory s obetonováním a na obě šachty byly nově osazeny litinové poklopy DN600 D400. Díky šikmému překopání křižovatky nedošlo ke střetu se splaškovou kanalizací a plynovodem v trase. U takto krátkého úseku opravy kanalizace bez nových revizních šachet nedává zkouška vodotěsnosti smysl, proto je odečtena.

Týká se pol. č.: 014111 (-32,098m3); 014121 (- 4,150m3); 129946 (172,000m); 13273 (-42,900m3); 17120 (-32,098m3); 17481 (-22,880m3); 17581 (-20,797m3); 87445 (-26,000m); 894858 (-3,000ks); 89911 (2,000ks); 899652 (-41,000m); 89980 (+131,000m); 96688 (0,000ks); 96711 (+0,008m3); 969245 (-33,000m);

2. Z důvodu souběhu akcí Modernizace II/312 a chodník podél II/312 Mostek vznikla potřeba vybudování dalšího odvodnění uličními vpustěmi v místě obruby. Tato problematika byla AD vyřešena v RDS, avšak do rozpočtu již zanesena nebyla, proto bude vyčíslena v tomto ZBV. Navíc byla do RDS doplněna obruba v km 3,170-3,230LS délky 60m. Konkrétně se tedy jedná o 60m betonové silniční obruby.

Doplnění uliční vpusti UV0 (km 3,210LS) s odtokem DN160 dl. 8m obetonován - komplet ZBV.

Obrubníková vpust' UVO1 (km 3,210PS) s odtokem DN160 dl. 2m- řešena v akci chodník podél II/312 Mostek.

Obrubníková vpust' UVO5 (km 3,230PS) s odtokem DN160 dl. 10m. - ZBV - posun do km 3,240PS a větší délka odtoku.

Uliční vpust' UV5 (km 3,260PS) s odtokem DN160 dl. 2m - dle SOD

Uliční vpust' UV (km 3,265PS) - pouze výšková úprava mříže ZBV

Týká se pol. č.: 014111 (20,280m3); 12573 (-26,250m3); 13173 (3,000m3); 13273 (17,280m3); 17120(20,280m3); 17481 (7,920m3); 17581 (9,077m3); 18222 (-175,000m2); 18242 (-175,000m2); 18247 (-175,000m2); 56364 (-14,000m2); 56960 (-6,000); 572321 (-14,000m2); 87433 (16,000m); 89712.1 (+1,000ks); 89922 (+1,000ks); 899523 (2,379m3); 917224 (60,000m)

3. V křižovatce v km 3,255LS bylo výškově upraveno plynovodní šoupě a v km 3,265PS osazen nový hydrantový a šoupátkový poklop + výškově upraveny poklopy splaškové kanalizace; v křižovatce km 3,480 LS byl ve výjezdu do obce výškově upraven poklop uzávěru vodovodu.

Týká se pol. č.: 89913 (2,000ks); 89921 (2,000ks); 89923 (4,000ks)

4. V navazujícím úseku stávajícího chodníku km 3,270-3,390PS byly z důvodu řádné sanace a doplnění drenáže komunikace odstraněny obruby, dlažba i vpusti a bylo nutné jejich zpětné osazení.

Obrubníková vpust' UVO (km 3,300PS) - pouze výšková úprava ZBV

Obrubníková vpust' UVO (km 3,330PS) - pouze výšková úprava ZBV

Obrubníková vpust' UVO (km 3,355PS) - pouze výšková úprava ZBV

Uliční vpust' UV6 (km 3,390PS) – rekonstrukce dle PD

Týká se pol. č.: 89922 (3,000ks)

5. Do UV6 měly být dle PD zaústěny nově osazené žlabovky v km 3,880-3,440PS, tyto žlabovky na přání obce Mostek a odsouhlasení AD, TDI a TDS nebudou osazeny, pouze bude upraven stávající rigol.

Týká se pol. č.: 935212 (-52,000m)

6. A v posledním úseku stávajícího chodníku v km 3,450-3,550PS byly z důvodu řádné sanace podloží a objevení velmi mělké porušené

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy - Z2021-034900 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102.2 - km 2,753 00 – km 4,182 16	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.2 / 01	Číslo ZBV: 09
--	---	----------------------

betonové kanalizace také všechny kanalizační vstupy dočasně odstraněny a provedeny dle dohody a dle nového návrhu. Konkrétně:

Uliční vpusť UV7 (km 3,480PS) posun dle požadavku AD o 11m z km 3,490PS (do nejnižšího místa) + odtok DN160 dl.11m + bylo doplněno odvodnění stáv. vpustí u RD dl. 6m

Kanalizační šachta Š1 (km 3,490PS) jednalo se o dvoupatrovou šachtu, horní polovina byla vybourána, napojena UV7, osazena skruž, přechodová deska a litinový poklop DN600 D400.

Kanalizační šachta Š2 (km 3,490LS) na stávající šachtu osazen a výškově upraven kanalizační poklop DN600 D400.

navíc na požadavek obce a majitele přilehlé nemovitosti byla v km 3,475-3,500LS (podél oplocení ČP 1) doplněná silniční obruba délky 26m a mezi obrubou a oplocením doplněno 75m² ornice a osetí. Dále u ČP 32 z důvodu zvětšení bezpečnosti u svahu doplněno dalších 5m silniční obruby v km

Ve sjezdech k ČP 1 nebyly z důvodu nedostatečných výškových spádů osazeny přejezdové obruby, ale bylo provedeno jejich zaasfaltování (asfaltové vrstvy a asf. záhlavka budou řešeny doměrky k SOD).

UV8 (km 3,505) rekonstrukce beze změny s napojením 2m

V km 3,475-3,550 byla v pravé straně komunikace vybourána stávající mělká, porušená, betonová dešťová kanalizace dl. 72m a rýha po kanalizaci vysanována drceným kamenivem ŠD 0/150.

Původní UV9 (km 3,515) byla společně s dešťovou kanalizací odstraněna a nově provedena tato UV v km 3,530PS s napojením dl. 9m do původní UV10, potrubí bylo obetonováno.

Šachta UV10 (km 3,525) byla zachována, pouze byla mříž UV nahrazena celoděrovaným kanalizačním poklopem DN600 D400.

UV11 byla dle PD zrekonstruována

Jako náhrada za odstraněnou dešťovou kanalizaci byla do rýhy umístěna drenáž, která je zaústěna do odtoků uličních vpustí, ale je řešena s ostatními drenážemi z tohoto objektu v ZL 10 Úprava technologie sanace podloží.

Týká se pol. č.: 014111 (44,797m³); 014121.1 (9,072m³); 12573 (11,250m³); 13173 (2,000m³); 13273 (42,797m³); 17120 (44,797m³); 17481 (8,910m³); 17581 (10,212m³); 18222 (75,000m²); 18242 (75,000m²); 18247 (75,000m²); 21452 (32,400m³); 87433 (18,000m); 89911G (3,000ks); 89921 (2,000ks); 899523 (2,676m³); 917224 (27,000m); 869245 (72,000m)

7. Příčný propustek v km 3,114 byl v situaci stavby označen jako plastová korugovaná trouba, ve vzorových příčných řezech se jednalo u železobetonovou troubu s betonovou přechodovou deskou z důvodu nedostatečného krytí. V realitě na stavbě bylo zjištěno, že troubu je možné uložit s dostatečným krytím, proto bylo s AD dohodnuto, že trouba bude použita plastová bez přechodové desky.

Týká se pol. č.: 43032 (-3,648m³); 420366 (-0,292t); 9183B2 (-9,500m); 9183B3 (9,500m)

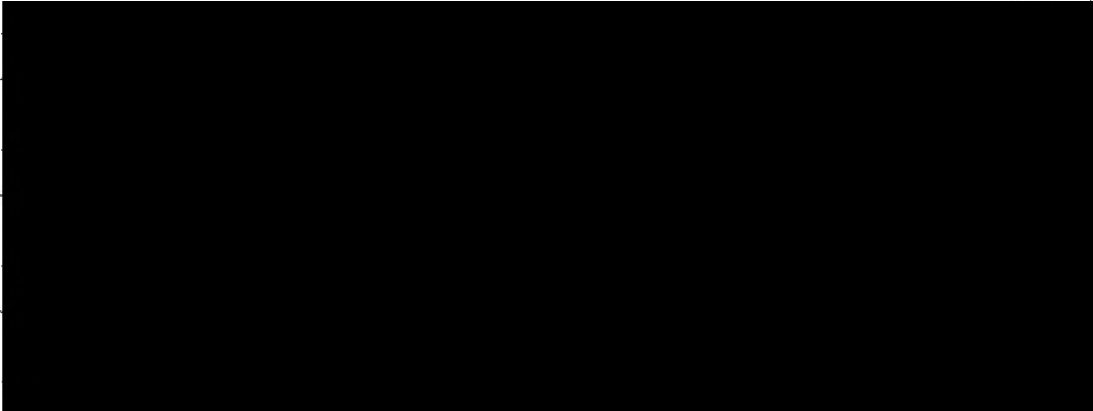
8. Poslední věc kterou toto ZBV obsahuje je zaslepení vtoku dešťové kanalizace na výjezdu z křižovatky v km 3,550 směr Brandýs nad Orlicí, cca 50m za řešeným úsekem na PS komunikace a nahrazení tohoto odtoku vsakem do podloží.

Týká se pol. č.: 014111 (6,000m³); 12573 (1,500m³); 13173 (6,000m³); 17120 (6,000m³); 18222 (10,000m²); 18242 (10,000m²); 18247 (10,000m²); 21152 (6,000m³) 21197(26,400m²); 451315 (+0,500m³)

Údaje v Kč bez DPH:


Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 260 561,64 Kč	389 661,79 Kč	129 100,15 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	
TDS	
AD	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy - Z2021-034900 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102.2 - km 2,753 00 – km 4,182 16	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.2 / 01	Číslo ZBV: 09
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)		
Zhotovitel		
		Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	10
Evidenční číslo a název stavby:	Modernizace silnice II/312 Choceň - České Libchavy - Z2021-034900
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102.2 - km 2,753 00 - km 4,182 16
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 102.2 / 02

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (5))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (5))	1 / 3	
Změnový list (§222, odst. (7))	1 / 4	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (7))	1 / 5	
Přehled změn stavby	1 / 6	
Soupis prací	43 / 7	
Přehled nových položek	1 / 50	
Oznámení_SO 102.2 _ RCRV	3 / 51	
Pokyn Správce stavby Variace parapláň Mostek	2 / 54	
Geodetické zaměření	14 / 56	
Foto	9 / 70	
Zkoušky	4 / 79	

Změnový list změny dle §222, odst. (5) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice II/317 Choceň – České Libchavy - Z2021-034900 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102.2 - km 2,753 00 – km 4,182 16	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.2 / 02	Číslo ZBV: 10
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 01.02.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice VII

Zhotovitel: Společnost Choceň - České Libchavy

Kačírkova 982/4, 15800 Praha 5

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

1

CDE

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tento změnový list upravuje sanace podloží v intravilánu obce Mostek, v celém úseku obce bylo zastiženo zavlhlé, místy mokré jílovité podloží, z tohoto důvodu zhotovitel doporučil v celém úseku obce doplnit odvodnění zemní plně drenáží, jelikož příkopy v intravilánu jsou mělké, nebo žádné. Tento návrh SS odsouhlasil a tento změnový list obsahuje vyčíslení úpravy. Navíc do této úpravy zhotovitel zahrnul i uložení a poplatek za skládku pro výkopek z travivodů dle SOD, který chybně nebyl v těchto položkách zahrnut. Všechny práce jsou geodeticky zaměřeny.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	209 398,34 Kč	209 398,34 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Domínka Digitálně

Správce stavby

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek

TDS

AD

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatele dle Interní směrnice SÚS
Pk)

Zhotovitel

Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 10

Evidenční číslo a název stavby: Z2021-034900 - Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102.2 - km 2,753 00 – km 4,182 16								č. 02					
Číslo a název rozpočtu:								Změna položek podle §222, odst. (5)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	8 702,791	8 821,991	119,200	151,33 Kč	1 316 993,36 Kč	0,00 Kč	18 038,54 Kč	1 335 031,90 Kč	18 038,54 Kč	1,37%
20	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	4 998,690	5 117,890	119,200	18,50 Kč	92 475,77 Kč	0,00 Kč	2 205,20 Kč	94 680,97 Kč	2 205,20 Kč	2,38%
28	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	168,000	596,000	428,000	441,95 Kč	74 247,60 Kč	0,00 Kč	189 154,60 Kč	263 402,20 Kč	189 154,60 Kč	254,76%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						1 483 716,73 Kč	0,00 Kč	209 398,34 Kč	1 693 115,07 Kč	209 398,34 Kč	
		Celkem za stavební objekt						22 428 322,71 Kč	0,00 Kč	209 398,34 Kč	22 637 721,05 Kč	209 398,34 Kč	
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						22 428 322,71 Kč	- 1 065 074,40 Kč	1 178 030,13 Kč	22 541 278,44 Kč	112 955,73 Kč	


Za Zhotovitele: **Ing. Zdeněk Kaška**

Digitálně podepsal
dne: 28.11.2023
15:35:56

Za Objednatele:

Datum:

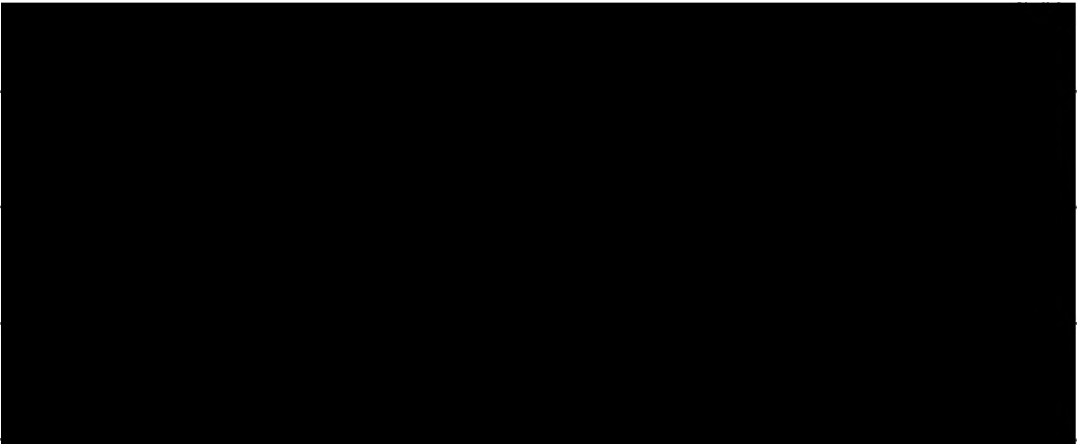

Datum:

Změnový list změny dle §222, odst. (7) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy - Z2021-034900 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102.2 - km 2,753 00 – km 4,182 16		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.2 / 02	Číslo ZBV: 10
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 01.02.2023 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice VII Zhotovitel: Společnost Choceň - České Libchavy Kačírkova 982/4, 15800 Praha 5			
Přílohy změnového listu:		Paré č. 1	Příjemce CDE
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Tento změnový list upravuje sanace podloží v intravilánu obce Mostek, v celém úseku obce bylo zastiženo zavlhlé, místy mokré jílovité podloží, z tohoto důvodu byl na SS zaslán návrh na zlepšení, kdy zhotovitel navrhl vypuštění separační geotextilie a navrhl záměnu spodní poloviny sanace tl. 25cm za sanaci lomovým kamenem, se kterým má zhotovitel v takovýchto složitých podmínkách lepší zkušenosti. Navíc v km 3,475-3,550 v křižovatce na konci úseku Etapy I, byla v úrovni zemní pláně zastižena k-ce původní komunikace, z tohoto důvodu byla vysanována pouze pravá strana křižovatky, kde se nacházela nevhodně umístěná dešťová kanalizace, to je však součástí ZBV č. 09. Tento návrh SS odsouhlasil a tento změnový list obsahuje vyčíslení úpravy. Změna obsahuje kompletní záměnu spodní vrstvy sanace v intravilánu obce Mostek (do km 3,600), která zasahuje i do Etapy II (3,550-3,600), bude tedy fakturována postupně dle provedeného množství. Byly schváleny body návrhu na zlepšení podle Smlouvy, konkrétně se jedná o vypuštění: 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 617m3 - 504 613,95,- 21451 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 4027m2 - 297 393,65,- záměna za položku dle ceníku OTSKP 2021: 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE 617m3 +579 980,00,- Předpokládaná úspora tohoto návrhu na zlepšení je 222 027,40 Kč bez DPH.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 802 007,40 Kč	579 980,00 Kč	- 222 027,40 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
TDS			
AD			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			
			Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	11
Evidenční číslo a název stavby:	Modernizace silnice II/312 Choceň - České Libchavy - Z2021-034900
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102.2 - km 2,753 00 - km 4,182 16
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 102.2 / 03

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (7))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (7))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	44 / 5	
Přehled nových položek	1 / 49	
Návrh zlepšení RCRV_033	2 / 50	
230914_Pokyn S	2 / 52	
Receptura RS CA tl. 180mm	4 / 54	
Geodetické zaměření	3 / 58	
Zkoušky RS CA Mostek	2 / 61	
Foto	7 / 63	

Změnový list změny dle §222, odst. (7) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice II/312 Chocẽň – České Libchavy - Z2021-034900 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102.2 - km 2,753 00 – km 4,182 16		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.2 / 03	Číslo ZBV: 11
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 01.02.2023 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice VII Zhotovitel: Společnost Chocẽň - České Libchavy Kačírkova 982/4, 15800 Praha 5			
Přílohy změnového listu:		Paré č. 1	Příjemce CDE
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Tento změnový list obsahuje zhotovitelem podaný návrh na zlepšení, který obsahoval záměnu MZK za vrstvu recyklace za studena RS CA, tento návrh byl přijat a v úseku km 3,124-3,598, v rámci Etapy I byla tato změna provedena v km 3,124-3,550, Úsek km 3,550 - 3,598 bude v rámci Etapy II dokončen v roce 2024, tato změna však upraví celý úsek. Konkrétně se jedná o položky: odpočet: 014121.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) (v tomto objektu není dostatečné množství penetračního makadamu, zcházející množství bude odečteno v rámci ZBV 14 z objektu SO101) 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNĚHO KAMENIVA TL. DO 150MM záměna za: 12843 N PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM Kromě finanční úspory tato změna zmenšila i skládkované množství materiálu, což má pozitivní vliv na udržitelnost.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 1 123 411,63 Kč	876 471,82 Kč	- 246 939,81 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
TDS			
AD			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			
			Číslo paré:
