



DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO SOD/01084/2023/ORM ZE DNE 25.1.2024

Víceúčelové hřiště v Kuří u Říčán

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

OBJEDNATEL:

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

identifikátor datové schránky:

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:

osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních:

Technický dozor stavebníka (TDS):

tel., email :

dále „Objednatel“

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Ing. Davidem Michaličkou, starostou města

KB, a.s., pobočka Říčany

00240702

CZ00240702

Skjbfwd

Ing. Štěpánka Šritrová

Ing. Soňa Příkazská, sona.prikazska@ricany.cz

Ing. David Michalička, starosta města

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:

Zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

tel.:

e-mail

dále „Zhotovitel“

VYSSPA – Sports Technology s.r.o.

Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

Jaroslavem Karáskem, jednatelem

Komerční banka a.s.

27967638

DIČ27967638

lysbi7

Petr Winkelhofer, manažer stavební výroby

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)



Článek 1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran ohledně předmětu a ceny díla, tak jak je uvedeno níže.

Článek 2. Předmět plnění

2.1. V průběhu realizace stavby došlo mezi objednatelem a zhotovitelem ke sporu ohledně provedení oplocení víceúčelového hřiště. Předmětem sporu je otázka, zda má zhotovitel dle smlouvy o dílo povinnost provést pouze síťové oplocení anebo síťové oplocení s dřevěnými mantinely, jejichž realizace je o 98 000 Kč nákladnější. Zhotovitel je názoru, že v nabídce oceňoval a předmětem díla je oplocení síťové, objednatel tvrdí, že z nabídky vyplývá, že oplocení má mít též dřevěné mantinely. Objednatel trvá na oplocení hřiště včetně dřevěných mantinelů, což dle vyjádření zhotovitele znamená 98 000,00 Kč vícenákladů. Vzhledem k tomu, že se smluvní strany ani po delším vyjednávání neshodly, směřoval spor k soudní žalobě. Jelikož však ani jedna smluvní strana nemá zájem řešit tento spor soudní cestou, a je zájem dokončit stavební práce v co nejkratším termínu, došlo k dohodě smluvních stran tak, že oplocení víceúčelového hřiště bude provedeno v kombinaci dřevěných mantinelů ve spodní části oplocení a síťového oplocení v horní části oplocení, kdy každá ze smluvních stran ponese 50 % shora uvedených vícenákladů.

Technický popis oplocení, které bude předmětem díla v souladu s tímto dodatkem a vyčíslení vícenákladů jsou přílohou tohoto dodatku.

Článek 3. Doba provádění díla

3.1. Shora uvedená změna má vliv na termín dokončení stavebních prací. Objekt víceúčelového hřiště ve smyslu dohody dle tohoto dodatku bude dokončen a objednateli předán do 7 týdnů od podpisu tohoto dodatku. Termín dokončení stavebních prací se prodlužuje o dobu projednávání shora uvedeného sporu, který byl ukončen dohodou smluvních stran dne 31. 10. 2024, dále o dobu nutnou k uzavření tohoto dodatku a o dobu 7 týdnů, které jsou nutné k výrobě dřevěných mantinelů.

Článek 4. Cena díla

4.1. **Původní cena** díla byla dohodou smluvních stran stanovena v odst. 3.2. smlouvy ve výši:

		bez DPH	včetně DPH
3.2.1	Za vypracování a odevzdání jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle odst. 1.3.1 této smlouvy v příslušném počtu paré dle smlouvy; TATO ČÁST CENY TVOŘÍ MAXIMÁLNĚ 10 % z celkové ceny díla (PD + realizace Stavby)	80 000,00	96 800,00
3.2.2	Za realizaci Stavby v souladu s PD dle odst. 1.3.2 této smlouvy	1 309 422,56	1 584 401,30
3.2.3	Celkem za realizaci díla dle článku 1 této smlouvy (PD + realizace Stavby)	1 389 422,56	1 681 201,30



4.2. Změna ceny díla:

Celková cena víceprací dle tohoto dodatku: 49 000,00 Kč bez DPH.

Celková cena méněprací dle tohoto dodatku: 0,00 Kč

Celková cena díla dle tohoto dodatku se navyšuje o: 49 000,00 Kč bez DPH, tj. 59 290,00 Kč včetně DPH.

4.3. Z důvodů shora uvedených se odst. 3.2. smlouvy o dílo mění takto:

		bez DPH	včetně DPH
3.2.1	Za vypracování a odevzdání jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle odst. 1.3.1 této smlouvy v příslušném počtu paré dle smlouvy; TATO ČÁST CENY TVOŘÍ MAXIMÁLNĚ 10 % z celkové ceny díla (PD + realizace Stavby)	80 000,00	96 800,00
3.2.2	Za realizaci Stavby v souladu s PD dle odst. 1.3.2 této smlouvy	1 358 422,56	1 643 691,29
3.2.3	Celkem za realizaci díla dle článku 1 této smlouvy, ve znění tohoto dodatku (PD + realizace Stavby)	1 438 422,56	1 740 491,29

Zhotovitel je plátcem DPH, daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění v době realizace díla. V době podpisu smlouvy činila výše DPH 21 %

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.

5.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

5.3. Tento dodatek je podepsán všemi smluvními stranami elektronicky.

5.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

5.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

5.6. Tento dodatek schválila rada města usnesením č. 24-47-007 ze dne 14.11.2024

Příloha: technický popis mantinelového oplocení



V Říčanech

Ing. David Michalička Digitálně podepsal
Ing. David Michalička
Datum: 2024.11.20
09:47:17 +01'00'

za objednatele

Ing. David Michalička
starosta

V Praze

Jaroslav Karásek Digitálně podepsal
Jaroslav Karásek
Datum: 2024.11.26
09:49:29 +01'00'

za zhotovitele

Jaroslav Karásek
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba:

Víceúčelové hřiště v Kuří u Říčan

Číslo projektu:

Objednatel:

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDI):

LNConsult s.r.o.
U hřiště 250
250 83 Škvorec
IČ: 29136504

Zhotovitel:

VYSSPA – Sports Technology s.r.o.
Skladová 2438/6
326 00 Plzeň - Východní Předměstí
IČ: 27967638

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: **1**

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	☐
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	☐
	ZAMÍTNUTO	☐

Změna se týká těchto SO, PS: SO 01 – Realizace stavby

Změnu požaduje: Objednatel/Zhotovitel

- na základě čeho: uceleného díla

Stručný popis změny: V průběhu realizace stavby došlo mezi objednatelem a zhotovitelem ke sporu ohledně provedení oplocení víceúčelového hřiště. Předmětem sporu je, zda má zhotovitel dle smlouvy o dílo povinnost provést pouze síťové oplocení anebo síťové oplocení s dřevěnými mantinely, jejichž realizace je o 98 000 Kč nákladnější. Zhotovitel je názoru, že v nabídce oceňoval a předmětem díla je oplocení síťové, objednatel tvrdí, že z nabídky vyplývá, že oplocení má mít též dřevěné mantinely. Objednatel trvá na oplocení hřiště včetně dřevěných mantinelů, což dle vyjádření zhotovitele znamená 98 000,00 Kč vícenákladů. Vzhledem k tomu, že se smluvní strany ani po delším vyjednávání neshodly, směřoval spor k soudní žalobě. Jelikož však ani jedna smluvní strana nemá zájem řešit tento spor soudní cestou, a je zájem dokončit stavební práce v co nejkratším termínu, došlo k dohodě smluvních stran tak, že oplocení víceúčelového hřiště bude provedeno v kombinaci dřevěných mantinelů ve spodní části oplocení a síťového oplocení v horní části oplocení, kdy každá ze smluvních stran ponese 50 % shora uvedených vícenákladů.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:

ANO

☐

NE

☒

Časový dopad na stavbu:

ANO

☒

NE

☐

Cena stavby dle smlouvy o dílo bez DPH:

1 389 422,56 Kč

Náklady na změnu dle ZL č. 01 bez DPH:

+ 49 000,00 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 01 bez DPH:

1 438 422,56 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
PD	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč
Realizace	1 309 422, 56 Kč	1 309 422,56 Kč	49 000,00 Kč	0,00 Kč	1 358 422,56 Kč
Total/ Celkem	1 389 422,56 Kč	1 389 422,56 Kč	49 000,00 Kč	0,00 Kč	1 438 422,56 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: Datum: Podpis (razítko)

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele):

Doporučuji

☐

Nedoporučuji

☐

Jméno: Datum: Podpis (razítko)

3/ Stanovisko Správce stavby (TDS):

Doporučuji

☐

Nedoporučuji

☐

Jméno: Datum: Podpis (razítko)

Přílohy: Projektová dokumentace


VOLEJBAL – BARVA BILA, SIRKA 50 MM
NOHEJBAL – BARVA MODRA, SIRKA 50 MM
BASKETBAL – BARVA ČERNA, SIRKA 50 MM
MALA KOPANA – BARVA ŽLTÁ, SIRKA 50 MM




Drawing Tolerances Unless Otherwise Specified		-		-		Accuracy ISO 2768-MH		Size	
-		-		c)		Tolerance ISO 8015		Semi-product	
Intro 10 ±1°		-		-		Projection E		Material	
10 - 50 ±0°30'		-		b)				Weight	
50 - 120 ±0°20'		-		-					
120 - 400 ±0°10'		-		a)					
Over 400 ±0°5'				Date		Index		Signature	
		Scale		Note		Drawn		Name	
		1:100				Checked		KURI U RICAN	
						Normalized		Type LAJNOVANI A OPLOCENI SPORTOVISTE	
		Ass. Drawing No				Manuf. discus		Drawing No	
		Old Drawing				Approved		VY003410	
		New Drawing				Date		Number of Sheets/Sheet	
		Item List				24.10.2024		5 / 1	

KURI U RICAN
ZAKLADY OPLOCENI A VYBAVENI SPORTOVISTE
1:100



DETAIL X1
1:20

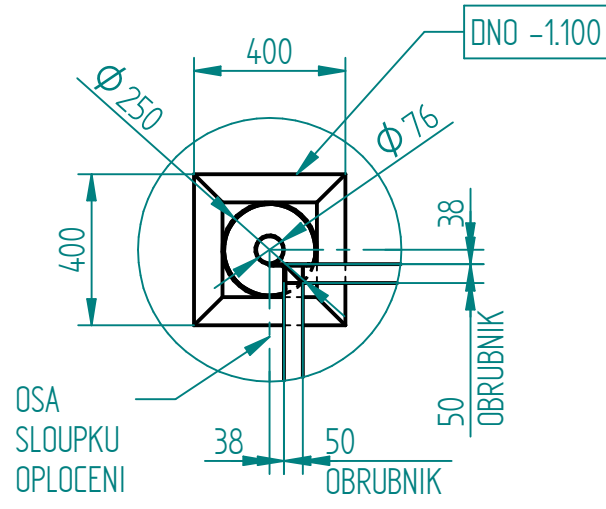

DETAIL X2
1:20

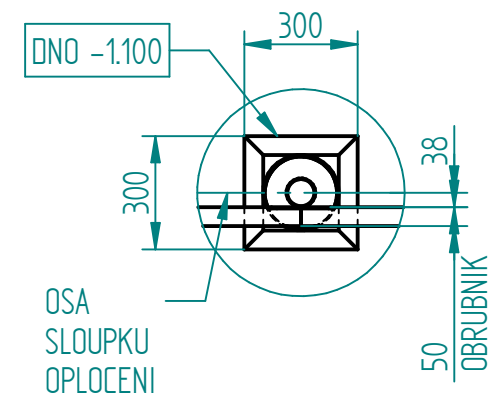

DETAIL X3
1:50

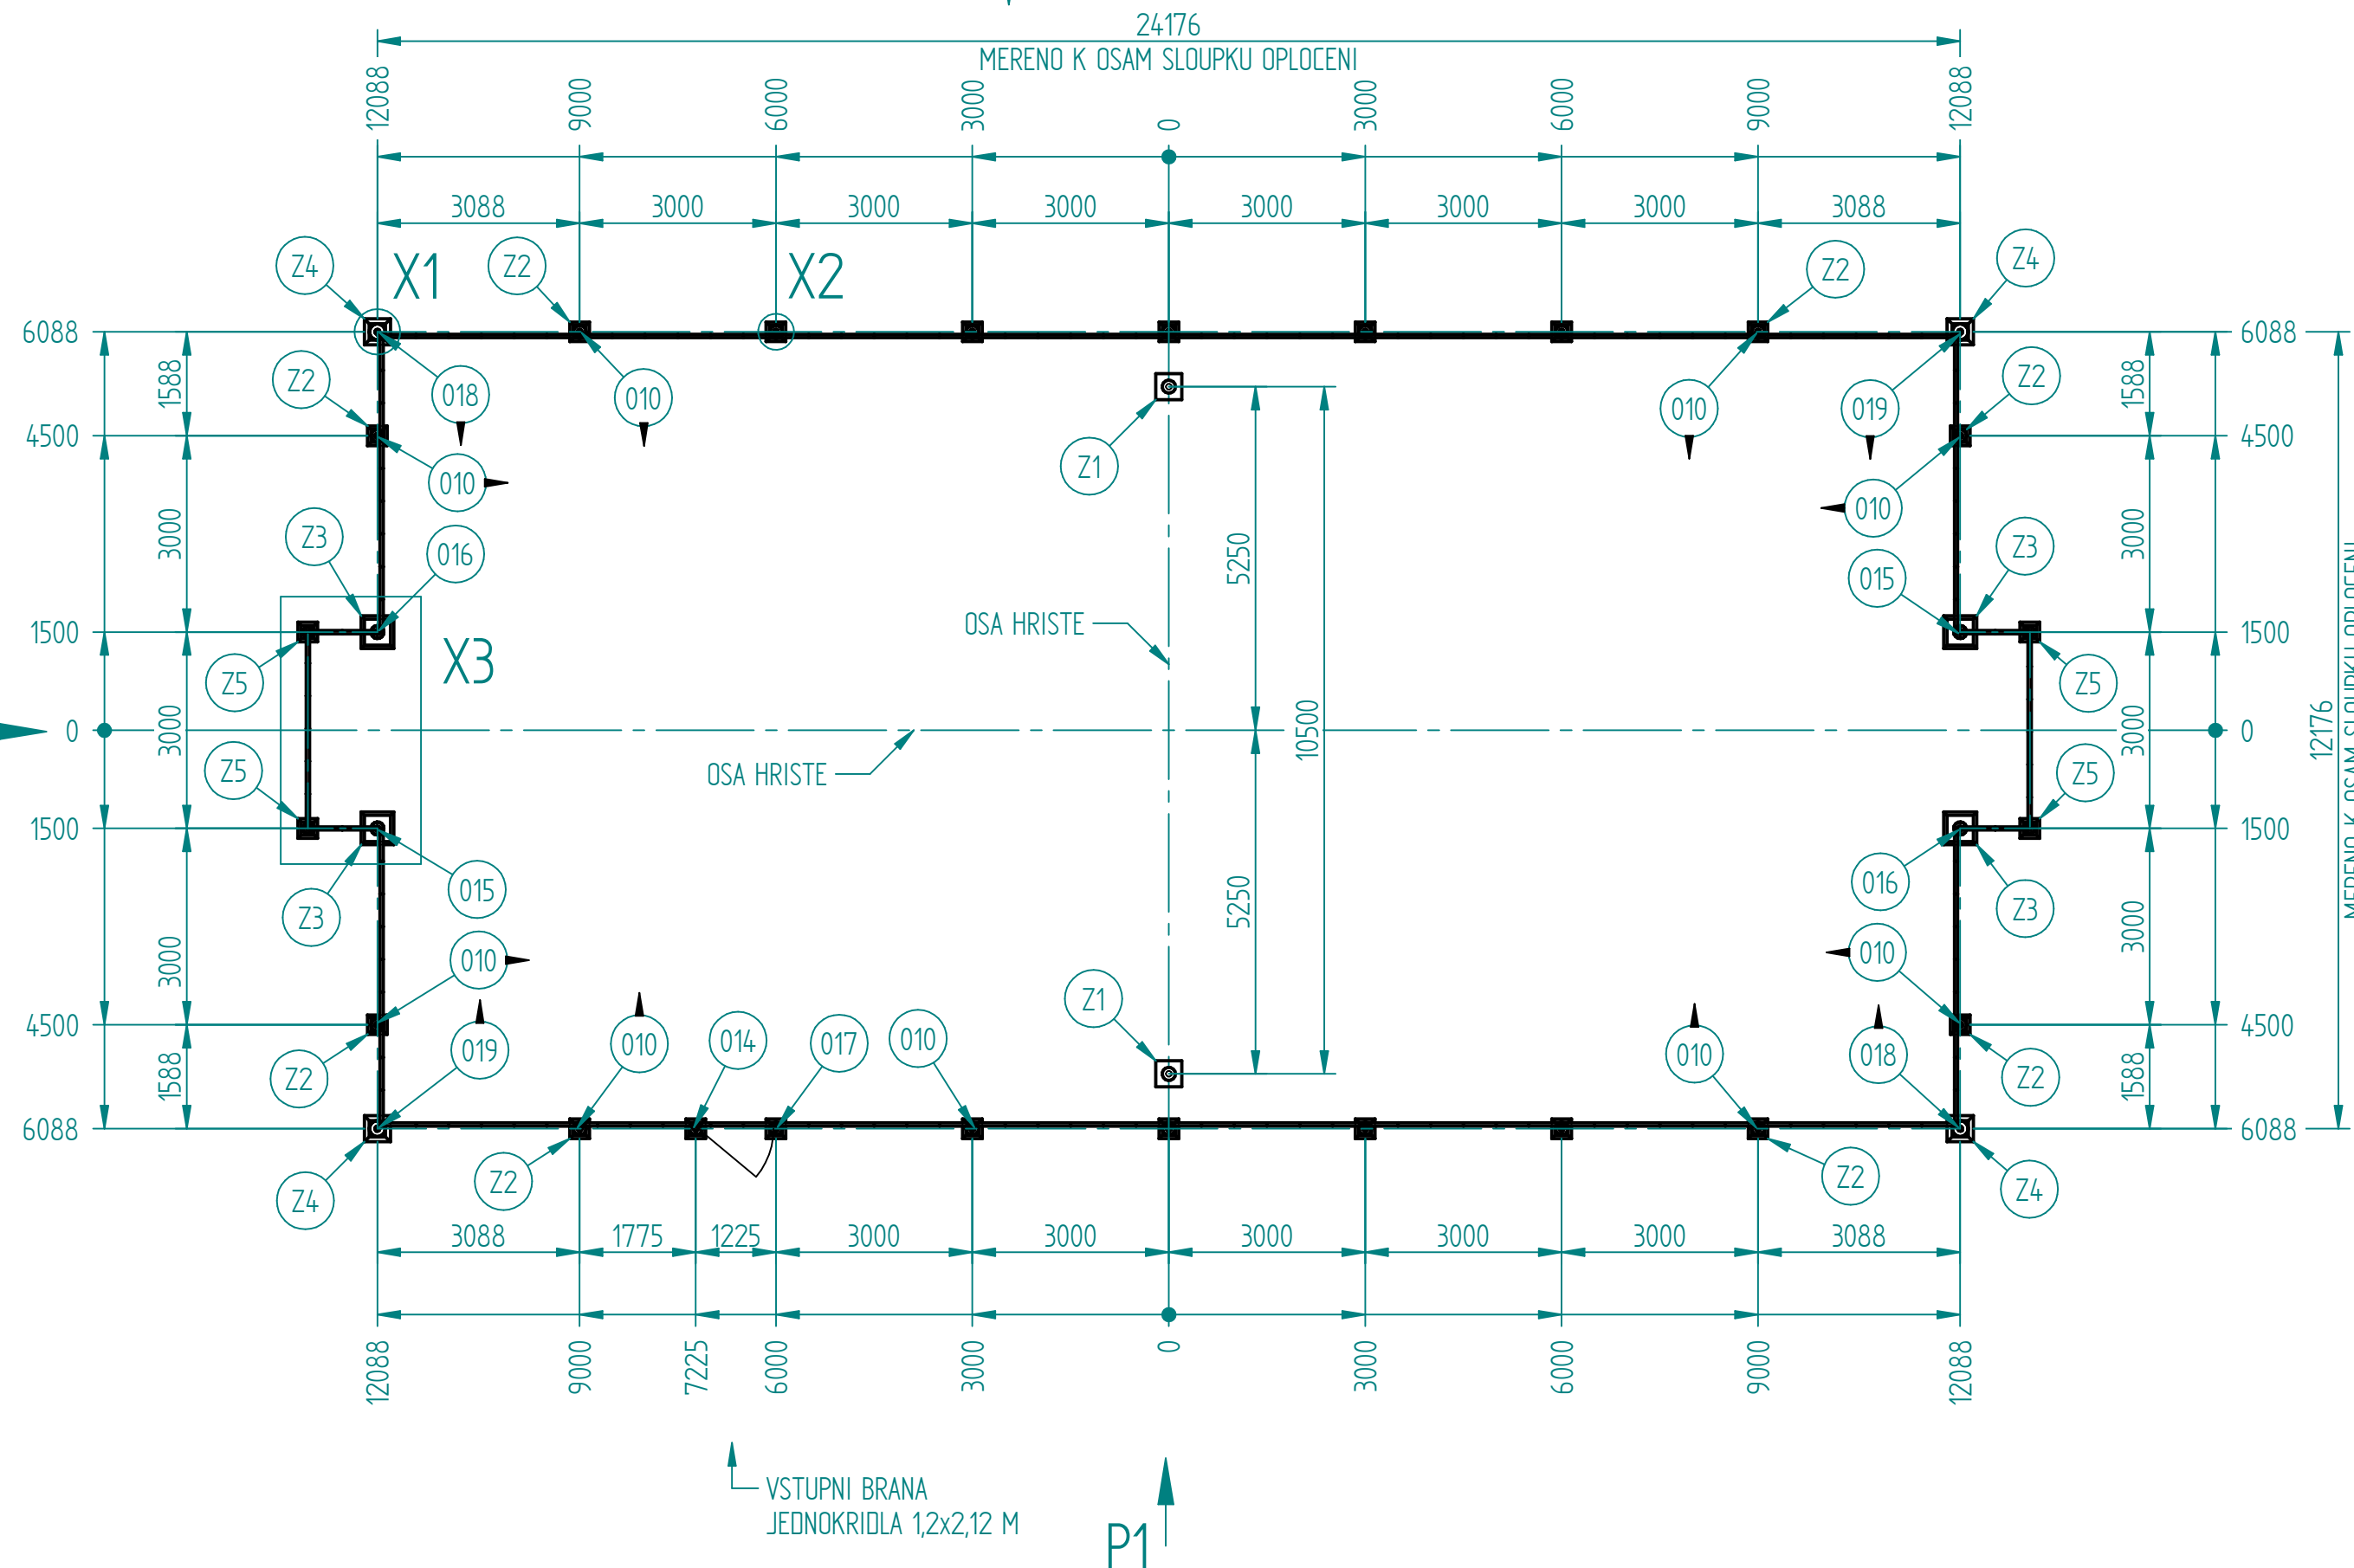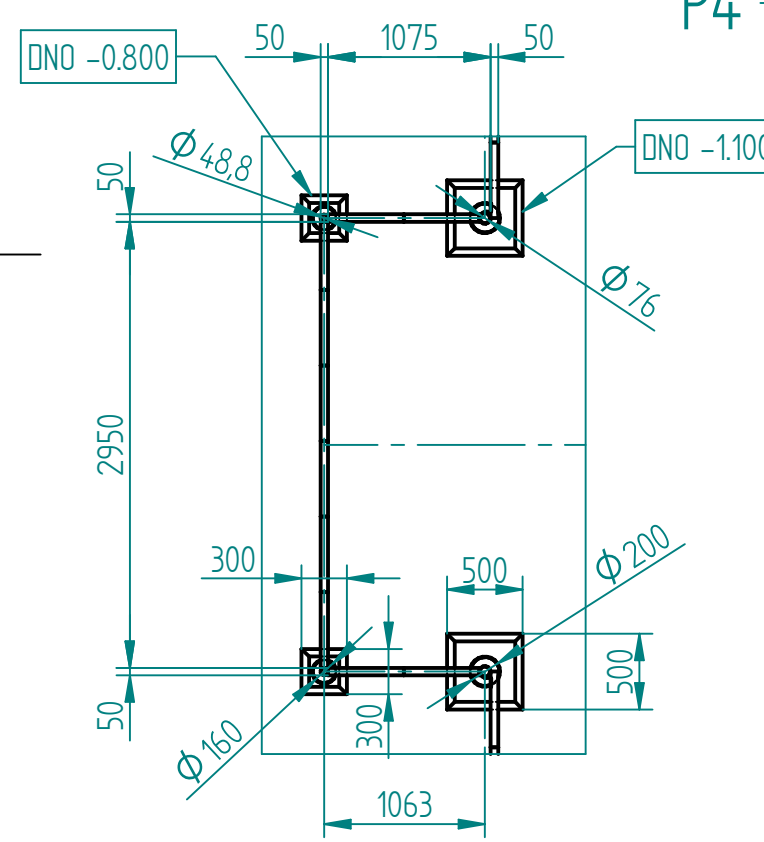

- Z1 POUZDRO PRO SLOUPEK NA SIT
KOTVICI TRUBKA KG200x4-1000 MM
BETON C16/20
ZAKLAD 400x400MM, DNO -880 MM
- Z2 POUZDRO PRO SLOUPEK OPLOCENI
KOTVICI TRUBKA KG160-1000
BETON C16/20
ZAKLAD 300x300 MM, DNO -1100 MM
- Z3 POUZDRO PRO SLOUPEK BRANKY MICOVE
KOTVICI TRUBKA KG160-1000
BETON C16/20
ZAKLAD 500x500 MM, DNO -1100 MM
- Z4 POUZDRO PRO ROHOVY SLOUPEK
KOTVICI TRUBKA KG200-1000
BETON C16/20
ZAKLAD 400x400 MM, DNO -1100 MM
- Z5 POUZDRO PRO BRANKU MICOVOU
KOTVICI TRUBKA KG160-500
BETON C16/20
ZAKLAD 300x300 MM, DNO -800 MM


019	VY000319-KR	SLOUPEK ROH P	2
018	VY000318-KR	SLOUPEK ROH L	2
017	VY000312-KR	SLOUPEK BRANKA - LEVY	1
016	VY000324-KR	SLOUPEK BM P	2
015	VY000323-KR	SLOUPEK BM L	2
014	VY000315-KR	SLOUPEK BB P	1
010	VY000309-KR	SLOUPEK	17
Pozice	Číslo výkresu	Název výkresu	Množství

POZNAMKA:
KAZDY SLOUPEK JE OPATREN POLOHOVACI ZNACKOU
POLOHOVACI ZNACKA JE DIRA Ø PR. 6 MM VZDALENA 950 MM OD SPODNI HRANY SLOUPKU A URČUJE:
1. HLOUBKU ULOZENI SLOUPKU - ZNACKA JE VYSKOVE ZAROVNANA S PVRCEM HRISTE, T.J. ±0.000
2. SMER ULOZENI SLOUPKU - VIZ. ČERNA ŠIPKA U POZICE SLOUPKU
3. PRO SLOUPKY OPLOCENI POUZIT PLASTOVE KOTVICI TRUBKY KG160 MM, PRO ROHOVE SLOUPKY OPLOCENI KG200 MM

MERENO NA OSY SLOUPKU OPLOCENI A OSY POUZDER PRO SLOUPEK NA SIT


Drawing Tolerances Unless Otherwise Specified	-	-	d)	-	Accuracy ISO 2768-H	Size		
Into 10	±1"	-	c)	-	Tolerance ISO 8015	Semi-product		
10 - 50	±0°30'	-	b)	-	Projection E	Material	Weight	
50 - 120	±0°20'	-	a)	-				
120 - 400	±0°10'							
Over 400	±0°5'							
3 - 6	±0.1	Scale	Note	Date	Index	Signature		
6 - 30	±0.2	1:100		Drawn		TAUBER		
30 - 120	±0.3			Checked				
120 - 400	±0.5			Normalized				
400 - 1000	±0.8	Ass. Drawing No		Manuf. discus				
1000 - 2000	±1.2	Old Drawing		Approved				
2000 - 4000	±2.0	New Drawing						
Over 4000	±3.0	Item List		Date	24.10.2024			
						Name		
						KURI U RICAN		
						Type LAJNOVANI A OPLOCENI SPORTOVISTE		
						Drawing No		
						VY003410		
						Number of Sheets/Sheet		
						5 / 2		

POHLED P4
1:100

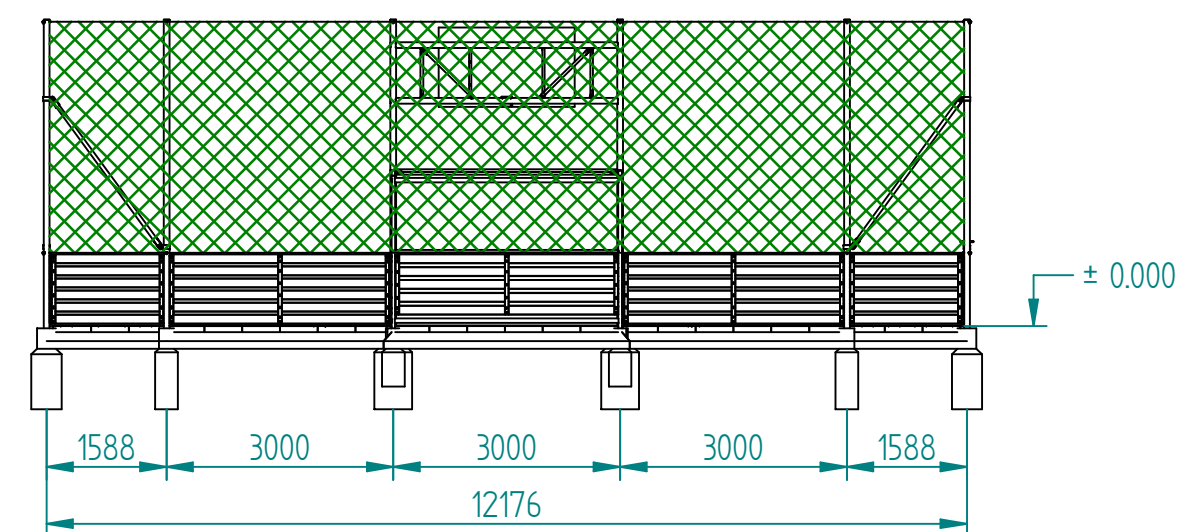

Drawing Tolerances Unless Otherwise Specified	-	-	d)	-	Accuracy ISO 2768-H	Size		
	-	-	c)	-	Tolerance ISO 8015	Semi-product		
Into 10 ±1"	-	-	b)	-	Projection E	Material		Weight
10 - 50 ±0°30'	-	-	a)	-	 VYSSPA VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY S.R.O.			
50 - 120 ±0°20'		Date	Index	Signature				
120 - 400 ±0°10'		Drawn	TAUBER					
Over 400 ±0°5'		Checked						
	Scale	Note	Normalized		Name	KURI U RICAN		
3 - 6 ±0.1	1:100		Manuf. discuss		Type			
6 - 30 ±0.2	Ass. Drawing No		Approved		Drawing No	VY003410		
30 - 120 ±0.3	Old Drawing							
120 - 400 ±0.5	New Drawing					5 / 3		
400 - 1000 ±0.8	Item List		Date	24.10.2024				
1000 - 2000 ±1.2								
2000 - 4000 ±2.0								
Over 4000 ±3.0								

KURI U RICAN
VICEUCELOVE HRISTE 24x12 M
3D VIZUALIZACE

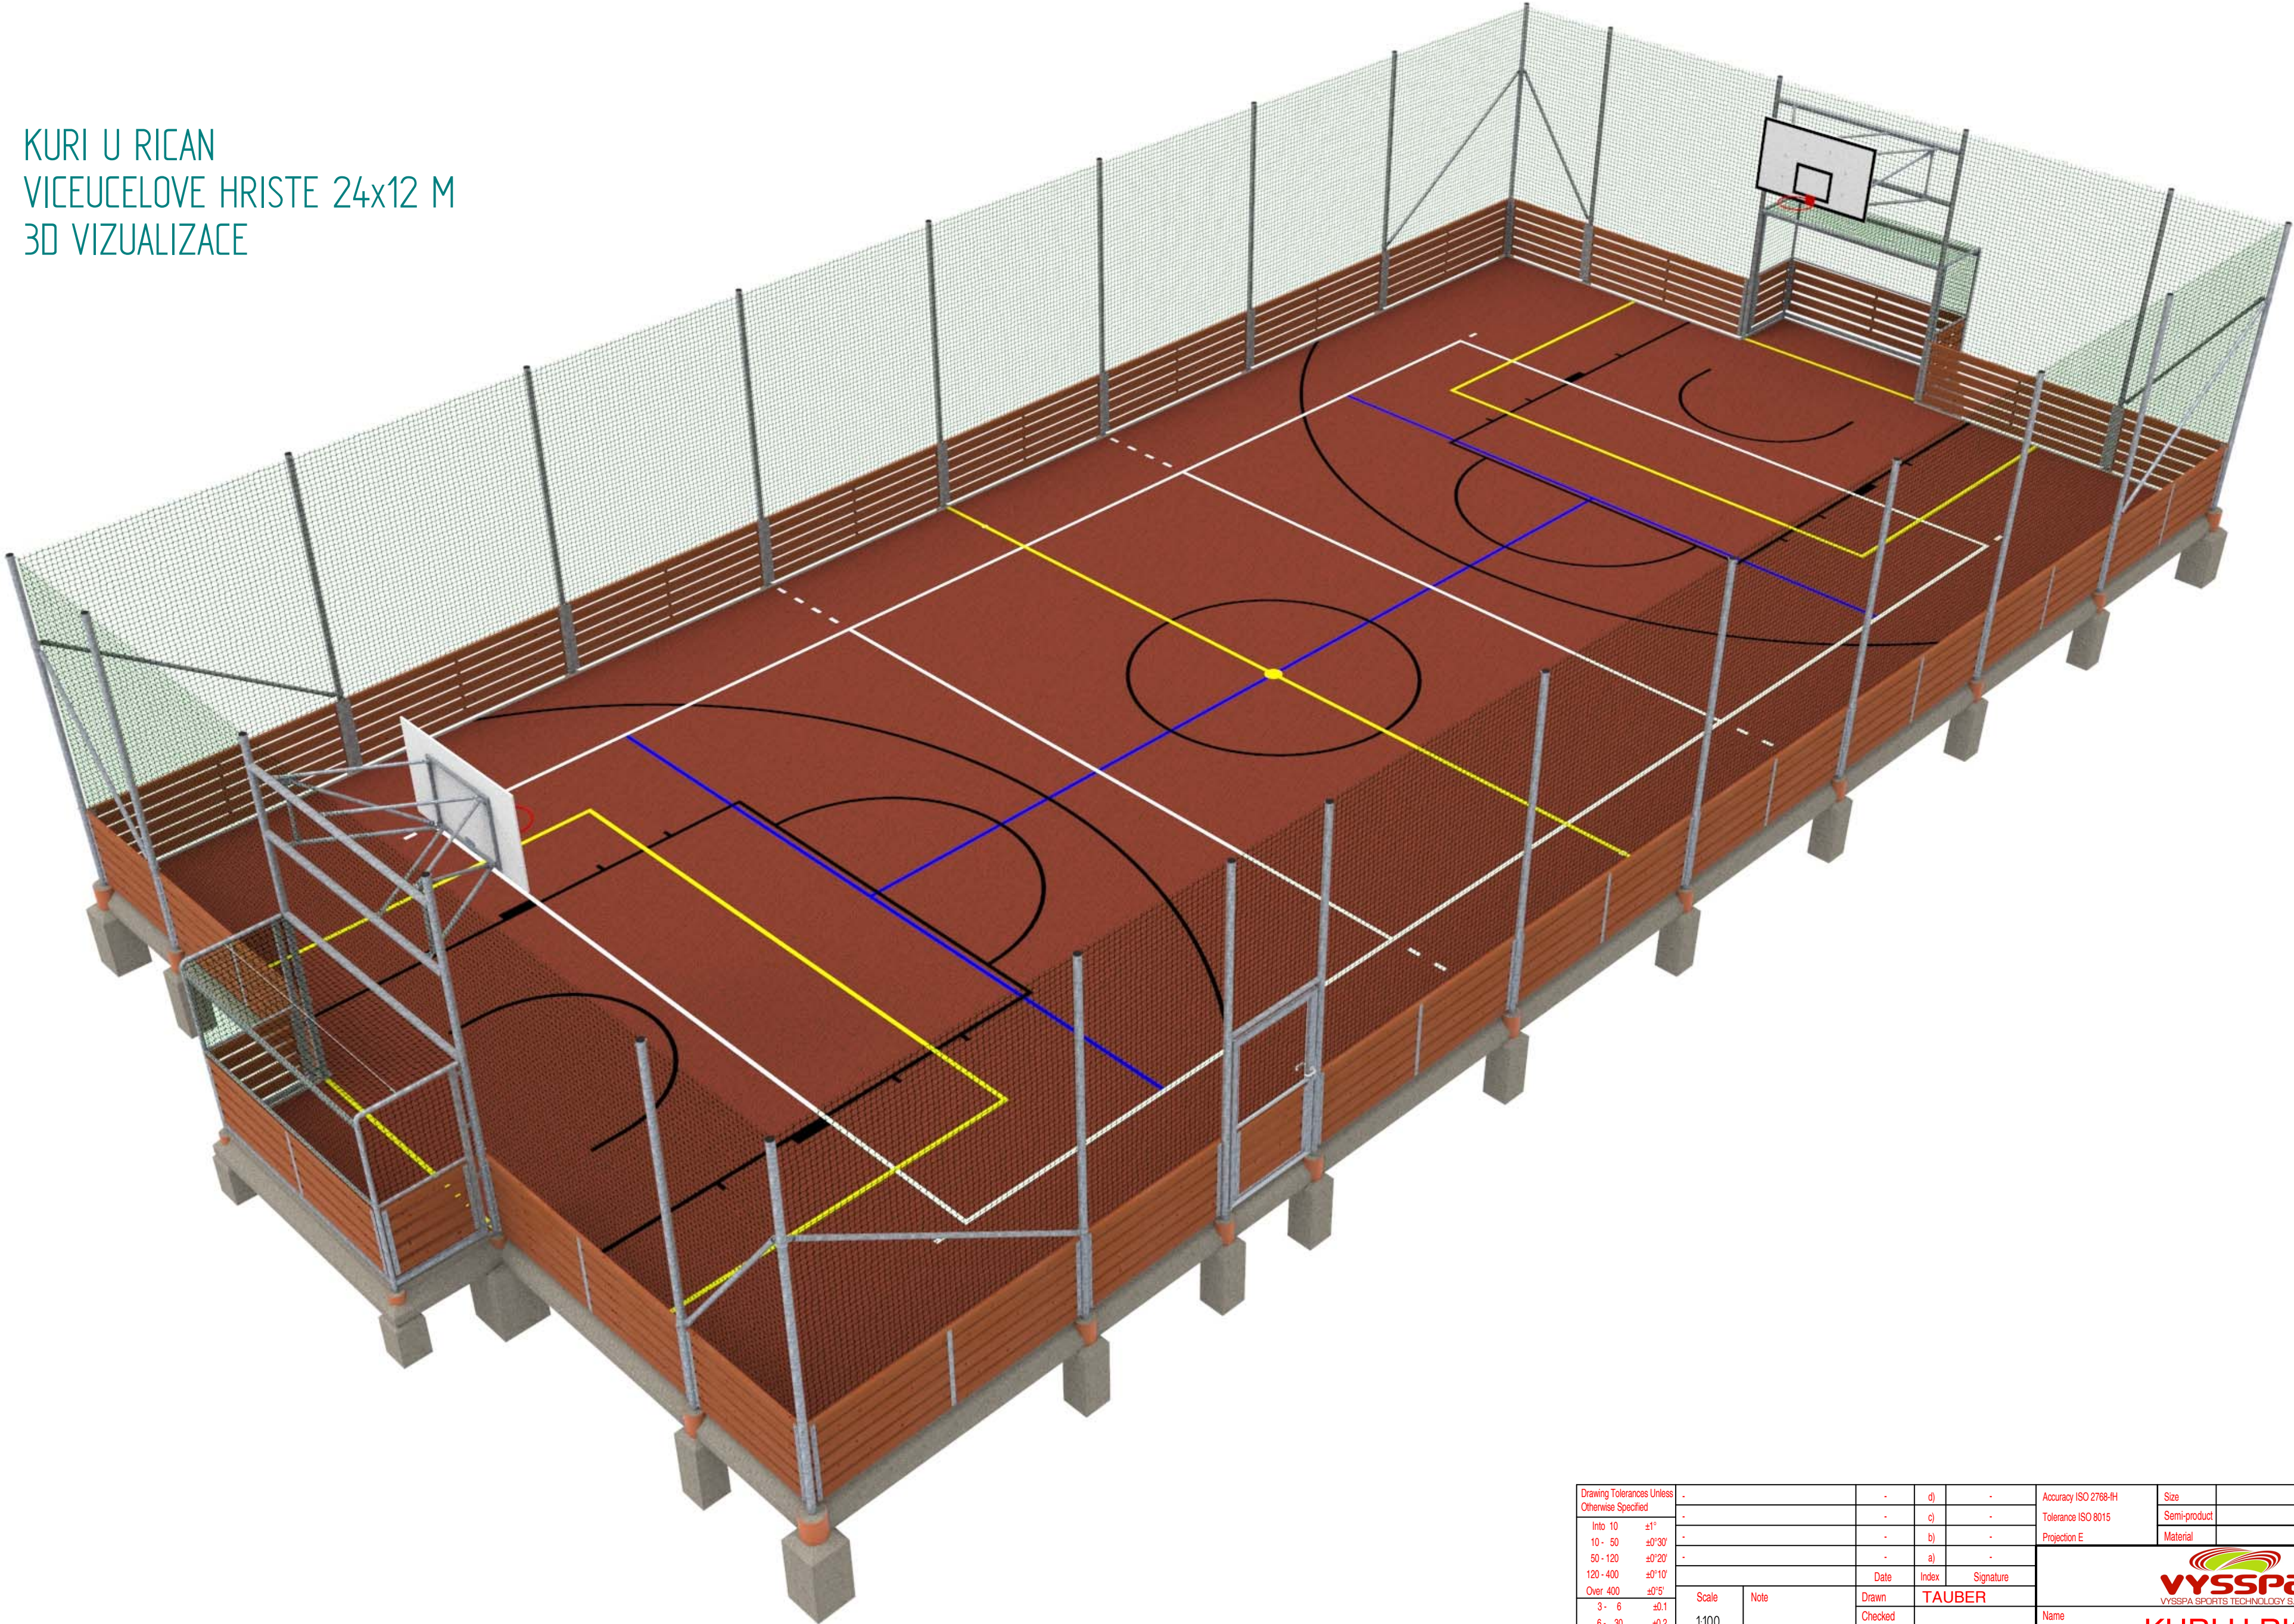

Drawing Tolerances Unless Otherwise Specified	-	-	d)	-	Accuracy ISO 2768-1H	Size		
	-	-	c)	-	Tolerance ISO 8015	Semi-product		
	-	-	b)	-	Projection E	Material	Weight	
	-	-	a)	-				
10 - 50	±1"				Date	Index	Signature	
50 - 120	±0"30"				Drawn	TAUBER		
120 - 400	±0"10"				Checked			
Over 400	±0"5"				Normalized			
3 - 6	±0.1	Scale	Note		Ass. Drawing No			
6 - 30	±0.2	1:100			Old Drawing			
30 - 120	±0.3				New Drawing			
120 - 400	±0.5				Item List			
400 - 1000	±0.8							
1000 - 2000	±1.2							
2000 - 4000	±2.0							
Over 4000	±3.0							
					Date	24.10.2024		
					Name			
					Type LAJNOVANI A OPLOCENI SPORTOVISTE			
					Drawing No			
					Number of Sheets/Sheet			
					5 / 4			

1									2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
A	KURI U RICAN – VICEUCELOVE HRISTE 24x12 M									420										BETONOVA VYPLN SLOUPKU			C25/30	39,676 kg	158,704 kg	4			
	OPLOCENI SPORTOVISTE – KUSOVNIK									385										PODLOZKA M8	PODLOZKA DIN 9021 8,4	DIN 9021		0,006 kg	0,006 kg	1			
										384										PODLOZKA M8	PODLOZKA DIN 125–1A 8,4	DIN 125–1A		0,002 kg	0,883 kg	484			
B	209		ZAMEK FAB 05140 N 1/2				1,608 kg	1,608 kg	1	384										PODLOZKA M8	PODLOZKA DIN 125–1A 8,4	DIN 125–1A		0,002 kg	0,022 kg	12			
	208		KLIKA				0,436 kg	0,436 kg	1	383										PODLOZKA 13	PODLOZKA DIN 125–1A 13	DIN 125–1A		0,006 kg	0,013 kg	2			
	205		LANKO 4 – 3000			INOX	0,296 kg	0,593 kg	2	382										PODLOZKA 10	PODLOZKA DIN 125–1A 10,5	DIN 125–1A		0,004 kg	0,360 kg	101			
C	202		KULATA ZATKA	KULATA ZATKA PR. 47,6	MOSS 111536	PLAST	0,010 kg	0,040 kg	4	361										NYT. MATICE M8	NYT. MATICE FABORY 69140 M8			0,006 kg	0,012 kg	2			
	201		KULATA ZATKA	KULATA ZATKA PR. 76,2	MOSS 111072	PLAST	0,029 kg	0,796 kg	27	350										MATICE M10	MATICE DIN 1587 M10	DIN 1587		0,021 kg	1,467 kg	70			
	158	VY000035–KR	PRKNO MANTINELU BM	40x120–877		SMRK	2,344 kg	46,887 kg	20	349										MATICE M8	KULATA SPOJOVACI MATICE M8x40			0,019 kg	0,076 kg	4			
D	157	VY000036–KR	PRKNO MANTINELU BM	40x120–2946		SMRK	7,875 kg	78,751 kg	10	348										MATICE M12	MATICE DIN 1587 M12	DIN 1587		0,030 kg	1,203 kg	40			
	155	VY000034–KR	PRKNO MANTINELU BRANKA	35x120–939		SMRK	2,195 kg	10,976 kg	5	346										MATICE M12	KULATA SPOJOVACI MATICE M12x40			0,030 kg	0,060 kg	2			
	154	VY001808–KR	PRKNO MANTINELU	40x120–1690		SMRK	4,518 kg	27,106 kg	6	343										MATICE M12	MATICE DIN 934 M12	DIN 934		0,018 kg	0,036 kg	2			
E	153	VY000032–KR	PRKNO MANTINELU	40x120–1500		SMRK	4,010 kg	96,233 kg	24	342										MATICE M10	MATICE DIN 934 M10	DIN 934		0,012 kg	0,194 kg	16			
	152	VY000033–KR	PRKNO MANTINELU	40x120–3000		SMRK	8,019 kg	192,466 kg	24	341										MATICE M8	MATICE DIN 1587 M8	DIN 1587		0,010 kg	5,046 kg	484			
	151	VY000031–KR	PRKNO MANTINELU	40x120–2915		SMRK	7,792 kg	701,298 kg	90	341										MATICE M8	MATICE DIN 1587 M8	DIN 1587		0,010 kg	0,125 kg	12			
F	107	VY000182–KR	SideFrame–VerticalPipe		SVARENEC	11373.0	1,328 kg	5,312 kg	4	339										SROUB M8x55	SROUB DIN 603 M8x55	DIN 603		0,030 kg	0,362 kg	12			
	106	VY000181–KR	SideFrame–UpperPipe		SVARENEC	11373.0	2,679 kg	10,715 kg	4	336										LANOVA SVORKA 5MM		DIN 741/555		0,016 kg	0,064 kg	4			
	105	VY000180–KR	SideFrame–ObliquePipe		SVARENEC	11373.0	2,471 kg	19,770 kg	8	335										SROUB S OKEM DIN 444 B M10x90	DIN 444 B M10x90	FABORY 17420.109.017		0,070 kg	3,774 kg	54			
G	104	VY000179–KR	BasketCrossbar2		SVARENEC	11373.0	16,654 kg	66,616 kg	4	333										SROUB DIN 933 M10x25		DIN 933		0,026 kg	0,417 kg	16			
	102	VY000177–KR	SideFrame–LowerPipe		SVARENEC	11373.0	4,484 kg	17,936 kg	4	330										VRUT M6X30	VRUT TORX M6X30	TALIROVA HLAVA		0,010 kg	1,681 kg	166			
	101	VY000396–KR	BOARDFRAME		SVARENEC	11373.0	9,023 kg	18,046 kg	2	325										SROUB M8x90	SROUB DIN 931 M8x90	DIN 931		0,041 kg	0,083 kg	2			
H	066	VY002634–KR	CIPANT ROHOVY		SVARENEC	11 373	0,911 kg	3,642 kg	4	321										SROUB M12x25	SROUB DIN 933 M12x25	DIN 933		0,040 kg	1,614 kg	40			
	065	VY002633–KR	CIPANT		SVARENEC	11 373	0,815 kg	6,520 kg	8	318										SROUB M8x50	SROUB DIN 603 M8x50	DIN 603		0,028 kg	0,395 kg	14			
	061	VY000176–KR	SIKMA VZPERA		SVARENEC	11373.0	6,289 kg	25,158 kg	4	317										SROUB M8x55	SROUB DIN 603 M8x55	DIN 603		0,030 kg	14,111 kg	468			
I	060	VY000157–KR	SIKMA VZPERA		SVARENEC	11373.0	8,942 kg	35,769 kg	4	313										SROUB M8x60	SROUB DIN 7991 M8x60	DIN 7991		0,025 kg	0,405 kg	16			
	052	VY000026–KR	PAS MANTINELU – BB	P3	CSN 425310.2	11373.0	0,980 kg	1,961 kg	2	312										SROUB M8x16	SROUB DIN 7991 M8x16	DIN 7991		0,008 kg	0,016 kg	2			
	051	VY000027–KR	PAS MANTINELU BM	PL050x3–780	CSN 425522	11373.0	0,877 kg	12,281 kg	14	311										SROUB M8x12	SROUB DIN 7991 M8x12	DIN 7991		0,006 kg	0,026 kg	4			
J	050	VY000025–KR	PAS MANTINELU	PL050x3–900	CSN 425522	11373.0	1,013 kg	67,846 kg	67	310										SROUB M12x100	SROUB DIN 7991 M12x100	DIN 7991		0,094 kg	0,189 kg	2			
	049	VY000049–KR	PANT SPODNI		SVARENEC	11373.0	0,121 kg	0,121 kg	1	310										SROUB M12x20	SROUB DIN 7991 M12x20	DIN 7991		0,023 kg	0,047 kg	2			
	048	VY000050–KR	PANT HORNÍ		SVARENEC	11373.0	0,109 kg	0,109 kg	1	309										SROUB M10x70	SROUB DIN 7991 M10x70	DIN 7991		0,046 kg	0,186 kg	4			
K	042	VY000047–KR	PODLOZKA ZAMKU	P6	CSN 425310.2	11373.0	0,297 kg	0,297 kg	1	308										SROUB M10x110	SROUB DIN 7991 M10x110	DIN 7991		0,071 kg	1,706 kg	24			
	041	VY000288–KR	PROTIZARAZKA – ZRC	P2.5	CSN 425310.2	11373.0	0,394 kg	0,394 kg	1	307										SROUB M10x100	SROUB DIN 7991 M10x100	DIN 7991		0,065 kg	1,039 kg	16			
	033	VY001591–KR	TRUBKA BM		SVARENEC	11373.0	4,703 kg	9,406 kg	2	306										SROUB M5x10	SROUB DIN 7500 ME–Z M5x10	DIN 7500 ME–Z		0,002 kg	0,004 kg	2			
L	032	VY000028–KR	ZADNI PRIENIK BM		SVARENEC	11373.0	11,458 kg	45,833 kg	4	302										ZAVITOVE OKO M8x50		FABORY 17420.085.010		0,041 kg	0,165 kg	4			
	031	VY000030–KR	BOCNICE BM L		SVARENEC	11373.0	30,102 kg	60,203 kg	2	251										BASKETBALOVY KOS				4,471 kg	8,942 kg	2			
	030	VY000029–KR	BOCNICE BM P		SVARENEC	11373.0	30,102 kg	60,203 kg	2	250										BOARD	1050x1800x18			19,017 kg	38,035 kg	2			
M	019	VY000319–KR	SLOUPEK ROH P	TRKR 76x2–5000	SVARENEC	11373.0	23,311 kg	46,621 kg	2	245										BETONARSKA OCEL PR. 10 MM	PR. 10–4750 MM			2,922 kg	11,689 kg	4			
	018	VY000318–KR	SLOUPEK ROH L	TRKR 76x2–5000	SVARENEC	11373.0	23,311 kg	46,621 kg	2	235										KOTEVNI TRUBKA KG160x4	TRKR160x4–500	11373.0		1,358 kg	5,430 kg	4			
	017	VY000312–KR	SLOUPEK BRANKA – LEVY	TRKR 76x2–5000	SVARENEC	11 373	20,829 kg	20,829 kg	1	233										KOTEVNI TRUBKA KG200x4	TRKR200x4–1000	11373.0		3,411 kg	78,459 kg	23			
N	016	VY000324–KR	SLOUPEK BM P	TRKR 76x4–5000	SVARENEC	11373.0	37,928 kg	75,855 kg	2	232										KOTEVNI TRUBKA KG250x4	TRKR250x4–1000	11373.0		4,281 kg	17,126 kg	4			
	015	VY000323–KR	SLOUPEK BM L	TRKR 76x4–5000	SVARENEC	11373.0	37,928 kg	75,855 kg	2	230										BETONOVY OBRUBNIK	200x50x500	BETON		11,500 kg	2058,500 kg	179			
	014	VY000315–KR	SLOUPEK BB P	TRKR 76x3–5000	SVARENEC	11373.0	29,541 kg	29,541 kg	1	210										VLOZKA FAB2020		FAB 2020		0,175 kg	0,175 kg	1			
O	010	VY000309–KR	SLOUPEK	TRKR 76x2–5000	SVARENEC	11373.0	23,090 kg	392,530 kg	17	Pozice									Číslo výkresu	Název výkresu	Název, rozměr	Polotovár	Mat.kon.	Hmotnosť (položka)	Hmotnosť (množství)	Množství			
	004	VY000053–KR	BRANKA		SVARENEC	11373.0	24,676 kg	24,676 kg	1	1																			
	003	VY000326–KR	BREVENO BRANKA		SVARENEC	11373.0	3,015 kg	3,015 kg	1	2																			
P	001	VY000018–KR	BREVENO BM		SVARENEC	11373.0	16,335 kg	32,669 kg	2	1																			
		Pozice	Číslo výkresu	Název výkresu	Název, rozměr	Polotovár	Mat.kon.	Hmotnosť (položka)	Hmotnosť (množství)	Množství																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																
