

Krycí list ZBV			
Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VON-1Vedlejší a ostatní náklady - pro část stavby č. 1	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: část 1 / 1	Číslo ZBV: 6	
Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001 Objednatel 2: Obec Krhanice Krhanice 46, 257 42 Krhanice IČ: 00232025			
Zhotovitel: B E S s.r.o. Sukova 625, 256 01 Benešov IČ: 43792553			
Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	80 500,00	80 500,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	80 500,00	80 500,00
Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02) a pro Rozpis ocenění změn položek (04).			
ZBV - krycí list			

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:	Číslo ZBV / Skupina změny:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VON-1Vedlejší a ostatní náklady - pro část stavby č. 1		část 1 / 1	06 . 3
Strany smlouvy o dílo S-2193/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.07.2023 (dále jen Smlouva):			
Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov			
Objednatel 2: Obec Krhanice, Krhanice 46, 257 42 Krhanice			
Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov			
<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 13 počet listů		<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel			
Předmět Změny: Navýšení pracnosti RDS			
Popis a zdůvodnění Změny: V průběhu provádění stavebních prací došlo k několika zásadním změnám během výstavby, které způsobili nutnost přepracování stávající Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“). Jedná se zejména o přeprojektování RDS z důvodu zastižení nevhodného podloží a sanace zemní pláně. Dále bylo zapotřebí přepracovat RDS pro pilotové založení opěrné zdi z důvodu změny délek jednotlivých pilot. V projekčních pracích bylo také nutné zohlednit nově zjištěnou přeložku inženýrských sítí. Zhotovitel v rámci svých povinností zapracoval potřebné skutečnosti do RDS, což vedlo ke vzniku nové položky č. 02943.R. Zhotovitel tyto skutečnosti oznámil svým dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 7“ ze dne 30.04.2024 (příloha č. 12). Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje k této změně vydala dne vyjádření ke změně rozsahu díla (příloha č. 13). Z informací o náplni položek a jednotlivých činnostech obsažených v soupisu prací, ani z ostatních dostupných pokladů, nemohl Zhotovitel předpokládat, že k takové skutečnosti dojde. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00
Technická pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomír Smetana podpis			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Roman Wilkonský	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Petr Jeřábek	podpis
Stavební dozor:	jméno	Tomáš Barták	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele č. 1:	jméno	Martin Voříšek	podpis
Zástupce Objednatele č. 2:	jméno	Ing. Jaroslav Mikyna	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba): KSÚS	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): Obec Krhanice	jméno	Mgr. Aleš Papoušek	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Freudl	podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6

Název Stavby:	Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	část 1 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	VON-1Vedlejší a ostatní náklady - pro část stavby č. 1

Údaje v Kč bez DPH	
Cena SO/PS dle Smlouvy	
1 - zadat	
2 544 594,90	

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 544 594,90	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	80 500,00	80 500,00	3,16%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	2 625 094,90	80 500,00	3,16%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: 2135 - Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice Číslo a název SO/PS: část 1 - ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK Číslo a název rozpočtu: VON-1 - Vedlejší a ostatní náklady - pro část stavby č. 1								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO VON-1					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky											
113	02943.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS - DOPRACOVÁNÍ RDS DLE ZBV	kpl	0,000	1,000	1,000	80 500,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	100,00%
		Celkem							0,00	80 500,00		80 500,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Jaroslav Mikyna (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:			Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice		
1		Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	14 938 781,90		
2=1+19+20		Aktuální smluvní částka (cena stavby)	16 473 929,24		
		Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	19 933 454,38		
3=(2/1)*100		Procento změny Přijaté smluvní částky	110,28%		
4=(25/1)*100		Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%		
5=(28/1)*100		Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%		

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 535 147,34
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	10,28%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 481 634,57

12=(1)*0,15	Limit	D4*0,15
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice	- 44 472,53	1 579 619,87	1 535 147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 44 472,53	1 579 619,87	1 535 147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 101	1	Okružní křižovatka / Sanace a odstranění dlažby	0,00	456 142,81	456 142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 310	2	Úpravy odvodnění / Úpravy odvodnění	- 26 985,53	369 513,29	342 527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26 985,53	369 513,29	342 527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 180	3	Přechodné dopravní značení / Dočasné pěší trasy	0,00	259 609,07	259 609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 609,07	259 609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 251	4	Opěrná zeď / Vrty pro piloty	0,00	252 597,80	252 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 597,80	252 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 134	5	Chodníky/Doměření	- 17 487,00	161 256,90	143 769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17 487,00	161 256,90	143 769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VON-1	6	Vedlejší a ostatní náklady - pro část stavby č. 1 / Navýšení pracnosti RDS	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	6
Název stavby:	2135 - Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 -
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	VON-1Vedlejší a ostatní náklady - pro část stavby č. 1
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	část 2 / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Rozbor ceny položky č. 02943.R	1
09 Cenová nabídka společnosti Atelier PROMIKA s.r.o.	2
10 Cenová nabídka společnosti Valbek, spol. s r.o.	1
11 Cenová nabídka společnosti SATRA, spol. s r.o.	2
12 Ohlášení změn stavby č. 7 ze dne 30.04.2024	2
13 Vyjádření KSÚS k ohlášení změny stavby	1
14 Vyjádření TDS k ohlášení stavby č. 7	1
15 Stavisko TDS k ZBV č. 6 ze dne 31.05.2024	1
16 Vyjádření Autorského dozoru ze dne 26.08.2024	2
Počet listů celkem	13

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice Číslo a název SO/PS: část 2 - ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC Číslo a název rozpočtu: VON-1 - Vedlejší a ostatní náklady - pro část stavby č. 1								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) VON-1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	0,000	0,000	29 788,60	29 788,60	0,00	0,00	29 788,60	0,00	0,00%
2	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	0,000	0,000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00%
3	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	0,000	0,000	8 936,60	8 936,60	0,00	0,00	8 936,60	0,00	0,00%
4	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000	0,000	0,000	35 746,30	35 746,30	0,00	0,00	35 746,30	0,00	0,00%
5	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	0,000	0,000	110 217,70	110 217,70	0,00	0,00	110 217,70	0,00	0,00%
6	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	0,000	0,000	321 716,60	321 716,60	0,00	0,00	321 716,60	0,00	0,00%
7	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	0,000	0,000	42 895,50	42 895,50	0,00	0,00	42 895,50	0,00	0,00%
8	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	0,000	0,000	5 957,70	5 957,70	0,00	0,00	5 957,70	0,00	0,00%
9	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	0,000	0,000	35 746,30	35 746,30	0,00	0,00	35 746,30	0,00	0,00%
10	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000	0,000	0,000	5 957,70	11 915,40	0,00	0,00	11 915,40	0,00	0,00%
		označení staveniště s logem IROP v průběhu výstavby (velikost dle graf. manuálu 2,2x2,1m): 1=1,000 [A] pamětní deska po dokončení stavby (velikost 0,3x0,4m): 1=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C]											
11	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000	0,000	0,000	5 957,70	11 915,40	0,00	0,00	11 915,40	0,00	0,00%
		Středočeský kraj, omlouváme se za dočasné omezení: 2=2,000 [A]											
12	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	0,000	0,000	29 758,80	29 758,80	0,00	0,00	29 758,80	0,00	0,00%
		kompletní provedení ZS vč. zajištění BOZP a vč. následného uvedení ploch ZS do původního, resp. dohodnutého stavu zabezpečení stavby, oplocení, buňky, sanita, energie											
		Nové položky											
113	02943.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS - DOPRACOVÁNÍ RDS DLE ZBV	kpl	0,000	1,000	1,000	80 500,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	100,00%
		ZBV6: 1 KPL											
		Celkem						2 544 594,90	0,00	80 500,00	2 625 094,90	80 500,00	96,93%

Rozbor ceny položky kalkulací

Položka02943.R

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS - DOPRACOVÁNÍ RDS DLE ZBV

MJKPL

H	Přímý materiál	-		
NC	z toho nákupní cena	-		
D	z toho doprava	-		
M	Mzdové náklady	-		
P	z toho přímé mzdy	-		
O	odvody33,8 % z mezd	-		
S	Stroje	-		
T	Ostatní přímé náklady	70 000,00		
PZN	Příme zpracovací náklady	[M] + [S] + [T]	70 000,00	
	Přímé náklady	[H] + [SUB] + [PZN] + [NK]	70 000,00	
R1	Výrobní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	3 500,00	
R2	Správní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	3 500,00	
R3		0,00 % z []	0,00	
	Nepřímé náklady	[R1] + [R2] + [R3]	7 000,00	
Z	Zisk	5,00 % z [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]	3 500,00	
R4		0,00 % z []	-	
NK	Nekalkulované náklady		3 500,00	
	Celkem	[H] + [SUB] + [PZN] až [NK]	80 500,00	
	Jednotková cena		80 500,00	

Výměra1,00000 KPL

Normohodiny

P.Č.	PKV	Číselné označení potřeby	Název kalkulační potřeby	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem
1	H						0,00				
2	H										
			Materiály				0,00				
3	P						0,00				
4	P										
			Mzdy				0,00				
5	S						0,00				
6	S										
7	S										
8	S										
9	S										
			Stroje				0,00				
10	T		Atelier PROMIKA, s.r.o.	KPL	1,00000	70 000,00	70 000,00				
11	T										
			Ostatní přímé náklady				70 000,00				

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme cenovou nabídku na dopracování RDS .

Doplňujeme informaci, že součástí RDS není DIO a součástí DSPS není zaměření skutečného provedení stavby.

Děkujeme.

Přeji hezký den

Martina Fialová

Atelier PROMIKA s.r.o.

Na Pankráci 1062/58

140 00 Praha 4

Mobil:

ID DS:

Email:

Web:

Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016





Firma: Atelier PROMIKA s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC
Rozpočet: VON-2 Vedlejší a ostatní náklady - pro část stavby č. 2



Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zkoušky podloží a konstrukčních vrstev	KPL	1,000	0,00	0,00
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Vytýčení veškerých inženýrských sítí a jejich ochrana během výstavby - náklady správců sítí včetně zemních prací a ostatních přípomocí zhotovitele	KPL	1,000	0,00	0,00
3	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodetické zaměření skutečného provedení stavby pro část stavby č. 2	KUS	1,000	0,00	0,00
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS pro část stavby č. 2	KPL	1,000		
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ vč. příp. tištěné formy, dle SOD pro část stavby č. 2	KPL	1,000		
6	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE vč. pasportizace přilehlých / dotčených objektů komunikace před provedením a po ukončení výstavby pro část stavby č. 2	KPL	1,000	0,00	0,00
7	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ kompletní provedení ZS vč. zajištění BOZP a vč. následného uvedení ploch ZS do původního, resp. dohodnutého stavu zabezpečení stavby, oplocení, buňky, sanita, energie	KPL	1,000	0,00	0,00
8	02943.R		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS - DOPRACOVÁNÍ RDS DLE ZBV pro část stavby č. 2	KPL	1,000	70 000,00	70 000,00

Dobrý den,


Cenová nabídka na dopracování RDS u projektu „Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 – Krhanice“ z důvodu zvýšeného počtu změn činí 95 000 Kč bez DPH.

Platnost cenové nabídky do 31.05.2024

S přáním pěkného dne,

Bulířová Michaela

referentka obchodního oddělení

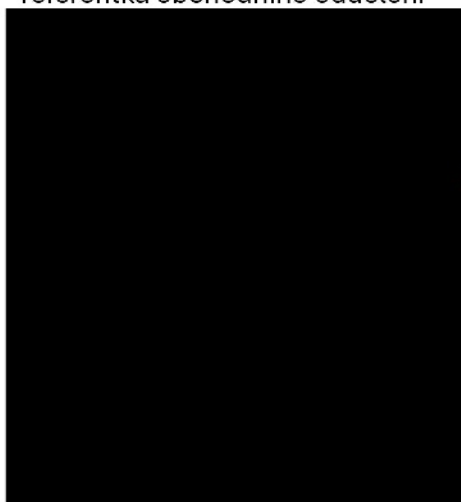

Valbek 

Vážený pane Pospíšile,
Děkuji Vám za poptávku.

Navrhujeme cenu za dopracování RDS na projektu OK KRHANICE ve výši 104000 Kč bez DPH.

Splatnost faktur 30 dní.

Děkuji Vám

S pozdravem

Radim Kryštůfek

Obchodní ředitel

SATRA, spol. s r.o.

Pod Pekárkami 878/2

190 00 Praha 9



Právní informace: Tento e-mail a jakékoli soubory k němu připojené mohou být důvěrné nebo chráněné právními předpisy. Pokud jste tuto zprávu omylem obdrželi, prosíme oznamte toto odesílateli bez zbytečného odkladu a poté ji vymažte z Vašeho systému.

Legal Disclaimer: The information contained in this message and any attached files can be confidential and may be legally privileged. If you have received this message by mistake please let the sender know immediately and then delete this mail.

Upozornění společnosti SATRA, spol.s r.o. (dále jen „Společnost“):

Tato zpráva (včetně příloh) má pouze komunikační, informativní a nezávazný charakter a nepředstavuje nabídku Společnosti na uzavření smlouvy ani Společnost nijak nezavazuje k uzavření jakékoliv smlouvy či pokračování v jednání o jejím uzavření ani nepředstavuje akceptaci návrhu, není-li výslovně ze strany Společnosti uvedeno jinak. Jakýkoliv úkon kontraktačního procesu (nabídka, akceptace) musí mít ze strany Společnosti písemnou (nikoliv elektronickou) formu. Pro vyloučení pochybností Společnost uvádí, že vylučuje možnost akceptace návrhu smlouvy s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 odst. 3 NOZ, ani když se

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY; č. 7

„Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 – Krhanice“

K RUKÁM:

Martin Voříšek – projektový manažer, KSÚS
Ing. Jan Fidler, DiS – statutární zástupce ředitele, KSÚS
Tomáš Barták – technický dozor stavebníka, AFRY CZ
Mgr. Aleš Papoušek – starosta obce Krhanice
Ing. Jaroslav Mikyňa – zástupce obce Krhanice ve věcech technických

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 – Krhanice“
Zhotovitel	B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 437 92 553
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Rostislav Hověžák, výrobní náměstek společnosti B E S s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	S-2193/00066001/2023 SoD/02/2023
Číslo SoD zhotovitele	S 164/2023
Termín plnění	Dokončení a předání Díla Objednateli do 18 týdnů
Celková cena díla	18 075 926,10 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.


Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	Celá stavba
Důvody potřeby změny, popis problému	Na základě již ohlášené 6. Změny stavby jsme byli informováni našim podzhotovitelem RDS 3M Projekt s.r.o. se sídlem 8. listopadu 228/1a, 169 00 Praha 6 – Břevnov, IČO 10898981, že dochází k navýšení pracovní zprávy RDS oproti platným legislativním požadavkům. Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti: A. Zhotovitel potvrdí svému podzhotoviteli zvýšení pracovní dokumentace RDS a uzavře s ním dodatek na zdárné dokončení projekčních prací. B. Zhotovitel ocení změnu transparentní pomocí individuální kalkulace anebo hodinových sazeb projektanta. Tyto skutečnosti Zadávací dokumentace nepředpokládala. Z informací o náplni položek a jednotlivých činnostech obsažených v soupisu prací ani z ostatních dostupných podkladů Zhotovitel nemohl předpokládat, že k takové skutečnosti dojde. Při ocenění soupisu prací tyto skutečnosti proto nezohlednil.
Čeho se zhotovitel domáhá	Akceptace úprav a vydání pokynu.
Vliv na termín plnění	Bez dopadu do času
Vliv na celkovou cenu díla	ANO, Zhotovitel připraví podrobné vyčíslení po obdržení Pokynu Objednatele.
Kategorizace změny dle ZZVZ	Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je podle § 10, odst. 10.1, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222. odstavec 6.


V Benešově dne 30/04/2024



Vyrobni namestek

V Praze dne

Za objednatele změnu potvrzuje



BES s.r.o.
Sukova 625
256 17 Benešov

Projekt: Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice

Věc: Vyjádření KSÚS k ohlášení změny stavby č. 6

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako spoluobjednatel akce „Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice,“ v souladu se stanoviskem AD a TDI stavby bere na vědomí ohlášení změny na základě aktuálně zjištěných skutečností při realizaci stavby.

Jedná se o změnu č. 6. KSÚS tímto žádá o předložení zpracovaných změnových listů.

Změna č. 6 – Změna se týká navýšení rozsahu zpracování realizační dokumentace stavby, při zpracování projektu nebylo možné tuto okolnost předvídat. Při realizaci stavebních prací došlo k několika zásadním změnám, RDS bylo nutné opakovaně přepracovat z důvodu zastižení nevhodného podloží, sanacím zemní pláň, přepracování dokumentace z důvodu změny délek jednotlivých pilot pro založení opěrné zdi, dále bylo nutné zohlednit přeložení infrastrukturních prvků. Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla, bez dopadu na termín plnění.

Změny budou řešeny formou ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetence vedení KSÚS.

Martin Voříšek
Projektový manažer



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



AFRY
AF PŮVRY

Vyjádření TDS k ohlášení změny stavby č. 7

Ohlášení změny se týká změny rozsahu realizační dokumentace stavby.

Původní řešení počítalo s vydáním podrobnější realizační dokumentace stavby dle rozsahu zadávací dokumentace.

V rámci stavby bylo zastiženo odlišné vozovkové souvrství, byl zjištěn skutečný stav podloží vozovky a odhalena kolize s vedením inženýrské sítě.


V rámci realizační dokumentace stavby bude proveden upravený návrh sanace podloží vozovky s ohledem na skutečně zastižené souvrství vozovky a jeho podloží. Dále bude nutné vytvořit dokumentaci k přeložce vedení inženýrské sítě vedené v prostoru stavby.

Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla a to v závislosti na rozsahu úprav RDS.

Zhotovitel tuto skutečnost oznámil „Formulářem pro ohlášení změny stavby č. 7“ ze dne 30.4.2024.

TDS z technického hlediska bere na vědomí ohlášení změny č. 7.

Za TDS KSÚS:





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Stavba: Okružní křižovatka silnic II/106 x II/1065 x III/1066 -
Krhanice

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov

Věc: Stanovisko TDS k ZBV č. 6

SO: VON-1 – Vedlejší a ostatní náklady – pro část stavby č.1


V rámci provádění díla jsou zjištěny skutečnosti, které vyžadují upravení realizační dokumentace stavby a vytvoření dokumentace přeložky inženýrské sítě.

Na základě jednání za účasti objednatele, zhotovitele, AD a TDS bylo projednáno a navrženo technické řešení, které bylo zapracováno do revize RDS, která byla TDS schválena. Dále bylo zadáno zpracování dokumentace přeložky inženýrské sítě.

Na základě výše uvedeného se ZBV č. 6 souhlasím.

Množství změnových položek je uváděno v předpokládaném rozsahu změn a bude čerpáno dle skutečného provádění.

Za TDS v Praze dne 31.5.2024 :



Tomáš Barták



atelierpromika
projektová činnost v dopravě

Atelier PROMIKA s.r.o.
Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273

BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Místo a datum odeslání

KRHANICRDS

Jeřábek

Praha 26.8.2024

Věc: Okružní křižovatka silnic II/106xIII/1065xIII/1066_Krhanice

Za autorský dozor souhlasíme s následujícími ZBV k akci „Okružní křižovatka silnic II/106xIII/1065xIII/1066_Krhanice“:

ZBV 01:

- Původní řešení PDPS počítalo v rámci SO 101 jen s nahrazením asf. vrstev ACP a ACO pro větev A i pro větev B. V průběhu stavebních prací, konkrétně po odfrézování, bylo zjištěno, že povrch je ve špatném stavu a podloží je nevhodné pro pokládku ACP 16S PMB v tl. 70mm na obou větvích. V případě větve A došlo k lokálním vysprávkám s tím, že penetrační makadam byl přehutněn, pokud bylo nutné došlo k urovnání vrstvy doplněním štěrkodrti a zhutněním. Následně byla provedena vrstva SC 8/10 v tl. 150mm. Na větvi B byla provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev vč. sanace aktivní zóny a podloží komunikace dle revize RDS.
- V PDSP bylo uvažováno v rámci SO 101 s vybouráním nestmelených vrstev vozovky, ale po odfrézování byl zjištěn původní kryt z kamenné kostkové dlažby. Tuto dlažbu musel zhotovitel strojně odstranit, očistit a přetřídit pro následný odkup.

ZBV 02:

- Úprava odvodnění ve větvi B. Průběh dešťové kanalizace nebyl při dokončení PD znám a z toho důvodu se počítalo se zrušením stávající vpusti při severní hraně větve B. Bylo zjištěno, že dešťová kanalizace je napojena do této vpusti a proto ji nelze zrušit. Navržená UV 1 tedy nebyla realizována. Tuto UV nahradila stávající vpust na začátku úseku ze které bylo vedeno nové potrubí PP DN 500. Potrubí bylo vyústěno v místech dle PD. Z totožného důvodu bylo nutno zachovat i stávající UV při jižní hraně větve B. UV 2 v navržené poloze tedy nebyla realizována. I v tomto případě byla upravena přípojka UV.



atelierpromika
projektová činnost v dopravě

Atelier PROMIKA s.r.o.
Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273

ZBV 03:

- Jedná se o doplnění dočasných pěších tras na žádost MÚ Benešov. Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničního správního úřadu.

ZBV 04:

- V průběhu provádění stavby na SO 251 pro zhotovení pilotového založení zdi bylo zjištěno odchylné geol. podloží, které vyvolalo potřebu hlubšího vrtání než předpokládala PDPS, tj. i do hloubek větších než 5,0m.

ZBV 05:

- Na základě požadavku Správy železnic na změnu prvků betonových palisád oproti PDPS v rámci SO 134 v souvislosti s aktualizací statického výpočtu došlo v rámci zpracování RDS k dopřesnění výměry obruby z betonových palisád.

ZBV 06:

- Úprava RDS z důvodu zastižení nevhodného podloží a sanace zemní pláně.
- Úprava RDS pro pilotové založení opěrné zdi z důvodu změny délek pilot.
- Projekt přeložky nově zjištěného infrastrukturního zařízení v rámci RDS.

ZBV 07:

- Tato změna narovnává závěrečný stav množství položek po skončení stavebních prací na tomto SO. Jedná se o spojovací postřik z modif. emulze do 0,5 kg/m², asfaltové vrstvy ACO 11+, 11S, tl. 40mm, ACP 16+, 16S tl. 70mm s rozptýlenou výztuží a zábradelní svodidlo úroveň zadržení H2.

ZBV 08:

- Úprava dopravního značení na základě místního šetření a další úpravy DZ dle požadavků kpt. Vyhnálka.



atelierpromika s.r.o.

Na Pankráci 1618 / 30, 140 00 Praha 4
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273

