

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přeložka silnice III/27212

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 101 / 003

Číslo ZBV:

6

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: Strabag a.s.
 Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
 IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.3	-1 438 509,55	158 578,39	-1 279 931,16

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6	-1 438 509,55	158 578,39	-1 279 931,16

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
 a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list																																		
Název a evidenční číslo Stavby: II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka silnice III/27212	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 101 / 003	Číslo ZBV: 6.3																																
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3236/00066001/2022 a zhotovitel č: 841/TC/FA/2022/030/FAFY na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 5.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Strabag a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5																																		
<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table><tr><td>1. Krycí list</td><td></td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>Sk. 3</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td></td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>Sk. 3</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td></td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dokladů</td><td></td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td></td><td>7</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td></td><td>22</td><td>počet listů</td></tr></table>	1. Krycí list		1	počet listů	2. Změnový list	Sk. 3	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací		1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	Sk. 3	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin		1	počet listů	6. Přehled dokladů		1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách		7	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů		22	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor	
1. Krycí list		1	počet listů																															
2. Změnový list	Sk. 3	2	počet listů																															
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací		1	počet listů																															
4. Rozpis ocenění Změn položek	Sk. 3	1	počet listů																															
5. Přehled zařazení změn do skupin		1	počet listů																															
6. Přehled dokladů		1	počet listů																															
7. Soupis prací SO po všech změnách		7	počet listů																															
Další doklady dle přehledu dokladů		22	počet listů																															
Iniciátor změny: Zhotovitel Předmět Změny: Úprava technického řešení																																		
Změna projektu větve G: Vzhledem k novým skutečnostem, které vyvolala přeložka kabelu pro společnost CETIN, bylo nutné uvažovat o možnostech přizpůsobení současného projektu v reakci na reálnou polohu kabelu po provedení přeložky. Zhotovitel oznámil Objednateli dne 24. 4. 2024 (viz. příloha č. 8) návrh na změnu odvodnění v okolí větve G. Původní trasa uvedená v projektu počítala nově s uložením kabelu velmi blízko hraně pozemku 1420/4, vzhledem k existenci oplocení přímo na hraně pozemku a původní trase překládaného kabelu, byla nová trasa uložení lehce změněna, tak aby byl kabel co nejméně ohrožen budoucí výstavbou. I přes veškerou snahu o jeho bezpečnou polohu je vzhledem k jeho důležitosti velmi riskantní provádět práce v jeho okolí strojně. Návrh Zhotovitele upravuje odvodnění komunikace tak, že dochází v rámci přepočtu odvodu srážkových vod ke zmenšení vsakovacího objektu podél silnice III/27212. Týká se položek č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 81, 83, 149, 1004 a 1005. Hodnota změny je -1 279 931,16 Kč bez DPH. Objednatel s úpravou technického řešení souhlasil (viz příloha č. 9). Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.																																		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-1 438 509,55	158 578,39	-1 279 931,16	1 597 087,94

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. jméno Tomáš Svoboda podpis

Projektant (autorský dozor): APIS s.r.o. jméno Ing. Jan Adamů podpis

Stavební dozor: SGS-IBHTDI jméno Ing. Pavel Šindelář podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS SK jméno Martin Voříšek podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Petr Ballek Ing. Petra Kroupová podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6**

Název Stavby: II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/ 003
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka silnice III/27212	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
50 619 492,59

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-3 646 211,01	6 095 189,56	53 068 471,14	2 448 978,55

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1 438 509,55	158 578,39	6 253 767,95	12,35%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-5 084 720,56	51 788 539,98	1 169 047,39	2,31%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212 Číslo a název SO/PS: SO 101 - Přeložka silnice III/27212 Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Přeložka silnice III/27212								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101 / 003					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Zemní práce						6 244 783,15	-998 095,33	104 740,38	5 351 428,20	-893 354,95	
1	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	25 531,181	24 891,934	-639,247	39,840	1 017 162,25	-25 467,60	0,00	991 694,65	-25 467,60	-2,50%
2	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	46 995,928	43 887,192	-3 108,736	43,940	2 065 001,08	-136 597,86	0,00	1 928 403,22	-136 597,86	-6,61%
3	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6 802,458	3 480,211	-3 322,247	65,910	448 350,01	-218 969,30	0,00	229 380,71	-218 969,30	-48,84%
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6 802,458	3 480,211	-3 322,247	44,340	301 620,99	-147 308,43	0,00	154 312,56	-147 308,43	-48,84%
5	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	11 904,302	8 102,620	-3 801,682	119,830	1 426 492,51	-455 555,55	0,00	970 936,96	-455 555,55	-31,94%
7	122252207	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně	m3	10 262,275	12 070,638	1 808,363	57,920	594 390,97	0,00	104 740,38	699 131,35	104 740,38	17,62%
15	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 945,500	1 875,000	-70,500	201,370	391 765,34	-14 196,59	0,00	377 568,75	-14 196,59	-3,62%
	8	Trubní vedení						1 367 602,54	-239 463,06	51 402,40	1 179 541,88	-188 060,66	
60	596411114	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	680,975	553,270	-127,705	506,760	345 090,89	-64 715,79	0,00	280 375,10	-64 715,79	-18,75%
61	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	687,785	558,803	-128,982	270,180	185 825,75	-34 848,36	0,00	150 977,39	-34 848,36	-18,75%
62	58344171	štěrkodrt frakce 0/32	t	108,956	88,523	-20,433	762,920	83 124,71	-15 588,74	0,00	67 535,97	-15 588,74	-18,75%
63	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	74,000	58,000	-16,000	1 078,870	79 836,38	-17 261,92	0,00	62 574,46	-17 261,92	-21,62%
65	59227029R2	žlabovka svahová betonová 600x500mm	m	16,000	0,000	-16,000	1 568,630	25 098,08	-25 098,08	0,00	0,00	-25 098,08	-100,00%
66	9194131R1	Vtoková jámka z betonu C30/37 vyztuženého svařovanými sítěmi Kari se zvýšenými nároky na prostředí	kus	2,000	1,000	-1,000	41 444,790	82 889,58	-41 444,79	0,00	41 444,79	-41 444,79	-50,00%
67	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	201,500	163,350	-38,150	1 061,740	213 940,61	-40 505,38	0,00	173 435,23	-40 505,38	-18,93%
68	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze	m2	193,000	221,200	28,200	1 822,780	351 796,54	0,00	51 402,40	403 198,94	51 402,40	14,61%
	9	Ostatní konstrukce a práce - bourání						1 621 199,59	-200 951,16	0,00	1 420 248,43	-200 951,16	
81	911331123	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zabíraním sloupků v rozmezí přes 2 do 4 m	m	997,000	864,000	-133,000	1 246,280	1 242 541,16	-165 755,24	0,00	1 076 785,92	-165 755,24	-13,34%
83	911331412	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky přes 4 do 12 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	120,000	104,000	-16,000	2 026,400	243 168,00	-32 422,40	0,00	210 745,60	-32 422,40	-13,33%
149	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	5 140,001	5 034,784	-105,217	26,360	135 490,43	-2 773,52	0,00	132 716,91	-2 773,52	-2,05%
		Nové položky / JC převzata z SoD SO 110						0,00	0,00	2 435,61	2 435,61	2 435,61	
1004	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	0,000	0,864	0,864	134,250	0,00	0,00	115,99	115,99	115,99	100,00%
1005	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	0,000	0,864	0,864	2 684,740	0,00	0,00	2 319,62	2 319,62	2 319,62	100,00%
		Celkem						9 233 585,28	-1 438 509,55	158 578,39	7 953 654,12	-1 279 931,16	-13,86%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Tomáš Svoboda

Za Objednatele: Martin Voříšek

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	76 925 171,56
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	78 054 340,46
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	94 445 751,96
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,47%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-8,54%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 224 890,68
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,59%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	23 077 551,47

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	18,05%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13 886 406,14
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	38 462 585,78

12=(39)	Sledování limitu 15 %	11 538 775,73
13=ABS(37)+38	Sledování limitu v %	375 174,60
14=140448000-37	Hodnota skupiny 5	139 726,41

- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=(ABS(37)+38)/1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 330 757,73	7 555 648,41	1 224 890,68	13 886 406,14	0,00	0,00	0,00	0,00	- 235 448,19	139 726,41	375 174,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 410 762,82	5 955 463,15	2 544 700,33	9 366 225,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 219 915,97	621 521,13	401 605,16	841 437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 27 175,89	188 937,00	161 761,11	216 112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 235 448,19	139 726,41	375 174,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 234 393,50	631 148,74	-603 244,76	1 865 542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 438 509,55	158 578,39	-1 279 931,16	1 597 087,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	6
Název a evidenční číslo stavby:	II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Přeložka silnice III/27212
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/ 003

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	7	
08 Oznámení Zhotovitele ze dne 24. 4. 2023 včetně příloh	3	
09 Vyjádření KSÚS	1	
10 Tabulka nových položek	1	
11 Vyjádření TDI ze dne 9. 11. 2023	1	
12 Vyjádření AD ze dne 4. 11. 2024	2	
13 Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce	2	
14 Vzorový příčný řez větev G	1	
15 Příčný řez retencí	1	
16 RDS - Charakteristické příčné řezy - větev G, v.č. 05g	1	
17 RDS - Koordinační situační výkres - úpravy	1	
18 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů	8	
Počet listů celkem	22	

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212 Číslo a název SO/PS: SO 101 - Přeložka silnice III/27212 Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Přeložka silnice III/27212								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101/002					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	25 531,181	24 891,934	-639,247	39,84	1 017 162,25	-25 467,60	0,00	991 694,65	-25 467,60	-2,50%
		Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití ornice: 24708,20*0,150 "- ornice" 3 706,230 4302,480+10720,013 "- zpětné využití výkopového materiálu pro násypy" 15 022,493 Mezisoučet 18 728,723 Nakládání na mezideponii pro odvoz přebytečného výkopku na skládku: (10262,275+1945,50+450,0+170,20+3285,096)-15022,493 "- přebytečná zemina" 1 090,578 0,050*3479,0+0,130*2558,0+0,150*917,0+0,230*(5434,0+2782,0)+0,250*4196,0 +0,330*6452,0 "- podorniči" 5 711,880 Součet 25 531,181 ZBV č. 6 Množství dle RDS 24 891,934 Celkem: -25 531,181 + 24 891,934 -639,247											
2	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	46 995,928	46 570,192	-425,736	43,94	2 065 001,08	-18 706,84	0,00	2 046 294,24	-18 706,84	-0,91%
		Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití 9727,350 "- ornice - přebytečná ornice zůstane uložena na mezideponii" 9 727,350 0,050*3479,0+0,130*2558,0+0,150*917,0+0,230*(5434,0+2782,0)+0,250*4196,0 +0,330*6452,0 "- podorniči" 5 711,880 10262,275 "- z komunikací" 10 262,275 1945,50 "- z hloubení jam" 1 945,500 450,0+170,20 "- z hloubení rýh" 620,200 Mezisoučet 28 267,205 Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití 24708,20*0,150 "- ornice" 3 706,230 4302,480+10720,013 "- zpětné využití výkopového materiálu pro násypy" 15 022,493 Mezisoučet 18 728,723 Součet 46 995,928 ZBV č. 1 Přetěžení zářezu o 0,3 m = 2683 (dle 3D) 2 683,000 ZBV č. 6 Množství dle RDS 46 570,192 Celkem: =-(46995,928+2683)+46570,192 -3 108,736 Množství po změnách: =2683-3108,736 -425,736											
3	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6 802,458	6 163,211	-639,247	65,91	448 350,01	-42 132,77	0,00	406 217,24	-42 132,77	-9,40%
		Odvoz přebytečného výkopku na skládku nebo deponii: (10262,275+1945,50+450,0+170,20+3285,096)-15022,493 "- přebytečná zemina" 1 090,578 0,050*3479,0+0,130*2558,0+0,150*917,0+0,230*(5434,0+2782,0)+0,250*4196,0 +0,330*6452,0 "- podorniči" 5 711,880 Součet 6 802,458 ZBV č. 1 Přetěžení zářezu o 0,3 m = 2683 (dle 3D) 2 683,000 ZBV č. 6 Množství dle RDS 6 163,211 Celkem: =-(6802,458+2683)+6163,211 -3 322,247 Množství po změnách: =2683-3322,247 -639,247											
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6 802,458	6 163,211	-639,247	44,34	301 620,99	-28 344,21	0,00	273 276,78	-28 344,21	-9,40%
		6802,458 "- viz. položka č. 162751xxx - Vodorovné přemístění na skládku" 6 802,458 ZBV č. 1 Přetěžení zářezu o 0,3 m = 2683 (dle 3D) 2 683,000 ZBV č. 6 Množství dle RDS 6 163,211 Celkem: =-(6802,458+2683)+6163,211 -3 322,247 Množství po změnách: =2683-3322,247 -639,247											
5	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	11 904,302	10 785,620	-1118,682	119,83	1 426 492,51	-134 051,66	0,00	1 292 440,85	-134 051,66	-9,40%
		6802,458*1,75 "- viz. položka č. 162301R02 - Vodorovné přemístění na skládku" 11 904,302 ZBV č. 1 Přetěžení zářezu o 0,3 m = 2683 (dle 3D) 2 683,000 ZBV č. 6 Množství dle RDS 10 785,620 Celkem: =-(11904,302+2683)+10785,62 -3 801,682 Množství po změnách: =2683-3801,682 -1 118,682											
6	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním	m2	13 596,675	13 596,675	0,000	23,28	316 530,59	0,00	0,00	316 530,59	0,00	0,00%
R11		Pro komunikace a zpevněné plochy: 11435,50*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I" 12 693,405 92,0*1,11 "- pojižděný prstenec OK - KS III" 102,120 75,0*1,05 "- ostrůvky na komunikaci - KS IV" 78,750 15,0*1,05 "- komunikace pro pěší - KS V" 15,750 673,0*1,05 "- hospodářské sjezdy - KS II" 706,650 Součet 13 596,675 Zemní práce pro komunikace a konstrukce 0,00											
7	122252207	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně	m3	10 262,275	9 906,175	-356,100	57,92	594 390,97	-20 625,31	0,00	573 765,66	-20 625,31	-3,47%
		větev A: 28,50*(0,7+0,37+0,43) 42,750 větev B: (60,0+30,0)*(2,95+0,08)+(30,0+20,0)*7,35+(20,0+30,0)*5,46+(30,0+20,0)*12,08+(20,0+20,0)*5,55+(20,0+20,0)*3,47+(20,0+30,0)*(0,03+0,36) 1 897,500 (30,0+20,0)*6,52+(20,0+20,0)*10,41+(20,0+20,0)*3,44+(20,0+30,0)*6,38+(30,0+20,0)*20,32+(20,0+20,0)*(1,04+21,57)+(20,0+27,50)*(0,19+7,92) 3 504,625 větev C: (40,0+20,0)*(1,5+0,09)+(20,0+20,0)*(0,41+0,48)+(20,0+20,0)*(0,97+1,22+0,2)+(20,0+5,50)*0,52 239,860 větev D: (30,0+15,0)*1,58+(15,0+25,0)*3,28 202,300 větev E: (20,0+20,0)*5,99+(20,0+20,0)*1,74+(20,0+20,0)*2,83+(20,0+14,0)*0,38 435,320 větev F: 40,0*0,77+25,0*(3,53+1,06) 145,550 větev G: (20,0+20,0)*6,67+(20,0+15,0)*(0,18+8,42)+(15,0+15,0)*(0,4+19,54) 1 166,000 rekultivace: (0,750+1,250)/2*2628,37 2 628,370 Součet 10 262,275 ZBV č. 1 Součet větev B: 1897,500 + 3504,625 = 5402,125 5402,125 * 0,5 = 2701,063 2701,063 - 5402,125 = -2701,063 Přetěžení zářezu o 0,3 m = 2683 (dle 3D) *0,2 = 536,6 536,600 Celkem: -2701,063 + 536,600 = - 2164,463 -2 164,463 ZBV č. 6 Množství dle RDS 9 906,175 Celkem: =-(10262,275-2164,463)+9906,175 1 808,363 Množství po změnách: =-2164,463+1808,363 -356,100											
8	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	205,246	205,246	0,000	119,83	24 594,63	0,00	0,00	24 594,63	0,00	0,00%

Uvažováno s 2,0% objemu:
10262,275*0,02

9	182251101	Svahování násypů strojně	m2	24 708,200	24 708,200	0,000	22,97	567 547,35	0,00	0,00	567 547,35	0,00	0,00%
24708,20 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury"			24 708,200										
10	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	24 708,200	24 708,200	0,000	19,17	473 656,19	0,00	0,00	473 656,19	0,00	0,00%
24708,20 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury"			24 708,200										
11	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	8 386,505	0,000	-8386,505	62,31	522 563,13	-522 563,13	0,00	0,00	-522 563,13	-100,00%
Úprava zemin mimo aktivní zónu pod komunikací: větev B: (20,0+20,0)*2,06+(20,0+30,0)*2,04 větev C: (40,0+20,0)*15,74+(20,0+20,0)*25,34+(20,0+20,0)*10,54 větev D: (30,0+15,0)*26,6+(15,0+25,0)*7,23 větev E: (20,0+20,0)*0,53+(20,0+20,0)*8,16+(20,0+20,0)*37,56+(20,0+14,50)*28,98 větev F: 110,0*(14,58+4,94)/2 větev G: (15,0+15,0)*(4,09+1,52)+(15,0+11,50)*9,23 Součet					184,400		2 379,600		1 486,200		2 849,810		
ZBV č. 1 Nemožnost provádění této technologie viz vyjádření Geotechnika					1 073,600		412,895		8 386,505		-8 386,505		
12	58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	1 174,111	0,000	-1174,111	2 306,82	2 708 462,74	-2 708 462,74	0,00	0,00	-2 708 462,74	-100,00%
Uvažovaná objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m3 Uvažované množství 8% (Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní zkoušky) 8386,505*1,75*0,08 "- Úprava zemin mimo aktivní zónu pod komunikací"					1 174,111		-1 174,111						
ZBV č. 1 Nemožnost provádění této technologie viz vyjádření Geotechnika													
13	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	4 302,480	4 302,480	0,000	34,92	150 242,60	0,00	0,00	150 242,60	0,00	0,00%
Úprava zemin v aktivní zóně komunikací: větev B: (60,0+30,0)*1,48+(20,0+30,0)*2,94 (20,0+20,0)*5,04+(20,0+30,0)*4,48 větev C: (40,0+20,0)*8,01+(20,0+20,0)*7,97+(20,0+20,0)*4,08 větev D: (30,0+15,0)*8,24+(15,0+25,0)*6,91 větev E: (20,0+20,0)*7,37+(20,0+20,0)*7,54+(20,0+14,50)*8,08 větev F: 110,0*(5,88+4,2)/2 větev G: (15,0+15,0)*7,73+(15,0+11,50)*12,28 Součet					280,200		425,600		962,600		647,200		
					875,160		554,400		557,320		4 302,480		
14	171152112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic	m3	10 720,013	10 720,013	0,000	31,27	335 214,81	0,00	0,00	335 214,81	0,00	0,00%
Násypy zemin mimo aktivní zónu - dosypy svahů zemního tělesa a rekultivace: větev A: 28,50*(0,26+0,24) větev B: (60,0+30,0)*(0,23+0,39)+(30,0+20,0)*0,19+(20,0+30,0)*(0,17+0,12)+(30,0+20,0)*0,21+(20,0+20,0)*0,2+(20,0+20,0)*0,2+(20,0+30,0)*0,2 (30,0+20,0)*0,21+(20,0+20,0)*0,23+(20,0+20,0)*0,31+(20,0+30,0)*0,32+(30,0+20,0)*(0,21+0,26)+(20,0+20,0)*(0,31+0,28)+(20,0+27,50)*(0,22+0,11) větev C: (40,0+20,0)*(0,25+0,22)+(20,0+20,0)*(0,23+0,21)+(20,0+20,0)*0,36+(20,0+5,50)*(0,28+0,11) větev D: (30,0+15,0)*(0,14+0,09)+(15,0+25,0)*(0,26+0,09) větev E: (20,0+20,0)*(0,11+0,25)+(20,0+20,0)*(0,15+0,23)+(20,0+20,0)*(0,1+0,21)+(20,0+14,50)*(0,1+0,4) větev F: 40,0*0,34+283,5*(2,10+1,70)/2 větev G: (20,0+15,0)*(0,13+0,26)+(15,0+15,0)*(0,21+0,23)+(15,0+11,50)*(0,36+0,31) rekultivace: (1,70+0,950)/2*1012,44 Mezisoučet Násypy upravovaných zemin mimo aktivní zónu pod komunikací: 8386,505 "- viz. pol. 116951201 - Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy" Součet					14,250		116,300		110,875		70,145		
					24,350		59,250		552,250		44,605		
					1 341,483		2 333,508						
					8 386,505		10 720,013						
R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací					0,00								
15	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 945,500	1 875,000	-70,500	201,37	391 765,34	-14 196,59	0,00	377 568,75	-14 196,59	-3,62%
50,0*38,91 "- vsakovací objekt"					1 945,500								
ZBV č. 6 Množství dle RDS Celkem: -1 945,500 + 1 875,000					1 875,000		-70,500						
16	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	450,000	45,000	-405,000	134,25	60 412,50	-54 371,25	0,00	6 041,25	-54 371,25	-90,00%
zpevnění dna příkopu: 1,0*0,60*(30,0+38,0+41,0+61,0+106,0+96,0+182,0+117,0+56,0+23,0) "- větev B"					450,000								
ZBV č. 1 450 * 0,1 = 45 45 - 450 = -405					-405,000								
17	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	170,200	170,200	0,000	302,75	51 528,05	0,00	0,00	51 528,05	0,00	0,00%
2,0*1,850*46,0 "- zpevnění dna příkopu - větev G"					170,200								
18	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	170,200	170,200	0,000	120,97	20 589,09	0,00	0,00	20 589,09	0,00	0,00%
2*1,850*46,0 "- zpevnění dna příkopu - větev G"					170,200								
19	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	170,200	170,200	0,000	59,64	10 150,73	0,00	0,00	10 150,73	0,00	0,00%
170,20 "- viz pol.č. 151101102 Zřízení příložného pažení"					170,200								
R13 Odstranění zeleně					0,00								
20	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	6 954,000	6 954,000	0,000	38,35	266 685,90	0,00	0,00	266 685,90	0,00	0,00%
Sejmutí podorničí Odvoz na skládku 3479,0 "- tl. 50mm" 2558,0 "- tl. 130mm" 917,0 "- tl. 150mm" Součet					3 479,000		2 558,000		917,000		6 954,000		
21	121151124	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	12 412,000	12 412,000	0,000	41,94	520 559,28	0,00	0,00	520 559,28	0,00	0,00%
Sejmutí podorničí Odvoz na skládku (5434,0+2782,0) "- tl. 230mm 4196,0 "- tl. 250mm" Součet					8 216,000		4 196,000		12 412,000				
22	121151126	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 300 do 400 mm strojně	m2	6 452,000	6 452,000	0,000	46,74	301 566,48	0,00	0,00	301 566,48	0,00	0,00%
Sejmutí podorničí Odvoz na skládku 6452,0 "- tl. 330mm"					6 452,000								
23	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	9 727,350	9 727,350	0,000	143,80	1 398 792,93	0,00	0,00	1 398 792,93	0,00	0,00%
Sejmutí ornice Odvoz na mezideponii investora													

		5938,50 "- větev B"		5 938,500									
		1453,0 "- větev C"		1 453,000									
		785,0 "- větev D"		785,000									
		1578,50 "- větev E"		1 578,500									
		559,50 "- větev F - OK"		559,500									
		792,0 "- větev G"		792,000									
		Součet		11 435,500									
49	576133221R1	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	11 435,500	11 435,500	0,000	316,45	3 618 763,98	0,00	0,00	3 618 763,98	0,00	0,00%
		komunikace pro aut. dopravu - KS I											
		329,0 "- větev A"		329,000									
		5938,50 "- větev B"		5 938,500									
		1453,0 "- větev C"		1 453,000									
		785,0 "- větev D"		785,000									
		1578,50 "- větev E"		1 578,500									
		559,50 "- větev F - OK"		559,500									
		792,0 "- větev G"		792,000									
		Součet		11 435,500									
50	573231106R1	Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	23 385,598	23 385,598	0,000	14,74	344 703,71	0,00	0,00	344 703,71	0,00	0,00%
		11435,50*(1,015+1,03) "- komunikace pro aut. dopravu - KS I"		23 385,598									
51	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	11 607,033	11 607,033	0,000	318,63	3 698 348,92	0,00	0,00	3 698 348,92	0,00	0,00%
		11435,50*1,015 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I"		11 607,033									
52	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	11 778,565	11 778,565	0,000	231,70	2 729 093,51	0,00	0,00	2 729 093,51	0,00	0,00%
		11435,50*1,03 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I"		11 778,565									
53	573191111R1	Postřik infiltrační kationaktivní modifikovanou emulzí v množství 1 kg/m2	m2	11 778,565	11 778,565	0,000	26,84	316 136,68	0,00	0,00	316 136,68	0,00	0,00%
		11435,50*1,03 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I"		11 778,565									
	R53	Pojížděný prstenec OK - žulová dlažba						0,00					
54	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do betonového lože tl 100 mm s vyplněním spár cementovou maltou M 25 XF4 ve formě zálivky	m2	92,000	92,000	0,000	923,09	84 924,28	0,00	0,00	84 924,28	0,00	0,00%
		92,0 "- pojižděný prstenec OK - KS III"		92,000									
55	58381008	kostka štipaná dlažební žula velká 15/17	m2	93,840	93,840	0,000	1 048,55	98 395,93	0,00	0,00	98 395,93	0,00	0,00%
		92,0 "- pojižděný prstenec OK - KS III"		92,000									
		92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		93,840									
	R54	Ostrůvky na komunikaci - žulová dlažba						0,00					
56	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	75,000	75,000	0,000	799,06	59 929,50	0,00	0,00	59 929,50	0,00	0,00%
		10,0+21,50+17,50+8,0+18,0 "- ostrůvky na komunikaci"		75,000									
57	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	76,500	76,500	0,000	559,23	42 781,10	0,00	0,00	42 781,10	0,00	0,00%
		10,0+21,50+17,50+8,0+18,0 "- ostrůvky na komunikaci"		75,000									
		75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		76,500									
	R56	Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby						0,00					
58	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,000	15,000	0,000	349,73	5 245,95	0,00	0,00	5 245,95	0,00	0,00%
		15,0 "- komunikace pro pěší - zpětné využití pův. dlažby"		15,000									
	R59	Ostatní plochy komunikací						0,00					
59	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 150 mm	m2	3 361,000	3 361,000	0,000	39,24	131 885,64	0,00	0,00	131 885,64	0,00	0,00%
		292,0+155,0+305,0+255,0+199,0+108,0+104,0+107,0+107,0+205,0+109,0+75,0+106,0+112,0+45,0+150,0+130,0+124,0 "- krajnice podél komunikace"		2 688,000									
		(18,0+10,50)+47,0+41,50+52,50+48,50+41,0+42,0+70,50+108,50+87,0+106,0 "- hospodářské sjezdy"		673,000									
		Součet		3 361,000									
	8	Trubní vedení						0,00					
	R83	Liniové a povrchové odvodnění						0,00					
60	596411114	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	680,975	553,270	-127,705	506,76	345 090,89	-64 715,79	0,00	280 375,10	-64 715,79	-18,75%
		(4,40+2,50)*40,0 "- zpevnění svahu vsakovacího objektu - větev B"		276,000									
		8,350*48,50 "- zpevnění svahu příkopu - větev G"		404,975									
		Součet		680,975									
	ZBV č. 6	Množství dle RDS		553,270									
		Celkem: -680,975 + 553,270		-127,705									
61	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	687,785	558,803	-128,982	270,18	185 825,75	-34 848,36	0,00	150 977,39	-34 848,36	-18,75%
		(4,40+2,50)*40,0 "- zpevnění svahu vsakovacího objektu - větev B"		276,000									
		8,350*48,50 "- zpevnění svahu příkopu - větev G"		404,975									
		Součet		680,975									
		680,975*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		687,785									
	ZBV č. 6	Množství dle RDS		558,803									
		Celkem: -687,785 + 558,803		-128,982									
62	58344171	štěrkodrt frakce 0/32	t	108,956	88,523	-20,433	762,92	83 124,71	-15 588,74	0,00	67 535,97	-15 588,74	-18,75%
		výplň vegetačních tvárnic:											
		0,080*(4,40+2,50)*40,0 "- zpevnění svahu vsakovacího objektu - větev B"		22,080									
		0,080*8,350*48,50 "- zpevnění svahu příkopu - větev G"		32,398									
		Součet		54,478									
		54,478*2 'Přepočtené koeficientem množství		108,956									
	ZBV č. 6	Množství dle RDS		88,523									
		108,956 - (127,705*0,080*2)											
		Celkem: -108,956 + 88,523		-20,433									
63	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	74,000	58,000	-16,000	1 078,87	79 836,38	-17 261,92	0,00	62 574,46	-17 261,92	-21,62%
		16,0+14,50+27,50 "- v příkopu"		58,000									
		10,0+6,0 "- skluzy"		16,000									
		Součet		74,000									
	ZBV č. 6	Množství dle RDS		58,000									
		Celkem: -74,000 + 58,000		-16,000									
64	59227029R1	žlabovka příkopová betonová 570x330mm	m	58,000	58,000	0,000	87,60	5 080,80	0,00	0,00	5 080,80	0,00	0,00%
		16,0+14,50+27,50 "- v příkopu"		58,000									
65	59227029R2	žlabovka svahová betonová 600x500mm	m	16,000	0,000	-16,000	1 568,63	25 098,08	-25 098,08	0,00	0,00	-25 098,08	-100,00%
		10,0+6,0 "- skluzy"		16,000									
	R84	Úprava příkopů						0,00					
	ZBV č. 6	Množství dle RDS		0,000									
		Celkem: -16,000 + 0,000		-16,000									
66	9194131R1	Vtoková jímka z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	kus	2,000	1,000	-1,000	41 444,79	82 889,58	-41 444,79	0,00	41 444,79	-41 444,79	-50,00%
	ZBV č. 6	Množství dle RDS		1,000									
		Celkem: -2,000 + 1,000		-1,000									
67	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	201,500	163,350	-38,150	1 061,74	213 940,61	-40 505,38	0,00	173 435,23	-40 505,38	-18,93%
		1,550*130,0 "- kamenný zához dna vsakovacího objektu"		201,500									
	ZBV č. 6	Množství dle RDS		163,350									
		Celkem: -201,500 + 163,350		-38,150									
68	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze	m2	193,000	221,200	28,200	1 822,78	351 796,54	0,00	51 402,40	403 198,94	51 402,40	14,61%
		41,0+24,0+128,0 "- dno příkopu"		193,000									
	ZBV č. 6	Množství dle RDS		221,200									
		Celkem: -193,000 + 221,200		28,200									
69	211521111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	630,600	630,600	0,000	1 078,52	680 114,71	0,00	0,00	680 114,71	0,00	0,00%
		zpevnění dna příkopu:											
		1,0*0,60*(30,0+38,0+41,0+61,0+106,0+96,0+182,0+117,0+56,0+23,0) "- větev B"		450,000									
		26,50*1,0 "- průleh u vsakovacího objektu"		26,500									
		3,35*46,0 "- zpevnění dna příkopu - větev G"		154,100									
		Součet		630,600									
70	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	2 953,250	2 953,250	0,000	50,69	149 700,24	0,00	0,00	149 700,24	0,00	0,00%
		zpevnění dna příkopu:											
		3,0*(30,0+38,0+41,0+61,0+106,0+96,0+182,0+117,0+56,0+23,0) "- větev B"		2 250,000									
		2*131,0+1,250*77,0 "- vsakovací objekt - větev B"		358,250									
		7,50*46,0 "- větev G"		345,000									
		Součet		2 953,250									
71	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	3 396,238	3 396,238	0,000	40,10	136 189,14	0,00	0,00	136 189,14	0,00	0,00%

[illegible]

		167*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	170,340		0,00								
R96		Bourání konstrukcí vozovek											
95	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	5 661,000	5 661,000	0,000	40,84	231 195,24	0,00	0,00	231 195,24	0,00	0,00%
		POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM DLE CENÍKU KSUS											
		2410,0 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS - rampa D 10"	2 410,000										
		1914,0 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS - II/272"	1 914,000										
		1337,0 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS - III/272 12"	1 337,000										
		Součet	5 661,000										
96	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	4 324,000	4 324,000	0,000	62,99	272 368,76	0,00	0,00	272 368,76	0,00	0,00%
		POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM DLE CENÍKU KSUS											
		2410,0 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS - rampa D 10"	2 410,000										
		1914,0 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS - II/272"	1 914,000										
		Součet	4 324,000										
97	113154335	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	3 251,000	3 251,000	0,000	107,18	348 442,18	0,00	0,00	348 442,18	0,00	0,00%
		POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM DLE CENÍKU KSUS											
		1914,0 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS - II/272"	1 914,000										
		1337,0 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS - III/272 12"	1 337,000										
		Součet	3 251,000										
98	113154336	Frézování živičného krytu tl 300 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 410,000	2 410,000	0,000	151,37	364 801,70	0,00	0,00	364 801,70	0,00	0,00%
		POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM DLE CENÍKU KSUS											
		2410,0 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS - rampa D 10"	2 410,000										
99	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	5 661,000	5 661,000	0,000	33,56	189 983,16	0,00	0,00	189 983,16	0,00	0,00%
		Podkladní vrstva komunikace pro aut. dopravu:											
		2410,0 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS - rampa D 10"	2 410,000										
		1914,0 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS - II/272"	1 914,000										
		1337,0 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS - III/272 12"	1 337,000										
		Součet	5 661,000										
100	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	15,000	15,000	0,000	33,79	506,85	0,00	0,00	506,85	0,00	0,00%
		15,0 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba - předláždění"	15,000										
101	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	59,000	59,000	0,000	100,69	5 940,71	0,00	0,00	5 940,71	0,00	0,00%
		POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM DLE CENÍKU KSUS											
		59,0 "- drobné plochy podél komunikace"	59,000										
102	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	845,000	845,000	0,000	20,14	17 018,30	0,00	0,00	17 018,30	0,00	0,00%
		podkladní vrstvy:											
		15,0 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba"	15,000										
		Obrusné vrstvy:											
		157,0+184,0+81,0+195,0+111,0+102,0 "- štěrkové plochy"	830,000										
		Součet	845,000										
103	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	10,000	10,000	0,000	121,10	1 211,00	0,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00%
		10,0 "- betonové obruby"	10,000										
104	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	2,000	2,000	0,000	50,41	100,82	0,00	0,00	100,82	0,00	0,00%
		2,0	2,000										
105	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	15,000	15,000	0,000	202,76	3 041,40	0,00	0,00	3 041,40	0,00	0,00%
		15,0 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba - předláždění"	15,000										
R97		Ostatní bourací práce	0,00										
106	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	7,000	7,000	0,000	865,00	6 055,00	0,00	0,00	6 055,00	0,00	0,00%
		7,0	7,000										
107	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	m	317,000	317,000	0,000	179,75	56 980,75	0,00	0,00	56 980,75	0,00	0,00%
		POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM DLE CENÍKU KSUS											
		80,0+108,0+129,0	317,000										
108	966008212	Bourání odvodňovací žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm	m	68,000	68,000	0,000	524,49	35 665,32	0,00	0,00	35 665,32	0,00	0,00%
		68,0 "- žlabovky v příkopu"	68,000										
109	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	24,795	24,795	0,000	655,62	16 256,10	0,00	0,00	16 256,10	0,00	0,00%
		0,80*1,40*21,0 "- základ zdi podél pomníku"	23,520										
		1,20*1,250*0,850 "- drobné betonové objekty"	1,275										
		Součet	24,795										
110	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	64,680	64,680	0,000	1 251,75	80 963,19	0,00	0,00	80 963,19	0,00	0,00%
		1,10*21,0*2,80 "- zeď podél pomníku"	64,680										
111	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	26,000	26,000	0,000	119,83	3 115,58	0,00	0,00	3 115,58	0,00	0,00%
R98		Vodorovné dopravní značení	0,00										
112	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	3 815,500	3 815,500	0,000	2,40	9 157,20	0,00	0,00	9 157,20	0,00	0,00%
		666,50+412,50 "- čáry š. 0,125 mm	1 079,000										
		2601,0+135,50 "- čáry š. 0,250 mm	2 736,500										
		Součet	3 815,500										
113	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	666,500	666,500	0,000	10,79	7 191,54	0,00	0,00	7 191,54	0,00	0,00%
		Po pokládce asfaltu:											
		125,50+34,0+50,50+135,0+48,0+86,0+107,50+26,0+54,0	666,500										
114	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	666,500	666,500	0,000	41,94	27 953,01	0,00	0,00	27 953,01	0,00	0,00%
		Obnova značení z barvy:											
		125,50+34,0+50,50+135,0+48,0+86,0+107,50+26,0+54,0	666,500										
115	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	412,500	412,500	0,000	9,59	3 955,88	0,00	0,00	3 955,88	0,00	0,00%
		Po pokládce asfaltu:											
		51,0+269,0+50,0+42,50	412,500										
116	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	412,500	412,500	0,000	38,95	16 066,88	0,00	0,00	16 066,88	0,00	0,00%
		Obnova značení z barvy:											
		320,0+50,0+42,50	412,500										
117	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	2 601,000	2 601,000	0,000	21,57	56 103,57	0,00	0,00	56 103,57	0,00	0,00%
		Po pokládce asfaltu:											
		163,0+15,0+11,0+149,50+15,0*2+5,50+58,0+19,0+18,50+7,50+55,0+674,0+14,50+14,0+7,0+523,50+154,0+12,50+12,0+5,50+149,0+80,50+15,0+14,0+7,0+87,0	2 301,500										
		88,0+102,0+109,50	299,500										
		Součet	2 601,000										
118	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	2 601,000	2 601,000	0,000	83,88	218 171,88	0,00	0,00	218 171,88	0,00	0,00%
		Obnova značení z barvy:											
		163,0+15,0+11,0+149,50+15,0*2+5,50+58,0+19,0+18,50+7,50+55,0+674,0+14,50+14,0+7,0+523,50+154,0+12,50+12,0+5,50+149,0+80,50+15,0+14,0+7,0+87,0	2 301,500										
		88,0+102,0+109,50	299,500										
		Součet	2 601,000										
119	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	135,500	135,500	0,000	17,98	2 436,29	0,00	0,00	2 436,29	0,00	0,00%
		Po pokládce asfaltu:											
		18,0+18,50+18,0+19,0+18,50+43,50	135,500										
120	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	135,500	135,500	0,000	77,89	10 554,10	0,00	0,00	10 554,10	0,00	0,00%
		Obnova značení z barvy:											
		18,0+18,50+18,0+19,0+18,50+43,50	135,500										
121	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	16,500	16,500	0,000	17,98	296,67	0,00	0,00	296,67	0,00	0,00%
		16,50 "- plošné značení na komunikaci"	16,500										
122	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	16,500	16,500	0,000	191,74	3 163,71	0,00	0,00	3 163,71	0,00	0,00%
		Po pokládce asfaltu:											
		16,50 "- plošné značení"	16,500										
123	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	16,500	16,500	0,000	503,31	8 304,62	0,00	0,00	8 304,62	0,00	0,00%

		Obnova značení z barvy: 16,50 "- plošné značení"		16,500									
	R99	Svislé dopravní značení						0,00					
124	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	29,000	29,000	0,000	719,01	20 851,29	0,00	0,00	20 851,29	0,00	0,00%
		13 "- pro 1 značku na 1 sloupek"		13,000									
		12 "- pro 2 značky na 1 sloupek"		12,000									
		2 "- pro 3 značky na 1 sloupek"		2,000									
		2*1 "- pro 1 značku na 2 sloupky"		2,000									
		Součet		29,000									
125	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	29,000	29,000	0,000	838,84	24 326,36	0,00	0,00	24 326,36	0,00	0,00%
126	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	43,000	43,000	0,000	239,67	10 305,81	0,00	0,00	10 305,81	0,00	0,00%
		4+13+8+2+9+5+1+1 "- nové značky"		43,000									
127	40445601	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm	kus	4,000	4,000	0,000	916,73	3 666,92	0,00	0,00	3 666,92	0,00	0,00%
		4 "- A4"		4,000									
128	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	13,000	13,000	0,000	1 064,13	13 833,69	0,00	0,00	13 833,69	0,00	0,00%
		1 "- B13"		1,000									
		2 "- B20a"		2,000									
		5 "- C1"		5,000									
		5 "- C4a"		5,000									
		Součet		13,000									
129	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	8,000	8,000	0,000	916,73	7 333,84	0,00	0,00	7 333,84	0,00	0,00%
		2 "- P1"		2,000									
		6 "- P4"		6,000									
		Součet		8,000									
130	4044562R1	dopravní značky IZ1a 1000x1000mm	kus	1,000	1,000	0,000	2 278,06	2 278,06	0,00	0,00	2 278,06	0,00	0,00%
131	40445630	informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm	kus	2,000	2,000	0,000	1 977,27	3 954,54	0,00	0,00	3 954,54	0,00	0,00%
		1 "- IS1b"		1,000									
		1 "- IS3b"		1,000									
		Součet		2,000									
132	40445631	informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm	kus	9,000	9,000	0,000	1 509,92	13 589,28	0,00	0,00	13 589,28	0,00	0,00%
		1 "- IS1c"		1,000									
		3 "- IS3c"		3,000									
		4 "- IS5"		4,000									
		1 "- IS24b"		1,000									
		Součet		9,000									
133	40445632	informativní značky směrové IS1d, IS2d, IS3d, IS4d, IS19d 1350x500mm	kus	5,000	5,000	0,000	1 977,27	9 886,35	0,00	0,00	9 886,35	0,00	0,00%
		2 "- IS1d"		2,000									
		3 "- IS3d"		3,000									
		Součet		5,000									
134	40445638	informativní značky směrové IS16, IS17 500x300mm	kus	1,000	1,000	0,000	606,36	606,36	0,00	0,00	606,36	0,00	0,00%
		1 "- IS16d"		1,000									
135	40445650	dodatekové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	1,000	0,000	606,36	606,36	0,00	0,00	606,36	0,00	0,00%
		1 "- E13"		1,000									
136	914981R01	Sloupky a stojky dopravního značení z příhradových konstrukcí vč. základů - dodávka a montáž	kus	10,000	10,000	0,000	25 165,26	251 652,60	0,00	0,00	251 652,60	0,00	0,00%
		2*5 "- pro IS9b"		10,000									
137	914211112R1	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti nad 12 m2	kus	5,000	5,000	0,000	5 752,06	28 760,30	0,00	0,00	28 760,30	0,00	0,00%
138	404442R05	značka lamelová dopravní svislá IS9b FeZn - reflexní tř. 2	m2	86,000	86,000	0,000	4 194,21	360 702,06	0,00	0,00	360 702,06	0,00	0,00%
		5*5,0*3,440 "- IS9b"		86,000									
139	912211121	Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo	kus	97,000	97,000	0,000	59,92	5 812,24	0,00	0,00	5 812,24	0,00	0,00%
140	40445153	sloupek svodidlový plastový	kus	97,000	97,000	0,000	299,59	29 060,23	0,00	0,00	29 060,23	0,00	0,00%
141	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	20,000	20,000	0,000	59,92	1 198,40	0,00	0,00	1 198,40	0,00	0,00%
142	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	20,000	20,000	0,000	287,60	5 752,00	0,00	0,00	5 752,00	0,00	0,00%
		20 "- Z11g červený"		20,000									
143	912221111	Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného zinkovaného ručním beraněním	kus	52,000	52,000	0,000	59,92	3 115,84	0,00	0,00	3 115,84	0,00	0,00%
144	40445165	sloupek směrový silniční ocelový	kus	52,000	52,000	0,000	383,47	19 940,44	0,00	0,00	19 940,44	0,00	0,00%
145	912521121	Montáž dopravního knoflíku zapuštěného do obrubníku	kus	179,000	179,000	0,000	179,75	32 175,25	0,00	0,00	32 175,25	0,00	0,00%
		94+85		179,000									
146	63437002	knoflík pochozí zapuštěný z tvrzeného skla D 50mm	kus	179,000	179,000	0,000	479,34	85 801,86	0,00	0,00	85 801,86	0,00	0,00%
		94+85		179,000									
	99	Přesuny hmot a sutí						0,00					
147	997221579R	Vodorovná doprava vybouraných hmot do sutí (směsný stavební odpad)	t	3 530,933	3 530,933	0,000	65,91	232 723,79	0,00	0,00	232 723,79	0,00	0,00%
		8340,610 "- sutí celkem"		8 340,610									
		-(651,015+994,520+1495,460+1662,90+5,782) "- odkupovaný vybouraný asfaltový materiál"		-4 809,677									
		Součet		3 530,933									
148	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3 530,933	3 530,933	0,000	161,78	571 234,34	0,00	0,00	571 234,34	0,00	0,00%
		8340,610 "- sutí celkem"		8 340,610									
		-(651,015+994,520+1495,460+1662,90+5,782) "- odkupovaný vybouraný asfaltový materiál"		-4 809,677									
		Součet		3 530,933									
149	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	5 140,001	5 034,784	-105,217	26,36	135 490,43	-2 773,52	0,00	132 716,91	-2 773,52	-2,05%
		ZBV č. 6 Množství dle RDS		5 034,784									
		Celkem: -5 140,001 + 5044,783		-105,217									
		Nové položky											
1001	122452207	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem přes 5000 m3 strojně	m3	0,000	4 847,463	4 847,463	380,00	0,00	0,00	1 842 035,94	1 842 035,94	1 842 035,94	100,00%
		ZBV 1 Nahrazené množství z pol. č. 7		2 701,063			CS ÚRS 2022 01						
		2683 (dle 3D) * 0,8 = 2146,4		2 146,400			CS ÚRS 2022 01						
		Celkem: 2701,063 + 2146,400 = 4847,463		4 847,463									
1002	132451254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	0,000	405,000	405,000	745,00	0,00	0,00	301 725,00	301 725,00	301 725,00	100,00%
		ZBV 1 Nahrazené množství z pol. č. 16		405,000			CS ÚRS 2022 01						
1003	564871116	Podklad ze štěrkokdrťe ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	0,000	8 943,333	8 943,333	344,00	0,00	0,00	3 076 506,55	3 076 506,55	3 076 506,55	100,00%
		ZBV 1 2683 m3 (dle 3D)					CS ÚRS 2022 01						
		2683/0,3 = 8 943,333 m2		8 943,333									
1004	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	0,000	0,864	0,864	134,250	0,00	0,00	115,99	115,99	115,99	100,00%
		ZBV č. 6 Množství dle RDS					JC z SoD SO 110 pol. č. 5						
1005	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	0,000	0,864	0,864	2 684,740	0,00	0,00	2 319,62	2 319,62	2 319,62	100,00%
		ZBV č. 6 Množství dle RDS					JC z SoD SO 110 pol. č. 8						
		Celkem						50 619 492,59	- 5 084 720,56	6 253 767,95	51 788 539,99	1 169 047,40	2,31%

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice
Odštěpný závod Praha



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov**



Naše značka: FA/124/JD

Dne 24.4.2024

Věc: Oznámení zhotovitele, návrh změny odvodnění v okolí větve G

Název stavby: II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212

Číslo smlouvy objednatele: S-3236/00066001/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/FA/2022/030/FAFY

Vážený Objednateli,

V souladu s Pod-čl. 7.8 Smlouvy o dílo č. S-3236/00066001/2022 ze dne 5.12.2022 Vám zasílám Oznámení s návrhem změny odvodnění v okolí větve G pro naši výše uvedenou stavbu.

Vzhledem k novým skutečnostem, které vyvolala přeložka kabelu pro společnost CETIN, bylo nutné uvažovat o možnostech přizpůsobení současného projektu v reakci na reálnou polohu kabelu po provedení přeložky.

Oproti původnímu předpokladu, že bude předmětem přeložky pouze kabel lokálního významu byla ve skutečnosti realizována přeložka sítě spol. CETIN celostátního významu s ohledem na nově vzniklé datové centrum v průmyslové zóně. Původní trasa uvedená v projektu počítala nově s uložení kabelu velmi blízko hraně pozemku 1420/4, vzhledem k existenci oplocení přímo na hraně pozemku a původní trase překládaného kabelu, byla nová trasa uložení lehce změněna, tak aby byl kabel co nejméně ohrožen budoucí výstavbou. I přes veškerou snahu o jeho bezpečnou polohu je vzhledem k jeho důležitosti velmi riskantní provádět práce v jeho okolí strojně. Proto jsme požádali zhotovitele RDS o to, aby byl prověřen současný projekt


strana 1 z 3

STRABAG a.s.
Boženy Němcové 756


Společnost: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.
IČO 60838744, DIČ CZ60838744

Raiffeisenbank a.s.
IBAN: CZ02 0300 0000 0001 1207 1233
BIC/SWIFT: CEKOCZPPXXX

s možností o zmenšení vsakovacího příkopu podél silnice III/27212 za účelem zvýšení ochranného prostoru v okolí překládaného kabelu.

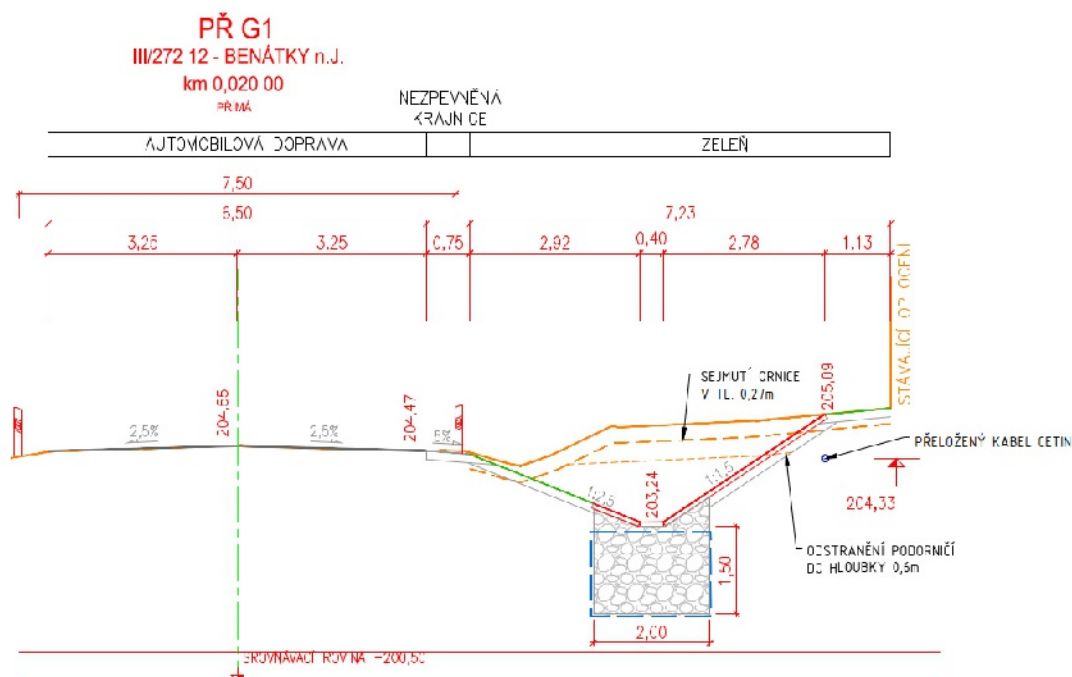

obr.1

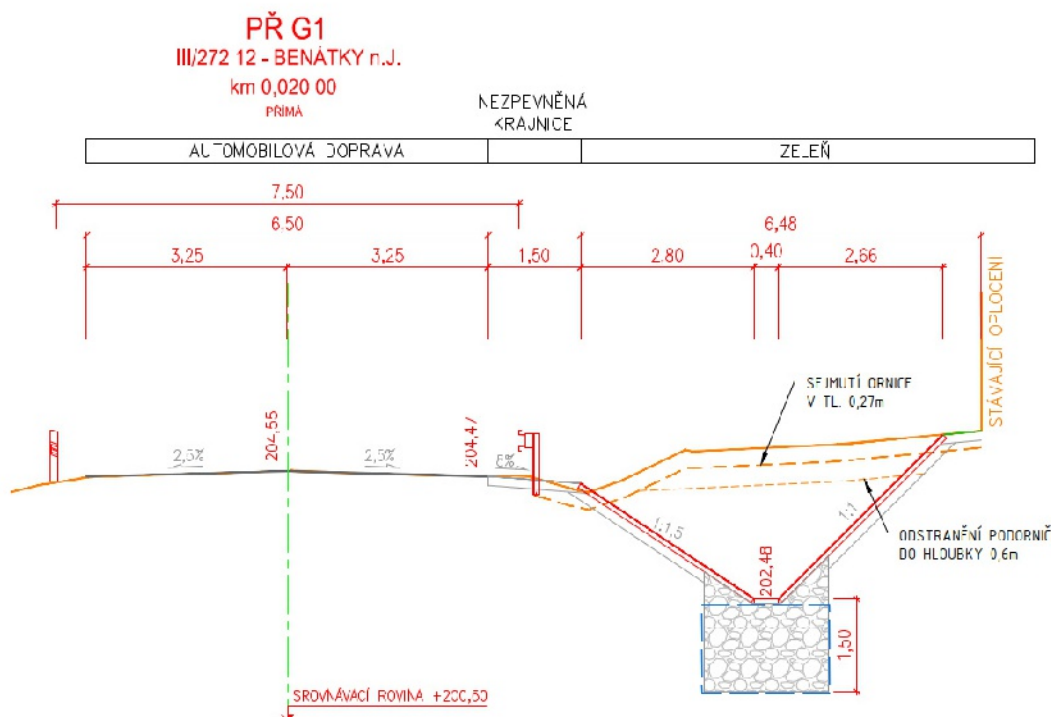

obr.2

Obr. 1. Charakteristický řez nově navrhovaného řešení s vyznačenou polohou kabelu CETIN po provedení přeložky

Obr. 2. Původní charakteristická řez vycházející z PDPS

Námi předložený návrh upravuje odvodnění komunikace tak, že dochází v rámci přepočtu odvodu srážkových vod ke zmenšení vsakovacího objektu podél silnice III/27212, což má za následek změnu dimenze u dvou propustků. Z propustku pod hospodářským sjezdem na pozemek 1419/2 o původní dimenzi DN 1000 by bylo možné uvažovat o propustku DN 600 a propustek pod větví G by bylo možno zmenšit z DN 1200 na DN 1000.

Celkový předpokládaný cenový dopad dle tohoto návrhu činí **-1.267.844,00 Kč**.

Za Zhotovitele: STRABAG a.s.

Ing. Jan Dušek

Přílohy:

1 – Návrh na variaci rozpočtu

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Projekt: II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212

Číslo smlouvy objednatele: S-3236/00066001/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/FA/2022/030/FAFY

Věc: Oznámení zhotovitele, změna projektu větve G


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212“ po dohodě a se souhlasem AD a TDI stavby bere na vědomí ohlášení změny, jejímž předmětem je změna projektu větve G, vyvolanou přeložkou kabelu pro společnost CETIN celostátního významu. KSÚS tímto žádá o předložení zpracovaných změnových listů.


Původní trasa uvedená v projektu počítala nově s uložením kabelu velmi blízko hraně pozemku 1420/4, vzhledem k existenci oplocení přímo na hraně pozemku a původní trase překládaného kabelu, byla nová trasa uložení lehce změněna, tak aby byl kabel co nejméně ohrožen budoucí výstavbou. I přes veškerou snahu o jeho bezpečnou polohu je vzhledem k jeho důležitosti velmi riskantní provádět práce v jeho okolí strojně. Z těchto důvodů je nutná, po přepočtu odvodu srážkových vod, úprava odvodnění komunikace formou změny dimenze u dvou propustků.

Změna bude řešena formou ZBV. Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných změn. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení, včetně finančního navýšení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

Martin Voříšek
Projektový manažer




Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
Kancelář: Praha
www.ksus.cz



TABULKA NOVÝCH POLOŽEK

Stavba: - II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212

Objekt: SO 101 - Přeložka silnice III/27212

Rozpočet: SO 101 - Přeložka silnice III/27212

Poř.č.	Položka	Typ	Text	Poznámky	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
1004	132251103	N	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	Jednotková cena převzata z SoD na SO 110 pol. č. 5.	M3	0,864	134,25	115,99
1005	274313811	N	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	Jednotková cena převzata z SoD na SO 110 pol. č. 8.	M3	0,864	2 684,74	2 319,62

VAŠE ZNAČKA:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: 24-868-20241107-O

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

IDDS:

MÍSTO / DATUM: Praha 9. 11. 2023

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Pan Martin Voříšek, Projektový manažer
Pověřená osoba Objednavatele
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Stavba: "II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212"

Číslo smluv: Objednatele: S-3236/00066001/2022 Zhotovitele: 841/TC/FA/2022/030/FAFY

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Věc: Vyjádření TDI k zaslanému návrhu zhotovitele ZBV č.4 a 5**ZBV č.4 Výměna obrub v ostrůvcích výjezdových a nájezdových větví OK:**


V PDPS byly navrženy v dělicích ostrůvcích mezi výjezdovými a nájezdovými větvemi okružní křižovatky žulové obrubníky OP2 s nášlapem 10 cm. Zhotovitel navrhl změnu a použít betonové obrubníky s ponecháním nášlapu 10 cm. Změnu zhotovitel odůvodňuje snížením rizika při najetí vozidel na obrubník a také snížením rizika vylomení obrubníku. Záměnou dojde k finanční úspoře. Dále dojde k materiálovému sjednocení s blízkou okružní křižovatkou umístěnou před vjezdem do Benátek n/J.

ZBV č.5 Úpravy odvodnění větve „G“ komunikace III/27212:

Při provádění přeložky kabelu CETIN podél větve „G“ podél komunikace III/27212 musela být trasa vedení přeložky kabelu CETIN oproti PDPS přizpůsobena zastiženým podmínkám. Změna polohy trasy přeložky kabelu CETIN vyvolala potřebu upravit odvodnění větve „G“ komunikace III/27212. V rámci úpravy odvodnění došlo k přepočtu množství odváděných dešťových vod, což vedlo ke zmenšení vsakovacího objektu umístěného vedle komunikace III/27212, a změně – zmenšení dimenze dvou propustků z původního DN 1000 na DN 600 a z původní dimenze DN 1200 na DN 1000.

K zaslaným návrhům zhotovitele ZBV č.4 a 5 nemá TDI po technické stránce připomínky.

S pozdravem



Ing. Pavel Šindelář
TDI



**ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.**
Ohradní 24b
140 00 Praha 4 - Michle

Firma je registrována v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 31260

Váš dopis/email zn.: KSÚS Stř.kr.
Ze dne: 22.10.2024

Naše zn.: APIS-1
Vyřizuje: Ing. Jan Adamů

Datová schránka: 279neic

Datum: 2024-11-04

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Pan Martin Voříšek, Projektový manažer
Pověřená osoba Objednavatele
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření AD k zaslanému návrhu zhotovitele ZBV č. 4 – 5

Akce: „II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212 - PD“

ZBV č.4

Výměna obrub v ostrůvcích výjezdových a nájezdových větví OK:

Zadávací dokumentace uvažuje v dělicích ostrůvcích mezi výjezdovými a nájezdovými větvemi okružní křižovatky s použitím žulových obrubníků OP2 s nášlapem 10 cm. Zhotovitel navrhl použití betonového obrubníku k okružním křižovatkám z důvodu snížení rizika pro vozidla při najetí na obrubník a zároveň z důvodu snížení rizika proti vylomení obrubníku a poškození celého ostrůvku. Použitím betonového obrubníku dojde k finanční úspoře i k materiálovému sjednocení s nedalekou okružní křižovatkou.

ZBV č.5

Vzhledem k novým skutečnostem, které vyvolala přeložka kabelu pro společnost CETIN a.s., bylo nutné uvažovat o možnostech přizpůsobení současného projektu v reakci na reálnou polohu kabelu po provedení přeložky.

Oproti původnímu předpokladu, že bude předmětem přeložky pouze kabel lokálního významu, byla s ohledem na nově vzniklé datové centrum v průmyslové zóně ve skutečnosti realizována přeložka sítí spol. CETIN a.s. celostátního významu. Původní trasa přeložky uvedená v projektu počítala s uložením kabelu velmi blízko hraně pozemku 1420/4. Vzhledem k existenci oplocení přímo na hraně pozemku a původní trase překládaného kabelu byla nová trasa uložena lehce změněna tak, aby byl kabel co nejméně ohrožen budoucí výstavbou. I přes veškerou snahu o jeho bezpečnou polohu je vzhledem k jeho důležitosti velmi riskantní provádět práce v jeho okolí strojně. Proto Zhotovitel stavby požádal zpracovatele RDS o to, aby byl prověřen současný projekt s možností o zmenšení vsakovacího příkopu podél silnice III/27212 za účelem zvýšení ochranného prostoru v okolí překládaného kabelu spol. CETIN a.s..

Zhotovitelem předložený návrh upravuje odvodnění komunikace tak, že dochází v rámci přepočtu odvodu srážkových vod ke zmenšení vsakovacího objektu podél silnice III/27212, což má za následek změnu dimenze u dvou propustků. Z propustku pod hospodářským sjezdem na pozemek 1419/2 o původní dimenzi DN 1000 by bylo možné uvažovat o propustku DN 600 a propustek pod větví G by bylo možno zmenšit z DN 1200 na DN 1000.




**ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.**
Ohradní 24b
140 00 Praha 4 - Michle

Firma je registrována v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 31260

Autorský dozor s tímto návrhem ZBV č. 4 - 5 souhlasí. Další připomínky k ZBV AD neuplatňuje. ZBV je možné autorizovat po cenovém projednání ze strany Krajské správy a údržby Středočeského kraje.

S pozdravem



AD



profil zadavatele

V Říčanech dne 25. 08. 2022

Reg. č.: VZ-381/22

Č.j.: 1646/22/KSUS/R/BAL

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14-20 k veřejné zakázce „II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupise prací je u frézovaného materiálu požadován odkup. V přiložených podkladech jsme nenašli ceník KSUS určující ceny odkupů. Prosíme o doplnění.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Ceny odkupů jsou uvedeny ve vzoru smlouvy – příloha č. 2 Ceník nepotřebných zásob
15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V SO 101 se vyskytuje položka číslo 65 – Vtoková jímka z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí – v projektové dokumentaci jsme k ní nenašli žádné podrobnosti. Prosíme o specifikaci – rozměry, této jímky.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Vtoková jímka byla v PD i v rozpočtu upřesněna: kaliště - ŽB jímka, beton C30/37 XF3+XA1, uvažované vnitřní rozměry 1,5m x 1,2m, výška 1,2m, tl. stěny 0,25m. Byl vydán nový soupis prací.
16.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Prosíme o upřesnění, co je obsaženo v položce soupisu prací č.8 u SO 301 – Výšková etáž předpoklad
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jedná se o výškovou změnu nivelety potrubí pomocí oblouků příslušných stupňů

17.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	soupise prací se nachází v SO 110 položka č. 32 - Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 600 až 800. V PD je toto čelo zakresleno bez podrobnějších rozměrů ve výkrese SO_110_08, ale je u něj uvedeno, že je prefabrikované. Prosíme zadavatele o upřesnění, zda bude čelo prefabrikované či z prostého betonu, sjednocení projektové dokumentace se soupisem prací a o uvedení rozměrů.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Prefabrikovaná čela propustku pro DN 600 jsou uvažovaná délky přibližně 1,5m. Soupis prací byl sjednocen s PD. Byl vydán nový soupis prací.

18.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V přiložených podkladech jsme nenašli ceník KSUS určující ceny odkupů. Prosíme o doplnění.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Ceník nepotřebných zásob je uveden v příloze č. 2 vzoru Smlouvy


19.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací u SO 801 - Vegetační úpravy jsou dle nás položky 25-29 (oddíl Rostlinný materiál - velikost a kvalita dle PD) duplicitní k položkám č. 49-86 (oddíl D10 - Rostliny). V položkách 25-29 je uveden celkový počet, v položkách 49-86 je uveden počet dle přesné specifikace rostlin. Prosíme zadavatele o přezkoumání, zda se jedná o duplicitu, úpravu soupisu prací či o případné vysvětlení, které z těchto položek mají být naceněné.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položky byly upraveny (odstraněny) a v návaznosti na dotaz č. 9 byl již vydán nový soupis prací, ve kterém byly tyto nesrovnalosti odstraněny.


20.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	pro vyloučení všech pochybností se ptáme, zda součástí nabídky účastníků má být příloha smlouvy "Jednotný vizuální styl (součást návrhu smlouvy)", jak je požadováno v zadávací dokumentaci na str. 18 i 22. V návrhu smlouvy o dílo tato příloha ale uvedena není (str. 23 smlouvy), ani není poskytnuta její podoba.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Ne, účastník nepoužije jednotný vizuální styl (toto je uvedeno v zadávací dokumentaci omylem). Ten není součástí smlouvy jako příloha.




Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- VV_2018-043 - II-272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III-27212....pdf
- VV_2018-043 - II-272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III-27212....xls
- C_03 Koordinační situační výkres_rev.pdf
- D_SO_101_02 Podrobná situace_rev.pdf

Zadavatel vzhledem k výše uvedenému mění termín pro podání nabídek na 14. 09. 2022 v 9:00

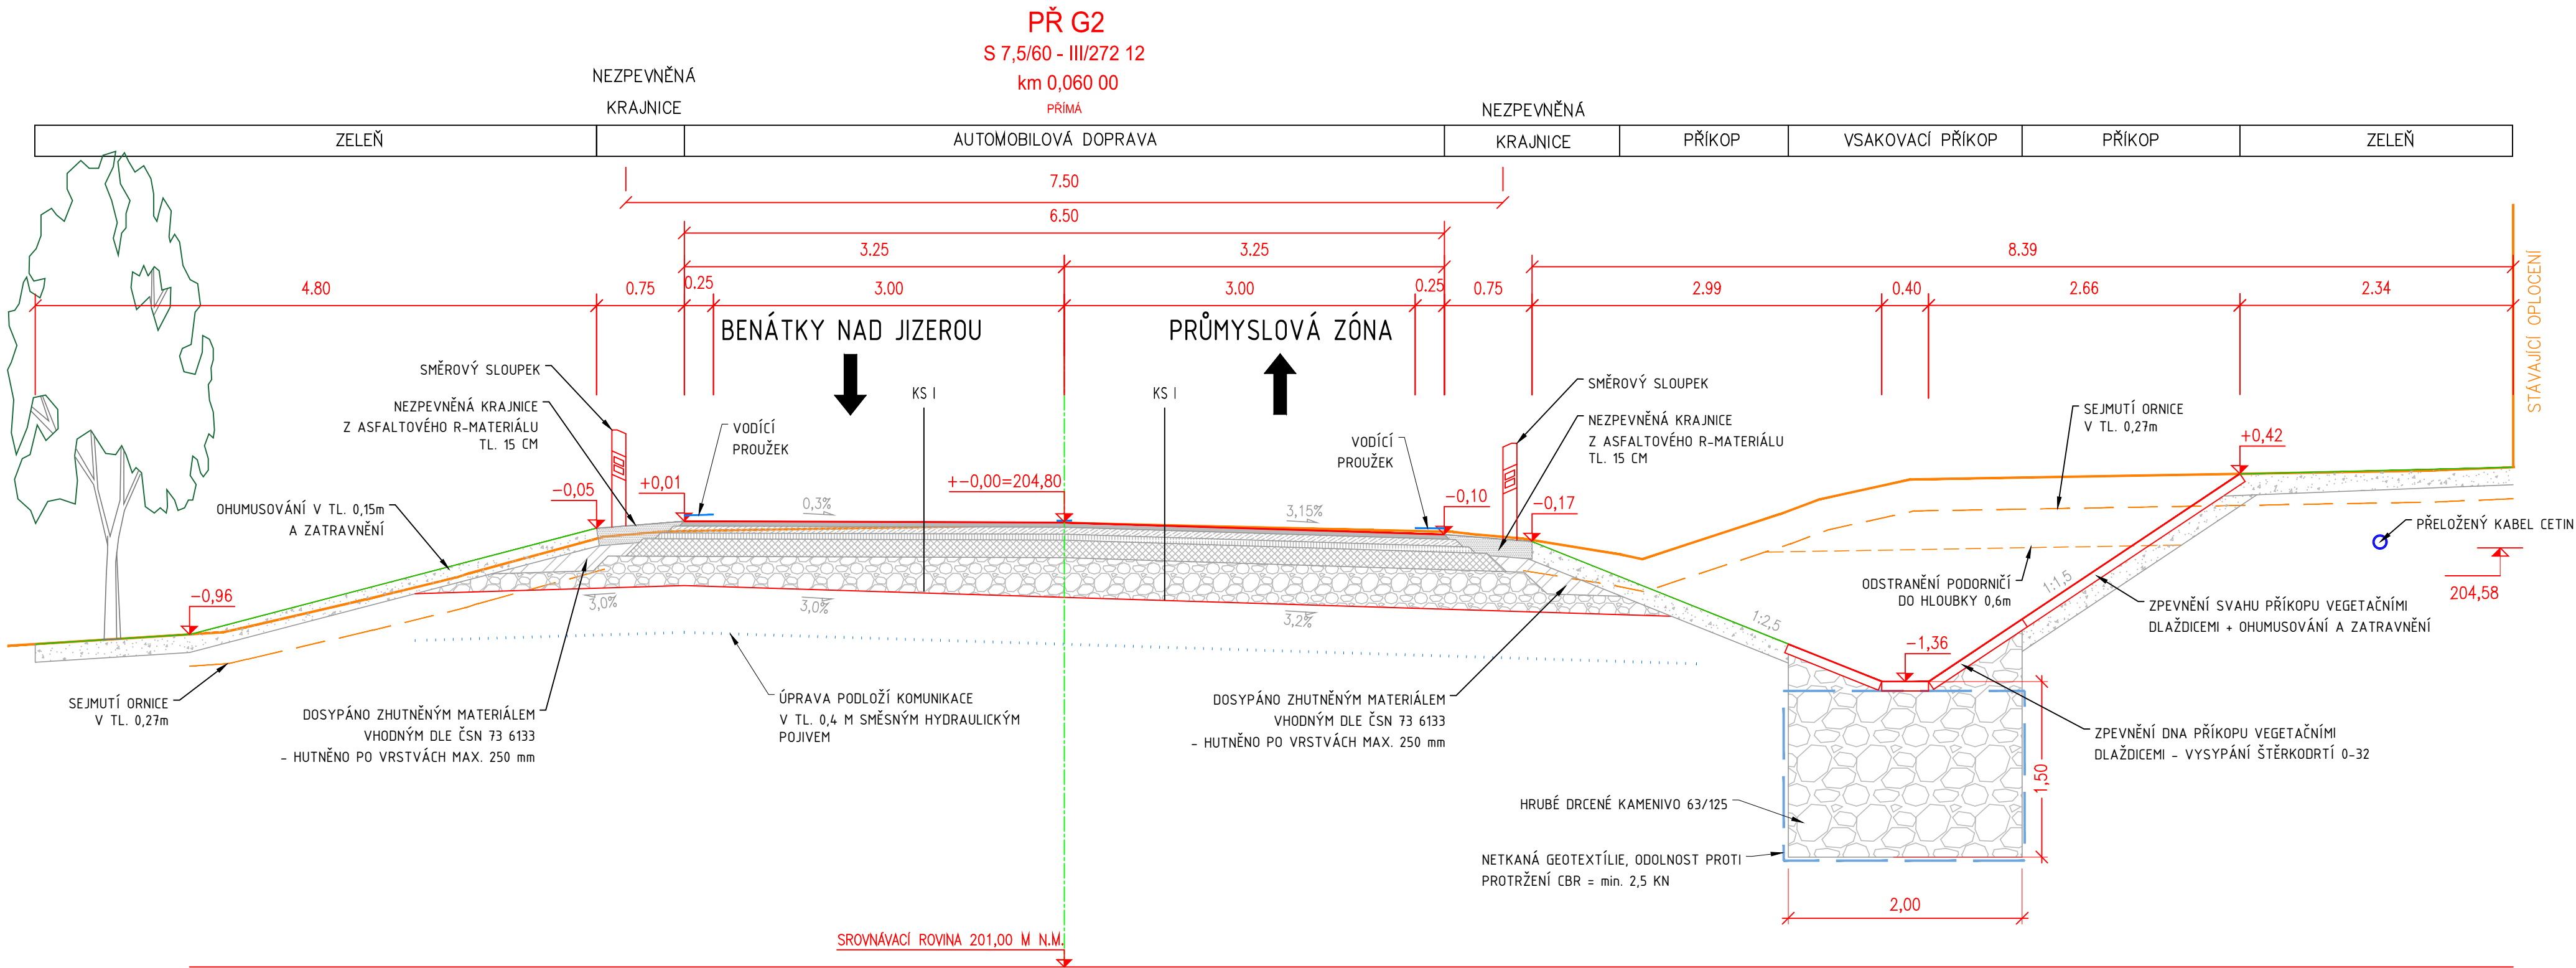

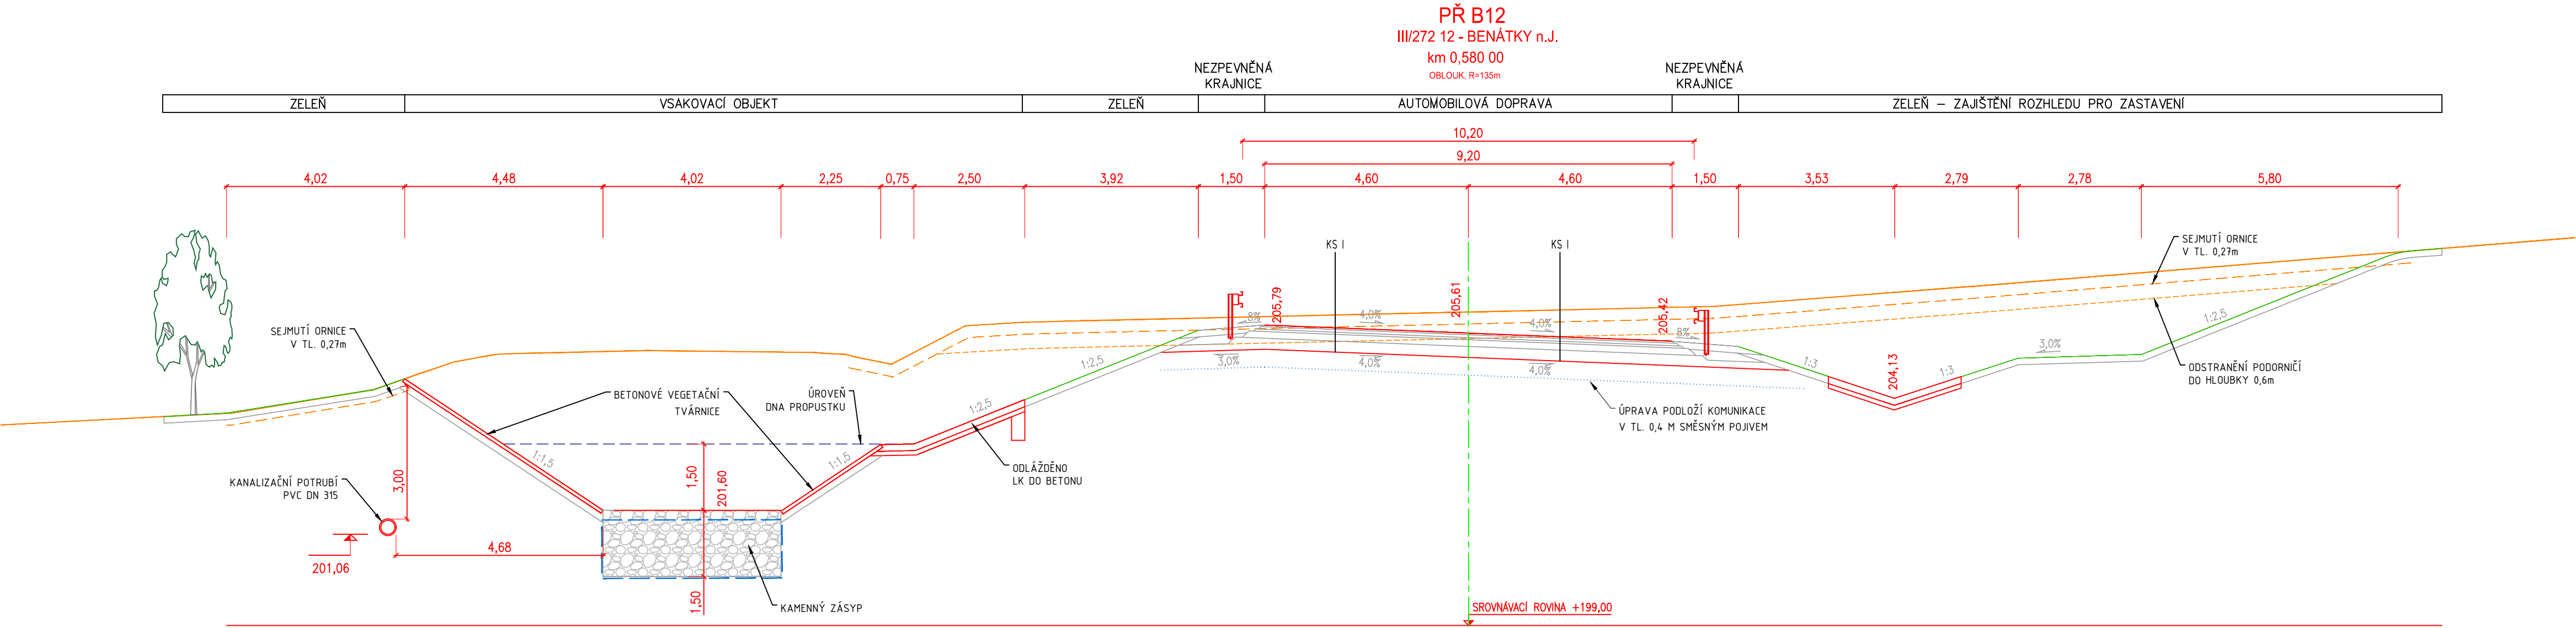

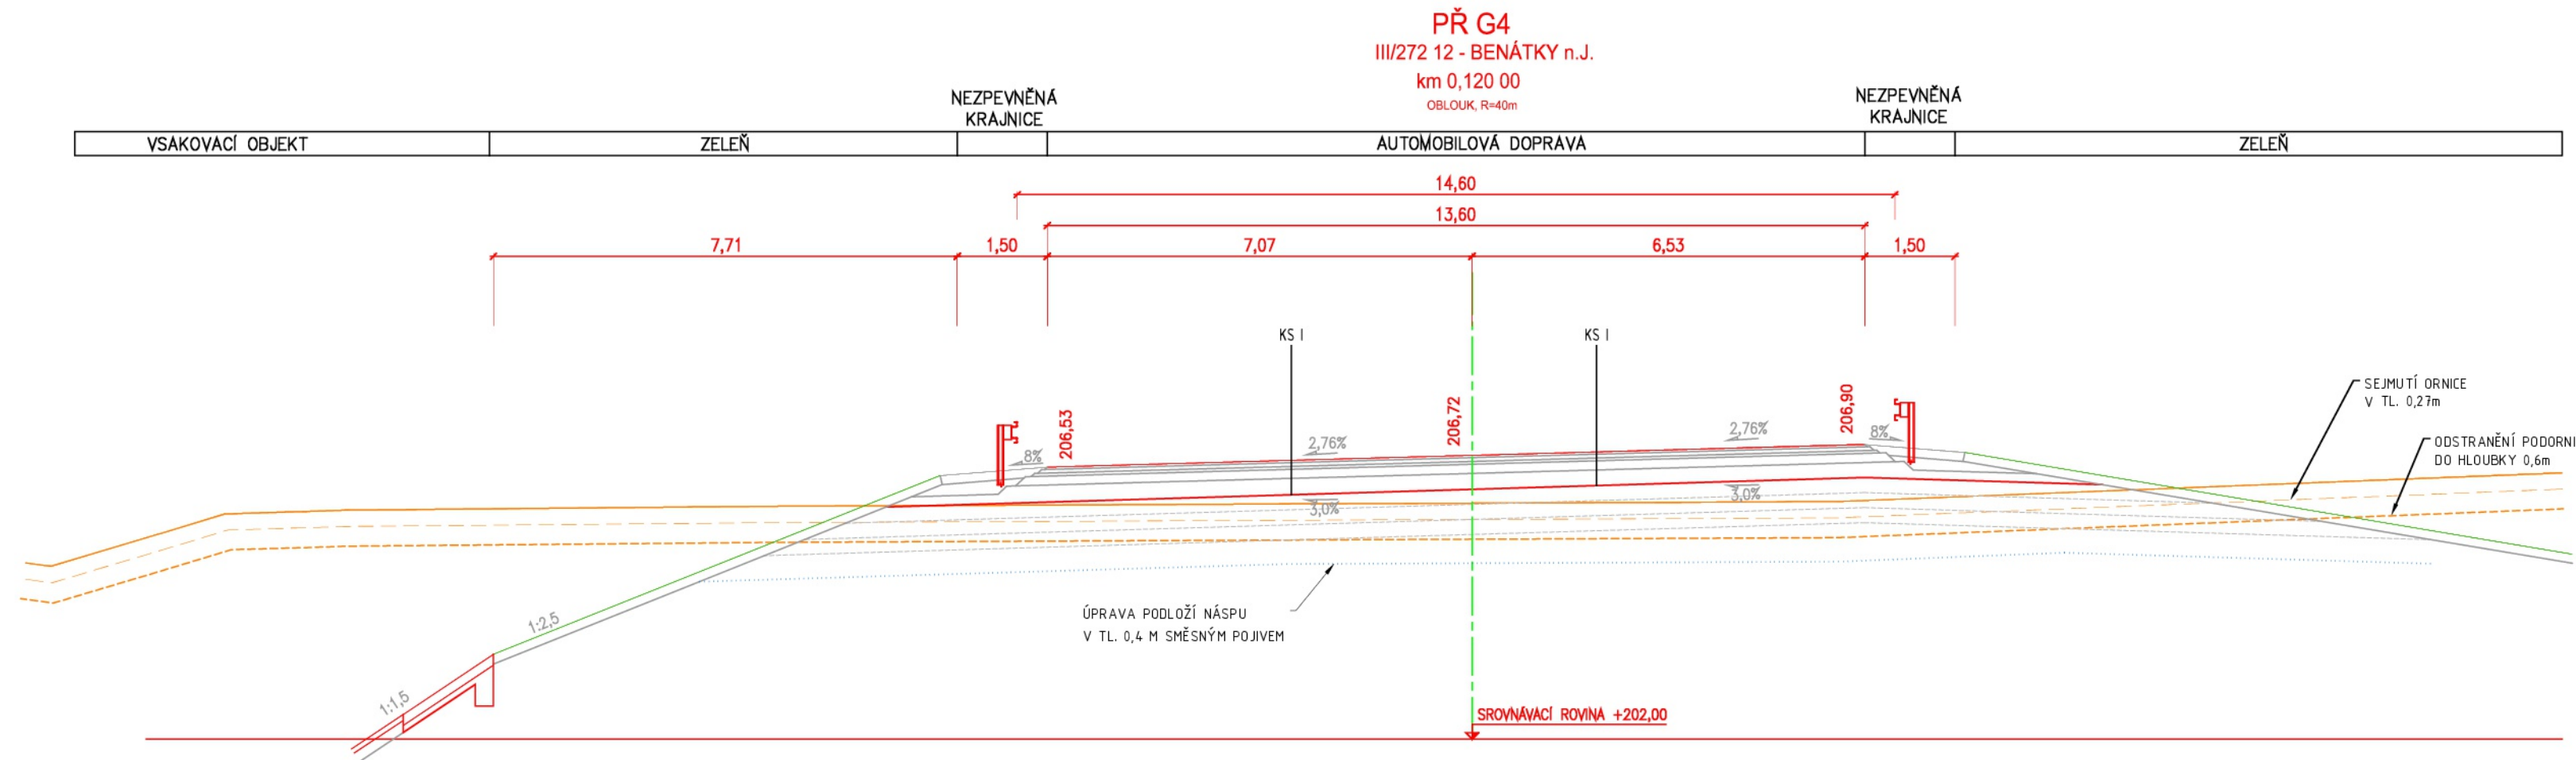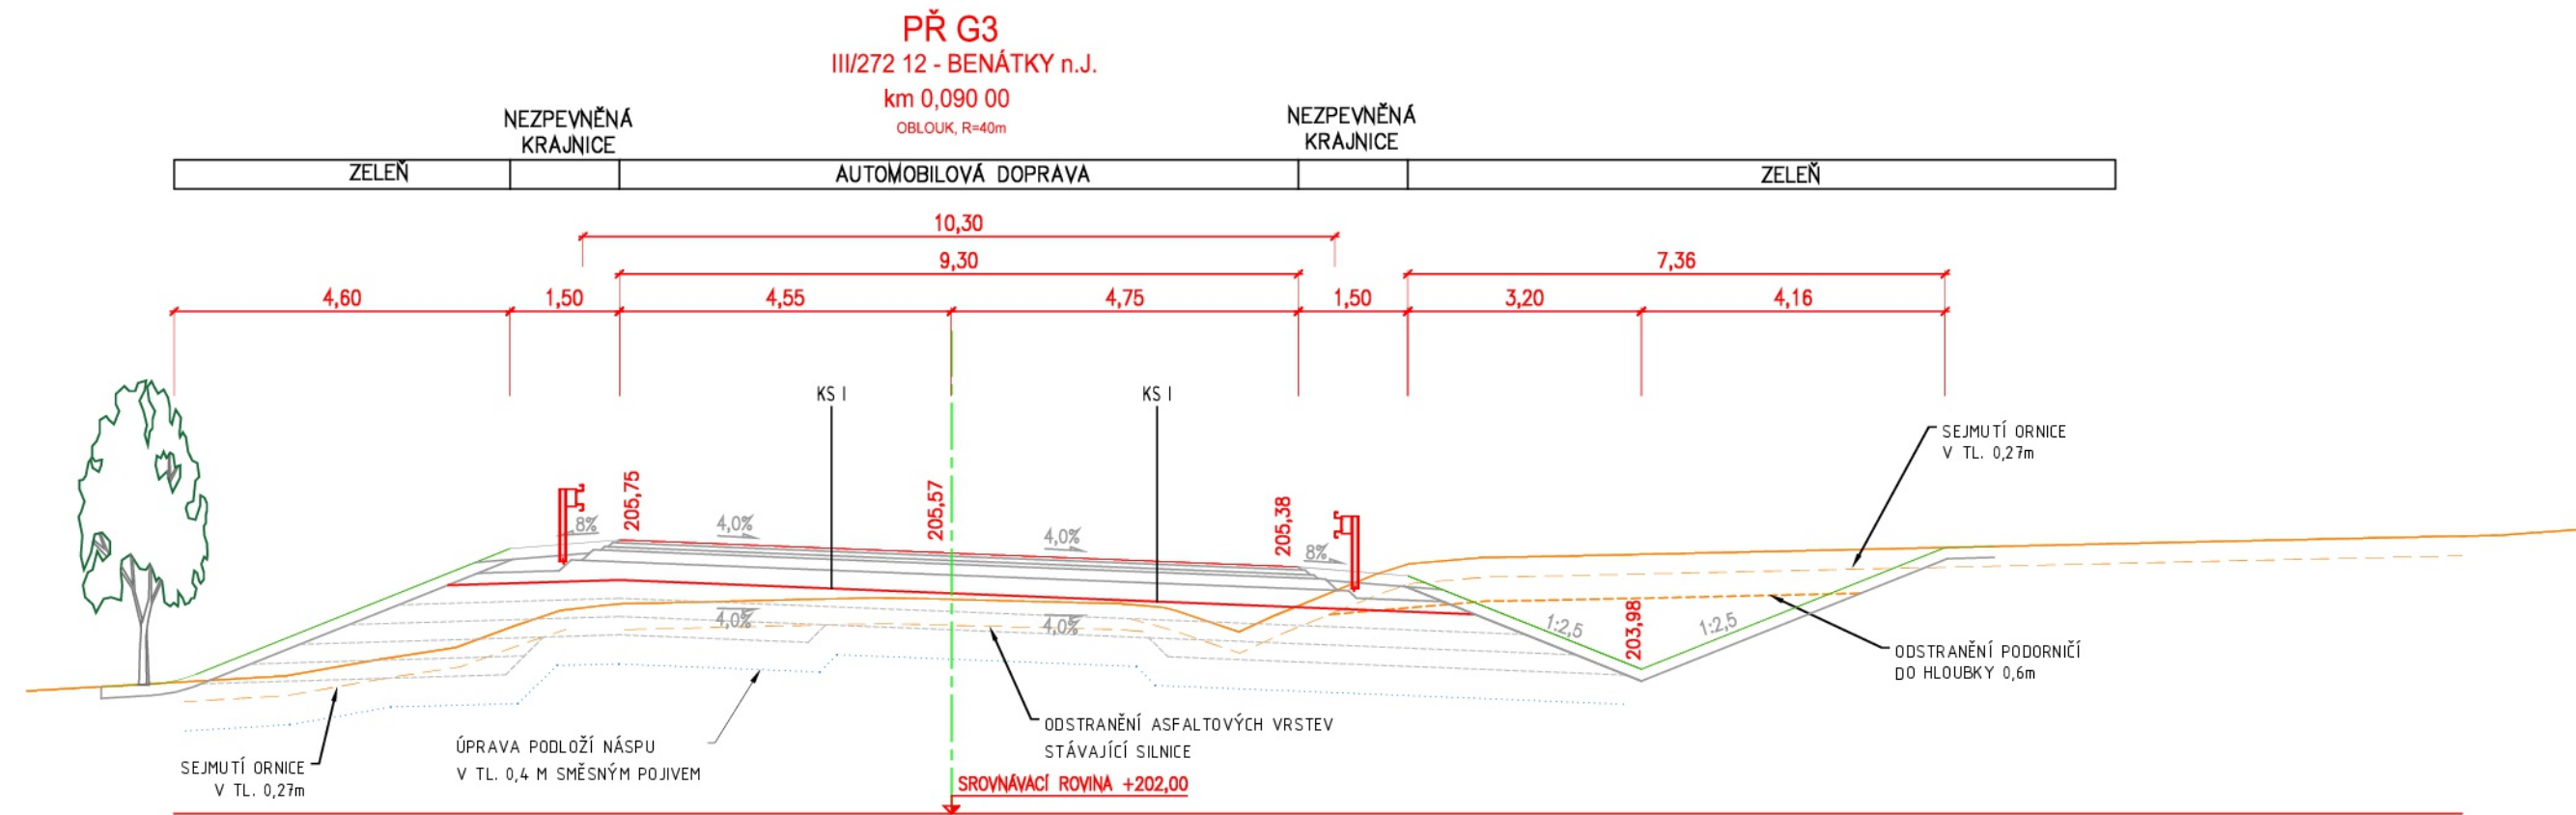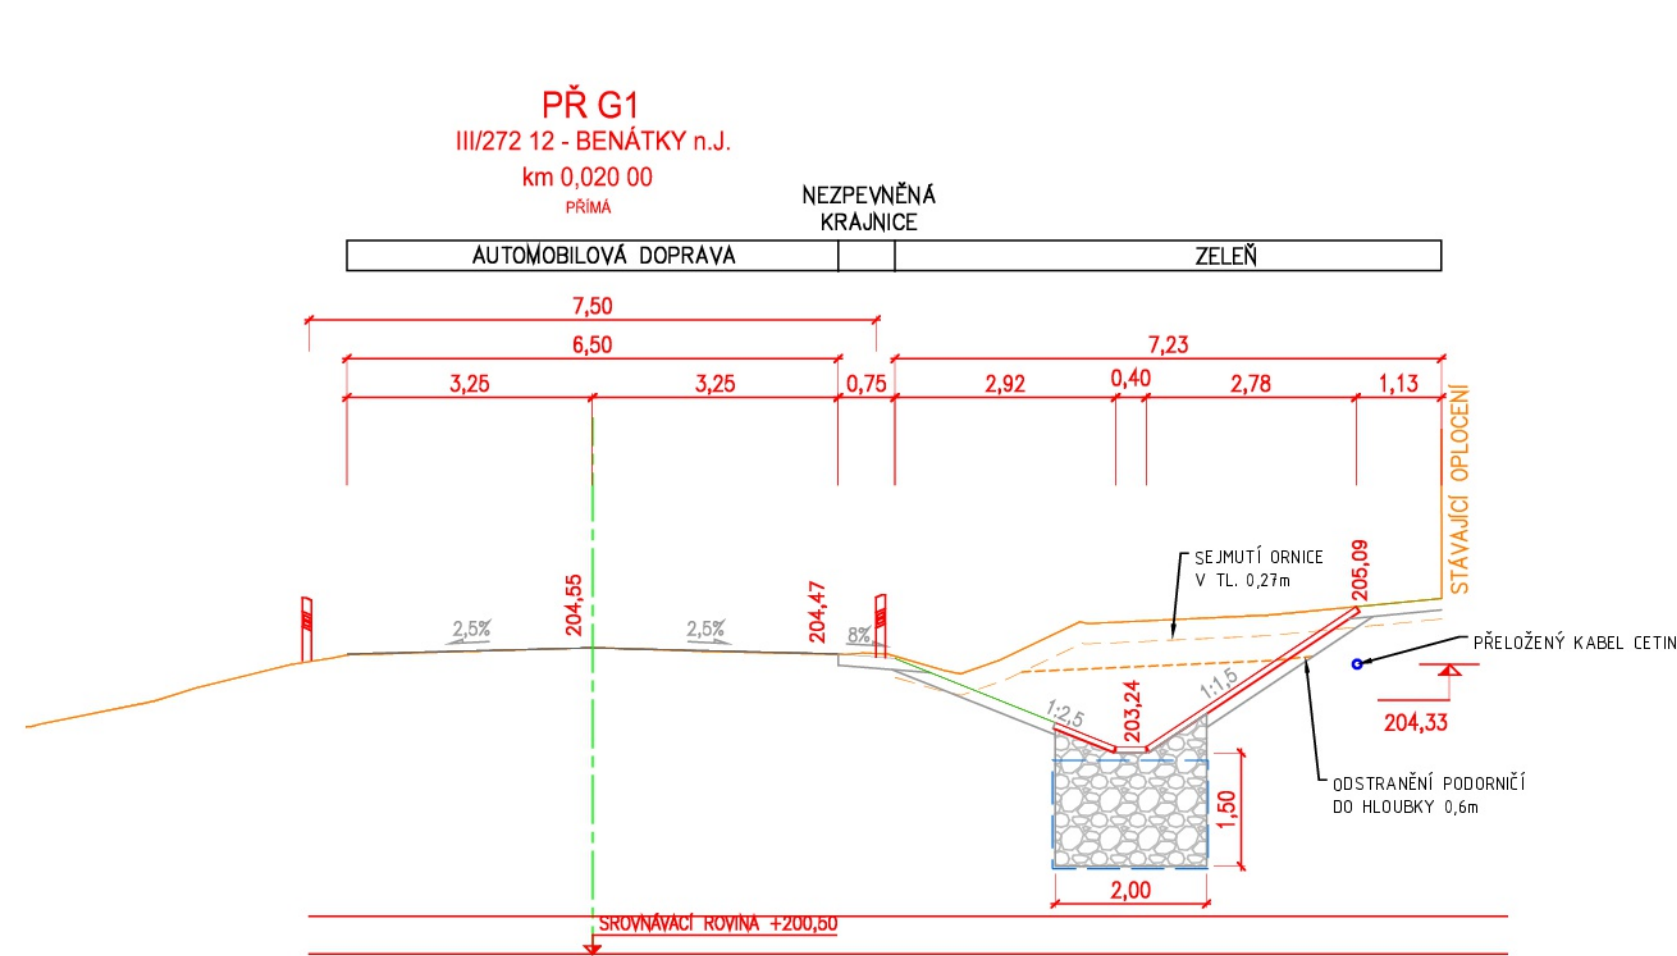


c			
b			
a	ZMĚNA HLoubKY PŘÍKOPU, SKLONU A ZPEVNĚNÍ SVAHŮ, ÚPRAVA NEZP. KRAJNICE, ÚPRAVA ROZSAHU SVODIDEL	21.11.2023	
č	text změny - odůvodnění	datum	podpis

Investor	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, příspěvk. org. Zborovská 11, 150 21 Praha 5	
----------	---	---

Objednatel	STRABAG a.s., odštěpný závod Praha Boženy Němcové 756, 294 71 Benátky nad Jizerou	
------------	---	---

Ředitel ateliéru	Zodpovědný projektant	Tech. kontrola	Vypracoval	 CR PROJECT s.r.o., POD BORKEM 319, 293 01 Mladá Boleslav tel.: +420 326 700 666 GSM GATE: +420 606 602 039 fax: +420 326 700 665 e-mail: info@crproject.cz URL: http://www.crproject.cz
Ing. Jiráček J.	Ing. Jiráček J.	Ing. Adamů J.	Ing. Příbyl M.	
stavba: II/272 BENÁTKY NAD JIZEROU, PŘÍPOJENÍ NA SILNICI III/27212				HIP: Ing. Martin Příbyl
část: D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ				číslo zakázky: 2023-022
objekt: SO.101 - PŘELOŽKA SILNICE III/27212				stupeň dokumentace: RDS
obsah: CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY VĚTEV "G" - III/272 12 - BENÁTKY n.J.				datum: 05.2023
název dig.souboru:				mřítko: 1:100 formát: 4 x A4
číslo přílohy: 101-05g				výkres číslo: výtisk číslo:
				05g

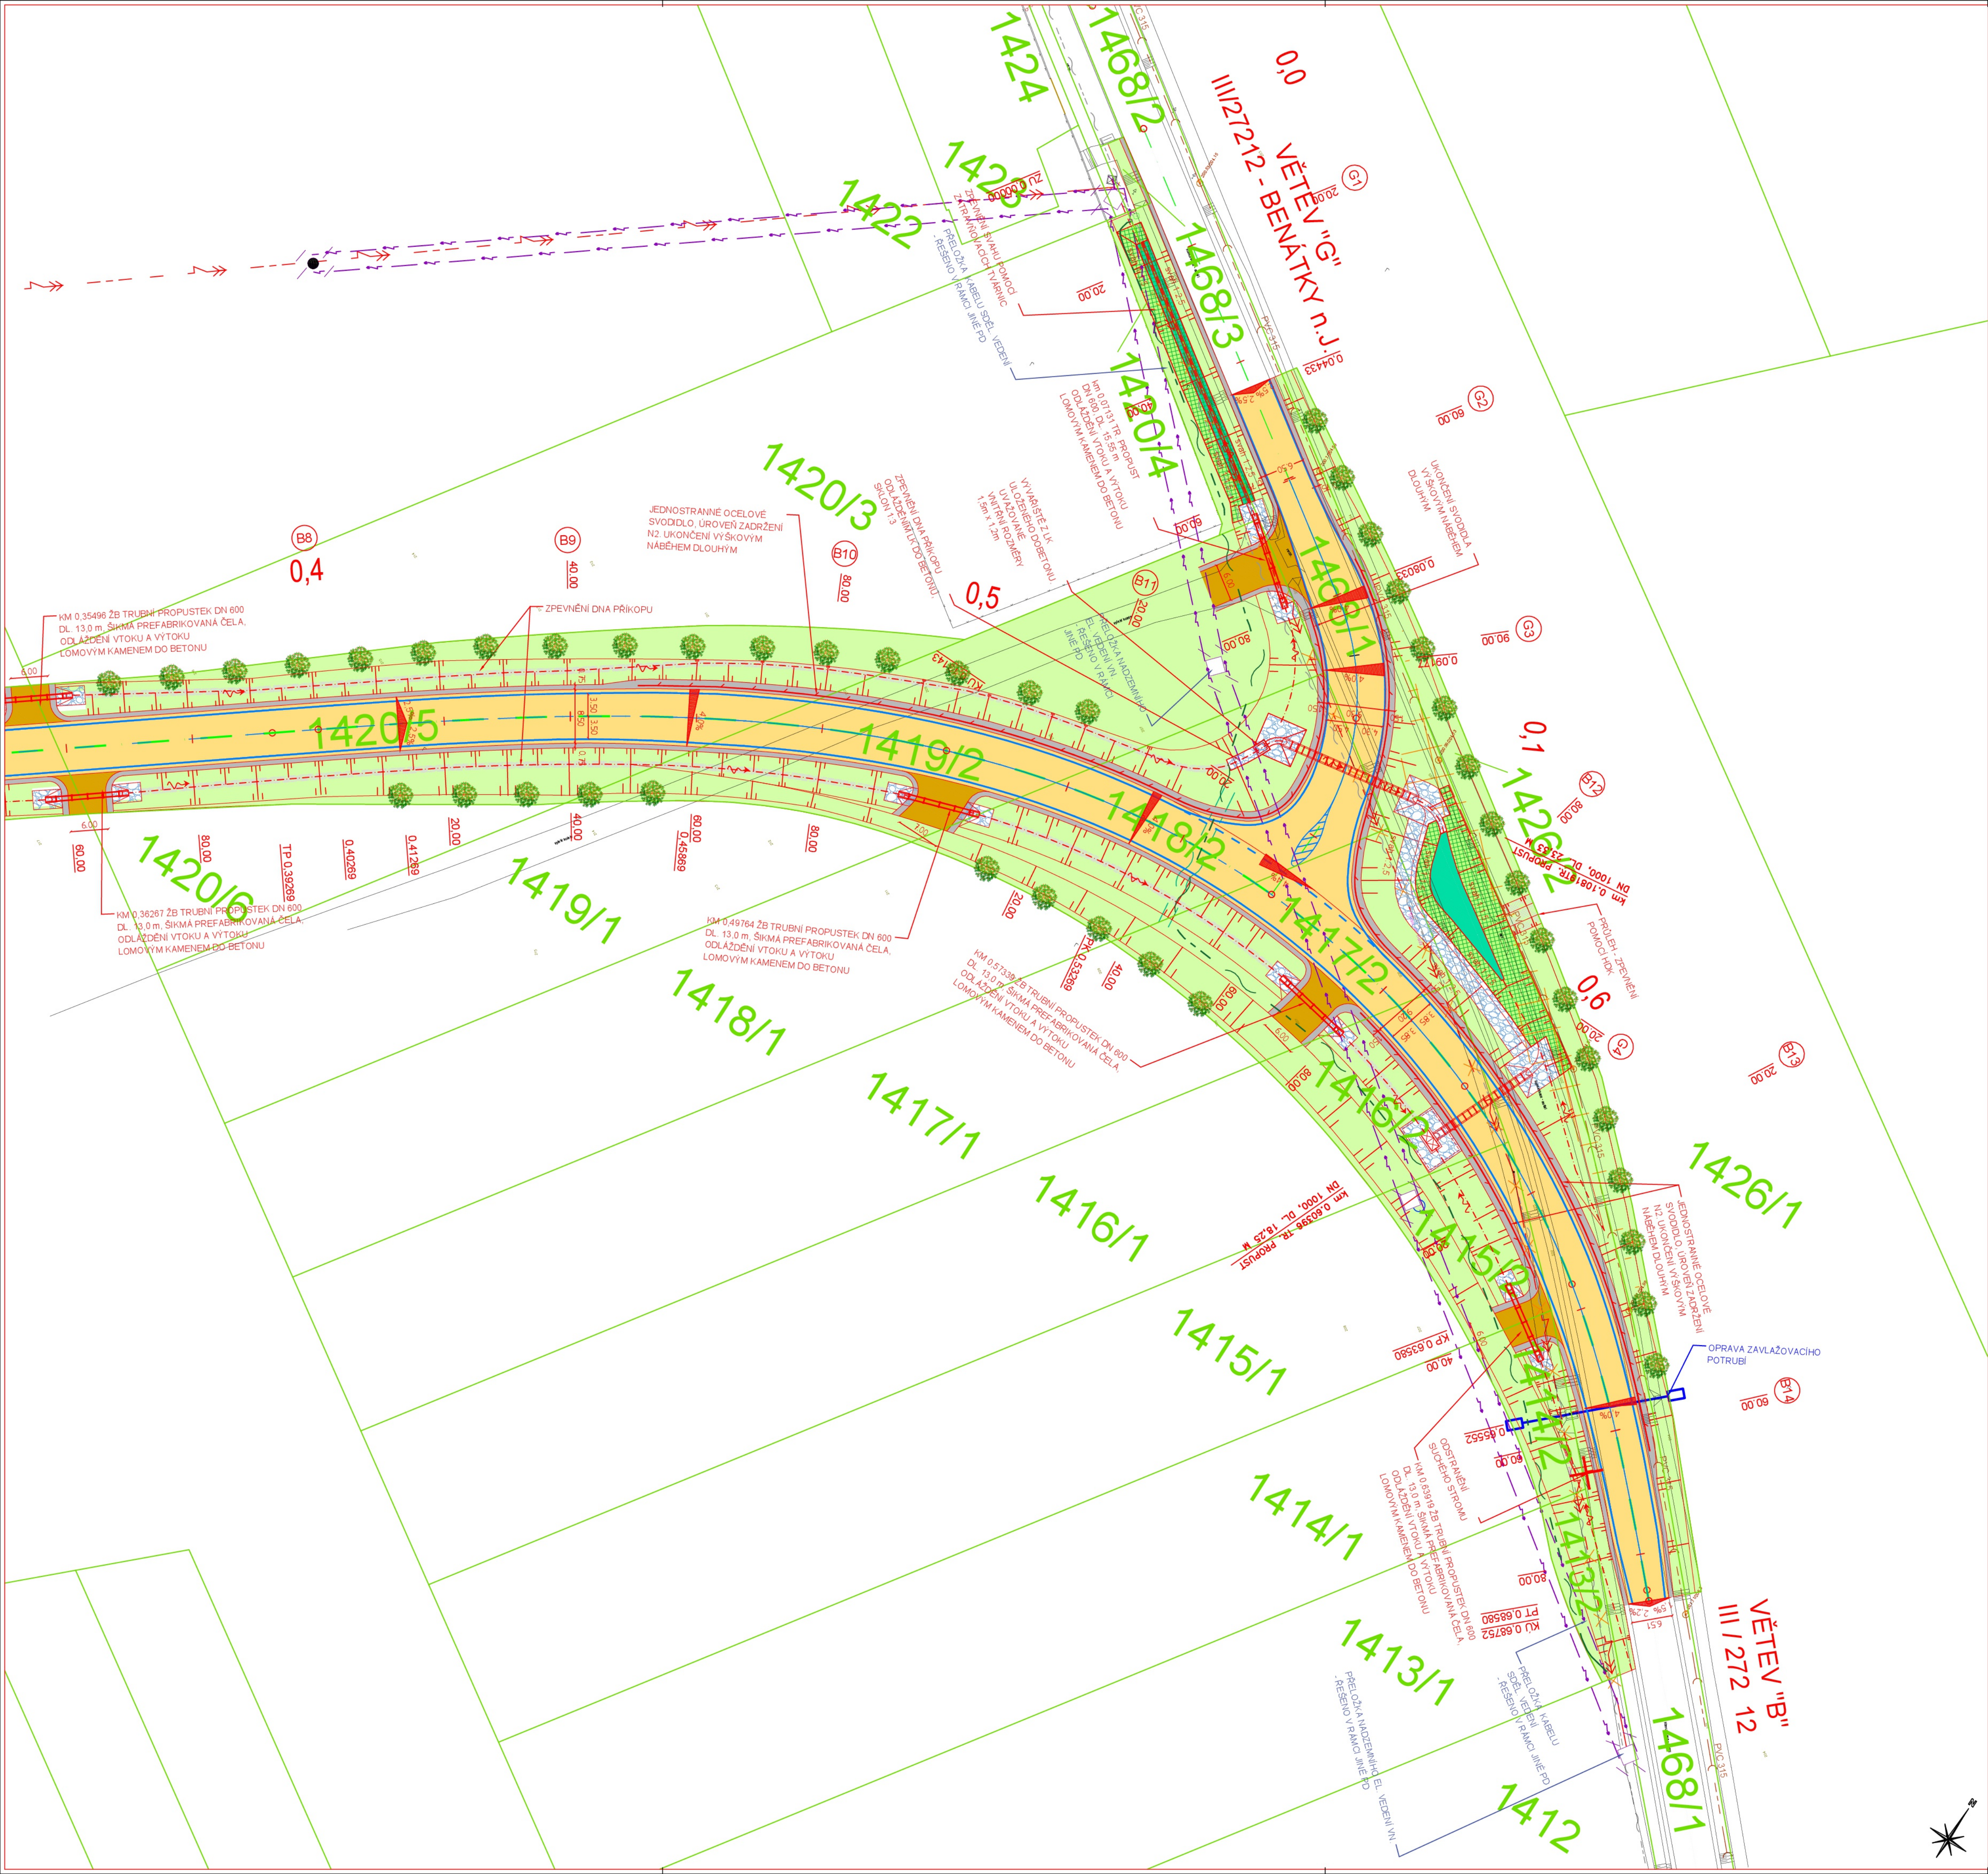

LEGENDA PLOCH A ZNAČEK	
	KOMUNIKACE S ASFALTOBETONOVÝM KRYTÍM
	NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE
	ODLÁŽDĚNÍ TRUBNÍCH PROPUSTKŮ LOMOVÝM KAMENEM DO BETONU
	PLOCHY ZELENĚ
	VSÁKOVACÍ OBJEKT
	ZPEVNĚNÍ SVAHU BETONOVOU VEGETAČNÍ DLAŽBOU
	REKULTIVACE STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH
	HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY S KRYTÍM Z ASFALTOVÉHO MATERIÁLU
	POUŽITÍ PRSTENEC OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY ZE ŽULOVÉ DLAŽBY
	VYDLAŽDĚNÍ DÉLČÍCH OSTRŮVÍ ZE ŽULOVÉ DLAŽBY
	ZPEVNĚNÍ DŇA PŘÍKOPU POMOCÍ HRUBÉHO DRCENÉHO KAMENIVA
	NAVŮRŽENÁ VÝSADBA DŘEVIN A KŘOVIN

c			
b			
a	UPRAVA PROPUSTKŮ NA VĚTVI "G" - V KM 0,10819 A POD HOSP. SJEZDEM - ZMĚNA DIMENZE, SKLONŮ A VÝŠKOVÉHO OSÁZENÍ PROPUSTKŮ. UPRAVA NAVAŽUJÍCÍCH PŘÍKOPŮ, SVODIDEL A NEZP. KRAJNICE. UPRAVA SVAHŮ RETENČNÍ NÁDRŽE.	21.11.2023	
č	text změny - odůvodnění	datum	podpis

Investor	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, příspě. org. Zborovská 11, 150 21 Praha 5	
----------	--	--

Objednatel	STRABAG a.s., odštěpný závod Praha Boženy Němcové 756, 294 71 Benátky nad Jizerou	
------------	--	--

Zpracoval	Kontroloval	Schválil	VEDU VODU s.r.o.
Ing. Evžen Kozák	Ing. Evžen Kozák		
Oprávněná osoba kooperanta: Ing. Evžen Kozák			číslo zakázky: 0523

Zpracoval	Kontroloval	Schválil	Ing. Ivan Marek Martinov 272
Bc. Nina Jakušová, DiS.	Ing. Ivan Marek	Ing. Barbora Nosková	
Oprávněná osoba kooperanta: Ing. Ivan Marek			číslo zakázky: 3175/08

Ředitel ateliéru	Zodpovědný projektant	Tech. kontrola	Vypracoval	
Ing. Jirak J.	Ing. Jirak J.	Ing. Adamů J.	Ing. Příbyl M.	
stavba: II/272 BENÁTKY NAD JIZEROU, PŘÍPOJENÍ NA SILNICI III/27212				HIP: Ing. Martin Příbyl
část: C - SITUAČNÍ VÝKRESY				číslo zakázky: 2023-022
objekt: -				stupeň dokumentace: RDS
obsah: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - úpravy				datum: 05.2023
název dig. souboru: číslo přílohy: C-03				mřítko: 1:500 formát: 8 x A4
				vytkes číslo: vytisk číslo: 03

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 19.09.2023

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

STRABAG a.s.

1.2. Sídlo

Kačírkova 982/4

15800 Praha

Česká republika

1.3. IČO

60838744

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Dipl. Ing. Moritz Freyborn	předseda představenstva
Ing. Pavel Brychcín	člen představenstva
Ing. Tomáš Hoza	člen představenstva

Způsob jednání

Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce.

1.5. Ostatní osoby oprávněné jednat jménem dodavatele

Jméno a příjmení osoby	Právní titul jednání jménem dodavatele	Způsob jednání	Datum platnosti do
Ing. Radim Aulický	prokurista	Viz poznámka 1 za tabulkou	
Ing. Martin Bašár	prokurista	Viz poznámka 2 za tabulkou	
Mgr. Karin Bílková	člen dozorčí rady		
Ing. Richard Fischer	prokurista	Viz poznámka 3 za tabulkou	
Ing.arch. Jan Havelka	prokurista	Viz poznámka 4 za tabulkou	
Mag. Heribert Herzog	člen dozorčí rady		
Ing. Jiří Horálek	prokurista	Viz poznámka 5 za tabulkou	
Ing. Radek Hradil	prokurista	Viz poznámka 6 za tabulkou	
Ing. Jan Hýzl	prokurista	Viz poznámka 7 za tabulkou	
Ing. Jan Chromý	prokurista	Viz poznámka 8 za	

		tabulkou	
Petr Kafka	prokurista	Viz poznámka 9 za tabulkou	
Ing. Pavel Klas	prokurista	Viz poznámka 10 za tabulkou	
Ing. Karel Klofáč	prokurista	Viz poznámka 11 za tabulkou	
Ing. Michal Kopper	prokurista	Viz poznámka 12 za tabulkou	
Ing. Alexej Korotkov	prokurista	Viz poznámka 13 za tabulkou	
Ing. Rostislav Krones	prokurista	Viz poznámka 14 za tabulkou	
Ing. Mag. Michal Pristaš	prokurista	Viz poznámka 15 za tabulkou	
Ing. Lukáš Příbyl	prokurista	Viz poznámka 16 za tabulkou	
Ing. Tomáš Rys	prokurista	Viz poznámka 17 za tabulkou	
Ing. Jiří Svoboda Ph.D.	prokurista	Viz poznámka 18 za tabulkou	
Michal Vaněček	prokurista	Viz poznámka 19 za tabulkou	
Dipl. Ing. (FH) Alfred Watzl	předseda dozorčí rady		

Pozn. 1

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 2

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 3

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 4

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 5

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 6

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 7

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 8

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 9

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 10

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 11

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 12

Ing. Michal Kopper je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

Pozn. 13

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 14

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 15

je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

Pozn. 16

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 17

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 18

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 19

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.5. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Oprávnění SBS 12255/2023/OBÚ-02	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	Viz poznámka 1 za tabulkou		14.03.2023	
Oprávnění SBS 43884/2019/OBÚ-02	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	Viz poznámka 2 za tabulkou		11.12.2019	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 5	Geologické práce		08.09.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Opravy silničních vozidel		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Alena Procházková, notářka v Praze	Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci		05.04.2018	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Projektová činnost ve výstavbě		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Alena Procházková, notářka v Praze	Provádění ohňostrojních prací		05.04.2018	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Alena Procházková, notářka v Praze	Viz poznámka 3 za tabulkou		05.04.2018	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Výkon zeměměřických činností		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Alena Procházková, notářka v Praze	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 4 za tabulkou	05.04.2018	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Alena Procházková, notářka v Praze	Výzkum, vývoj, výroba, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací		05.04.2018	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Zámečnictví, nástrojářství		08.12.2010	
Výpis ze živnostenského rejstříku	Městská část Praha 5	Distribuce pohonných hmot		08.11.2017	

Pozn. 1

Oprávnění k hornické činnosti a k činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování a navrhování objektů a zařízení při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., § 2 písm. b), c), d), e), f), g), i) a § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i)

Pozn. 2

Oprávnění organizaci odborně způsobilé pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Pozn. 3

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní

provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Pozn. 4

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
Výroba potravinářských a škrobářenských výrobků
Pěstitelské pálení
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
Výroba hnojiv
Výroba plastových a pryžových výrobků
Výroba a zpracování skla
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
Broušení technického a šperkového kamene
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
Výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
Výroba strojů a zařízení
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
Stavba a výroba plavidel
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
Výroba a opravy čalounických výrobků
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
Výroba zdravotnických potřeb
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáček a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Sklenářské práce, rámování a paspartování
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
Skládování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 Ubytovací služby
 Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 Pronájem a půjčování věcí movitých
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 Projektování pozemkových úprav
 Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 Projektování elektrických zařízení
 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 Testování, měření, analýzy a kontroly
 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 Fotografické služby
 Překladatelská a tlumočnická činnost
 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 Poskytování technických služeb
 Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Osvědčení o autorizaci 16034	Ing. Jiří Horálek je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	26.05.1995	
Osvědčení o autorizaci 29154	Ing. Miloš Húsek je autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce	ČKAIT	29.06.2007	
Osvědčení o autorizaci 22251	Ing. Zdeněk Led je autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby	ČKAIT	27.06.2000	
Osvědčení o autorizaci 23852	Ing. Jiří Štolba je autorizovaným technikem v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení	ČKAIT	25.02.2003	
Osvědčení o autorizaci 23851	Ing. Jiří Štolba je autorizovaným inženýrem v oboru technologická zařízení staveb	ČKAIT	25.02.2003	
Osvědčení o autorizaci 30902	Ing. Martin Bašár je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	24.06.2008	
Osvědčení o autorizaci 30326	Ing. Radek Blaško je autorizovaným inženýrem v oboru geotechnika	ČKAIT	04.12.2007	
Osvědčení o autorizaci 44858	Ing. Ivo Gaja je autorizovaným inženýrem v oboru geotechnika	ČKAIT	01.07.2021	
Osvědčení o autorizaci 38777	Ing. Marián Chotár je autorizovaným inženýrem v oboru geotechnika	ČKAIT	02.11.2017	
Osvědčení o autorizaci 34311	Ing. Aleš Teichmann je autorizovaným inženýrem v oboru geotechnika	ČKAIT	26.06.2012	
Osvědčení o autorizaci 37488	Ing. Václav Dohnálek je autorizovaným	ČKAIT	28.04.2015	

	inženýrem v oboru geotechnika			
Osvědčení o odborné způsobilosti SBS/01168/2013/OBÚ-02	Ing. Marián Chotár je odborně způsobilý k výkonu funkce technický dozor pro vedení důlních a podzemních děl	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	15.02.2013	
Osvědčení o odborné způsobilosti 84/2015	Ing. Aleš Teichmann je odborně způsobilý k výkonu funkce báňský projektant	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	31.08.2015	
Osvědčení o odborné způsobilosti 1353/2001	Ing. Jaroslav Havelka je odborně způsobilý projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru: Inženýrská geologie	Ministerstvo životního prostředí	03.05.2001	
Osvědčení o odborné způsobilosti ZEKA/857/KOO/2020	Vladimír Wimmer je odborně způsobilý k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů	ZEKA plus, s.r.o. Slavičín	29.05.2020	29.05.2025
Osvědčení o odborné způsobilosti báňského projektanta SBS 17696/2019/OBÚ-02/2	Ing. Ivo Gaja je odborně způsobilý k výkonu funkce báňský projektant	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	14.08.2019	
Osvědčení o odborné způsobilosti závodního SBS 33875/2014/OBÚ-02	Ing. Václav Dohnálek je odborně způsobilý k výkonu funkce závodní	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	03.12.2014	
Osvědčení o odborné způsobilosti závodního 85/2015	Ing. Aleš Teichmann je odborně způsobilý k výkonu funkce závodní	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	31.08.2015	
Osvědčení o odborné způsobilosti závodního SBS 33872/2014/OBÚ-02	Ing. Jan Panuška je odborně způsobilý k výkonu funkce závodní	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	03.12.2014	
Osvědčení o odborné způsobilosti závodního SBS 21218/2015/OBÚ-02	Ing. Marián Chotár je odborně způsobilý k výkonu funkce závodní	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	15.07.2015	
Osvědčení o odborné způsobilosti závodního SBS 17696/2019/OBÚ-02/1	Ing. Ivo Gaja je odborně způsobilý k výkonu funkce závodní	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	14.08.2019	
Osvědčení TD 0095	Ing. Václav Dohnálek je způsobilý k výkonu funkce technický dozor pro činnost prováděnou hornickým způsobem	Obvodní báňský úřad v Brně	30.04.2009	
Rozhodnutí SBS 39819/2022/ČBÚ-21/4	Ing. Jaroslav Spáč je odborně způsobilý k výkonu regulované činnosti: hlavní důlní měřič	Český báňský úřad, Praha	18.10.2022	
Úřední oprávnění č.j. 4525/1995-12	Ing. Stanislav Bílek je úředně oprávněn pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro ověřování c)	Český úřad zeměměřický a katastrální	19.11.2007	
Úřední oprávnění 1098	Ing. Radim Mikula je úředně oprávněn pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro ověřování: b), c)	Český úřad zeměměřický a katastrální	20.10.1995	
Úřední oprávnění 1098	Ing. Radim Mikula je úředně oprávněn pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro ověřování: a)	Český úřad zeměměřický a katastrální	02.04.1998	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 09.06.2004.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 14.09.2023.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 19.09.2023

Evidenční číslo: W23090003089

