

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	002
Evidenční číslo a název Stavby:	Most v ul. Božanovská, X503 – rek., Praha 20, č. akce 1000005, nový most
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	461 Přeložka sdělovacího vedení
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	461 Přeložka sdělovacího vedení
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	461/001

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Krycí list ZBV	1/1	
Změnový list pro změny dle § 222. odst. (4) ZZVZ	1/2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1/3	
Rozpis ocenění změn položek	1/4	
Přehled zařazení změn do Skupin	1/5	
Zápis z kontrolního dne stavby č. 7 konaného dne 15.08.2023	3/6	
Zápis z kontrolního dne stavby č. 8 konaného dne 29.08.2023	3/9	
Pokyn Objednatele k předložení změnového listu k Variaci č. 2 ze dne 21.09.2023	2/12	
Odpočet neprováděných prací	1/14	

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

Most v ul. Božanovská, X503 – rek., Praha 20, č. akce 1000005, nový most

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

461 Přeložka sdělovacího vedení

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

461 Přeložka sdělovacího vedení

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

461/001

Číslo ZBV:

002

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 03447286

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČ: 26177005

Rekapitulace ZBV č. 002

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. 002	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
§ 100	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. 002	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
§222, odst. (7)	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. 002	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
§ 222, odst. (6)	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. 002	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
§ 222, odst. (5)	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. 002	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
§222, odst. (4)	-100 219,85	0,00	-100 219,85

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
002	-100 219,85	0,00	-100 219,85

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle § 222, odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo Stavby:

**Most v ul. Božanovská, X503 – rek., Praha 20, č. akce 1000005,
nový most**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přeložka sdělovacího vedení

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

461/001

Číslo ZBV:

002

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.10.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Popis Změny:

V rámci kontrolního dne stavby, konaného dne 15.08.2023, byl Zhotovitel informován o plánovaném uzavření smlouvy mezi Objednatel a společností CETIN, a.s. ohledně realizace SO 461. Následně byl Zhotovitel v rámci kontrolního dne stavby, konaného dne 29.08.2023, informován, že obdrží pokyn k nerealizaci SO 461, resp. že po Zhotoviteli bude požadováno pouze uložení chrániček do říms. Zhotovitel následně obdržel pokyn Objednatele k předložení změnového listu k Variaci v souladu s Pod-čl. 2.3 a 10.5 Smluvních podmínek, jejímž předmětem bude nerealizace SO 461, resp. požadavek na pouhé uložení chrániček do říms, ostatní práce budou realizovány společností CETIN, a.s.

Tímto plní Zhotovitel svou povinnost a v souladu s Pod-článkem 10.5 předkládá změnový list, v rámci kterého dochází k vypuštění předmětných prací v ceně 150 000,00 Kč se zohledněním prací provedených, tedy provedení zemních prací vč. zásypů v ceně 30 333,65 Kč, provedení chráničky v ceně 13 846,50 Kč a činnosti geodeta v ceně 5 600,00 Kč (-150 000,00 + 30 333,65 + 13 846,50 + 5 600,00 = -100 219,85).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
-100 219,85	0,00	-100 219,85

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno		datum	
Pověřená osoba Objednatele TSK	jméno		datum	
Investiční ředitel TSK	jméno		datum	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde k... jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace... zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel Náměstek GR, sekce investiční TSK	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis	Ing. Josef Richtr Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2024.05.03 13:43:18 +02'00'
Zhotovitel	jméno		datum	podpis	

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 002**

Název Stavby: Most v ul. Božanovská, X503 – rek., Praha 20, č. akce 1000005, nový most	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 461/001	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 181.2 Dopravně - inženýrská opatření pro nový Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 461 Přeložka sdělovacího vedení	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
150 000,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	150 000,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-100 219,85	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-100 219,85	49 780,15	-100 219,85	33,19%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis


Zhotovitel (stavbyvedoucí): SOUHLASÍM


Projektant (autorský dozor): SOUHLASÍM

Stavební dozor: SOUHLASÍM

Správce stavby: SOUHLASÍM

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy a.s. odpovědný za cenové projednání Změny: SOUHLASÍM

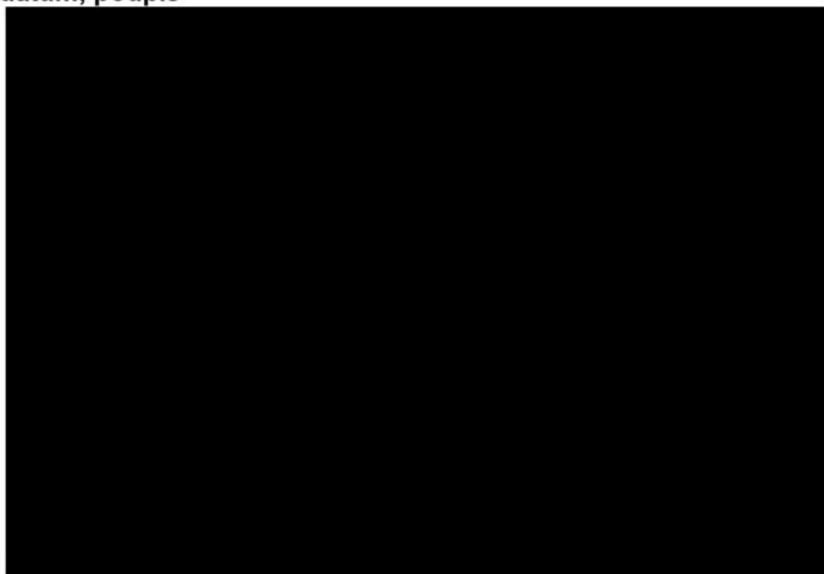



en
v
81

Zápis z kontrolního dne stavby Most v ul. Božanovská, X503 – rek., Praha 20, č.akce 1000005, nový most

Kontrolní den			
Číslo	7.	Konání dne	15.08.2023
Účastníci	Seznam účastníků je uveden v příloze Prezenční listina		

Kontrola úkolů z předchozího kontrolního dne				
Úkol číslo	Název	Skutečný stav splnění úkolu	Splněno [A/N]	
1.2	Stanovení na zastávky DIO	Zhotovitel obdržel od Sp. St. Pokyn k předložení variace. Zhotovitel ještě obdrží vydané stanovení od Sp. St. Stanovení zasláno, Zhotovitel zašle Návrh Variace. Zhotovitel zaslal návrh Variace. Sp. St. Vydá pokyn k předložení Změnového listu.	Sp. St.	4.8.2023
3.1	PVK SO 331	Zhotovitel požaduje součinnost objednatele s projektem o způsobem ukotvení SO331. Zhotovitel uvádí, že zahájení součinnosti a předání podkladů od Objednatele, může mít dopad do HMG stavby. Jednání bude svoláno ideálně začátkem příštího týdne. Sp. St. Obeslal PVK s uvedením součinnosti se Zhotovitelem, Bohužel zatím bez reakci. Objednatel prověří smluvní vztah s PVK. Sp. St. Odpověděl na email od Zhotovitele. Zhotovitel zašle oficiální dopis na Sp. St. A Objednatele. Dopis od Zhotovitele zaslán na Sp. St. Sp. St. Svolá jednání za účasti Objednatele, Zhotovitele, AD a Sp. St. Jednání proběhlo, Sp. St. Vydá stanovisko.	Sp. St.	18.8.2023

Zpráva zhotovitele o průběhu stavebních prací	
1. plnění věcného harmonogramu	Práce v souladu s HMG z 10.3.2023
2. popis provedených prací	Osazena NK, probíhá svár NK
3. finanční plnění	V souladu Fin. HMG ze dne 10.3.2023 Proběhla 1. fakturace (milník č. 1) ve výši 10 750 000,- Faktura odeslána Objednateli. 2. fakturace se předpokládá v srpnu.
4. předávání RDS	Postupné předkládání přes CDE (vydán čistopis části 300 NK, předložena část 400 zábradlí, VTD dilatačních závěrů) – příslušenství se ladí dle ZD, bude předloženo přes CDE.
5. fotodokumentace	Nahrávána 1x týdně na CDE

Kontrola kvality	
1. Subdodavatelé	Viz. Tabulka sub na CDE - postupně
2. Materiály	Viz. Tabulka materiálů v CDE - postupně
3. Zkoušky	Viz. Laboratorní deník – aktuální k 8.8.2023
4. Plány prací	Zasíláno vždy do 12:00 h v pátek na následující týden
5. TePř a KZP	Veškeré TePř a KZP na aktuální práce jsou schváleny

Stav BOZP a PO
Viz. Zápis v elektronickém deníku, kontroly BOZP probíhají pravidelně zápisem v el. SD. Vydána Aktualizace Plánu BOZP dne 31.7.2023 – postupy pro práce ve výškách.

Různé

1. Na Základě zasílání plánu prací a nahrávání fotodokumentace plní Zhotovitel předkládání informací objednateli.
4. Zhotoviteli bude zasláno vyjádření ohledně ložisek – zasláno 6.6.2023, Čeká se na vyjádření Zhotovitele. do příštího KD 18.7.2023. Vyjádření Zhotovitele zasláno. **Sp. St. Vydá stanovisko do 18.8.2023.**
6. Montáž nosníků by měla proběhnout 5. a 6.8.2023
7. Proběhla kontrolní prohlídka stavební úřadem Prahy 20, po dokončení spodní stavby – příprava před osazením NK. Další prohlídka Stavebním úřadem proběhne po dokončení kompletní NK vč. Spřahující desky.

Závěry kontrolního dne**Úkoly ze 7. kontrolního dne**

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
7.1	VO na mostě SO442	Zhotovitel má provést přípravu pro VO, dodávku stožárů a výložníků má zajistit dle bodu 12.1 d). Objednatel zajistí kontakt na THMP pro koordinaci prací se Zhotovitelem.	Zhotovitel/Objednatel	
7.2	SO461	Objednatel zajistí uzavření smlouvy s Cetinem. Objednatel svolá samostatné jednání ohledně SO461 a SO442.	Objednatel	23.8.2023

Datum konání příštího KD 29.08.2023 od 13:00 h na zařízení staveniště.

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

Zapsal



Podpis

[The following text is completely obscured by a large black redaction box.]

Zápis z kontrolního dne stavby

Most v ul. Božanovská, X503 – rek., Praha 20, č.akce 1000005, nový most

Kontrolní den			
Číslo	8.	Konaný dne	29.08.2023
Účastníci	Seznam účastníků je uveden v příloze Prezenční listina		

Kontrola úkolů z předchozího kontrolního dne				
Úkol číslo	Název	Skutečný stav splnění úkolu	Splněno [A/N]	
1.2	Stanovení na zastávky DIO	Zhotovitel obdržel od Sp. St. Pokyn k předložení variace. Zhotovitel ještě obdrží vydané stanovení od Sp. St. Stanovení zasláno, Zhotovitel zašle Návrh Variace. Zhotovitel zaslal návrh Variace. Sp. St. Vydá pokyn k předložení Změnového listu.	Sp. St.	1.9.2023
3.1	PVK SO 331	Zhotovitel požaduje součinnost objednatele s projektem o způsobem ukotvení SO331. Zhotovitel uvádí, že zahájení součinnosti a předání podkladů od Objednatele, může mít dopad do HMG stavby. Jednání bude svoláno ideálně začátkem příštího týdne. Sp. St. Obeslal PVK s uvedením součinnosti se Zhotovitelem, Bohužel zatím bez reakci. Objednatel prověří smluvní vztah s PVK. Sp. St. Odpověděl na email od Zhotovitele. Zhotovitel zašle oficiální dopis na Sp. St. A Objednatele. Dopis od Zhotovitele zaslán na Sp. St. Sp. St. Svolá jednání za účasti Objednatele, Zhotovitele, AD a Sp. St. Jednání proběhlo, Sp. St. Vydá stanovisko. Sp.St. vydal pokyn k předložení Variace. Zhotovitel zašle návrh Variace s předběžným termínem 12.9.2023.	Sp. St.	12.9.2023

Zpráva zhotovitele o průběhu stavebních prací	
1. plnění věcného harmonogramu	Práce v souladu s HMG z 10.3.2023
2. popis provedených prací	Dovaření nosného spoje NK, montáž bednění NK
3. finanční plnění	V souladu Fin. HMG ze dne 10.3.2023 Proběhla 1. fakturace (milník č. 1) ve výši 10 750 000,- Faktura odeslána Objednateli. 2. fakturace se předpokládá v srpnu.
4. předávání RDS	Postupné předkládání přes CDE (vydán čistopis části 300 NK, předložena část 400 zábradlí, VTD dilatačních závěrů) – příslušenství se ladí dle ZD, bude předloženo přes CDE.
5. fotodokumentace	Nahrávána 1x týdně na CDE

Kontrola kvality	
1. Subdodavatelé	Viz. Tabulka sub na CDE - postupně
2. Materiály	Viz. Tabulka materiálů v CDE - postupně
3. Zkoušky	Viz. Laboratorní deník – aktuální k 29.8.2023
4. Plány prací	Zasíláno vždy do 12:00 h v pátek na následující týden
5. TePř a KZP	Veškeré TePř a KZP na aktuální práce jsou schváleny

Stav BOZP a PO

Viz. Zápis v elektronickém deníku, kontroly BOZP probíhají pravidelně zápisem v el. SD. Vydána Aktualizace Plánu BOZP dne 31.7.2023 – postupy pro práce ve výškách.

Různé

1. Na Základě zasílání plánu prací a nahrávání fotodokumentace plní Zhotovitel předkládání informací objednateli.

4. Zhotoviteli bude zasláno vyjádření ohledně ložisek – zasláno 6.6.2023, Čeká se na vyjádření Zhotovitele. do příštího KD 18.7.2023. Vyjádření Zhotovitele zasláno. Sp. St. Vydá stanovisko do 18.8.2023. **Sp. St. Zaslal. Vypouští se.**

6. Proběhla kontrolní prohlídka stavební úřadem Prahy 20, po dokončení spodní stavby – příprava před osazením NK. Další prohlídka Stavebním úřadem proběhne po dokončení kompletní NK vč. Spřahující desky.

Závěry kontrolního dne

Úkoly ze 7. kontrolního dne

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
7.1	VO na mostě SO442	Zhotovitel má provést přípravu pro VO, dodávku stožárů a výložníků má zajistit dle bodu 12.1 d). Objednatel zajistí kontakt na THMP pro koordinaci prací se Zhotovitelem. Zástupce THMP byl dnes přítomen a dle jeho vyjádření má dodávku a montáž provést Objednatel. Na základě této skutečnosti Sp. St. Vydá pokyn k předložení Variace. Po zpracování RDS bude aktualizováno vyjádření THMP. – zajistí Objednatel.	Zhotovitel/Objednatel	1.9.2023 Předložení RDS od Zhotovitele do 12.9.2023
7.2	SO461	Objednatel zajistí uzavření smlouvy s Cetinem. Objednatel svolá samostatné jednání ohledně SO461 a SO442. Sp. St. Vydá pokyn k nerealizaci SO461, pouze Zhotovitel provede uložení chrániček. Z tohoto důvodu musí Zhotovitel předložit podrobnou kalkulaci na tyto objekty.	Objednatel	23.8.2023
8.1		Objednatel zažádal o prodloužení na samotnou stavbu i na samostatný SO331.	Objednatel	

Datum konání příštího KD 12.09.2023 od 13:00 h na zařízení staveniště.


Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

Zapsal



Podpis



Číslo Smlouvy Objednatele: 3/22/5900/036

Číslo Smlouvy Zhotovitele: 221611127

Dílo: Most v ul. Božanovská, X503 – rek., Praha 20, č. akce 1000005, nový most

Věc: Pokyn Objednatele k předložení změnového listu k Variaci

Související korespondence: -

Související Články/Pod-články Smlouvy: 1.5, 2.3, 10.1, 10.2, 10.5 Smluvních podmínek

Adresováno: [REDAKCE] pce Zhotovitele (v souladu s Pod-článkem 4.2 Smluvních podmínek)

Datum: 21.09.2023

POKYN OBJEDNATELE K PŘEDLOŽENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU K VARIACI

v souladu s Pod-článkem 2.3 a 10.5 Smluvních podmínek

Vážený pane inženýre,

v návaznosti na kontrolní den stavby č. 7, konaný dne 15.08.2023, Vás tímto v souladu s Pod-článkem 2.3 a Článkem 10 Smluvních podmínek vyzývám k předložení změnového listu k Variaci, jejímž předmětem bude nerealizace SO 461, dojde pouze k uložení chrániček do říms, ostatní práce budou realizovány společností CETIN a.s., se kterou Objednatel uzavře smlouvu. V souladu s Pod-čl. 10.5 Smluvních podmínek (Postup při variaci a při claimu) bude Variace zaznamenána Stranami do změnového listu.

Objednatel Zhotovitele informuje, že lze při Variacích postupovat přiměřeně v souladu s Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění, která je dostupná na stránkách www.sfdi.cz.

Objednatel předpokládá ocenění Variace ve změnovém listu v souladu se Smlouvou tak, aby mohl Objednatel v souladu s Pod-čl. 10.5 Smluvních podmínek ocenění předmětné Variace odsouhlasit, popř. určit.

S pozdravem



SO 461 - odpočet neprováděných prací

Kalkulace dle SoD

Kompletní provedení přeložky CETIN	KPL	-150 000,00 Kč
------------------------------------	-----	----------------

Provedené práce:

Zemní práce - výkop, 24 m ³	8 640,05 Kč
Zemní práce - zásyp se zhutněním, 24,0 m ³	21 693,60 Kč
Chránička - plastová, prům. DN = 50 mm, dodávka + montáž, 54,3 m	13 846,50 Kč
Geodet - výjezd měřičské skupiny, 1/2 den	5 600,00 Kč
Celkem odpočet	-100 219,85
