

Krycí list ZBV			
Název Stavby dle SoD: III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II. Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 180.1 - Přechodné dopravní značení		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 180.1/001	Číslo ZBV: 3
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001			
Zhotovitel: Starmosty s.r.o. Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6 IČ: 07122764			
Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	0,00	422 822,42	422 822,42
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	0,00	422 822,42	422 822,42
Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02) a pro Rozpis ocenění změn položek (04).			
ZBV - krycí list			

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II. Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 180.1 - Přechodné dopravní značení	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 180.1/001	Číslo ZBV / Skupina změny: 3 . 3																								
Strany smlouvy o dílo S-2693/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 07.09.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Starmosty s.r.o., Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6																										
<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>12</td><td>počet listů</td></tr></table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	12	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
1. Krycí list	1	počet listů																								
2. Změnový list	2	počet listů																								
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																								
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																								
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																								
6. Přehled dokladů	1	počet listů																								
7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů																								
Další doklady dle přehledu dokladů	12	počet listů																								
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Změna DIO Název (dílčí) Změny: Změna DIO Na základě smlouvy č. Z_S24_12_8120084932 uzavřené mezi KSUS a ČEZ distribuce dne 19.9.2023 (příloha č. 14) mělo dojít před zahájením rekonstrukce opěrné zdi k nutné přeložce inženýrských sítí NN ČEZ (SO 401). Při kontrolním dni č. 02 proběhlo předání staveniště za účelem realizace SO 401 (mezi KSUS Středočeského kraje – ČEZ) a byla předána zásadní informace, že k vypnutí EE a následnému odstranění kolizního sloupu (součást SO 401) dojde až 11.12.2023. Z toho nutně vyplývá nemožnost realizace DC 2 dle původního HMG stavby a také k výraznému posunu celkového HMG na stavbě III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p. 39 - II. Na základě této skutečnosti musela být stavba rozdělena na dvě etapy, které rozděluje zimní technologická přestávka. Dle požadavku investora muselo dojít před zimní technologickou přestávkou k provizornímu zprovoznění části komunikace pro automobilovou dopravu a pěší. Tento požadavek bude mít dopad do prodloužení termínu výstavby oproti SoD. S ohledem na etapizaci výstavby a prodloužení termínu došlo také k prodloužení a navýšení dopravně inženýrského opatření. Po dobu zprovoznění části komunikace muselo dojít k nezbytně nutným bezpečnostním opatřením pro ochránění a zabezpečení stavby a provozu vozidel během zimní technologické přestávky. Kvůli zamezení pádu na pozemek č.p. 39 bylo na římse osazeno provizorní oplocení. Tato bezpečnostní opatření byla schváleno KOO BOZP. Dokladem je příloha č. 12 zápis z KD č. 07 ze dne 21.12.2023 Dopad do položky č. 1 a položek č. 101-118 Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, resp. podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby Silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění Změn závazků dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných Zakázek Zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných Zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje podstatnou Změnu Závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.																										

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	422 822,42	422 822,42	422 822,42

Technická pomoc Objednatele jméno Ing.Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Michal Kabela podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Pavel Hrdina podpis

Stavební dozor: jméno Ing. David Křemeček podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele: jméno Jan Zákostelský, DiS. podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler,Dis. podpis

Zhotovitel: jméno Michal Kabela podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

Název Stavby:	III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II.
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 180.1/001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 180.1 - Přechodné dopravní značení

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
145 341,13

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	145 341,13	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	422 822,42	422 822,42	290,92%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	568 163,55	422 822,42	290,92%

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 3

Evidenční číslo a název stavby: 17 251 00 - III/6031 Senohraby, průtah; D.1 stavební část

Číslo a název SO/PS: SO 180.1 - Přechodné dopravní značení

Číslo a název rozpočtu: SO 180.1 - Přechodné dopravní značení

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02720.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULAČNÍ A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	2,000	1,000	145 341,13	145 341,13	0,00	145 341,13	290 682,26	145 341,13	100,00
Nové položky													
101	911CE2.N	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	0,000	48,000	48,000	634,13	0,00	0,00	30 438,24	30 438,24	30 438,24	100,00
102	911CE3.N	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	48,000	48,000	680,94	0,00	0,00	32 685,12	32 685,12	32 685,12	100,00
103	911CE9.N	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 VÝŠ 0,8M - NÁJEM	MDEN	0,000	4 224,000	4 224,000	9,80	0,00	0,00	41 395,20	41 395,20	41 395,20	100,00
104	914121.N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	0,000	10,000	10,000	3 252,80	0,00	0,00	32 528,00	32 528,00	32 528,00	100,00
105	914123.N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	10,000	10,000	214,11	0,00	0,00	2 141,10	2 141,10	2 141,10	100,00
106	914129.N	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	880,000	880,000	9,80	0,00	0,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	100,00
107	916121.N	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ	KUS	0,000	2,000	2,000	12 226,05	0,00	0,00	24 452,10	24 452,10	24 452,10	100,00
108	916123.N	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	2,000	2,000	138,20	0,00	0,00	276,40	276,40	276,40	100,00
109	916129.N	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	176,000	176,000	136,43	0,00	0,00	24 011,68	24 011,68	24 011,68	100,00
110	916311.N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	0,000	2,000	2,000	3 103,06	0,00	0,00	6 206,12	6 206,12	6 206,12	100,00
111	916313.N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	2,000	2,000	152,90	0,00	0,00	305,80	305,80	305,80	100,00
112	916319.N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	176,000	176,000	16,17	0,00	0,00	2 845,92	2 845,92	2 845,92	100,00
113	916331.N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	0,000	2,000	2,000	1 976,14	0,00	0,00	3 952,28	3 952,28	3 952,28	100,00
114	916333.N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	2,000	2,000	77,92	0,00	0,00	155,84	155,84	155,84	100,00
115	916339.N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	176,000	176,000	8,83	0,00	0,00	1 554,08	1 554,08	1 554,08	100,00
116	916812.N	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	49,000	49,000	282,27	0,00	0,00	13 831,23	13 831,23	13 831,23	100,00
117	916813.N	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ	M	0,000	49,000	49,000	157,30	0,00	0,00	7 707,70	7 707,70	7 707,70	100,00
118	916819.N	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ	MDEN	0,000	4 312,000	4 312,000	10,29	0,00	0,00	44 370,48	44 370,48	44 370,48	100,00
Celkem								145 341,13	0,00	422 822,42	568 163,55	422 822,42	290,92

Za Zhotovitele: Michal Kabela

Za Objednatele: Ing. David Křemeček

Datum:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II.

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	6 595 894,74
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	7 312 371,74
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	8 847 969,81
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	110,86%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	716 477,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	10,86%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 978 768,42

12=(1)*0,15	Limit	D4*0,15
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	limit 15 %
16	17	18			19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	39=ABS(37)+38
		III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II.			0,00	716 477,00	716 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 477,00	716 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	1	Vedlejší a ostatní náklady / Zařízení staveniště			0,00	52 486,85	52 486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 486,85	52 486,85	0,00	0,00	0,00	0,00
101a	2	Silnice III/6031 úsek podél SO 255 / Provizorní komunikace			0,00	241 167,73	241 167,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 167,73	241 167,73	0,00	0,00	0,00	0,00
180.1	3	Přechodné dopravní značení / Změna DIO			0,00	422 822,42	422 822,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 822,42	422 822,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název stavby:	III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II.
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 180.1 - Přejídné dopravní značení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 180.1/001

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	2
08 Oznámení zhotovitele ze dne 18.10.2023	1
09 Souhlas investora s navrženým řešením	1
10 Vyjádření TDS ze dne 29.04.2024	1
11 Vyjádření AD ze dne 6.5.2024	1
12 Zápis z KD č. 07 ze dne 21.12.2023	1
13 Výkres DIO přes zimní přestávku	1
14 Smlouva mezi KSUS a ČEZ distribuce ze dne 19.9.2023	4
15 HMG zimní přestávka	1
16 Zápis ve SD zahájení/ukončení ZTP ze dne 21.12.2023/19.3.2024	1
Počet listů celkem	12

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby dle SoD: III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II. Číslo a název SO/PS: SO 180.1 Přechodné dopravní značení Číslo a název rozpočtu: SO 180.1 Přechodné dopravní značení								SO 180.1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0 Všeobecné konstrukce a práce													
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	2,000	1,000	145 341,13	145 341,13	0,00	145 341,13	290 682,26	145 341,13	100,00%
		položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. zvětšené i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie, citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.											
		1=1,000 [A] ZBV 3 Užívání komunikace přes zemní období Nutné etapizování výstavby - druhá etapa: Po uplynutí ZTP bylo nutné opětovně zřídit DIO jako v 1. etapě kvůli dokončení prací na DC2. 1,0=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C]											
Nové položky													
9 Ostatní konstrukce a práce													
101	911CE2.N	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	0,000	48,000	48,000	634,13	0,00	0,00	30 438,24	30 438,24	30 438,24	100,00%
		JC dle OTSKP 2023 ZBV 3 Užívání komunikace přes zemní období Zřízení dočasné betonové bariéry při zemní technologické přestávce 24*2,0=48,000 [A]											
102	911CE3.N	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	48,000	48,000	680,94	0,00	0,00	32 685,12	32 685,12	32 685,12	100,00%
		JC dle OTSKP 2023 ZBV 3 Užívání komunikace přes zemní období Odstranění dočasné betonové bariéry při zemní technologické přestávce 24*2,0=48,000 [A]											
103	911CE9.N	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 VÝŠ 0,8M - NÁJEM	MDEN	0,000	4224,000	4224,000	9,80	0,00	0,00	41 395,20	41 395,20	41 395,20	100,00%
		JC dle OTSKP 2023 ZBV 3 Užívání komunikace přes zemní období od 22.12.2023 do 18.03.2024 88*48=4 224,000 [A]											
104	914121.N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	0,000	10,000	10,000	3 252,80	0,00	0,00	32 528,00	32 528,00	32 528,00	100,00%
		JC dle OTSKP 2023 ZBV 3 Užívání komunikace přes zemní období Dodání a montáž dočasných značek - 3xB20a, 2xA15, 1xP8, 1xB26, 1xP7, 2xC4b 10,0=10,000 [A]											
105	914123.N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	10,000	10,000	214,11	0,00	0,00	2 141,10	2 141,10	2 141,10	100,00%
		JC dle OTSKP 2023 ZBV 3 Užívání komunikace přes zemní období Demontáž dočasných značek - 3xB20a, 2xA15, 1xP8, 1xB26, 1xP7, 2xC4b 10,0=10,000 [A]											
106	914129.N	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	880,000	880,000	9,80	0,00	0,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	100,00%
		JC dle OTSKP 2023 ZBV 3 Užívání komunikace přes zemní období Nájemné dočasných značek - 3xB20a, 2xA15, 1xP8, 1xB26, 1xP7, 2xC4b od 22.12.2023 do 18.03.2024 88*10,0=880,000 [A]											
107	916121.N	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ	KUS	0,000	2,000	2,000	12 226,05	0,00	0,00	24 452,10	24 452,10	24 452,10	100,00%
		JC dle OTSKP 2023 ZBV 3 Užívání komunikace přes zemní období Dodání a montáž S1 při zemní technologické přestávce 2 ks po 3 světlech 2,0=2,000 [A]											
108	916123.N	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	2,000	2,000	138,20	0,00	0,00	276,40	276,40	276,40	100,00%
		JC dle OTSKP 2023 ZBV 3 Užívání komunikace přes zemní období Demontáž S1 při zemní technologické přestávce 2 ks po 3 světlech 2,0=2,000 [A]											
109	916129.N	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	176,000	176,000	136,43	0,00	0,00	24 011,68	24 011,68	24 011,68	100,00%
		ZBV 3 Užívání komunikace přes zemní období Nájem S1 při zemní technologické přestávce 2 ks po 3 světlech od 22.12.2023 do 18.03.2024 88,0*2,0=176,000 [A]											
110	916311.N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	0,000	2,000	2,000	3 103,06	0,00	0,00	6 206,12	6 206,12	6 206,12	100,00%
		JC dle OTSKP 2023 ZBV 3 Užívání komunikace přes zemní období Dodání a montáž dopravní zábrany před zemní tehnologickou přestávkou 2,0=2,000 [A]											
111	916313.N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	2,000	2,000	152,90	0,00	0,00	305,80	305,80	305,80	100,00%
		JC dle OTSKP 2023 ZBV 3 Užívání komunikace přes zemní období Demontáž dopravní zábrany po zemní tehnologické přestávce 2,0=2,000 [A]											
112	916319.N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	176,000	176,000	16,17	0,00	0,00	2 845,92	2 845,92	2 845,92	100,00%

JC dle OTSKP 2023 ZBV 3 Užívání komunikace přes zimní období Nájem zábrany Z2 při zimní technologické přestávce 2 ks od 22.12.2023 do 18.03.2024 88,0*2=176,000 [A]													
113	916331.N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	0,000	2,000	2,000	1 976,14	0,00	0,00	3 952,28	3 952,28	3 952,28	100,00%
JC dle OTSKP 2023 ZBV 3 Užívání komunikace přes zimní období Dodání a montáž Z4 při zimní technologické přestávce 2 ks 2,0=2,000 [A]													
114	916333.N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	2,000	2,000	77,92	0,00	0,00	155,84	155,84	155,84	100,00%
JC dle OTSKP 2023 ZBV 3 Užívání komunikace přes zimní období Demontáž Z4 při zimní technologické přestávce 2 ks 2,0=2,000 [A]													
115	916339.N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	176,000	176,000	8,83	0,00	0,00	1 554,08	1 554,08	1 554,08	100,00%
JC dle OTSKP 2023 ZBV 3 Užívání komunikace přes zimní období Nájem Z4 při zimní technologické přestávce 2 ks od 22.12.2023 do 18.03.2024 88,0*2=176,000 [A]													
116	916812.N	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	49,000	49,000	282,27	0,00	0,00	13 831,23	13 831,23	13 831,23	100,00%
JC dle OTSKP 2023 ZBV 3 Užívání komunikace přes zimní období Zřízení oplocení jako bariéry při zimní technologické přestávce 14*3,5=49,000 [A]													
117	916813.N	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ	M	0,000	49,000	49,000	157,30	0,00	0,00	7 707,70	7 707,70	7 707,70	100,00%
JC dle OTSKP 2023 ZBV 3 Užívání komunikace přes zimní období Odstranění oplocení jako bariéry při zimní technologické přestávce 14*3,5=49,000 [A]													
118	916819.N	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ	M	0,000	4312,000	4312,000	10,29	0,00	0,00	44 370,48	44 370,48	44 370,48	100,00%
JC dle OTSKP 2023 ZBV 3 Užívání komunikace přes zimní období Nájem oplocení při zimní technologické přestávce 49 metrů od 22.12.2023 do 18.03.2024 88,0*49=4 312,000 [A]													
		Celkem						145 341,13	0,00	422 822,42	568 163,55	422 822,42	19,00

Příjemce:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Jan Zákostelský, DiS.
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov



V Praze, dne 18.10.2023

Věc: Oznámení zhotovitele objednateli o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci na základě §18, odst. 1, písmeno f Směrnice R-Sm-36 ze dne 1.1.2022

Název akce: III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II.


Číslo smlouvy: S-2693/00066001/2023

Při zahájení demolice stávající opěrné zdi nedošlo k realizaci přeložky NN SO 401, která není součástí naší SoD. Z tohoto důvodu bude nutné dočasně vynechat dilatační celek zdi DC2. Dojde ke změně pracovního postupu v důsledku překážející podpěry NN SO 401.

Změna v postupu prací: zhotovení dilatačních celků DC1, DC3, DC4 a DC5, kdy bude vynechán dilatační celek DC2, propojení mezi DC1, DC2 a DC3 bude zhotoveno provizorním pažením. Výkop podél celé stěny bude provizorně zasypán a následně bude provizorně zhotoven živičný kryt. Po vyřešení překážek, bude provizorní násyp odtěžen, vybetonován dilatační celek DC2 a bude zhotoveno vozovkové souvrství.

Žádáme objednatele o sdělení dalšího postupu.

S pozdravem



**Starmosty s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha Modřany
Michal Kabela**

Vyřizuje / telefon

Říčany

Věc: Souhlas s navrženým řešením u akce „III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39“ po projednání s TDS a AD souhlasí s navrženým řešením.



Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

S ohledem na objektivně nepředvídatelné skutečnosti zjištěné na stavbě během provádění prací týkající nerealizace přeložky vedení NN společností ČEZ, bylo nutné vynechat dilatační celek zdi DC2. S ohledem na tuto skutečnost dojde ke změně postupu provádění prací.

Dojde ke zhotovení dilatačních celků DC1, DC3, DC4, DC5. Propojení mezi DC1 DC2 a DC3 bude po dobu zimní technologické přestávky zhotoveno provizorním pažením. Výkop celé stěny bude provizorně zasypán a následně provizorně zhotoven živičný kryt, tak aby mohla probíhat zimní údržba na komunikaci III/6031. Následně dojde k odtěžení násypu, vybetonování DC2 a bude zhotoveno vozovkové souvrství.

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.





**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc:	Vyjádření TDS k ZBV 1, 2, 3 a 4
Stavba:	III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č. p. 39 - II
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Objekt:	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady (ZBV 1)
	SO 101a Silnice III/6031 úsek podél SO 255 (ZBV 2)
	SO 180.1 Přechodné dopravní značení (ZBV 3)
	SO 255 Opěrná zeď u č.p. 39 (ZBV 4)
Zhotovitel:	Starmosty s.r.o.

1. Výše uvedené návrhy ZBV vyplývají ze skutečnosti změny průběhu stavby s ohledem na to, že před zahájením stavby zdi nedošlo k přeložce NN vedení ČEZ a.s. SO 401 (není součástí výše uvedené stavby). Stavba byla přesto zahájena s předpokladem, že nedojde k ovlivnění průběhu stavby přeložkou NN. Tento předpoklad se během stavby nepotvrdil. Z toho důvodu bylo nutno upravit postup s vynecháním DC 2 a přerušením stavby od 12/2023 do 03/2024 (s provizorním užíváním stavby po dobu přerušení). Tato skutečnost vedla ke změně technického řešení (provizorní násypy, pažení, vozovkové souvrství atd.). Podrobněji viz návrhy ZBV a zápisy z KD.
2. Potvrzuji, že změna je vyvolána v průběhu provádění stavby. Navrhovaná změna zároveň negativně neovlivňuje postup a bezpečnost průběhu stavby, ani její následné užívání.
3. Skutečnosti, které vedly k návrhu změny, jsou zaznamenány v zápisech z kontrolního dne od TDS.
4. S návrhem jednotlivých výše uvedených ZBV souhlasím.

Dne 29.4.2024

S pozdravem



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Ing. Aleš Čermák MBA
Zborovská 11
Praha, 150 00

Čj : PX 2024
V Praze : 6. května 2024
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

tel.: 736 662 206

Akce: III/6031 Senohraby, průtah
Věc: Vyjádření AD č. 4

Vážený pane řediteli,

AD obdržel emailem dne 10. 4. 2024 koncepty ZBV č. 1, 2 a 3. Předmětem ZBV č. 1 je úprava harmonogramu stavby a s tím související náklady stavby na zařízení staveniště a administrativu spojenou s úpravou DIO. Předmětem ZBV č. 2 je výstavba provizorní vozovky pro provoz v době kdy neprobíhala stavba a její následné odstranění. Předmětem ZBV č. 3 jsou náklady na zajištění stavby a provozu v místě stavby v době, kdy neprobíhala stavba, jedná se o DIO, svodidla a oplocení.

Během předání stavby bylo zjištěno, že dosud nebyla provedena přeložka NN ČEZ (SO 401). Jelikož tato přeložka nemohla být provedena před zahájením stavby, bylo nutné upravit harmonogram stavby. V důsledku této úpravy vznikly dodatečné náklady na provizorní komunikaci, zabezpečení stavby a zabezpečení provozu v době kdy byla stavba zastavena. Zároveň bylo nutné zajistit úpravu DIO a zrušit a následně znovu zřídit zařízení staveniště. AD konstatuje, že na základě předložených dokladů jsou výše zmíněné úpravy nutné.

AD s návrhem ZBV č. 1, 2 a 3 souhlasí.

S pozdravem za Pontex, spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdina

Zápis z Kontrolního dne č. 07

konaného dne 21.12.2023

Stavba:	III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č. p. 39 - II
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Stavební dozor:	REALSTAV MB, spol. s r.o.
Koordinátor BOZP:	REALSTAV MB, spol. s r.o.
Zhotovitel:	Starmosty s.r.o.
Autorský dozor:	Pontex, spol. s r. o.

1 Předmět jednání

Jednání bylo svoláno za účelem průběžného monitorování a kontroly procesu výstavby.

2 Kontrola předchozích úkolů

3.1 Bylo provedeno předání staveniště zhotoviteli - viz Příloha Protokol z předání staveniště. Během předání stavby bylo konstatováno, že prozatím nebyla provedena přeložka NN ČEZ (SO 401). Tato skutečnost sice nebrání zahájení stavby (postup od konce staničení), **ale pokud nedojde v řádu 2-3 týdnů k realizaci SO 401, bude pravděpodobně ohrožen postup prací na zdi.** Objednatel bude informovat do příštího KD o stavu přípravy/ realizace SO 401. **KD 01:** Předána informace o záměru předání staveniště pro realizaci SO 401 ke dni 24.10.2023, následující harmonogram prací na SO 401 je neznámý. **KD 02:** Během KD proběhlo předání staveniště za účelem realizace SO 401 (mezi ČEZ a KSÚS – podrobnosti viz samostatný zápis ČEZ), byla předána zásadní informace, že k vypnutí EE a následnému odstranění kolizního sloupu (součást SO 401) dojde 11.12.2023. Z toho nutně vyplývá nemožnost realizace DC 2 v předpokládaném HMG stavby zdi. HMG je nutno zhotovitelem upravit – do příštího KD. **KD 03:** Zástupce KSÚS předal informaci o upřesnění termínu vypnutí EE – aktuálně bude provedeno 23.11.2023. Do té doby je nutno provést přípravy na přepojení – nutno zkoordinovat činnosti mezi zhotovitelem SO 401 a zhotovitelem stavby zdi. (výkopy, přístupy apod.) **KD 04:** Zhotovitel předal info z koordinační schůzky se zhotovitelem SO 401: Zahájení prací na SO 401 16.11.2023, vypnutí a přepojení kabelů EE 23.11., odstranění sloupu v kolizi s DD2 – neupřesněno – předpoklad po 23.11. **S ohledem na výše uvedené je výstavba kolizního DC 2 časově nemožná s ohledem na očekávané klimatické období a především s ohledem na možnost dodávky balených směsí. Z tohoto důvodu bude stavba připravena na provizorní užívání k 22.12.2023 a do cca 30.3.2024** (předpoklad provozu jedním pruhem bez semaforů pouze s příslušnými DZ, provizorní povrch z AB, podél vozovky na straně ke zdi betonová svodidla – veškeré podrobnosti budou upřesněny). **KD 05:** SO 401: vypnutí EE proběhlo, stávající sloup odstraněn a oproti plánu nahrazen provizorním před lícem DC2, SO 401 tedy definitivně nedokončeno, zhotovitel stavby upozornil zhotovitele SO 401 zápisem do jeho SD, že je nutno dokončit do 10.3.2024. **KD 06:** Termín připravenosti provizorního užívání od 22.12.2023 potvrzen, režim provozu v prostoru stavby bude probíhat dle schváleného DIO. Stavba bude tímto přerušena. **KD 07:** Stavba přerušena – viz odstavec 4.

3.15 TDI upozorňuje na nutnost oficiálního oznámení změny stavby objednateli před dokončením s ohledem na bod 3.1. **KD 06:** Oznámeno a schváleno. Návrh ZBV probíhá. **KD 07:** Trvá.

3 Přehled projednaného a nové úkoly

3.19 Od předchozího KD proběhla kpl příprava stavby na provizorní užívání. Byly provedeny vrstvy vozovky, osazení betonových svodidel, příslušného dopravního, uvedení chodníků v prostoru stavby do provozuschopného stavu apod.


4 Postup prací do příštího KD

Není stanoven. **Stavba přerušena zápisem TDI do SD k 21.12.2023. Od 22.12.2023 bude stavba v režimu provizorního užívání s režimem dopravy dle rozhodnutí MěÚ Říčany ev. č. 417024/2023 (částečná uzavírka od 22.12.23 do 31.3.2024, provoz jedním pruhem bez SSZ s vyznačením přednosti v jízdě).**

5 Příští kontrolní den se uskuteční v termínu ukončení přerušování stavby. Toto je předpokládáno v průběhu 03/2024. Konkrétní termín bude včas upřesněn.

Z TDI zapsal:



Přítomni: David Křemeček, Jakub Žalud, Helena Pechlátová



DIO - SENOHRABY

částečná uzavírka silnice III/6031

havárie opěrné zdi u čp. 39

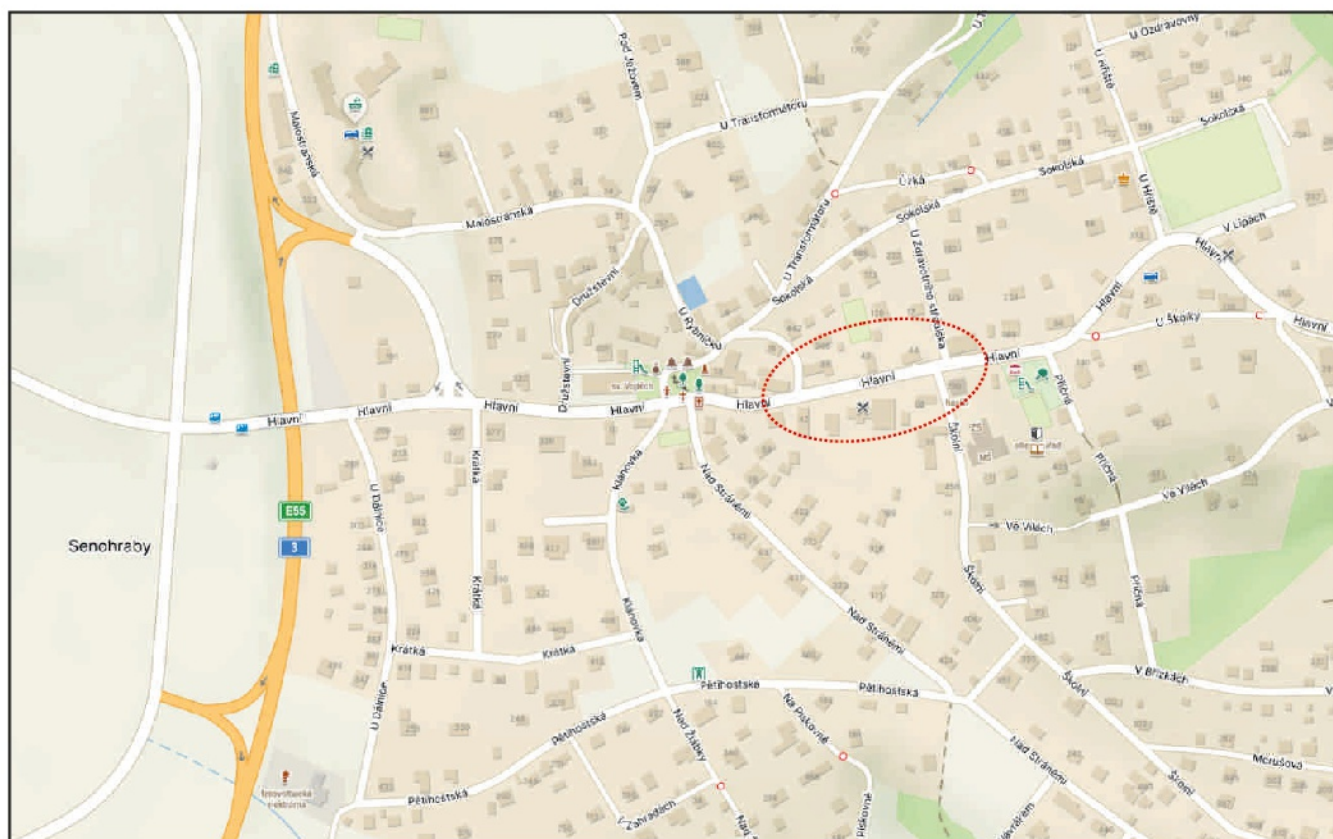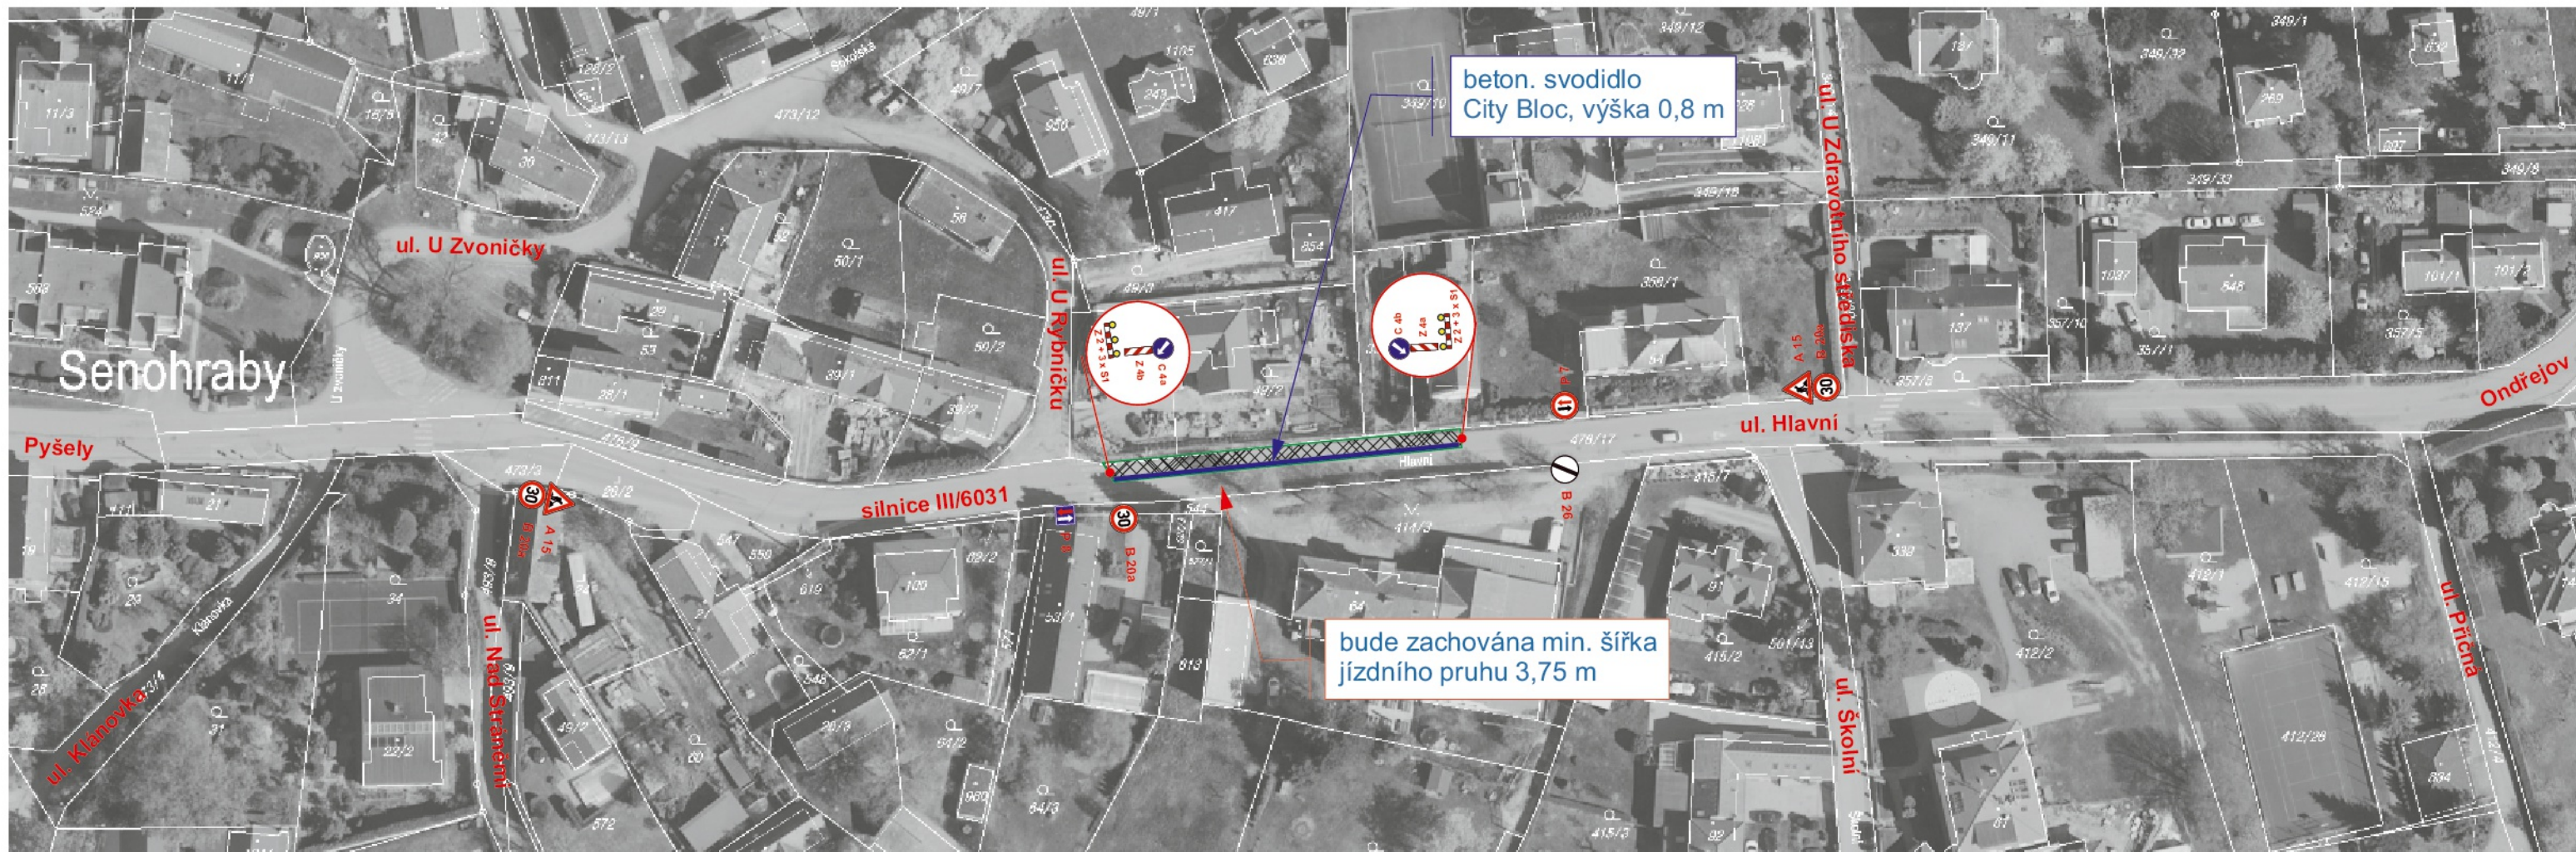

Legenda:

- částečná uzavírka silnice III/6031
- betonové svodidlo City Bloc, výška 0,8 m

A 15 - přechodné dopravní značení

Pozn.: Bude zachována min. šířka jízdního pruhu 3,75 m.
Délka omezení max. 50 m.

Zhotovitel projektové dokumentace

HPN PROJEKT

HPN projekt
Obrátit
384 12 01

DIO - SENOHRABY
částečná uzavírka silnice III/6031
havárie opěrné zdi u čp. 39

DIO

Objednatel:	Starmosty s.r.o.
Vypracoval:	Pavel Neckář
Zodp. projektant:	Pavel Neckář
Datum:	11/2023
Stupeň:	RDS

číslo: Z_S24_12_8120084932

o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, uzavřené na základě § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen „energetický zákon“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „OZ“).

I. SMLUVNÍ STRANY

PROVOZOVATEL:

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035

se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. značka B 2145

s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu/kód banky: 35-4544580267/0100,

zastoupena na základě pověření ze dne 7.4.2022 Ing. Lubošem Hausmanem, vedoucím oddělení Inženýring vn,nn Střed

Kontaktní údaje:

Adresa pro písemný styk: ČEZ Distribuce, a.s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860; www. cez.cz; e-mail: info@cezdistribuce.cz

(dále jen „Provozovatel“)

ŽADATEL:

Středočeský kraj, Číslo zákazníka: 11097002

Datum narození: , IČ: 70891095, DIČ: CZ70891095

Ulice: Zborovská 81/11/11

Obec: Praha 5, Dodací pošta: Praha 5, PSČ: 150 00

Zápis v obchodním rejstříku (rejstříkový soud a spisová značka (tj. oddíl a vložka): Zastoupená Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o. zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

Zastoupený: Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28.06.2022

mail:

mobil:

(dále jen „Žadatel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, ve smyslu stanoviska Provozovatele ze dne 10.03.2022 ev. č. 8120084932 v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované firmou REMONT Šerák, spol. s r.o., na stavbu „PY-Senohraby-Hlavní-kNN-Přeložka IZ-12-6003270“u a úhrada nákladů spojených s přeložkou v souladu s ustanovením § 47 energetického zákona (dále jen „přeložka“).

Provozovatel je vlastníkem zařízení distribuční soustavy venkovního vedení NN a VN v lokalitě Senohraby.

III. VÝŠE ÚHRADY

1. Na základě §47 odst. 2 energetického zákona je Žadatel povinen uhradit náklady na přeložku rozvodného zařízení v plné výši. Předpokládaná výše nákladů (bez DPH), které jsou spojeny s přeložkou zařízení, činí: **571.442,- Kč** (realizační náklady 361.816,- Kč, materiál 113.000,-Kč projektová dokumentace 32.530,- Kč, inženýrská činnost 10.000,- Kč, náklady spojené se zřizováním věcných břemen k dotčeným nemovitým věcem 36.096,- Kč, náklady na vypnutí sítě 18.000,-Kč). Jedná se o cenu předpokládanou na základě vyhotovené projektové dokumentace za účelem možnosti vystavení zálohové faktury dle odstavce 2. čl. III. této smlouvy, kdy Provozovatelem skutečně vynaložené náklady na realizaci přeložky, ve smyslu odstavce 3. a 4. čl. III. této smlouvy, budou Žadateli vyúčtovány fakturou po vynaložení uvedených nákladů, která je splatná 21. den od vystavení dokladu.
2. Žadatel před započítáním samotné realizace uhradí Provozovateli zálohu na provedení přeložky v částce předpokládané výše nákladů. Platba bude realizována na základě zálohové faktury vystavené Provozovatelem. Zálohová faktura na částku **571.442,-Kč** bude vystavena po uzavření této smlouvy.
3. Žadatel se zavazuje po dokončení realizace přeložky uhradit skutečně vynaložené náklady spojené s realizací přeložky včetně nákladů s přeložkou souvisejících (náklady prostavěné, náklady na projektovou činnost, vlastní náklady Provozovatele, náklady na místní poplatky, nájemné za pronájem komunikací, vícepráce vyžádané Žadatelem, náhrady za majetkoprávní vypořádání, věcná břemena apod.). Případný rozdíl od konečné ceny bude vyúčtován ve faktuře zaslané po ukončení realizace a vyúčtování všech nákladů spojených s přeložkou. Ve faktuře bude zúčtována záloha poskytnutá Žadatelem.
4. V případě, že do účetního vypořádání samotné stavby nebudou dořešeny náklady spojené s náhradou za omezení v obvyklém užívání nemovitých věcí a náklady spojené se zřízením věcných břemen k nemovitostem dotčených stavbou přeložky, bude faktura za tyto náklady vystavena po ukončení vypořádání všech nákladů s tímto spojených. K pokrytí zálohy na fakturu za zřízení věcných břemen bude použito části zálohy za náklady spojené se zřizováním věcných břemen k dotčeným nemovitostem uvedené ve výčtu položek v 1. odstavci, článku III. této smlouvy. Zbylá část záloh bude zúčtována do faktury za náklady, které budou známy z účetního vypořádání samotné stavby přeložky. Fakturu za tyto náklady vyhotoví Provozovatel po účetním vypořádání samotné stavby přeložky, a to bez zbytečného odkladu.
5. Povinnost úhrady vyplývá pro Žadatele ze zákona, a proto úhrada nákladů přeložky není zdanitelným plněním a nepodléhá dani z přidané hodnoty (viz výklad MF ČR – informace o uplatňování DPH v energetice ze dne 11.3.2005).

IV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

PROVOZOVATEL:

1. Provozovatel se zavazuje, s předpokladem předchozího uzavření této smlouvy a splnění úhrad způsobem sjednaným v článku III. této smlouvy, zajistit realizaci přeložky v termínu do 6 měsíců od úspěšného předání a převzetí staveniště. Termíny zprovoznění energetického díla jsou podmíněny stavební připraveností Žadatele dle odstavce 2. článku IV. této smlouvy, příznivými klimatickými podmínkami, které umožní provádění prací v souladu s technologickými předpisy Provozovatele a

nabytím právní moci příslušného povolení podle stavebního zákona za předpokladu, že takového povolení bude k uskutečnění přeložky zapotřebí. Stavbu bude provádět firma REMONT Šerák, spol. s r.o.

2. Provozovatel se zavazuje účelně vynakládat Žadatelem poskytnuté finanční prostředky pouze ke smluvně sjednanému účelů.

ŽADATEL:

1. Je povinen řádně, včas a ve sjednané výši uhradit platby sjednané v článku III. této smlouvy. V případě opožděné platby zaplatí Žadatel úrok z prodlení ve výši dle nového občanského zákoníku z dlužné částky za každý den z prodlení až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. Zajistit stavební připravenost pro uskutečnění přeložky, kdy stavební připraveností pro uskutečnění přeložky se rozumí na svůj náklad v nezbytně nutném rozsahu vyklidit a připravit prostor pro stavbu přeložky na svých nemovitých věcech s předáním volné trasy pro uskutečnění přeložky.
3. Umožnit přístup pracovníkům Provozovatele a vybraného zhotovitele na pozemky Žadatele, za účelem provádění prací a úkonů, souvisejících s realizací přeložky, a to nejpozději ke dni zahájení prací.
4. Zavazuje se Provozovateli za jím stanovených podmínek poskytnout veškerou nezbytně potřebnou součinnost a podklady.
5. Nesplní-li řádně a včas své povinnosti dle článku III. a IV. této smlouvy, odkládá se dle dohody smluvních stran termín realizace přeložky automaticky o dobu prodlení Žadatele se splněním jeho povinností + 30 dnů. Dostane-li se Žadatel se splněním svých povinností dle této smlouvy do prodlení delšího než 90 dnů, je dle dohody smluvních stran Provozovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku Provozovatele na zaplacení úroku z prodlení, popř. nároku na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy nebo zánikem práv a povinností z této smlouvy vyplývajících z jakéhokoliv jiného důvodu nevzniká smluvním stranám povinnost vrátit uhrazené smluvní pokuty či úroky z prodlení, na něž smluvním stranám vznikl nárok v době účinnosti této smlouvy.
6. Na nemovitých věcech ve vlastnictví Žadatele, dotčených stanoveným technickým řešením dle stanoviska Provozovatele, jehož ev.č. je uvedeno v čl.II této smlouvy, umožní zřízení věcného břemene za finanční náhradu dle znění zákona 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) a souvisejících předpisů v platném znění.

Smluvní strany se dohodly, že budou účinně spolupracovat při realizaci celé stavby. Zároveň se zavazují vzájemně se informovat o všech skutečnostech majících vliv na závazky dohodnuté v této smlouvě.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Žadatel vyvolává v souladu s ustanovením § 47 odstavec 2 energetického zákona potřebu přeložky zařízení distribuční soustavy dle čl.II této smlouvy. Dle ustanovení § 47 odst. 3 energetického zákona se vlastnictví přeložkou dotčeného zařízení distribuční soustavy po realizaci přeložky nemění.
2. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami týkající se jejího předmětu a obsahu. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, a to pod sankcí jejich neplatnosti. Písemná forma je nezbytná i pro právní jednání směřující ke zrušení smlouvy.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zpětného doručení provozovateli žadatelem.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že je tato smlouva uzavírána adhezním způsobem a jako taková se nezveřejňuje podle § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
5. Smluvní strany se zavazují, že před případným uveřejněním této smlouvy dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv, budou kontaktovat druhou ze smluvních stran za účelem zajištění ochrany informací, které jsou z povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv vyjmuty.
6. Fyzické osoby, které tuto smlouvu za jednotlivé smluvní strany uzavírají, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.
7. Provozovatel, v rámci respektování jemu příslušející povinnosti dbát rovného přístupu k zákazníkům, a v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ, předem vylučuje možnost přijetí návrhu dohody s dodatkem nebo odchylkou, byť i takovou, která podstatně nemění podmínky nabídky Provozovatele (navrhovatele), učiněnými Žadatelem.
8. Je-li tato smlouva uzavírána prostředky umožňující komunikaci na dálku (distančním způsobem) nebo mimo obchodní prostory Provozovatele, je Žadatel (spotřebitel) oprávněn od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, a to písemně prostřednictvím formuláře, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis OZ a který je k dispozici v provozních místech (kancelářích, provozovnách apod.) provozovatele a ke stažení na webové adrese www.cezdistribuce.cz. Žadatel je-li spotřebitelem, současně žádá provozovatele, aby započal s plněním svého závazku dle této smlouvy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle předchozí věty, a to ve smyslu § 1823 OZ.
9. Pokud smlouva nebude podepsána a doručena provozovateli do 30 dnů ode dne, kdy byl návrh smlouvy doručen Žadateli a neproběhnou-li další upřesňující jednání, má se za to, že Žadatel od svého záměru ustoupil.
10. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je společnost ČEZ Distribuce, a. s., subjektu údajů na požádání poskytne.
11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu
12. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily a jejím jednotlivým ustanovením rozumí. Dále prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Kladně

Ing. Hausman Lubos
vedoucí oddělení Inženýring vn, nn Střed
ČEZ Distribuce, a.s.

274

V.

A. Čermák

[illegible]

Datum	Denní záznamy stavby
21.12.23	Zápis TDI:
	Stavba je k dnešnímu dni přerušena
	z důvodu technologicko-klimatických
	podmínek.
	Stavba bude od 22.12.23 pravidelně
	užívána v souladu se schváleným DO.
19.3.24	Zápis TDI:
	Dnešního dne byla stavba otevřena
	po zimní přestávce. Podrobnosti
	viz zápis z KD OS.
19.3.2024	POČASÍ: ! POLOJASNO +3°C +12°C
ÚTERÝ	PLAC. DOZA : 400 - 1400 HOD.
	POČET PLAC. : 63 + 43 BAGLEX + ATHP
	MECHANIZACE: DL. NÁČADÍ, FLEŽA, DL. NÁČADÍ AUT., 1 PAS. BAGL
	PLAC. PLÁČE:
	- FLEŽOVÁNÍ ÚSEKU JEL PA
	- PROVEDENÍ ZS
	- DEMOLICE STAV. OPĚRKY
20.3.2024	POČASÍ: ! POLOJASNO +3°C +13°C
STŘEDA	PLAC. DOZA : 400 - 1400 HOD.
	POČET PLAC. : 63 + 33 BAGLEX + ATHP
	MECHANIZACE: NÁČL. AUTO LX; 1 PAS. BAGL; DL. NÁČADÍ
	PLAC. PLÁČE:
	- DEMOLICE STAV. OPĚRKY
	- VYKOPOUTÍ PLÁČE NA ZS
	-
