

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby

Název zakázky: „Sanace tělesa železničního spodku na trati Varnsdorf –Seifhennersdorf (DB) v km 12,288-12,7“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

(dále jen „objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-1442/2024

číslo jednací: 22841/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

ISPROFOND: 5423520087

a

Zhotovitel:

REMEX CZ a.s.

se sídlem: K Váze 1111/66, 154 00 Praha 5

IČO: 60201088, DIČ: CZ 60201088

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 23208

bank. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupena: Richardem Filipem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

K Váze 1111/66, 154 00 Praha 5

(dále jen „zhotovitel“)

číslo smlouvy: N/100/2024/052/01

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22. 3. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby, název zakázky: „Sanace tělesa železničního spodku na trati Varnsdorf – Seifhennersdorf (DB) v km 12,288-12,7“ s účinností Smlouvy ke dni 25. 3. 2024 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3. Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“), jehož předmětem je posun lhůty pro dokončení stavebních prací do 31.3.2025, přičemž důvodem posunutí stavebních prací je nutný posun termínu stavebních prací jen v části u SO 11-10-01 Kolejový svršek, SO 11-96-01 Náhradní výsadba, SO 11-24-01 Pilotová stěna, SO 11-11-01 Kolejový spodek a SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy. Důvodem je, že došlo k výraznému zásahu stavby povodněmi v září 2024. Tím došlo k nemožnosti dokončení uvedených stavebních prací v termínu dle Smlouvy, přičemž některé následné práce (náhradní výsadba) nebude možno provést s ohledem na příchod zimy a nutné technologické zimní pauzy.

Tyto změny však nemají vliv na celkovou lhůtu pro dokončení díla.

Výše uvedené okolnosti jsou také důvodem pro odpovídající úpravu harmonogramu postupu prací.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplyvá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 Předmět. Cena a harmonogram postupu prací, odst. 3.7.

Smluvní strany se též dohodly na odpovídající změně Přílohy č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) Harmonogram postupu prací.

Dále se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 2 (současně Příloha č. 6 Smlouvy) Oprávněné osoby, kdy se doplňují kontakty na TDS objednatele (dle odborností), včetně jejich zástupců, a zároveň se mění osoba jednající za objednatele ve věcech smluvních a obchodních.

I. Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Prodlužuje se lhůta pro dokončení stavebních prací

Lhůta pro dokončení stavebních prací se prodlužuje do 31.3.2025.

2. Ruší se stávající znění článku 3 Předmět. Cena a harmonogram postupu prací, odst. 3.7. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3. - PŘEDMĚT. CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 2.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí 9 měsíců, tj. do 30.4.2025 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací trvá do **31.3.2025** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **30.4.2025**.

3. Změna Přílohy č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4. Změna Přílohy č. 6 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku jsou Přílohy:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací
Příloha č. 2 (současně Příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby

Za objednatele:

V Praze



12.12.2024 13:03
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.08
08:35:11 +01'00'

.....
Richard Filip
předseda představenstva
REMEX CZ a.s.

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy)



Harmonogram postupu prací

Příloha č. 2 (současně Příloha č. 6 Smlouvy)

Oprávněné osoby

Zpracováno 25.11.2024

Zafazeni	Cinnost	srpen 24							září 24							
připravné práce	Zřízení staveníště															
	Vytýčení a zajištění IS															
	Kácení dřevin															
	Návoz materiálů pro výstavbu															
	Snesení kolejového roštu kol č. 2															
	Odtěžení kolejového lože kol č. 2															
demontáž svršku	Snesení kolejového roštu kol č. 1															
	Odtěžení kolejového lože kol č. 1															
	Zřízení knejného lože															
	Vracení kolejového roštu															
montáž svršku	Úprava GPK															
	Výstavba TZZ3 km 12,3 - 12,55 + dlažby/vetrační tvarnice UCH, UK B pod pilotovkou(km 12,585 - 12,685)															
	Výstavba odvodnění km 12,685 - 13,000 vpravo															
železniční spodek	Traťovýdy km 12,3 - 12,55															
	Konstrukce vrstvy km 12,55 - 13,00															
	Terénní úpravy															
	ZB jímka v km 12,583															
	ZB jímky v km 12,684 a 12,731															
	Odkvězení(SL+ zemina)															
	Sanace plané- ŠD fr. 0/5															
	Sanace zemni plané-tráva															
	ŠNK fr. 0/32 KV															
propustek	Vykopy															
	Podkladní betony															
	Zaklady															
	Instalace prefabrikátů															
	ZB stény jímek															
pilotová stěna	1x ALP + 2x ALN, rost															
	Zásypy a odtěžení															
ZAB-ZAR	ZAB+ZAR software															
	SO 11.96.01 nahradní vysadba															
Likvidace odpadů																

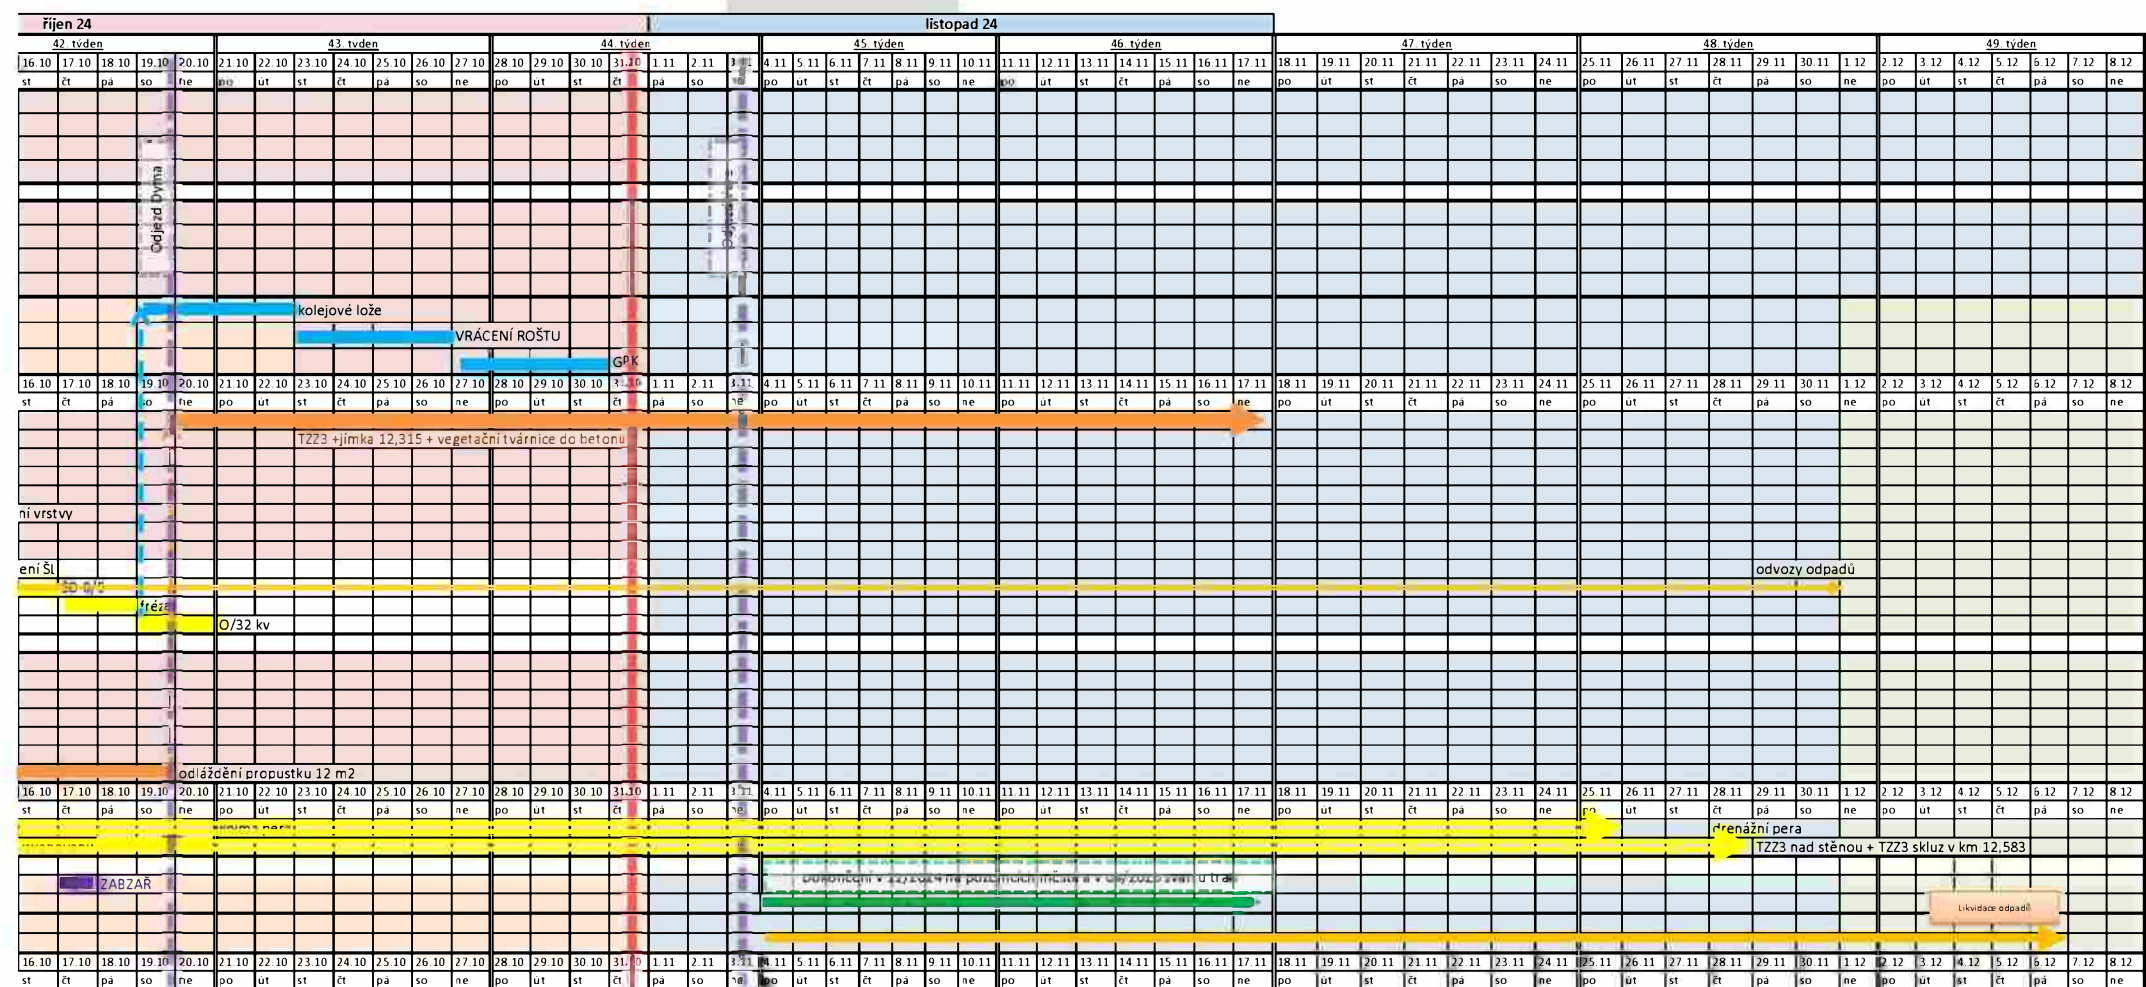

dna jímek
spodku

výsadba keru,
hydroosev,
georohože

dna jímek
propustku

spárování SO Pil. stěny

Příloha č. 2 (současně Příloha č. 6 Smlouvy)

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Ve věcech technických

Jméno a příjmení [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Technický dozor stavebníka (TDS) na žel. svršek a spodek (Hlavní inženýr stavby):

Jméno a příjmení [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Technický dozor stavebníka (TDS) na žel. svršek a spodek – zástupce:

Jméno a příjmení [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Technický dozor stavebníka (TDS) na mostní konstrukce a inženýrské stavby:

Jméno a příjmení [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Technický dozor stavebníka (TDS) na mostní konstrukce a inženýrské stavby – zástupce:

Jméno a příjmení

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Technický dozor stavebníka (TDS) na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Technický dozor stavebníka (TDS) na sdělovací a zabezpečovací zařízení – zástupce:

Jméno a příjmení

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Koordinátor BOZP na staveništi

Jméno a příjmení

[REDACTED]
[REDACTED]

████████████████████
████████████████

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení ██████████
██
████████████████
████████████████

Ve věcech technických

Jméno a příjmení ██████████
██
████████████████
████████████████

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice autorizovaný zeměměřický inženýr)

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení ██████████
██
████████████████
████████████████

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení ██████████
██
████████████████
████████████████

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení ██████████
██
████████████████
████████████████

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Jméno a příjmení [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Všechny podpisy jsou platné.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 09.12.2024 10:29:00.451

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 08.12.2024 08:35:11

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 09.12.2024 10:29:00.451

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 03.09.2024 09:02:21

Platný do: 23.09.2025 09:02:21

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5194184

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c0d88a1d-52b2-4385-9af6-e29ef038082e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.12.2024 10:29:01

Hash komponenty: 185e3b4980e72bbf92baa10acb127358d02edcf05d55bf0dedeb17590d1e0f0d

Hashovací funkce: sha256Hex



268daabe-a0c7-410b-8e83-9e2b4afb6141
