

PŘÍLOHA a)

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-84/1073/600/20/2024

evidenční znak: OV2-663/2024

číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2024-041

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba: Ing. Jiří Synek, náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel


[REDACTED] 1.zástupce statutárního orgánu organizace na
základě pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]

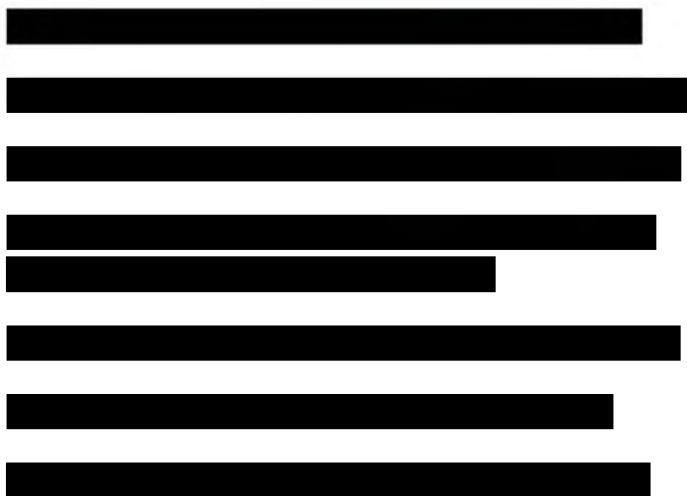

■dále jen „Objednatel“)

a

II. M – SILNICE a.s.

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsdou představenstva, písemně pověřeného představenstvem

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 430

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: stred@msilnice.cz

Zástupce zhotovitele: Ing. Lukáš Horčík, ředitel oblastního závodu STŘED

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „**smluvní strany**“).

Tento DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) byl uzavřen podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník.

1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 20.5.2024 Smlouvu o dílo č. SMLO-84/1073/600/20/2024 (dále jen „Smlouva“) na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce mostu ev. č. 32265-1 Blížňovice**“.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by

neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna – smluvní částky

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek 2., a to takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
19 021 738,20	3 994 565,02	23 016 303,22

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

3. Odůvodnění

Změna smluvní částky se zvýšila celkem o 1 410 622,20 Kč bez DPH na základě dodatečných prací. Jednotlivé důvody navýšení smluvní částky jsou popsány ve změnovém listě - ZBV 01, který tvoří přílohu tohoto Dodatku.

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku včetně příloh a případných metadat byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se

dohodly, že Dodatek zveřejní Objednavatel.

5. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují elektronickými podpisy dle předchozí věty, je Dodatek vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
6. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Přílohy:

Č. 1 - ZBV 01 ze dne 5.12.2024 ve formátu PDF.

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:

**Ing. Zdeněk
Vašák**  Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.12.09
14:26:24 +01'00'

Ing. Zdeněk Vašák

ředitel

Správa a údržba silnic

Pardubického kraje

V Hradci Králové dne:

Za Zhotovitele:

**Ing. Zdeněk
Babka**  Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Babka
Datum: 2024.12.11
13:51:11 +01'00'

Ing. Zdeněk Babka

místopředseda představenstva

M - SILNICE a.s.

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 32265-1 Blížňovice - OV2-663/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ RD BLÍŽŇOVICE Č.P. 15, Č.P. 43	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 002 / 01	Číslo ZBV: 01
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 20.05.2024
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce
--------------------------	---------------------------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V průběhu provádění přípravných prací na realizaci stavby byly na základě provedené pasportizace sousedících staveb zjištěny statické poruchy na nemovitostech na adrese Blížňovice 15 (par. č. 26, k. ú. Blížňovice) a Blížňovice 43 (par. č. 77, k. ú. Blížňovice). Tyto poruchy by s ohledem na provádění stavebních prací dle předpokladu PDPS mohly mít vliv na životnost staveb, případně přímo na jejich poškození.

Na základě výše uvedené skutečnosti byl vypracován projekt statického zajištění konstrukce u obou dotčených objektů a dále provedeno samotné zajištění obou nemovitostí dle vypracovaného projektu tak, aby nemohly být způsobeny škody třetím osobám při realizaci stavebních prací.

Změna má vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 02630.N (STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ RD BLÍŽŇOVICE Č.P. 15, Č.P. 43).

Projektant dokumentace ve stupni PDPS neměl přístup do přílehlých nemovitostí a případné statické poruchy těchto nemovitostí nemohly být v době přípravy této dokumentace odhaleny. Ke zjištění těchto skutečností mohlo dojít až v průběhu provádění přípravných prací, po provedení detailní pasportizace přílehlých nemovitostí.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	1 410 622,20 Kč	1 410 622,20 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zástupce Objednatele (TDS)	jméno: [redacted]			[redacted signature]
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: [redacted]	datum	podpis	[redacted signature]
Projektant	jméno: [redacted]	datum	podpis	[redacted signature]

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 32265-1 Blížňovice - OV2-663/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ RD BLÍŽŇOVICE Č.P. 15, Č.P. 43	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 002 / 01	Číslo ZBV: 01	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: ██████████	datum	podpis ██████████
Zhotovitel	jméno: ██████████	datum	podpis ██████████
		Číslo paré:	
