



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Objednatel: město Hlinsko
se sídlem: Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupené: Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města
IČO: 00270059
DIČ: CZ00270059
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]
**Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických:** [REDACTED]

Kontaktní osoba:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
provozovna: závod Morava jih, Vídeňská 104, 602 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku: vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupený: Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
daňový režim: ano plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]
**Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických:** Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
Kontaktní osoba: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel jsou v tomto dodatku nazýváni jednotlivě též jako „smluvní strana“ a společně též jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. zhotovitele 198/3/2024 (1856.4241198TSE) na akci „**Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko, II. etapa**“ následovně:

A. Mění se odst. 1 čl. III. (doba plnění a místo plnění) a nově zní:

1. Doba pro provedení díla je stanovena takto:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

- Předpokládaný termín zahájení provádění díla: 05/2024
- **Řádné ukončení a zprovoznění** (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) **30/7/2025**

Zdůvodnění zpoždění realizace stavby, viz. příloha č. 2, detailní claim zhotovitele

B. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. zhotovitele 198/3/2024 (1856.4241198TSE) na akci „**Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko, II. etapa**“ se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 novou smlouvu o dílo.

C. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují elektronické podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

D. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Za datum podpisu se považuje údaj z časového razítka, pokud není, pak datum uvedené v elektronickém podpisu podepisující strany.

E. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

F. Uzavření dodatku schválila, v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Rada města Hlinsko dne 9. prosince 2024 usnesením č. RM 307-2024.

Přílohy: č. 1 HMG

Č. 2 detailní claim zhotovitele

V Hlinsku dne

V Brně dne

Za Objednatele:

Miroslav
Krčil

Digitálně podepsal
Miroslav Krčil
Datum: 2024.12.11
10:31:34 +01'00'


Miroslav Krčil, DiS.
starosta města

Za Zhotovitele:

Ing. Ludvík
Šumbera

Digitálně podepsal
Ing. Ludvík
Šumbera
Datum: 2024.12.10
09:27:55 +01'00'

Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih
EUROVIA CZ a.s.

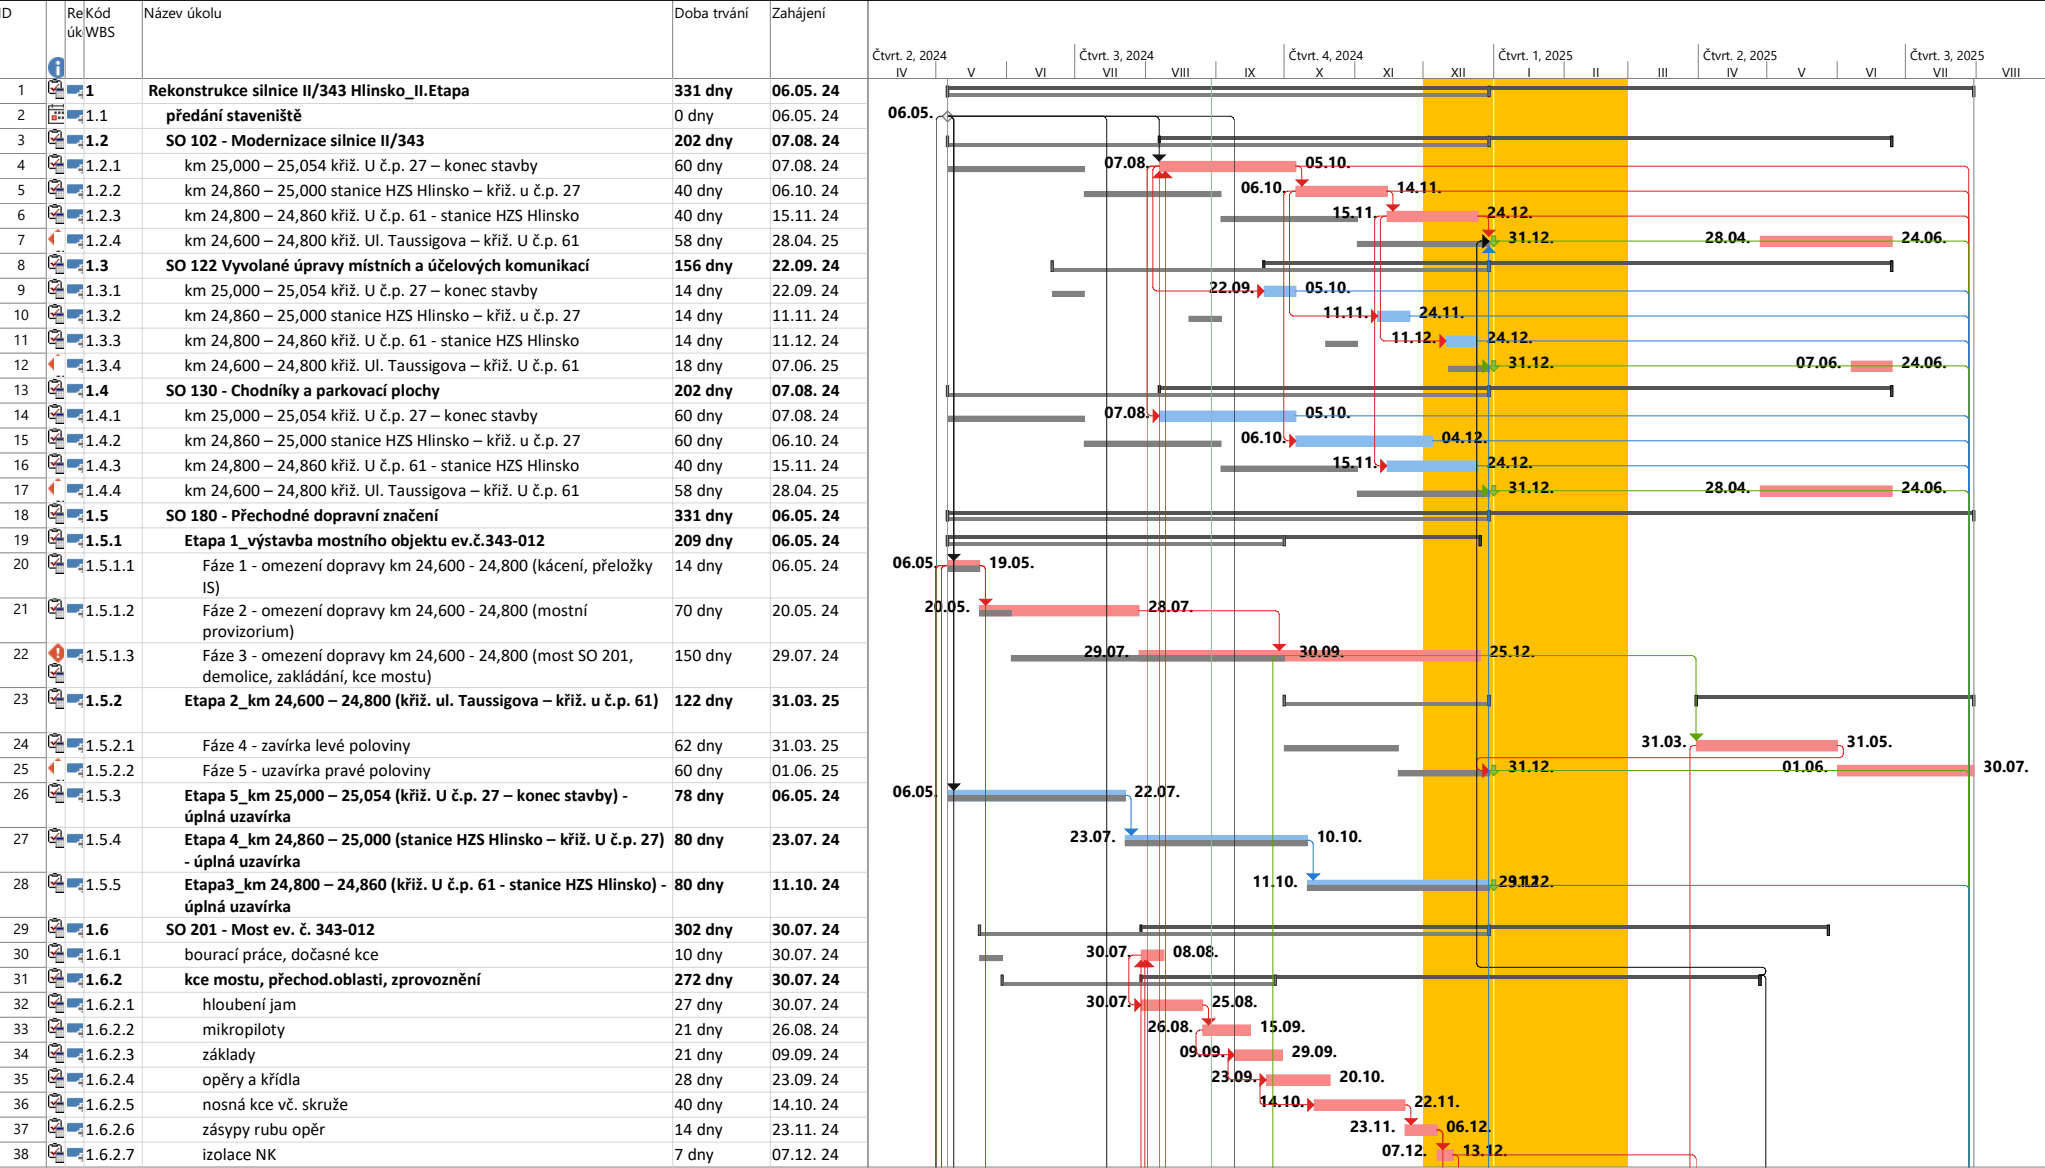

Projekt: Hlinsko_II.etapa_SP_v.04_zpoždění SO řady 400_SP_v.02

Úkol

Rozdělení

Milník

.....

◆

.....

◆

.....

◆

Souhrnný

Souhm projektu

Konečný termín

↓

Kritický

Kritické rozdělení

Směrný plán


.....

Milník podle směrného plánu

Souhrnný úkol směrného plánu

Průběh

◆

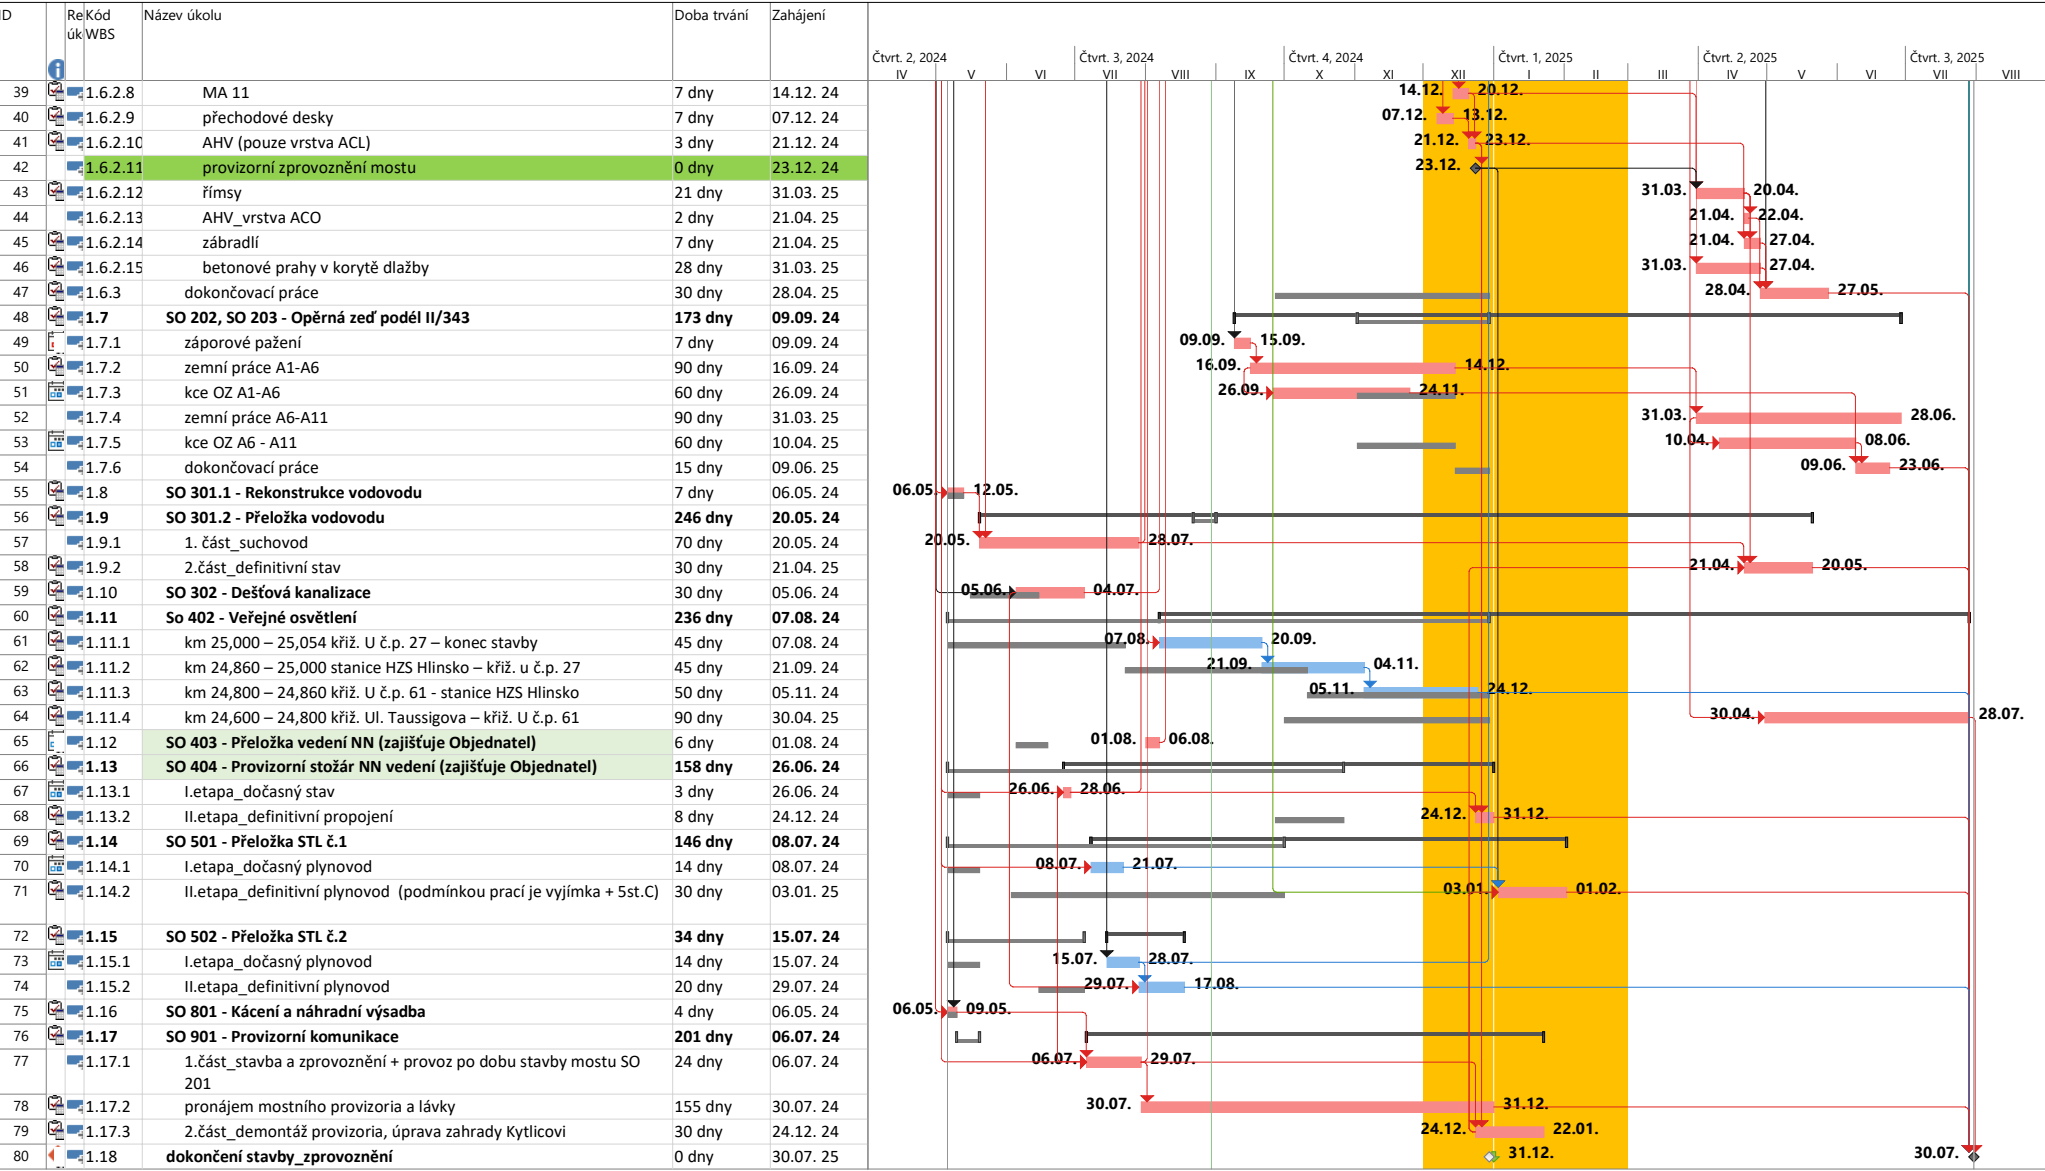

Projekt: Hlinsko_II.etapa_SP_v.04_zpoždění SO řady 400_SP_v.02

Úkol

Rozdělení

Milník

.....

◆

Souhrnný

Souhrn projektu

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Směrný plán

Milník podle směrného plánu

Souhrnný úkol směrného plánu

Průběh

◆

EUROVIA CZ a.s.

U Michelského lesa 1581/2
Michle, 140 00 Praha 4

Město Hlinsko

Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko

Naše značka:
003/MHL/1198TSE

Vyřizuje/telefon:

V Jihlavě dne:
31. 8. 2024

Stavba: Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko, II. etapa

Věc: Oznámení a zdůvodnění zpoždění realizace stavby

Související Pod-články Smlouvy: čl. III

ZCELA DETAILNÍ CLAIM ZHOTOVITELE
v souladu se Smlouvou

Vážený pane,

Zhotovitel v předstihu oznamuje zpoždění způsobené stavebními pracemi, jejichž dodávka není předmětem zasmělných prací a jejichž realizace předchází realizaci stavebních objektů nacházejících se od samého začátku na kritické cestě.

Zhotovitel v návaznosti na toto oznámení předkládá Objednateli zcela detailní claim s uvedením všech podrobností na podporu podstaty claimu a na podporu požadovaného prodloužení doby.

Zhotovitel pro přehlednost předkládá časový sled událostí, které přímo či nepřímo ovlivnily současné zpoždění celé stavby:

- 1) Podpis smlouvy na konci měsíce dubna 2024
- 2) Předání staveniště 6. 5. 2025 na základě výzvy Objednatele ze dne 30. 4. 2024
- 3) Zpoždění realizace přeložky NN – SO 403 a 404 ze strany ČEZ bylo z důvodu nevyřešených podkladů v DÚR, následně vedlo ke zpoždění vydání rozhodnutí o umístění stavby – Zhotovitel a ani Objednatel neměli možnost tento problém jakkoliv ovlivnit.
Daná situace měla vliv na:
 - a. zahájení prací na SO 102 v km 25,000 – KÚ, následné navazující práce na úseku ZÚ – km 25,000
 - b. zahájení prací na SO 123 Chodníky a parkovací plochy
 - c. zahájení prací na SO 402 Veřejné osvětlení
 - d. na termín demontáže stávající lávky pro pěší v SO 201.
 - e. Související zpoždění realizace suchovodů pro STL plynovod SO 501 a vodovod 301.2.
 - f. Další související zpoždění bylo v provádění propojů STL plynovodu, stanovený termín propojů GasNet 18. 7. respektive 11. 7. 2024
- 4) Pozdní vydání souhlasů k povolení propojů STL plynovodu v návaznosti na změnu schémat propojů stanovených správcem sítě GasNet. Nově požadovaná změna řešení schémat propojů na ZÚ a KÚ

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 1561

přeložky, a pozdní schválení výjimky ze strany GAsNet ze smlouvy o zajištění přeložky č. 4000252607.

- a. toto způsobilo zpoždění realizaci vodovodu SO 301
- b. a zpoždění dokončení přechodových oblastí provizorního mostu SO 901

- 5) Změna způsobu pažení stavební jámy mostu SO 201 z důvodu zastižení skalního podloží GT3 v hloubkách od 5 m, úpravou technologie došlo k zvýšení časové náročnosti na tyto práce a ke zpoždění prací na zakládání mostu cca 10 dnů

Navržená opatření k zmírnění následků současného zpoždění realizace stavby:

- Provizorní zprovoznění stavby mostu SO 201 do konce roku 2024
- Realizace zimních opatření souvisejících s provizorními přeložkami STL plynovodu a vodovodu, (zajištění vytápěných stanů pro realizaci propojů vody a STL plynovodu, vytápěná hala pro skladování trubních materiálů)
- Realizace zimních opatření souvisejících s dopravou a údržbou (provizorní opravy povrchů komunikací a chodníků v místě staveniště)
- Demontáž provizorního mostu vč. demontáží opěr O1 a O2, demontáž lávky v případě souhlasu správce vodovodu a mostu s provizorním umístěním vodovodu do upravené horizontální polohy pod novou kci mostu SO 201
- Realizace přeložky STL plynovodu SO 501 (podmínkou je souhlas správce sítě GasNet a optimální teploty min. 5 st. C)
- Provádění stavebních objektů SO 201, 202, 203 v období nařízené ZTP 24/25 (podmínkou je souhlas SUSPK a optimální teploty min. 5 st. C a realizace záporového pažení, kterým dojde k zajištění polohy přeložených IS STL plynovodu a vodovodu, zajištění stability svahu, proti sesunutí svahu stavební jámy, zatíženého stavební technikou a veřejnou dopravou na PK)
- Projednání úpravy stanovení přechodného dopravního značení pro ZTP 24/25, prodloužení uzavírky pro rok 2025, realizace DIO dle rozhodnutí a stanovení

Zhotovitel tímto zdvořile žádá Objednatele o prodloužení Doby pro dokončení stavby a Doby pro uvedení stavby do provozu dle přiložené aktualizace Harmonogramu.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Za Zhotovitele

Digitally signed by Tomáš Sedlák
DN: cn=Tomáš Sedlák, c=CZ, o=EUROVIA CS, a.s., ou=18002482,
email=tomas.sedlak@eurovia.cz
Reason: Schvaluji tento dokument.
Location: Kosovská 5517/20, 586 01 Jihlava
Date: 2024.09.13 12:51:38 +02'00'

Přílohy:

- HMG – směrný plán
- HMG – aktualizace č. 01

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 1561
