

MP-034-0010

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. S915/2017/014
na akci**

Oprava a technické zhodnocení LC Bohuslavická

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupený na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted]

ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: [redacted] (technický dozor), č. telefonu: [redacted] e-mail:

[redacted], zastupitelnost: [redacted], č. telefonu [redacted] e-mail:

fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín

adresa pro zasílání fakturace:

**Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice, náměstí Svobody 289,
687 08 Buchlovice**

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

A

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zapsán v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno

kontaktní adresa: OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín

zastoupený: [redacted] vedoucím odštěpného závodu

oprávnění jednat: [redacted] ředitel oblasti Hodonín

[redacted] výrobně technický ředitel; *oba na základě plné moci*

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

**IV.
Cena za dílo**

Na základě kontrolního dne na stavbě 3.7.2017 došlo ke změně ceny díla dle **Čl. IV. odst. 1.** výše uvedené Smlouvy o dílo a upravuje se v souladu s **Čl. IV. odst. 2** této smlouvy, následovně:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 10 884 213,70 Kč bez DPH, slovy desetmilionůosmsetosmdesátčtyřitisícdvěstětřináct korun českých sedmdesát haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

	cena díla bez DPH
Cena díla dle SOD	10 743 155,00
Cena dle dodatku č.1 - vícepráce	182 764,40
Cena dle dodatku č.1 - méněpráce	- 41 705,70
Cena díla celkem	10 884 213,70

XIII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého dodatku v jeho plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

7. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
8. Součástí tohoto dodatku je příloha – rozpočet méněprací a víceprací.

V Hodoníně, dne 28.7.2017

Ve Zlíně, dne 31-07-2017



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16026-14/24XC-BJ

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Bohuslavická - km 1,687 - 7,583

JKSO:

Místo: Bohuslavice u Kyjova, Čeložnice

CC-CZ:

Datum: 17.07.2017

Objednatel:

Lesy ČR, s.p. LS Buchlovice

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební, s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

141 058,70

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

141 058,70

DPH základní

21,00%

ze

141 058,70

29 622,33

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

170 681,03

Projektant

[REDACTED]

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

[REDACTED]

Zhotovitel

[REDACTED]

Datum a podpis:

Razítko

Da

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16026-14/24XC-BJ

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Bohuslavická - km 1,687 - 7,583

Místo: Bohuslavice u Kyjova, Čeložnice

Datum: 17.07.2017


Objednatel: Lesy ČR, s.p. LS Buchovice

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	141 058,70	170 681,03
16026-14/24XC-BJ-D1V	Dodatek č. 1 - vícepráce SO 01	118 018,17	142 801,99
16026-14/24XC-BJ-D2M	Dodatek č. 1 - méněpráce SO 02	-41 705,70	-50 463,90
16026-14/24XC-BJ-D3V	Dodatek č. 1 - vícepráce SO 03	64 746,23	78 342,94
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		141 058,70	170 681,03

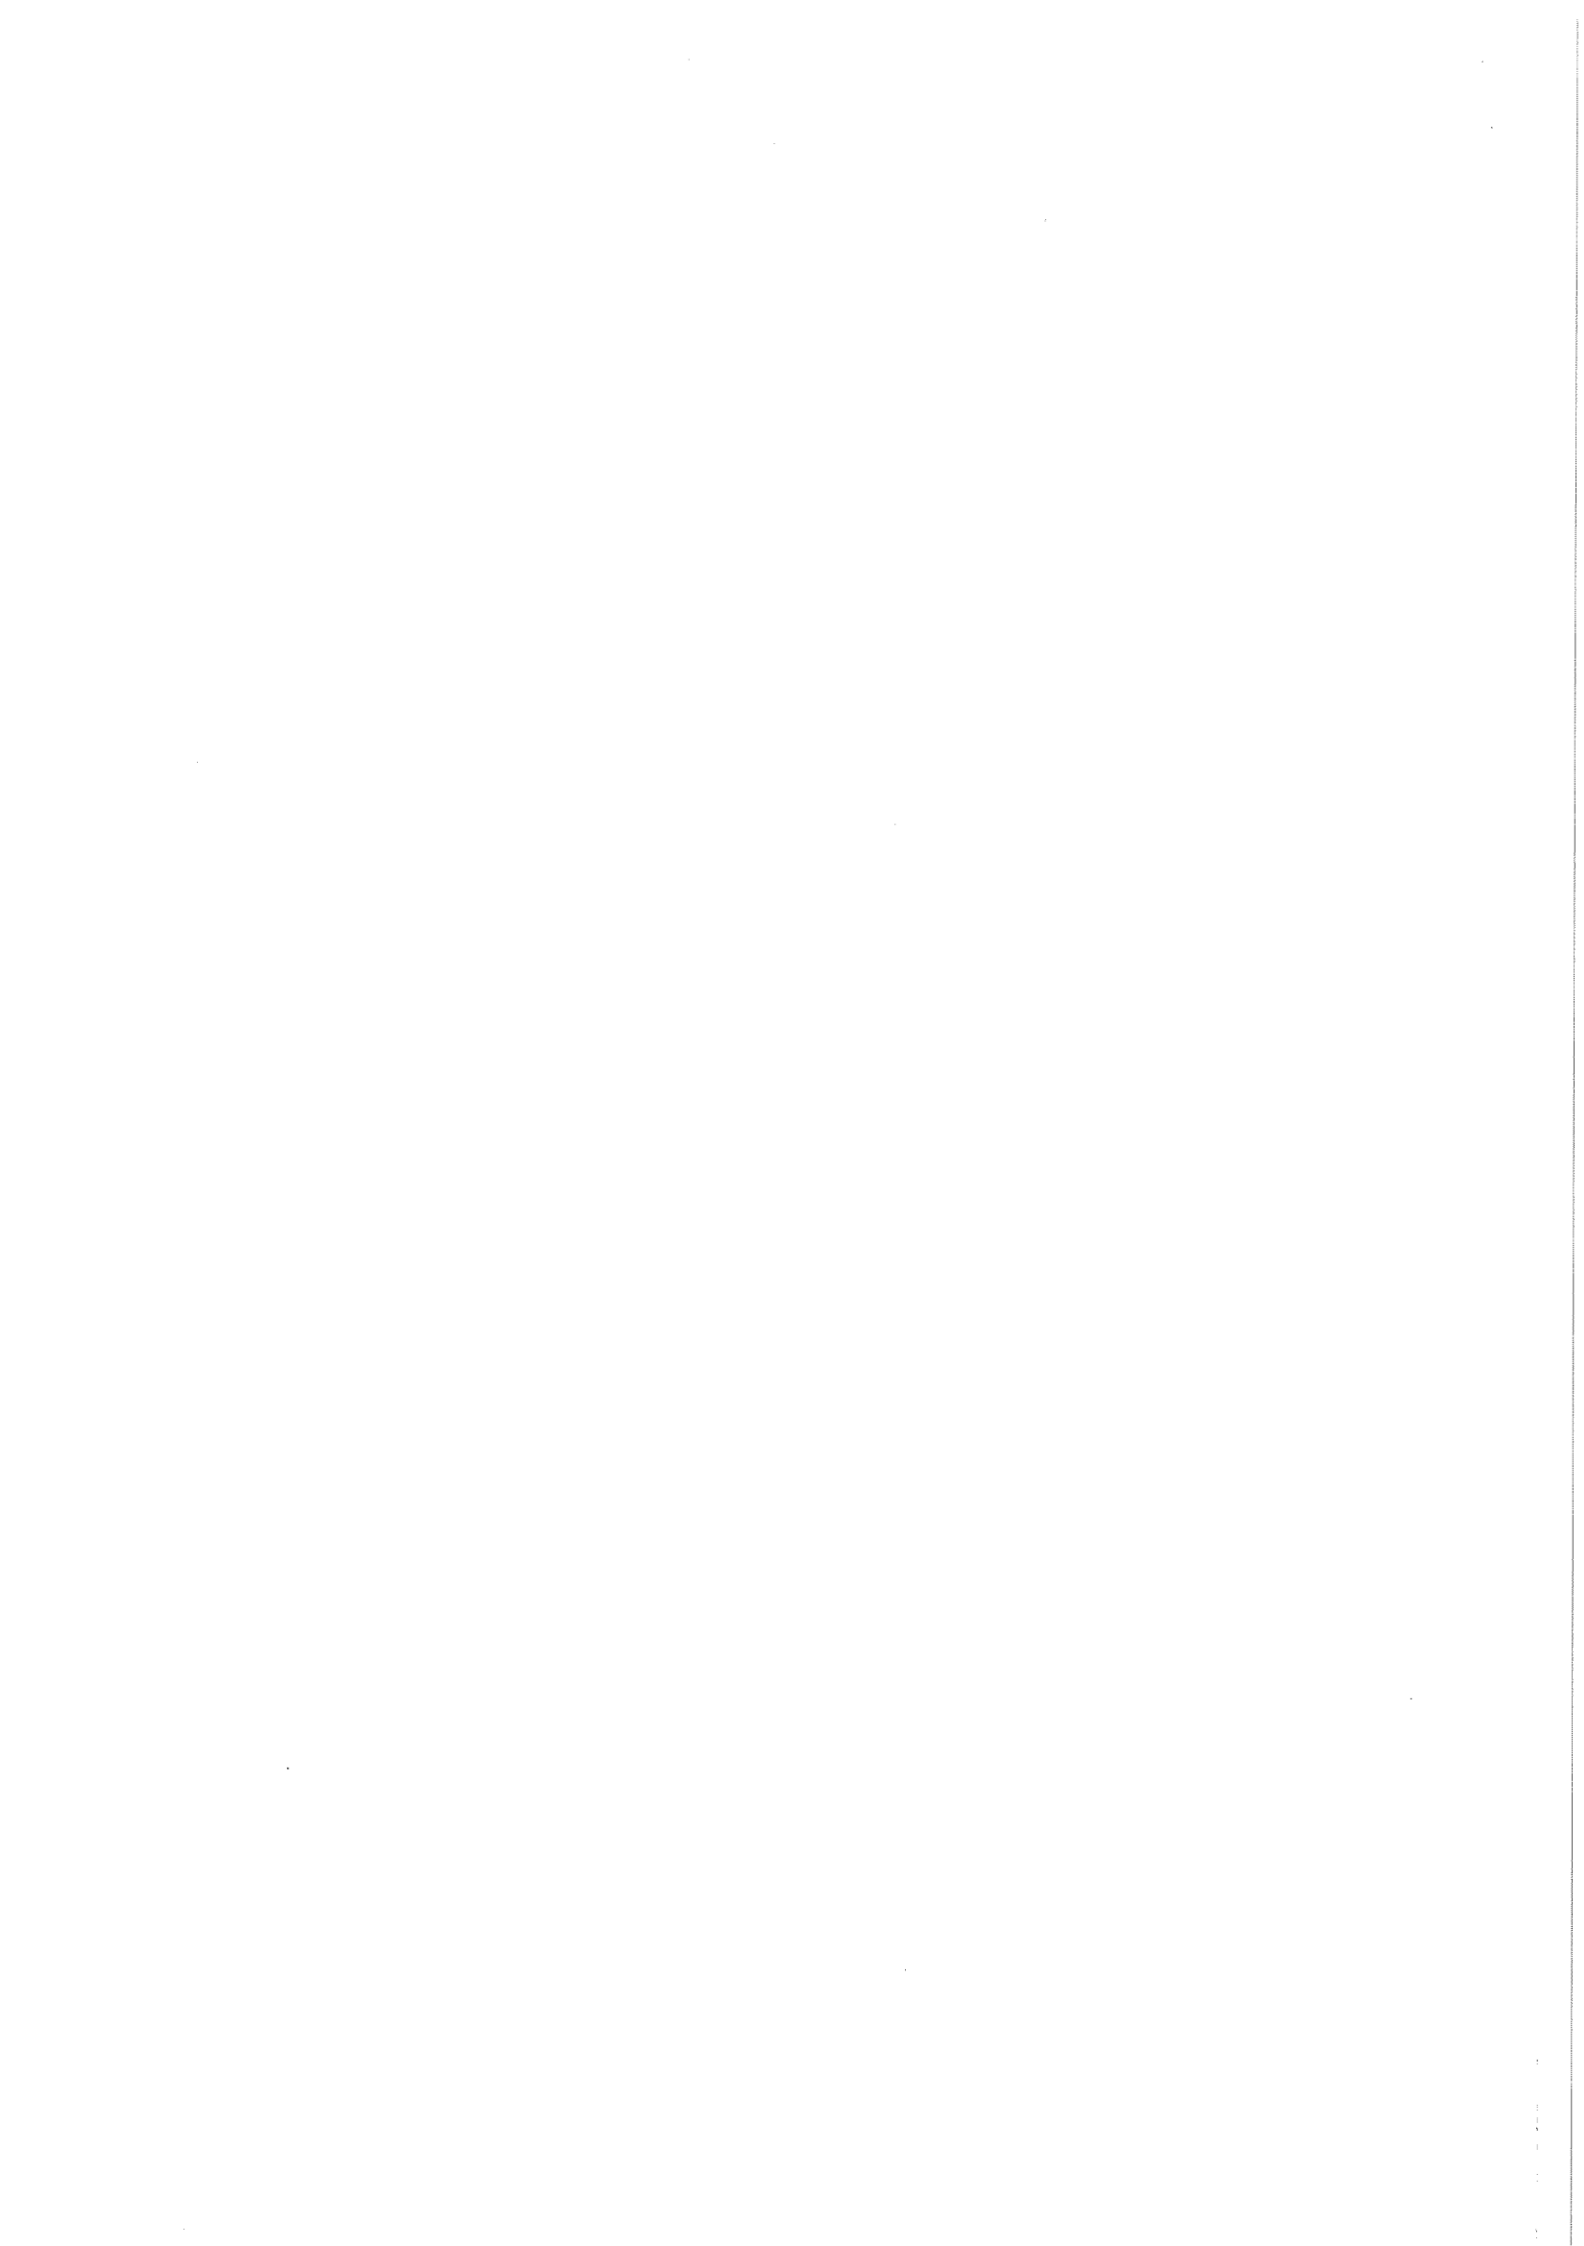

ROZPOČET

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Bohuslavická - km 1,687 - 7,583

Objekt: 16026-14/24XC-BJ-D1V - Dodatek č. 1 - vícepráce SO 01

Místo: Bohuslavice u Kyjova, Čeložnice

Datum: 17.07.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. LS Buchovice

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

118 018,17

HSV - Práce a dodávky HSV

118 018,17

1 - Zemní práce

11 284,69

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,870	210,00	2 702,70
					25,740		
					25,740		
					25,740		
					25,740		
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	2,574	10,00	25,74
					2,574		
					2,574		
3	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	12,870	305,00	3 925,35
					12,870		
4	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	2,574	10,00	25,74
					2,574		
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	4,130	169,00	697,97
					8,260		
					8,260		
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,826	10,00	8,26
					0,826		
7	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	4,130	265,00	1 094,45
					4,130		
					4,130		
8	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	0,826	10,00	8,26
					0,826		
					0,826		
9	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,340	56,00	1 755,04
					8,260		
					25,740		
					34,000		
					-2,660		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					31,340		
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,660	72,00	191,52
Zásyp1					2,660		
Součet					2,660		
11	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	15,670	32,00	501,44
Rýhy_2000					8,260		
Jámy					25,740		
Mezisoučet					34,000		
-Zásyp1					-2,660		
Součet (50%)					31,340		
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,670	10,00	156,70
Rýhy_2000					8,260		
Jámy					25,740		
Mezisoučet					34,000		
-Zásyp1					-2,660		
Součet (50%)					31,340		
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,660	72,00	191,52
"HP - čela"							
" HP km 2,459 - vlevo" (4,13-2,8)*2					2,660		
Zásyp1 Součet					2,660		
4 - Vodorovné konstrukce							2 115,00
14	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	9,000	235,00	2 115,00
"HP"							
" HP km 2,459 - vlevo" 9*1					9,000		
Součet					9,000		
5 - Komunikace pozemní							22 682,85
15	K	RP92	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm pro případné rozšíření v obloucích	m2	123,950	183,00	22 682,85
<i>Položka vychází z pol. 564871116</i>							
"Rozšíření vlevo"							
"km 2,392-2,450" 29					29,000		
"km 2,636-2,680" 22					22,000		
"km 2,820-2,882" 62					62,000		
"Rozšíření vpravo"							
"km 1,720-1,870" 75					75,000		
"km 1,870-2,015" 145					145,000		
"km 2,150-2,315" 82,5					82,500		
"km 2,360-2,392" 32					32,000		
"km 2,392-2,450" 29					29,000		
"km 2,450-2,540" 90					90,000		
"km 2,680-2,770" 45					45,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		611,500		
			"minus původní návrh rozšíření v PD" -487,55		-487,550		
			Mezisoučet		-487,550		
			Součet		123,950		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

80 089,00

16	K	RP95	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	15 000,00	30 000,00
			<i>Položka vychází z pol. 919441211, je zde navýšené množství betonu pro základy vč. vyztužení kari sítí (dle výkresu v PD).</i>				
			" HP km 2,459 - vlevo" 2		2,000		
			Součet		2,000		
17	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	3,600	2 112,00	7 603,20
			" HP km 2,459 - vlevo" 9*0,4		3,600		
			Součet		3,600		
18	K	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	9,000	450,00	4 050,00
			" HP km 2,459 - vlevo" 9		9,000		
			Součet		9,000		
19	M	562411110	trouba 8 kPa d = 400 mm	m	9,000	2 000,00	18 000,00
			<i>trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou</i>				
20	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,006	19 500,00	117,00
			" HP km 2,459 - vlevo" 9*0,85*0,79/1000		0,006		
			Součet		0,006		
21	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva	m3	17,640	670,00	11 818,80
			" HP km 2,459 - vlevo" 9*1,96		17,640		
			Součet		17,640		
22	K	RP97	Bourání trubního propustku do DN 500	kpl	8,000	1 000,00	8 000,00
			"Hospodářské propustky (m)"				
			" HP km 2,459 - vlevo" 6		6,000		
			Mezisoučet		6,000		
			"Čela"				
			" HP km 2,459 - vlevo" 2		2,000		
			Mezisoučet		2,000		
			Součet		8,000		
23	K	RP98	Likvidace vybouraných hmot v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace s vybouranými hmotami a poplatky za uložení sutě na skládku.	kus	1,000	500,00	500,00
			"Hospodářské propustky (m)"				
			" HP km 2,459 - vlevo" 6		6,000		
			Mezisoučet		6,000		
			"Čela"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" HP km 2,459 - vlevo" 2		2,000		
			Mezisoučet		2,000		
			Součet		8,000		
			1		1,000		
			Součet		1,000		

998 - Přesun hmot

1 846,63

24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	57,707	28,00	1 615,80
25	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	57,707	4,00	230,83

VP - Vícepráce

0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Bohuslavická - km 1,687 - 7,583

Objekt: 16026-14/24XC-BJ-D2M - Dodatek č. 1 - méněpráce SO 02

Místo: Bohuslavice u Kyjova, Čeložnice

Datum: 17.07.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. LS Buchlovice

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-41 705,70

HSV - Práce a dodávky HSV

-41 705,70

5 - Komunikace pozemní

-41 705,70

1	K	RP92	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm pro případné rozšíření v obloucích	m2	-227,900	183,00	-41 705,70
---	---	------	--	----	----------	--------	------------

Položka vychází z pol. 564871116

"Rozšíření vlevo"

"km 3,742-3,754" 6 6,000

"km 3,851-3,900" 24,5 24,500

"km 4,150-4,180" 15 15,000

"km 4,223-4,372" 89,4 89,400

"km 4,620-4,660" 20 20,000

"km 5,010-5,105" 47,5 47,500

"Rozšíření vpravo"

"km 4,139-4,180" 20,5 20,500

"km 4,912-5,010 " 49 49,000

Mezisoučet 271,900


"minus původní návrh rozšíření v PD" -499,8 -499,800

Mezisoučet -499,800

Součet -227,900

VP - Vícepráce

0,00

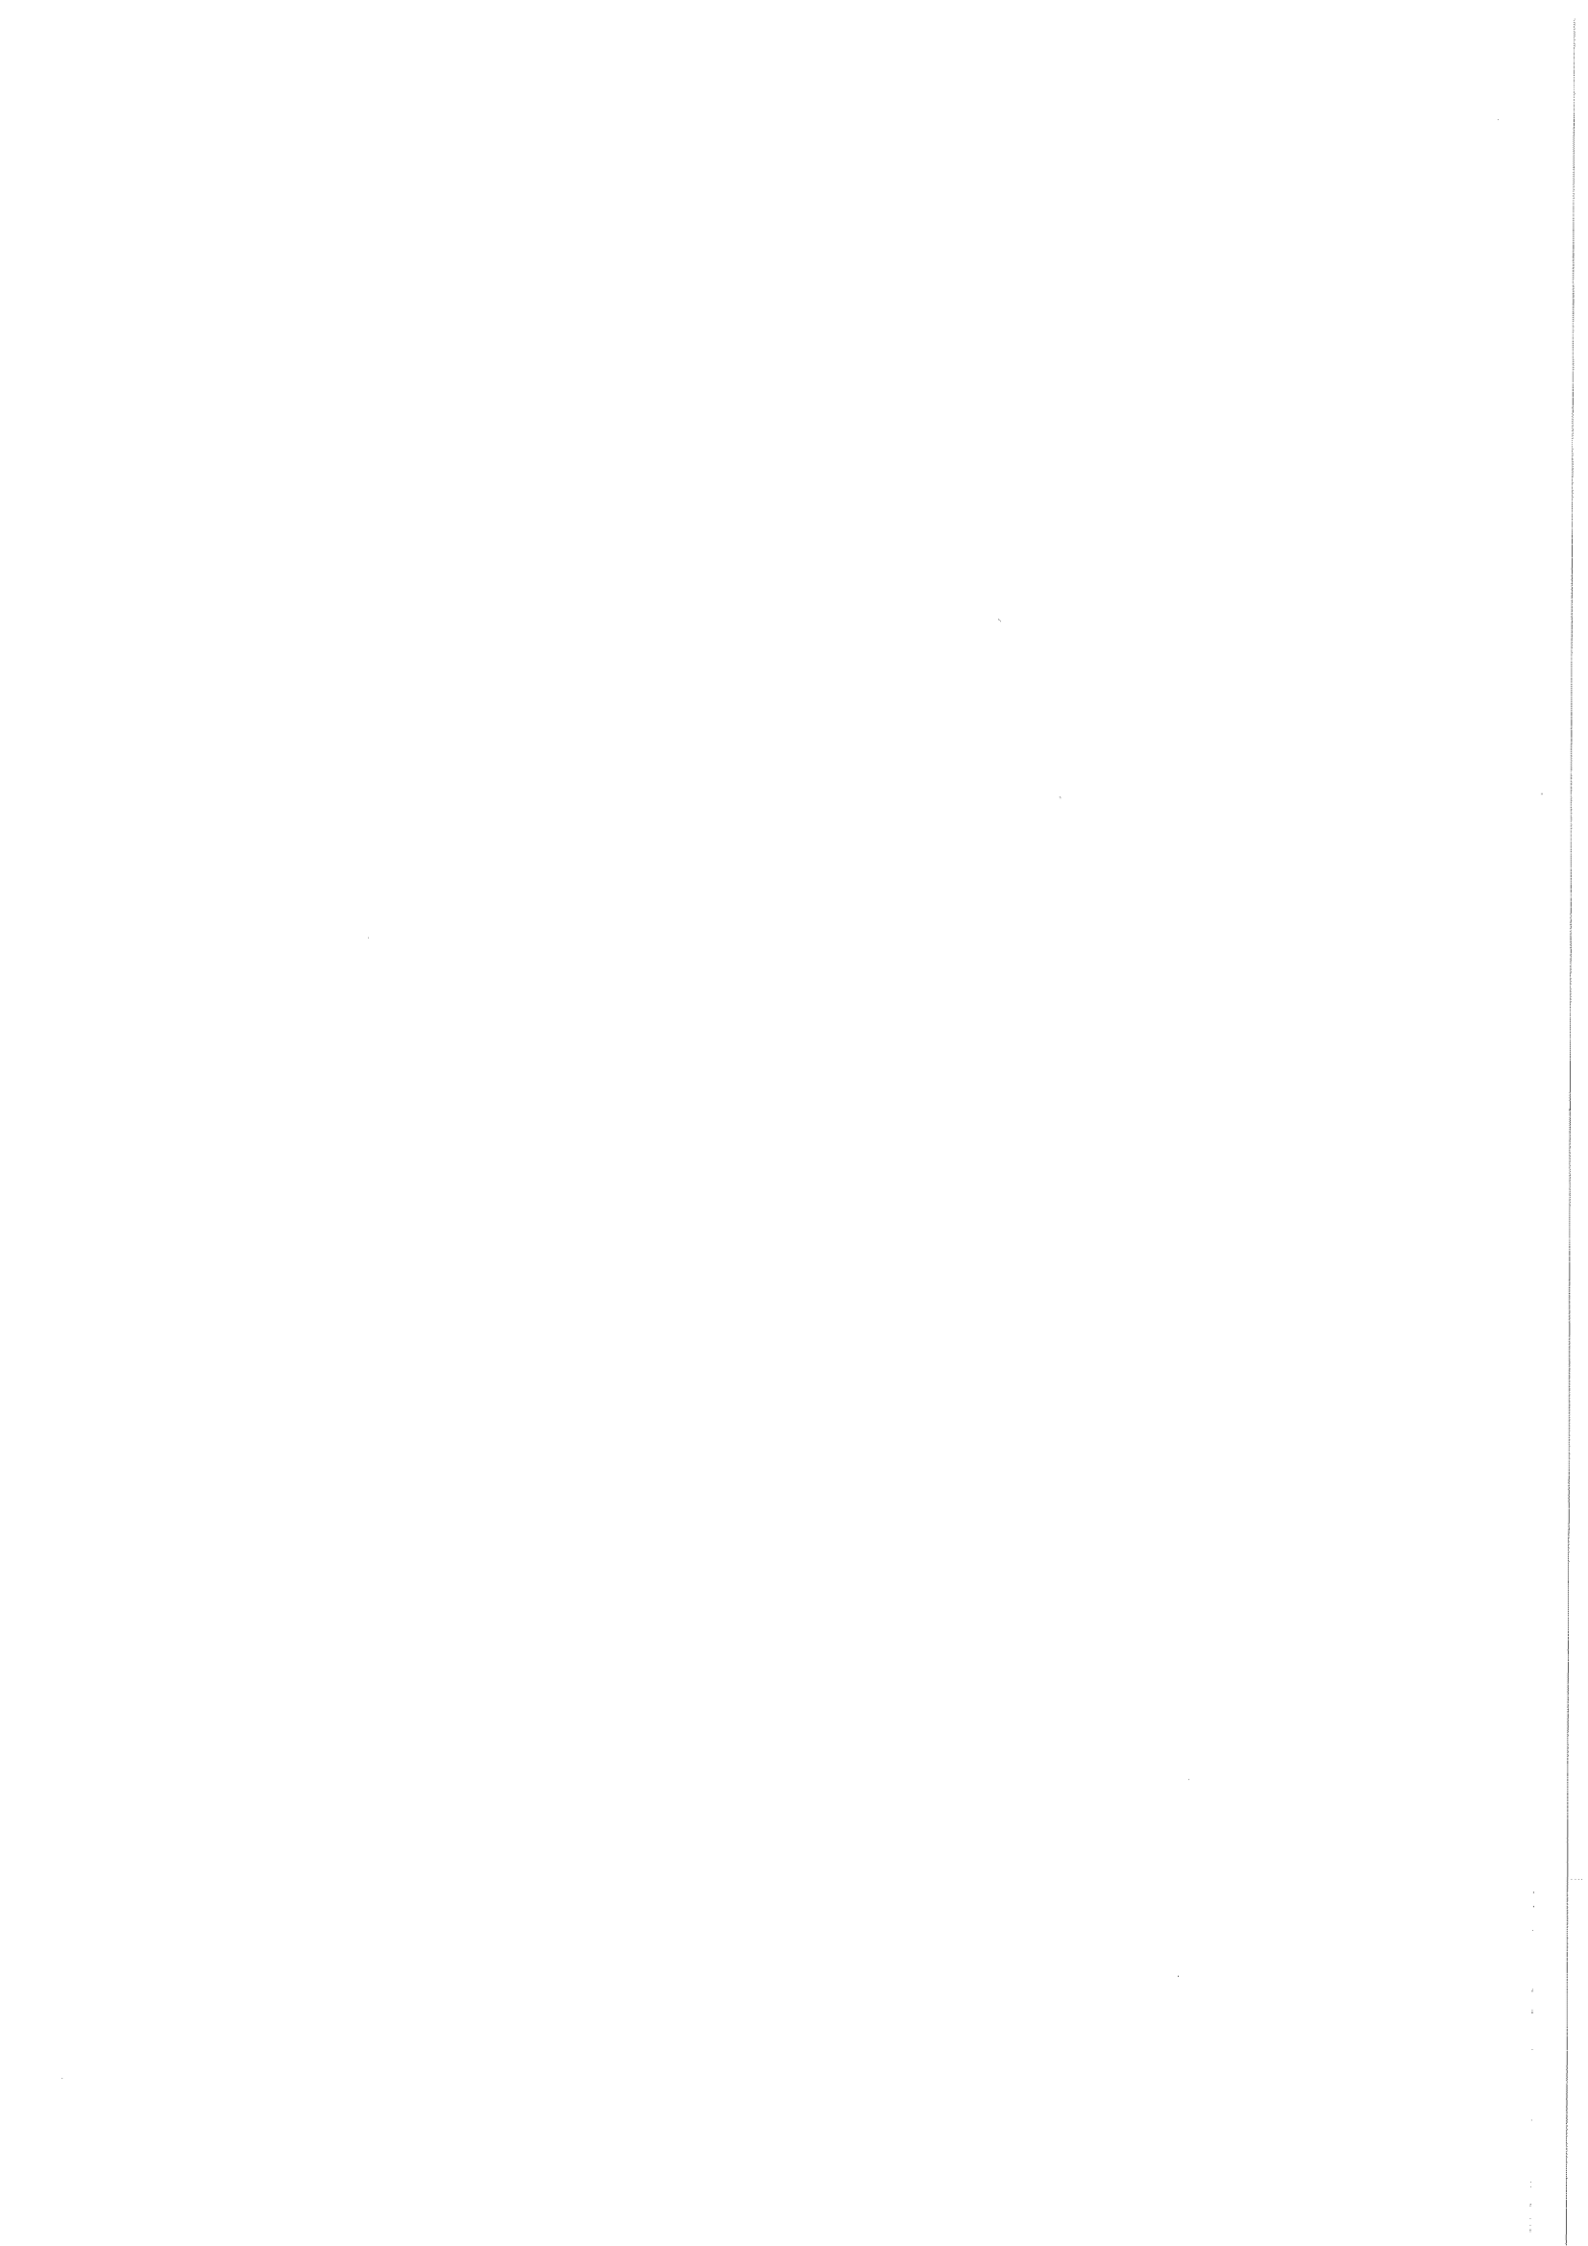

ROZPOČET

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Bohuslavická - km 1,687 - 7,583

Objekt: 16026-14/24XC-BJ-D3V - Dodatek č. 1 - vícepráce SO 03

Místo: Bohuslavice u Kyjova, Čeložnice

Datum: 17.07.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. LS Buchlovice

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

64 746,23

HSV - Práce a dodávky HSV

64 746,23

1 - Zemní práce

8 774,73

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,075	210,00	2 535,75
"TP - jímky"							
" TP24 km 7,480 " 12,90							
					12,900		
"TP"							
" TP22 km 6,972 " (8,5-6)*4,5							
					11,250		
Jámy				Součet (50%)			
					24,150		
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	2,415	10,00	24,15
Jámy*0,5*0,2							
					2,415		
				Součet			
					2,415		
3	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	12,075	305,00	3 682,88
Jámy*0,5							
					12,075		
4	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	2,415	10,00	24,15
Jámy*0,5*0,2							
					2,415		
5	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,475	56,00	810,60
Jámy							
					24,150		
Mezisoučet							
					24,150		
-Zásyp1							
					-9,675		
				Součet			
					14,475		
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,675	72,00	696,60
Zásyp1							
					9,675		
				Součet			
					9,675		
7	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	7,238	32,00	231,62
Jámy							
					24,150		
Mezisoučet							
					24,150		
-Zásyp1							
					-9,675		
				Součet (50%)			
					14,475		
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,238	10,00	72,38
Jámy							
					24,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		24,150		
			-Zásyp1		-9,675		
			Součet (50%)		14,475		
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	9,675	72,00	696,60

"Tp"

" TP22 km 6,972 " (8,5-6)*1,75 4,375

"Jímka"

" TP24 km 7,480 " 12,9-(2*2*1,9) 5,300

Zásyp1 Součet 9,675

4 - Vodorovné konstrukce

1 645,00

10	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	7,000	235,00	1 645,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

"TP"

" TP22 km 6,972 " (8,5-6)*1,2 3,000

"TP - jímka"

" TP24 km 7,480 " 4 4,000

Součet 7,000

5 - Komunikace pozemní

11 373,45

11	K	RP92	Podklad ze štěrkdrtě ŠD tl. 300 mm pro případné rozšíření v obloucích	m2	62,150	183,00	11 373,45
----	---	------	---	----	--------	--------	-----------

Položka vychází z pol. 564871116

"Rozšíření vlevo"

"km 6,412-6,826" 207 207,000

"km 6,975-7,015" 20 20,000

"Rozšíření vpravo"

"km 6,421-6,493" 36 36,000

"km 7,120-7,210" 45 45,000

"km 7,228-7,416" 94 94,000

"km 7,443-7,583" 70 70,000

Mezisoučet 472,000

"minus původní návrh rozšíření v PD" -409,85 -409,850

Mezisoučet -409,850

Součet 62,150

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 773,60

12	K	RP94	Vtaková jímka z lomového kamene propustku z trub do DN 800	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
----	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------

Položka vychází z pol. 919413111, je zde navýšené množství betonu pro základy (dle výkresu v PD).

" TP24 km 7,480 " 1 1,000

Součet 1,000

13	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	2,000	1 414,00	2 828,00
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

"Pouze znovuosazení - trouby z TP22"

" TP23 km 7,308 " 2 2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					2,000		
14	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	2,500	500,00	1 250,00
" TP22 km 6,972 " (8,5-6)					2,500		
Součet					2,500		
15	M	562411130	trouba 8 kPA d = 600 mm	m	2,500	3 500,00	8 750,00
trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou							
16	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,525	2 112,00	3 220,80
"Tp"							
" TP22 km 6,972 " (8,5-6)*0,61					1,525		
Součet					1,525		
17	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,002	19 500,00	39,00
"TP"							
" TP22 km 6,972 " (8,5-6)*1,2*0,79/1000					0,002		
Součet					0,002		
18	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva	m3	7,740	670,00	5 185,80
"TP"							
" TP22 km 6,972 " (8,5-6)*1,72					4,300		
" TP23 km 7,308 " 2*1,72					3,440		
Součet					7,740		
19	K	RP96	Bourání trubního propustku do DN 800	kpl	3,000	1 500,00	4 500,00
"TP (m)"							
" TP23 km 7,308 " 2					2,000		
Mezisoučet					2,000		
"Jímky"							
" TP24 km 7,480 " 1					1,000		
Mezisoučet					1,000		
Součet					3,000		
20	K	RP98	Likvidace vybouraných hmot v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace s vybouranými hmotami a poplatky za uložení sutě na skládku.	kus	2,000	500,00	1 000,00
"TP (m)"							
" TP23 km 7,308 " 2					2,000		
Mezisoučet					2,000		
"Jímky"							
" TP24 km 7,480 " 1					1,000		
Mezisoučet					1,000		
Součet					3,000		
2					2,000		
Součet					2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	36,858	28,00	1 032,02
22	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	36,858	4,00	147,43

VP - Vícepráce

0,00
