



Název zakázky : Výstupní-TTV

ZL č.1

Adam Hořejší

18.09.2024

Stanislav Jokiel

11.10.2024

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : TTV-změna způsobu založení

1) VPC/MNP-viz rozdílový výkaz výměr od projektantů stavby


PŘÍČINA / DŮVOD : Na základě zjištěných skutečností a kolizí stavby se stávajícími inž.sítěmi-ČEZ Distribuce, VO a CETIN muselo dojít u základů TTV č. 88-97 ke změně způsobů založení TTV z kopaných ŽB základů na velkoprofilové piloty, na kterých bude TTV č. 88-97 založeno. Na základě těchto skutečností zpracovali projektanti podklad a rozdílový výkaz výměr, který zhotovíte nacení a předloží v rámci Dodatku č. 1 investorovi k odsouhlasení.

Tyto práce mají vliv na cenu a termín díla. Prodloužení termínu realizace díla o 60 dní.

POPIS / SCHEMA :

Příloha :

- 1) rozpočet k ZL č.1
2) PD k ZL č.1-změna způsobu založení

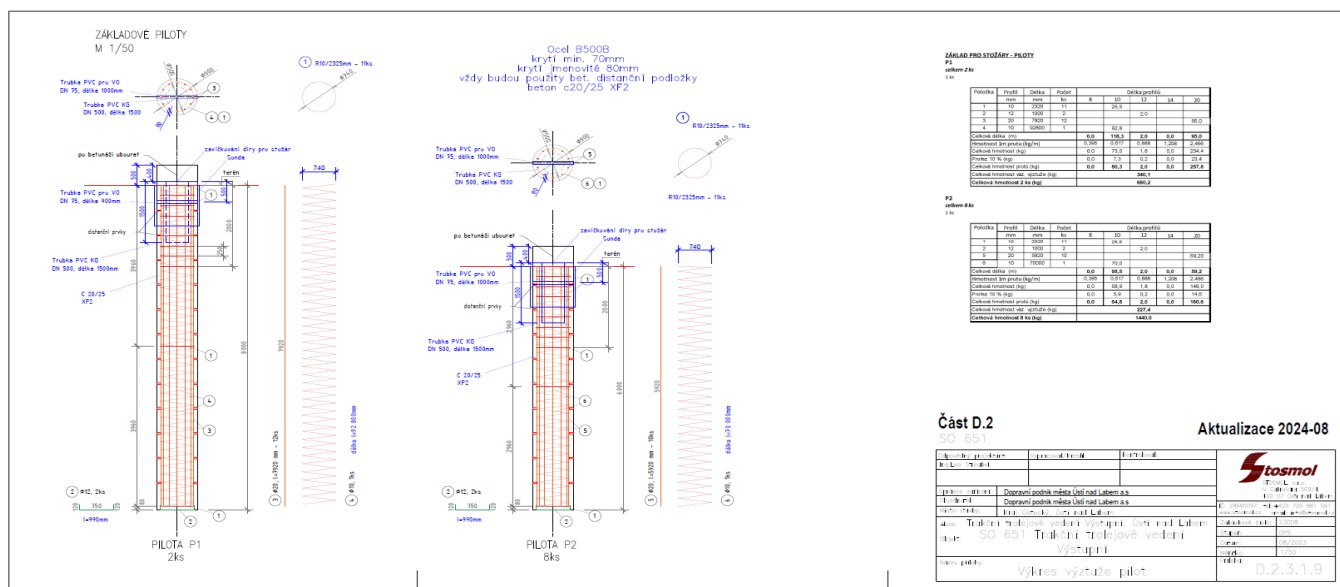

Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a budou mít vliv na cenu a termín dokončení díla o 60 dní.
Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :	Adam Hořejší Stavbyvedoucí	Odsouhlasil :	Karel Lank Technický dozor investora
---------------------	--------------------------------------	----------------------	--
