



VODÁRNY Kladno – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„ČOV Kladno – Dubí, rekonstrukce I. etapa“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-624/23-D4
Číslo zakázky: 21400123
Číslo smlouvy u zhotovitele: 1-01-23-001-KCAH

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
Tel. 312 812 200, e-mail: josef.zivnustek@vkm.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Ing. Aleš Beran, manažer útvaru investic
Tel.: 702 093 818, e-mail: ales.beran@vkm.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno

Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **STRABAG Water s.r.o.**
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 340448
IČO: 01706446
DIČ: CZ01706446
Zastoupený: Ing. Jindřich Tautman, jednatel
Ing. Přemysl Neumajer, jednatel

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Přemysl Neumajer, obchodní vedoucí oblasti

Zmocněnec pro technická jednání: Ing. Pavel Kužela, technický vedoucí oblasti

Ing. Pavel Pavlů, vedoucí provozní jednotky

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 107-4955310237/0100

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 8/2024**, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	96 659 770,26 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	1 376 142,60 Kč
Změna ceny dodatkem č. 2	3 867 403,75 Kč
Změna ceny dodatkem č. 3	2 854 792,85 Kč
Změna ceny dodatkem č. 4	- 43 290,24 Kč
Celková cena bez DPH	104 714 819,22 Kč
DPH 21 %	21 990 112,03 Kč
Cena celkem včetně DPH	126 704 931,25 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-624/23 (**ČOV Kladno – Dubí, rekonstrukce I. etapy**), uzavřené dne 25.10.2023 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. R-624/23 (**ČOV Kladno – Dubí, rekonstrukce I. etapy**), uzavřené dne 25.10.2023, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-624/23 (**ČOV Kladno – Dubí, rekonstrukce I. etapy**), uzavřené dne 25.10.2023.

3.4 Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **18. 02. 2025**


OBJEDNATEL




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

V Praze dne **18. 02. 2025**

ZHOTOVITEL



STRABAG Water s.r.o.
Ing. Jindřich Tautman, jednatel

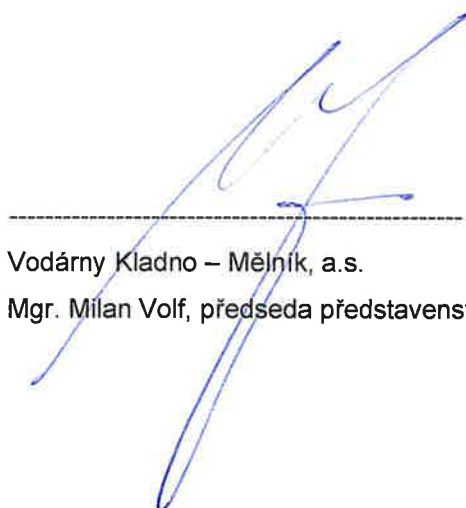

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Mgr. Milan Volf, předseda představenstva



STRABAG Water s.r.o.
Ing. Přemysl Neumajer, jednatel

VODÁRNY Kladno - Mělník, a. s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno
2

Stavba:		Smlouva o dílo:	
ČOV Kladno – Dubí, rekonstrukce I. etapa		Číslo objednavatele: R-624/23 Číslo stavby: 21 40 01 23	
ZMĚNOVÝ LIST		Č. ZL: 8/2025	
Investor:		Datum:	
Vodárny Kladno – Mělník, a.s.		20.1.2025	
Týká se (stavební objekt)	VON – Vedlejší rozpočtové náklady VRN4		

Změna:

Při závěrečné kontrole položkového rozpočtu Smlouvy o dílo byla zjištěna duplicita položky č.12 – VRN4 K042503000 Plán BOZP na staveništi. Tuto položku z rozpočtu Smlouvy o dílo zhotovitel nemá právo nárokovat, jelikož realizaci a kontrolu plánu BOZP pro naši společnost zajišťuje správce stavby a koordinátor BOZP, společnost TARGETON, s.r.o. Z tohoto důvodu zhotovitel odečítá tuto položku v celkové hodnotě:

-43 290,24 Kč

Celková cena: -43 290,24 Kč

ČOV Kladno Dubí - rekonstrukce I.etapa	cena bez DPH
Rozpočet stavby - SOD	96 659 770,26
Dodatek SOD č.1	
ZL č.1	-834 532,66
ZL č.2	493 713,39
ZL č.3	892 193,18
ZL č.4	824 768,69
Dodatek SOD č.2	
ZL č.5	1 949 958,58
ZL č.6	1 917 445,17
Dodatek SOD č.3	
změna termínu	do 28.2.2025
ZL č.7	2 854 792,85
Dodatek SOD č.4	
ZL č.8	-43 290,24
CELKEM	104 714 819,22

Procentuální zvýšení ceny	8,33%
----------------------------------	--------------



OHODNOCENÍ CENY	
Cena bez DPH:	-43 290,24
Cena slovy:	Mínus čtyřicet tři tisíc dvě stě devadesát korun českých a dvacet čtyři haléřů českých
Technický dozor stavby: TARGETON, s.r.o. Ing. Vojtěch Štorc Datum: 20.1.2025	Autorský dozor: D-PLUS, projektová a inženýrská, a.s. Ing. Zdeněk Danihelka Datum: 20.1.2025
Zhotovitel: STRABAG Water s.r.o. Ing. Pavel Pavlů Datum: 20.1.2025	Odsouhlasil: Vodárny Kladno – Mělník, a.s. Ing. Josef Živnůstek Datum: 20.1.2025

Stavba: ČOV Kladno Dubí - rekonstrukce, I.etapa - Rekapitulace ZL č.8

číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena
	Náklady z rozpočtů			
K042503000	VRN4 Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	-43 290,24
CELKEM BEZ DPH				-43 290,24

