

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 5	
Komu: INV MHMP			Datum: 29.11.2022	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 461 RDS Žluté lázně – úpravy rozvodů slaboproudu, CCTV		
na výkresy:		Přílohy 01,02		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL5 – SO 461 Žluté lázně – úpravy rozvodů slaboproudu, CCTV</u> V rámci zpracování RDS dochází k těmto navrhovaným změnám oproti dokumentaci PDPS (DVZ): – Jedná se o zkrácení zemní kabelové trasy propojení strukturované kabeláže (SSK) mezi vrátnicí a stávajícími rozvody SSK o 13m. Úprava kabelové trasy je patrná z výkresu situace – příloha č.02. – Nové místo napojení strukturované kabeláže na stávající datové rozvody areálu bude v rozvaděči, umístěném v objektu kancelář, napravo vedle stávající pěší vrátnice oproti původnímu místu napojení v buňce vlevo od vrátnice. – Zkrácení trasy a její zaústění do buňky kanceláře má dopad na výměru položek, které představují vyhloubení a přípravu kabelové rýhy vč. odvozu přebytečného výkopku, vlastní kabeláž (vč. optotrubky) a její uložení, měření, zásyp kabelové rýhy, obnovu povrchů.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Požadavkem Objednatele na základě požadavků nájemce a správce areálu Žlutých lázní. Jedná se o nepředvídanou změnu.				
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:		ZHOTOVITEL:	
D Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování návrhu na ocenění změny (NOZ). Neměly by být zřejmé změny (PoZ).				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 005	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 02.02.2023	
NOZ č. 005 navazuje na:	OZ č. 5	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL5 – SO 461 Žluté lázně – úpravy rozvodů slaboproudu, CCTV</u> <u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.</u> Cena stavebních prací Cena odpočty -23 205,37 Kč Cena přípočty 31,50 Kč Cena celkem -23 173,87 Kč DPH 21 % -4 866,51 Kč Cena včetně DPH -28 040,38 Kč Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): mínus dvacet tři tisíc jedno sto sedmdesát tři korun českých osmdesát sedm haléřů (bez DPH)		Dopad do HMG: NE		
ZHO STR Dati				

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 005	
PoZ vystavil:		Datum: 28.05.2024	
PoZ č. 005 na NOZ č. 005		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí -23 173,87 Kč bez DPH tj. -0,00 %, z toho: - odpočty činí: -23 205,37 Kč bez DPH tj. -0,00 % - přípočty činí: 31,50 Kč bez DPH tj. 0,00 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): -23 173,87 Kč	Provedení změny: 02/2023–04/2023		
Nová cena díla (bez DPH): 1 188 443 160,73 Kč	Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 31,50 Kč		
Důvod ke změně:			
Požadavkem Objednatele na základě požadavků nájemce a správce areálu Žlutých lázní.			
Jedná se o nepředvídanou změnu.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP Ing. Petr Hankovec Vedoucí oddělení	Podpis zmocněnce Příkazníka Ing. Tomáš Krupka Společnost INE/PUNG	Podpis zmocněnce Zhotovitele Ing. Robert Brož, Ph.D. Sdružení „TBR + FIRESTA STRAŽNÍK – DVOŘECKÝ
Da			

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 9	
Komu: INV MHMP			Datum: 02.12.2022	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 415 RDS Žluté lázně – úprava rozvodů NN a VO		
na výkresy:		Přílohy 01,03		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL9 – SO 415 Žluté lázně – úprava rozvodů NN a VO</u> V rámci zpracování RDS dochází k těmto navrhovaným změnám oproti dokumentaci PDPS (DVZ): Tato změna je vyvolána změnou SO 003 Změna „a“, na základě které byly do dokumentace doplněny přípojky elektro silnoprůd pro mobilní dvojdomky a silnoprůdové rozvody v elektro ve dvojdomcích. Důvodem změny u všech níže uvedených položek soupisu prací a zavedení nových položek do soupisu prací jsou dodatečné požadavky nájemce a správce areálu Žlutých lázní vzhledem k přemístění stávajících přístřešků mobiliáře z místa určených pro nový vjezd a vrátnici do areálu na jiné místo uvnitř areálu.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Požadavkem Objednatel na základě požadavků nájemce a správce areálu Žlutých lázní. Jedná se o nepředvídanou změnu.				
PŘÍKAZNÍK:		AUTORSKÝ DOZOR:		ZHOTOVITEL:
				
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 009	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 02.02.2023	
NOZ č. 009 navazuje na:	OZ č. 009	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL9 – SO 415 Žluté lázně – úprava rozvodů NN a VO</u> V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy. Cena stavebních prací Cena odpočty 0,00 Kč Cena přípočty 435 503,38 Kč Cena celkem 435 503,38 Kč DPH 21 % 91 455,71 Kč Cena včetně DPH 526 959,09 Kč Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Přehled nových položek				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): čtyři sta třicet pět tisíc pět set tři korun českých třicet osm haléřů _____ (bez DPH)		Dopad do HMG: ANO		
ZHOTOVITEL: 11	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:		
Datum: 20.3.2024	Datum:	Datum: 20.3.2024		

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 009	
PoZ vystavil:		Datum: 28.05.2024	
PoZ č. 009 na NOZ č. 009		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 435 503,38 Kč bez DPH tj. 0,04 %, z toho: - odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 435 503,38 Kč bez DPH tj. 0,04 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací: viz F01, F02		Počet připojených výkresů: viz F01	
Změna ceny díla (bez DPH): 435 503,38 Kč		Provedení změny: 02/2023 – 05/2023	
Nová cena díla (bez DPH): 1 188 878 664,11 Kč		Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 435 503,38 Kč	
Důvod ke změně: Požadavkem Objednatele na základě požadavků nájemce a správce areálu Žlutých lázní.. Jedná se o nepředvídanou změnu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP Ing. Petr Hankovec	Podpis zmocněnce Příkazníka Ing. Tomáš Krupka Společnost	Podpis zmocněnce Zhotovitele Ing. Robert Brož, Ph.D. Sdružení „TBR + FIRESTA
Datu 			

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 20	
Komu: INV MHMP			Datum: 28.02.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu, Část 200.1 - Spodní stavba P2 a P3		
na výkresy:		Přílohy 01,03,04,05,07 a 09		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL 20 – SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu,</u> <u>Část 200.1 - Spodní stavba P2 a P3</u> - Posun základové spáry pilíře P3 o 1,0 m směrem nahoru, změna půdorysného tvaru základu tohoto pilíře P3 z důvodu úpravy řešení zajištění pažení této stavební jámy, má za následek zkrácení dříku pilíře P3 a tím pádem i snížení spotřeby betonu dříku pilíře P3. Upřesnění spotřeby betonářské výztuže základů a dříků pilířů P2, P3. Posun základové spáry pilíře P3 je předmětem Oznámení změny č. 18. - Úprava výměry podkladního betonu pod základy pilířů P2 a P3 z důvodu úpravy řešení pažených stavebních jam v rámci RDS částí 100.4 – Změna „a“ a 100.5, která je předmětem Oznámení změny č. 18. - Předchozí projektový stupeň PDPS (DVZ) byl vypracován v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění. V rámci DVZ byla spotřeba betonářské výztuže stanovena odborným odhadem, ve spotřebě 160 kg/m3 pro základ i dřík pilířů P2 a P3. V rámci RDS je proveden podrobný statický výpočet a rozkreslení výkresů výztuže základů i dříků spodní stavby do podrobností potřebných pro realizaci stavby. - Upřesnění spotřeby množství zeminy pro zpětné zásypy jam pro základy pilířů P2 a P3 z důvodu úpravy tvaru pažených jímek pro základy obou pilířů. - U pilíře P2 je část zpětného zásypu nově tvořena prostým betonem z důvodu nedostatku prostoru v upravené pažené jímce pro dostatečně zhutnění zpětného zásypu kolem samotného základu.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Zpracováním podrobného statického řešení v rámci RDS s ohledem na požadavky pasportu VK Smíchov a SK Zlíchov (TUBES, 10/2022), aktuálnímu stavu založení SK Zlíchov. - Zastiženými geologickými a hydrogeologickými podmínkami a následnou úpravou tvaru pažených stavebních jam a jejich zajištění (navazuje na Oznámení změny č. 18). - Podrobným statickým výpočtem ve stupni RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.				
PŘÍKAZNÍK:		AUTORSKÝ DOZOR:		ZHOTOVITEL:
S				
Datum				
Toto				
změn				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 020											
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 01.06.2023											
NOZ č. 020 navazuje na:	OZ č. 020	PZ č.												
Odesláno/ předáno:	osobně													
<u>ZL 20 – SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu,</u> <u>Část 200.1 - Spodní stavba P2 a P3</u>														
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.														
Cena stavebních prací <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>-618 560,37 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>306 245,82 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>-312 314,55 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>-65 586,06 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>-377 900,61 Kč</td> </tr> </table>					Cena odpočty	-618 560,37 Kč	Cena přípočty	306 245,82 Kč	Cena celkem	-312 314,55 Kč	DPH 21 %	-65 586,06 Kč	Cena včetně DPH	-377 900,61 Kč
Cena odpočty	-618 560,37 Kč													
Cena přípočty	306 245,82 Kč													
Cena celkem	-312 314,55 Kč													
DPH 21 %	-65 586,06 Kč													
Cena včetně DPH	-377 900,61 Kč													
Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Přehled nových položek														
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): mínus tři sta dvanáct tisíc tři sta čtrnáct korun českých padesát pět haléřů _____ (bez DPH)		Dopad do HMG: ANO												
ZH S STF Da														

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 020	
PoZ vystavil:		Datum: 28.05.2024	
PoZ č. 020 na NOZ č. 020		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí -312 314,55 Kč bez DPH tj. -0,03 %, z toho: - odpočty činí: -618 560,37 Kč bez DPH tj. -0,06 % - přípočty činí: 306 245,82 Kč bez DPH tj. 0,03 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): -312 314,55 Kč		Provedení změny: 02/2023–06/2023	
Nová cena díla (bez DPH): 1 188 566 349,56 Kč		Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 306 245,82 Kč	
Důvod ke změně: Zpracováním podrobného statického řešení v rámci RDS s ohledem na požadavky pasportu VK Smíchov a SK Zlíchov (TUBES, 10/2022), aktuálnímu stavu založení SK Zlíchov. Zastiženými geologickými a hydrogeologickými podmínkami a následnou úpravou tvaru pažených stavebních jam a jejich zajištění (navazuje na Oznámení změny č. 18). Podrobným statickým výpočtem ve stupni RDS. Jedná se o nepředvídanou změnu.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP Ing. Petr Hankovec	Podpis zmocněnce Příkazníka Ing. Tomáš Krupka Společnost INEPLING	Podpis zmocněnce Zhotovitele Ing. Robert Brož, Ph.D. Sdružení „TBR + FIRESTA STRABAG – DVORECKÝ
Da			

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 21	
Komu: INV MHMP			Datum: 14.02.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu, Část 200.2 - Základy opěr O1 a O7		
na výkresy:		Přílohy 01,02,05 a 07		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL21 – SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu,</u> <u>Část 200.2 - Základy opěr O1 a O7</u> V rámci zpracování RDS dochází k této změně oproti dokumentaci DVZ: - Upřesnění množství objemu výkopů pro výkopovou jámu základů opěry O7 z důvodu upřesnění řešení pažených stavebních jam v rámci RDS částí 100.4, které je předmětem Oznámení změny č. 1, a upřesnění úpravy podloží základové spáry pod dřík opěry O7. - Doplnění čerpacích jímek pro odčerpání vody z výkopové jámy opěry O7 z důvodu vyšší zastižené úrovně hladiny podzemní vody, která vystupuje nad základovou spáru opěry. - Doplnění čerpání vody z výkopové jámy opěry O7 z důvodu vyšší zastižené úrovně hladiny podzemní vody, která vystupuje nad základovou spáru opěry O7. - Upřesnění spotřeby množství betonu do základů opěr O1 a O7 z důvodu přesnějšího výpočtu spotřeby množství v RDS. - Upřesnění spotřeby betonářské výztuže do základů opěr. Předchozí projektový stupeň PDPS (DVZ) byl vypracován v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění. V rámci DVZ byla spotřeba betonářské výztuže základů opěr stanovena odborným odhadem ve spotřebě 140 kg/m3. V rámci RDS je proveden podrobný statický výpočet a rozkreslení výkresů výztuže do podrobností potřebných pro realizaci stavby. - Úprava a upřesnění výměry podkladního betonu pod základy opěr O1 a O7 z důvodu úpravy řešení pažených stavebních jam v rámci RDS částí 100.4, které jsou předmětem Oznámení změny č. 1 a sanace podloží pod základovou spárou opěry O7 na základě zastižené geologie. - Doplnění nové položky pro dočasné betonové svodidlo do soupisu prací na ochranu proti pádu podél výkopové jámy opěry O7 u účelové komunikace uvnitř areálu Žlutých lázní.				

Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:

- Aktuálně zastiženými geologickými a hydrogeologickými podmínkami v rámci provádění hlubinného založení mostu a zpracováním podrobného statického řešení v rámci RDS.
- S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.

PŘÍKAZNÍK:**AUTORSKÝ DOZOR:****ZHOTOVITEL:**

Sp

A +
MOST“**Datum:****Datum:****Datum:**

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). **Není tedy Potvrzením změny (PoZ).**

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 021	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 03.06.2023	
NOZ č. 021 navazuje na:	OZ č. 021	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL21 – SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu.</u> <u>Část 200.2 - Základy opěr O1 a O7</u>				
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.				
Cena stavebních prací				
Cena odpočty	-2 326 540,24 Kč			
Cena přípočty	1 141 679,74 Kč			
Cena celkem	-1 184 860,50 Kč			
DPH 21 %	-248 820,71 Kč			
Cena včetně DPH	-1 433 681,21 Kč			
Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Přehled nových položek - VP k pol.č. 87657				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): mínus jeden milion jedno sto osmdesát čtyři tisíc osm set šedesát korun českých padesát haléřů (bez DPH)		Dopad do HMG: ANO		

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 021	
PoZ vystavil:		Datum: 28.05.2024	
PoZ č. 021 na NOZ č. 021		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí -1 184 860,50 Kč bez DPH tj. -0,11 %, z toho: - odpočty činí: -2 326 540,24 Kč bez DPH tj. -0,22 % - přípočty činí: 1 141 679,74 Kč bez DPH tj. 0,11 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): -1 184 860,50 Kč		Provedení změny: 03/2023 – 03/2024	
Nová cena díla (bez DPH): 1 187 381 489,06 Kč		Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 75 918,06 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 1 065 761,68 Kč	
Důvod ke změně:			
Aktuálně zastíženými geologickými a hydrogeologickými podmínkami v rámci provádění hlubinného založení mostu a zpracováním podrobného statického řešení v rámci RDS. Jedná se o nepředvídanou změnu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP Ing. Petr Hankovec	Podpis zmocněnce Příkazníka Ing. Tomáš Krupka Společnost	Podpis zmocněnce Zhotovitele Ing. Robert Brož, Ph.D. Sdružení TBR + FIRESTA
Datum:	23.05.2023	28.05.2024	28.05.2024

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 21a	
Komu: INV MHMP			Datum: 10.03.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu, Část 200.2a - Základy opěr O1 a O7		
na výkresy:		Přílohy 01a, 02a a 04a		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL21 – SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu,</u> <u>Část 200.2a - Základy opěr O1 a O7</u> V rámci zpracování RDS dochází k této změně oproti dokumentaci DVZ: - V návaznosti na změnu rozsahu pažení O1, která je předmětem Oznámení změny č. 19, se upravuje i tvar výkopové jámy a tím i množství objemu výkopů. Výkopové práce proběhnou ve dvou etapách, protože jižní křídlo je v přímé kolizi s kabely PREDi a výkopovou jámu pro toto jižní křídlo bude možné začít provádět až po definitivní přeložce těchto kabelů mimo půdorys opěry O1. - Upřesnění spotřeby množství betonu do základů opěry O1 z důvodu nezbytné úpravy tvaru základu severního křídla opěry O1, které bylo v kolizi s pažicí stěnou. - Upřesnění spotřeby betonářské výztuže do základu severního křídla opěry O1 z důvodu úpravy tvaru základu - Úprava a upřesnění výměry podkladního betonu pod základy opěry O1 z důvodu úpravy řešení pažené stavební jámy v rámci RDS část 100.4 – Změna „b“. Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Existencí inženýrských sítí PREDi a nutností jejich zachování v průběhu provádění založení O1. - Zpracováním podrobného statického řešení v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.				


PŘÍKAZNÍK:

AUTORSKÝ DOZOR:


ZHOTOVITEL:

Da

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 021a	
NOZ zpracoval: Zhotovitel		Datum: 29.04.2024		
NOZ č. 021a navazuje na:	OZ č. 021a	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
ZL21a – SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu, Část 200.2a – Základy opěr O1 a O7				
Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 21a).				
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.				
Cena stavebních prací				
Cena odpočty	-6 369,71 Kč			
Cena přípočty	160 704,92 Kč			
Cena celkem	154 335,21 Kč			
DPH 21 %	32 410,39 Kč			
Cena včetně DPH	186 745,60 Kč			
Seznam příloh/Počet listů příloh:				
- Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Příloha č. 1 Rozložení prací na dopracování a úpravu dokumentace RDS (po ZL 021a) - Přehled nových položek - Formulář pro kalkulaci ceny pol. 02943e.R				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Dopad do HMG:		
jedno sto padesát čtyři tisíc tři sta třicet pět korun českých dvacet jeden haléřů		ANO		
(bez DPH)				
ZHOTOVITEL				
				
Ing. _____				
Sdružení				
STRABAG				
Datum:				

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 021a	
PoZ vystavil:		Datum: 28.05.2024	
PoZ č. 021a na NOZ č. 021a		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 154 335,21 Kč bez DPH tj. 0,01 %, z toho: - odpočty činí: -6 369,71 Kč bez DPH tj. -0,00 % - přípočty činí: 160 704,92 Kč bez DPH tj. 0,01 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 154 335,21 Kč	Provedení změny: 02/2023–06/2023		
Nová cena díla (bez DPH): 1 187 535 824,27 Kč	Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 160 704,92 Kč		
Důvod ke změně:			
Existence inženýrských sítí PREDi a nutností jejich zachování v průběhu provádění založení O 1. Zpracováním podrobného statického řešení v rámci RDS.			
Jedná se o nepředvídanou změnu.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP Ing. Petr Hankovec Vedoucí oddělení	Podpis zmocněnce Příkazníka Ing. Tomáš Krupka Společnost „JNE/BUNG –	Podpis zmocněnce Zhotovitele Ing. Robert Brož, Ph.D. Sdružení „TBR + FIRESTA STRABAG – DVORECKÝ
Datum			

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 22	
Komu: INV MHMP			Datum: 27.02.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu, Část 200.3 - Spodní stavba P6		
na výkresy:		Přílohy 01,03 a 05		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL22 – SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu,</u> <u>Část 200.3 - Spodní stavba P6</u> V rámci zpracování RDS dochází k následujícím změnám oproti dokumentaci DVZ: - Úprava tvaru základu z důvodu koordinace s navazujícími konstrukcemi (pobytové schodiště) a finálních úprav terénu. - Upřesnění spotřeby betonářské výztuže základu a dříku pilíře P6. Předchozí projektový stupeň PDPS (DVZ) byl vypracován v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění. V rámci DVZ byla spotřeba betonářské výztuže stanovena odborným odhadem, ve spotřebě 160 kg/m3 pro základ i dřík pilíře P6. V rámci RDS je proveden podrobný statický výpočet a rozkreslení výkresů výztuže základů i dříků spodní stavby do podrobností potřebných pro realizaci stavby. - Upřesnění výměry podkladního betonu a spotřeby množství zeminy pro zpětné zasypy jámy pro základ pilíře P6 z důvodu úpravy tvaru pažené jámky pro základ pilíře P6 Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Koordinací s navazujícími konstrukcemi (pobytové schodiště), finálním terénem a úpravou stavebních jam. - Zpracováním podrobného statického řešení v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.				
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL: 		
				
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování návrhu na ocenění změny (NOZ). Nemá tedy potvrzením změny (PoZ).				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 022	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 05.06.2023	
NOZ č. 022 navazuje na:	OZ č. 022	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL22 – SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu,</u> <u>Část 200.3 - Spodní stavba P6</u>				
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.				
Cena stavebních prací				
Cena odpočty	-242 288,71 Kč			
Cena přípočty	179 518,44 Kč			
Cena celkem	-62 770,27 Kč			
DPH 21 %	-13 181,76 Kč			
Cena včetně DPH	-75 952,03 Kč			
Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Přehled nových položek				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): mínus šedesát dva tisíc sedm set sedmdesát korun českých dvacet sedm haléřů _____ (bez DPH)		Dopad do HMG: ANO		
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:		
Datum: 3.4.2024		Datum:		Datum: 3.4.2024

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 022	
PoZ vystavil:		Datum: 28.05.2024	
PoZ č. 022 na NOZ č. 022		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí -62 770,27 Kč bez DPH tj. -0,01 %, z toho: - odpočty činí: -242 288,71 Kč bez DPH tj. -0,02 % - přípočty činí: 179 518,44 Kč bez DPH tj. 0,02 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): -62 770,27 Kč		Provedení změny: 02/2023–04/2023	
Nová cena díla (bez DPH): 1 187 473 054,00 Kč		Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 179 518,44 Kč	
Důvod ke změně:			
Koordinací s navazujícími konstrukcemi (pobytové schodiště), finálním terénem a úpravou stavebních jam a zpracováním podrobného statického řešení v rámci RDS. Jedná se o nepředvídanou změnu.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Příkazníka Ing. Tomáš Krupka	Podpis zmocněnce Zhotovitele Ing. Robert Brož, Ph.D.
Datum: 28.05.2024			

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 25	
Komu: INV MHMP			Datum: 22.03.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu, Část 200.8 - Záporová stěna za O1		
na výkresy:		Přílohy 01,02 a 05		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL25 – SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu,</u> <u>Část 200.8 - Záporová stěna za O1</u> V rámci zpracování RDS dochází k této změně oproti dokumentaci DVZ: - Byla upravena poloha záporové stěny v příčném směru tak, aby byla zajištěna dostatečná volná šířka pro provoz v ulici „Na Zlíchově“ a současně bylo možné se vyhnout stávajícím již realizovaným křižovatkovým kolejím v nájezdu na budovaný most. - Pro zajištění dostatečné volné šířky pro obousměrný provoz v ulici „Na Zlíchově“ mimo drážní těleso tramvajové trati (požadavek Silničního správního úřadu) po dokončení záporové stěny, musí být pro zajištění a splnění daného požadavku (šířka 6,5 m) rozebrán ostrůvek a posunut jeho obrubník na délce cca 21,0+1,5 m o cca 750 mm. Kvůli zajištění bezpečnosti silničního provozu je podél záporové stěny doplněno dočasné betonové svodidlo. - V návaznosti na změnu rozsahu pažení a tvarů výkopových jam pro základy opěry O1 a křídel a upřesněním postupu provádění v koordinaci s navazujícími objekty SO 202 a SO 221 se upravuje množství objemu výkopů připadajících k SO 201. Úprava množství bude zohledněna až po vyjasnění výkopových jam po nezbytném přeložení všech IS v zájmovém prostoru opěry O1 (kabely PREDi).				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Zajištění provozu v ulici Na Zlíchově dle požadavku Silničního správního úřadu a koordinaci s navazujícími objekty. - Zpracováním podrobného statického řešení v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.				
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:		
Datum:	Datum:	Datum:		
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 025	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 24.06.2023	
NOZ č. 025 navazuje na:	OZ č. 025	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL25 – SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu,</u> <u>Část 200.8 - Záporová stěna za O1</u> <u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.</u> Cena stavebních prací Cena odpočty -4 677 468,19 Kč Cena přípočty 704 620,03 Kč Cena celkem -3 972 848,16 Kč DPH 21 % -834 298,11 Kč Cena včetně DPH -4 807 146,27 Kč Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Přehled nových položek Navrhovaná změna ceny díla (slovy): minus tři miliony devět set sedmdesát dva tisíc osm set čtyřicet osm korun českých šestnáct haléřů _____ (bez DPH) Dopad do HMG: ANO ZHOTOVITEL:  AUTORSKÝ DOZOR: PŘÍKAZNÍK:  Sd STRA Datum: 20.6.2023 Datum: Datum:				

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 025	
PoZ vystavil:		Datum: 14.06.2024	
PoZ č. 025 na NOZ č. 025		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí -3 972 848,16 Kč bez DPH tj. -0,37 %, z toho: - odpočty činí: -4 677 468,19 Kč bez DPH tj. -0,44 % - přípočty činí: 704 620,03 Kč bez DPH tj. 0,07 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): -3 972 848,16 Kč	Provedení změny: 01/2023 – 05/2023		
Nová cena díla (bez DPH): 1 183 500 205,84 Kč	Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 704 620,03 Kč		
Důvod ke změně:			
Zajištění provozu v ulici Na Zlíchově dle požadavku Silničního správního úřadu a koordinaci s navazujícími objekty. Zpracováním podrobného statického řešení v rámci RDS. Jedná se o nepředvídanou změnu.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Příkazníka Ing. Tomáš Krupka Společnost	Podpis zmocněnce Zhotovitele Ing. Robert Brož, Ph.D. Sdružení TBP + FIRESTA
Datum:			

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 26	
Komu: INV MHMP			Datum: 15.02.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 001 - Příprava území - levý břeh Vltavy Změna "a" - Zajištění objektu VK Smíchov		
na výkresy:		Přílohy 01a, 02a		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL26 – SO 001 - Příprava území - levý břeh Vltavy Změna "a" - Zajištění objektu VK Smíchov</u> Na základě výsledku pasportizace objektu VK Smíchov (11/2022) a následného Pokynu příkazníka č. 3 k provedení změny díla – Zajištění nestandardně založeného objektu VK Smíchov spočívá změna v: - Realizaci 2 ks ocelových rámu (R01, R02), které budou tvořit trvalé podepření vodorovných konstrukcí pod 1.NP objektu v této části. Součástí opatření je zajištění podkladních konstrukcí, zejména injektáž dutin pod stokou a navazujícími opěrnými křídly (pův. zajištěním svahu) a realizace nové základové patky pod rámem. - Opatření má minimalizovat rizika spojená s realizací prací na spodní stavbě Dvoreckého mostu. Jejich cílem není celková sanace objektu.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Nestandardním založením SZ rohu objektu VK Smíchov - Zpracováním podrobného statického řešení na základě Pokynu příkazníka č.3. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.				
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:		
Datum: 20.6.2023	Datum: 28.6.2023	Datum: 29.6.2023		
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 026											
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 29.04.2024											
NOZ č. 026 navazuje na:	OZ č. 026	PZ č.												
Odesláno/ předáno:	osobně													
ZL26 – SO 001 - Příprava území – levý břeh Vltavy Změna "a" - Zajištění objektu VK Smíchov Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 26) <u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.</u> Cena stavebních prací <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena připočty</td> <td>279 921,83 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>279 921,83 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>58 783,58 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>338 705,41 Kč</td> </tr> </table> Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Příloha č. 1 Rozložení prací na dopracování a úpravu dokumentace RDS (po ZL 026) - Příloha č. 2 Rozložení prací na vypracování dokumentace DSPS (po ZL 026) - Přehled nových položek - Formulář pro kalkulaci ceny pol. 029113.R, 02943a.R, 02944a.R - CN pro kalkulaci pol.č.30 (029113.R)					Cena odpočty	0,00 Kč	Cena připočty	279 921,83 Kč	Cena celkem	279 921,83 Kč	DPH 21 %	58 783,58 Kč	Cena včetně DPH	338 705,41 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč													
Cena připočty	279 921,83 Kč													
Cena celkem	279 921,83 Kč													
DPH 21 %	58 783,58 Kč													
Cena včetně DPH	338 705,41 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): dvě stě sedmdesát devět tisíc devět set dvacet jedna korun českých osmdesát tři haléřů (bez DPH)		Dopad do HMG: ANO												
ZHOTOVITEL	AUTORSKÝ DOZOR	PŘÍKAZNÍK												
ST														
Datum. 27. 4. 2024	Datum.	Datum. 27. 4. 2024												

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 026	
PoZ vystavil:		Datum: 14.06.2024	
PoZ č. 026 na NOZ č. 026		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 279 921,83 Kč bez DPH tj. 0,03 %, z toho: - odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 279 921,83 Kč bez DPH tj. 0,03 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 279 921,83 Kč	Provedení změny: 02/2023–03/2023		
Nová cena díla (bez DPH): 1 183 780 127,67 Kč	Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 279 921,83 Kč		
Důvod ke změně: Nestandardním založením SZ rohu objektu VK Smíchov Zpracováním podrobného statického řešení na základě pokynu Příkazníka č.3. Jedná se o nepředvídanou změnu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Objednatele	Podpis zmocněnce Objednatele	Podpis zmocněnce Příkazníka	Podpis zmocněnce Zhotovitele
Datum:			

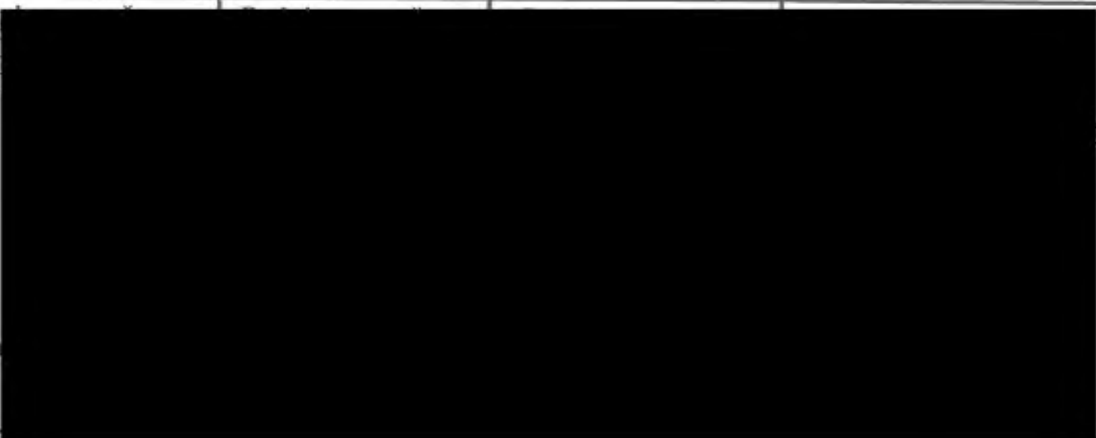
Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 27	
Komu: INV MHMP			Datum: 06.02.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 003 - Příprava území – pravý břeh Vltavy Změna "b" - Úprava vjezdu na stavbu		
na výkresy:		Přílohy 01, 02		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL27 – SO 003 - Příprava území - pravý břeh Vltavy Změna "b" - Úprava vjezdu na stavbu</u> Předmětem RDS SO 003 Změny „b“ jsou stavební úpravy spočívající v zajištění vjezdu do prostoru stavby a zařízení staveniště z ulice Podolské nábřeží i pro velké návěsy dovážející stavební materiál a úpravy pojezdových ploch uvnitř zařízení staveniště. Zmiňované stavební úpravy spočívají v rozšíření stávajícího vjezdu do areálu stavby a zpevnění v současné době nezpevněných a zatravněných ploch potřebných pro vjezd vozidel a staveništní dopravy, vč. úpravy účelové komunikace a plochy uvnitř areálu zařízení stavby. Důvodem změny jsou nové požadavky DP hl. m. Prahy na výstavbu tramvajové trati v ulici Podolské nábřeží v předstihu před výstavbou mostu oproti postupu prací předpokládanému v Zadávací dokumentaci. Dále též neumožnění přístupů na stavbu po trasách uvažovaných v DVZ z důvodu nedostupnosti uvažovaných pozemků.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Nové požadavky DP hl.m. Prahy - Neumožnění přístupů na stavbu dle Zadávací dokumentace z důvodu nedostupnosti pozemků. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.				
PŘÍKAZNÍK:		AUTORSKÝ DOZOR:		ZHOTOVITEL:
Datum: _____ Toto oznámení změny (OZ) je přílohou pro posouzení změny (PoZ).				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 027	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 25.06.2023	
NOZ č. 027 navazuje na:	OZ č. 027	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL27 – SO 003 - Příprava území - pravý břeh Vltavy</u> <u>Změna "b" - Úprava vjezdu na stavbu</u> V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.				
Cena stavebních prací				
Cena odpočty	0,00 Kč			
Cena přípočty	1 097 928,95 Kč			
Cena celkem	1 097 928,95 Kč			
DPH 21 %	230 565,08 Kč			
Cena včetně DPH	1 328 494,03 Kč			
Seznam příloh/Počet listů příloh:				
- Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Příloha č. 1 Rozložení prací na dopracování a úpravu dokumentace RDS - Přehled nových položek - Formulář pro kalkulaci ceny pol. 02943a.R				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):			Dopad do HMG:	
jeden milion devadesát sedm tisíc devět set dvacet osm korun českých devadesát pět haléřů			ANO	
(bez DPH)				
ZHOTOVITEL	AUTORSKÝ DOZOR	PŘÍKAZNÍK		
In Sdru STRAB				
Datum				

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 027	
PoZ vystavil:		Datum: 14.06.2024	
PoZ č. 027 na NOZ č. 027		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 1 097 928,95 Kč bez DPH tj. 0,10 %, z toho: - odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 1 097 928,95 Kč bez DPH tj. 0,10 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací: viz F01, F02		Počet připojených výkresů: viz F01	
Změna ceny díla (bez DPH): 1 097 928,95 Kč		Provedení změny: 11/2022 – 05/2023	
Nová cena díla (bez DPH): 1 184 878 056,62 Kč		Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 1 097 928,95 Kč	
Důvod ke změně: Nové požadavky DP hl. města Prahy. Neumožnění přístupu na stavbu dle Zadávací dokumentace z důvodu nedostupnosti pozemků. Jedná se o nepředvídanou změnu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Objednatele	Podpis zmocněnce Objednatele	Podpis zmocněnce Příkazníka	Podpis zmocněnce Zhotovitele
Datum:			

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 29	
Komu: INV MHMP			Datum: 10.03.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 181 – Dopravně-inženýrská opatření Část 01 – Levý břeh Etapa 2A, 2B a 3B		
na výkresy:		Přílohy Situace 2A, 2B a 3B, email prousek.tomas@ropid.cz ze dne 14.10.2022 a vnitřní sdělení MHMPXPJZY7WF		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL29 – SO 181 – Dopravně-inženýrská opatření</u> <u>Část 01 – Levý břeh</u> V rámci zpracování RDS dochází k následujícím změnám oproti dokumentaci DVZ: - Práce a činnosti, které vyplynuly z nového požadavku ROPID a odboru dopravy MHMP na vybudování zastávky Lihovar ve směru do centra s délkou nástupní hrany min 38,5 m. S ohledem na tento požadavek bylo nutné přesunout zastávku z prostoru před prodejnou sportovních potřeb InSPORTline do prostoru před čerpací stanicí SHELL. Tyto požadavky jsou nutné z pohledu zajištění dopravní obslužnosti oblasti v rámci koordinace staveb MHMP, TSK a dalších investorů v území. - Provedení zastávky musí umožňovat vozidlům BUS se k ní srovnat a musí umožnit bezbariérový nástup cestujících. - K zastávce musí být provedena dočasná pěší vazba přes ulici Strakonická, která si vyžádá i vybudování dočasných prvků SSZ a úpravu stávajících SSZ. Zároveň je pro bezpečné převedení chodců nutné rozšířit střední dělicí pruh a vybudování zpevněných ploch ve středním dělicím pruhu. - V této části objektu je vybudování zastávky a pěší vazby předmětem Etap 2A, 2B a 3B - V příloze je uveden příklad emailu s požadavky ROPID potvrzený vnitřním sdělením MHMP.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Novými požadavky ROPID a odboru dopravy MHMP. - Vypracováním podrobného návrhu RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.				
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:		
Datum: 15.7.2023	Datum: 14.7.2023	Datum: 17.7.2023		
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 029	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 02.08.2023	
NOZ č. 029 navazuje na:	OZ č. 029	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL29 – SO 181 - Dopravně-inženýrská opatření</u> <u>Část 01- levý břeh</u>				
<u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.</u>				
Cena stavebních prací				
Cena odpočty	0,00 Kč			
Cena přípočty	2 964 571,33 Kč			
Cena celkem	2 964 571,33 Kč			
DPH 21 %	622 559,98 Kč			
Cena včetně DPH	3 587 131,31 Kč			
Seznam příloh/Počet listů příloh:				
- Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Přehled nových položek - Formulář pro kalkulaci ceny pol. 02720.R, 02720a.R, 75O00.R, 75O00a.R, 91752.R - CN pro kalkulaci ceny pol. 02720.R, 02720a.R, 75O00.R, 75O00a.R, 91752.R				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):			Dopad do HMG:	
dva miliony devět set šedesát čtyři tisíc pět set sedmdesát jedna korun českých třicet tři haléřů			ANO	
(bez DPH)				

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 029
PoZ vystavil:		Datum: 14.06.2024
PoZ č. 029 na NOZ č. 029		na jiný dokument:
Odesláno/ předáno:		osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 2 964 571,33 Kč bez DPH tj. 0,28 %, z toho: - odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 2 964 571,33 Kč bez DPH tj. 0,28 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.		
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů: viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 2 964 571,33 Kč	Provedení změny: 10/2022–09/2024	
Nová cena díla (bez DPH): 1 187 842 627,95 Kč	Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 22 596,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 2 941 975,33 Kč	
Důvod ke změně:		
Novými požadavky ROPID a odboru dopravy MHMP. Vypracováním podrobného návrhu RDS. Jedná se o nepředvídanou změnu.		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poznámka:		
Podpis:		
Datum:		

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 30	
Komu: INV MHMP			Datum: 23.03.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 181 – Dopravně-inženýrská opatření Část 01 – Levý břeh Etapa 6 – Na Zlíchově		
na výkresy:		Přílohy – Situace Etapa 5 a 6		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL29 – SO 181 – Dopravně-inženýrská opatření</u> <u>Část 01 – Levý břeh</u> V rámci zpracování RDS dochází k následujícím změnám oproti dokumentaci DVZ: - Práce a činnosti, které vyplynuly z nového požadavku odboru dopravy MHMP na zachování obousměrného provozu v ulici Na Zlíchově v průběhu instalace ocelových zápor pro zajištění stavební jámy. - Při budování záporové stěny bylo z důvodu zachování obousměrného provozu nutné převést dopravu na tramvajovou trať včetně vybudování provizorních nájezdů a sjezdů z tramvajové trati. - Po vybudování záporové stěny, která slouží pro zajištění stavební jámy pro opěru OP1 objektu SO 201 a opěrné stěny SO 221, bylo nutné umístit v ulici Na Zlíchově betonová svodidla pro ochranu ocelových zápor. Tím došlo ke zúžení volné šířky komunikace a nutnosti úpravy středového dělicího ostrůvku a umístění přechodného dopravního značení a zařízení dle přiložené situace. - Tyto úpravy mají dopad do změny dalších stavebních objektů, které jsou řešeny v samostatných změnových listech. - Požadavek na zachování obousměrného provozu byl projednán na jednání dne 23.3.2023 na odboru PKD MHMP.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Novými požadavky odboru dopravy MHMP. - Vypracováním podrobného návrhu RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.				
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:		
Dá				
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 030											
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 22.04.2024											
NOZ č. 030 navazuje na:		OZ č. 030	PZ č.											
Odesláno/ předáno:	osobně													
ZL030 – SO 181 – Dopravně-inženýrská opatření Část 01 – Levý břeh – ul. Na Zlíchově Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 030). <u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.</u> Cena stavebních prací: <table><tr><td>Cena odpočty</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>Cena přípočty</td><td>323 612,60 Kč</td></tr><tr><td>Cena celkem</td><td>323 612,60 Kč</td></tr><tr><td>DPH 21 %</td><td>67 958,65 Kč</td></tr><tr><td>Cena včetně DPH</td><td>391 571,25 Kč</td></tr></table> Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Přehled nových položek - kalkulace pol.č. 02720b.R, 02720c.R, 02720d.R, 75O00b.R, - CN pro kalkulaci pol.č. 02720b.R, 02720c.R, 02720c.R, 75O00b.R,					Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	323 612,60 Kč	Cena celkem	323 612,60 Kč	DPH 21 %	67 958,65 Kč	Cena včetně DPH	391 571,25 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč													
Cena přípočty	323 612,60 Kč													
Cena celkem	323 612,60 Kč													
DPH 21 %	67 958,65 Kč													
Cena včetně DPH	391 571,25 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): tři sta dvacet tři tisíc šest set dvanáct korun českých šedesát haléřů (bez DPH)		Dopad do HMG: ANO												

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 030
PoZ vystavil:	Datum: 14.06.2024	
PoZ č. 030 na NOZ č. 030	na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:	osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 323 612,60 Kč bez DPH tj. 0,03 %, z toho: - odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 323 612,60 Kč bez DPH tj. 0,03 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.		
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů: viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 323 612,60 Kč	Provedení změny: 04/2023 – 05/2025	
Nová cena díla (bez DPH): 1 188 166 240,55 Kč	Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 323 612,6 Kč	
Důvod ke změně:		
Novými požadavky odboru dopravy MHMP. Vypracováním podrobného návrhu RDS. Jedná se o nepředvídanou změnu.		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poznámka:		

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 31	
Komu: INV MHMP			Datum: 05.01.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 181 – Dopravně-inženýrská opatření Část 02 – Pravý břeh Etapa 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 – Podolské nábřeží		
na výkresy:		Přílohy – Situace Etapa 2,3,4,5,6,7 a 8		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL31 – SO 181 – Dopravně-inženýrská opatření</u> <u>Část 02 – Pravý břeh – Výstavba TT Podolské nábřeží</u> V rámci zpracování RDS dochází k následujícím změnám oproti dokumentaci DVZ: - Práce a činnosti, které vyplynuly z nového požadavku DP hl. m. Prahy na výstavbu tramvajové trati v ulici Podolské nábřeží vč. zabudování výhybek a přípravy odbočení na novou trať na budovaný nový tramvajový most přes řeku Vltavu v předstihu před výstavbou mostu oproti postupu prací předpokládaném v Zadávací dokumentaci nejdéle do 05/2023. - V rámci SO 181 jsou v této dílčí části řešeny jednotlivé etapy dopravně-inženýrského opatření nutné pro zajištění vjezdu do prostoru stavby a zařízení staveniště z ulice Podolské nábřeží (Etapa 2), pro provedení přeložek inženýrských sítí a založení chrániček pro sítě budované v dalších etapách výstavby mostu (Etapy 3, 4, 5 a 6), pro výstavbu nové tramvajové trati vč. zbudování výhybek a přípravy odbočení na novou trať na budovaný nový tramvajový most přes Vltavu (Etapy 5 a 6) a pro vybudování provizorní úpravy povrchů zpevněných ploch komunikací a chodníků včetně provedení dopravně-inženýrského opatření pro následné provozování a využívání veřejným provozem do doby, než budou realizovány finální stavební úpravy spojené s dokončením stavby a navázáním ulice Podolské nábřeží na nový tramvajový most přes Vltavu (Etapa 7 a 8).				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Novými požadavky DP hl. m. Prahy na čas realizace (do 05/2023) úpravy TT Podolské nábřeží. - Zpracováním podrobného řešení etapizace TT v rámci RDS a vypracováním DIO. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.				
PŘÍKAZNÍK	AUTORSKÝ DOZOR	ZHOTOVITEL		
Datum				
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 031											
NOZ zpracoval: Zhotovitel		Datum: 29.05.2024												
NOZ č. 031 navazuje na:	OZ č. 031	PZ č.												
Odesláno/ předáno:	osobně													
ZL031 – SO 181 – Dopravně-inženýrská opatření Část 02 – Pravý břeh – Výstavba TT Podolské nábřeží Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 031). V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy. Cena stavebních prací: <table><tr><td>Cena odpočty</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>Cena přípočty</td><td>1 762 100,51 Kč</td></tr><tr><td>Cena celkem</td><td>1 762 100,51 Kč</td></tr><tr><td>DPH 21 %</td><td>370 041,11 Kč</td></tr><tr><td>Cena včetně DPH</td><td>2 132 141,62 Kč</td></tr></table> Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Přehled nových položek v ZL č.031 - kalkulace pol.č. 02720e.R, 02720f.R, 02720g.R, 02720h.R, 02720i.R, 02720j.R, 75O00c.R, - CN pro kalkulaci pol.č. 02720e.R, 02720f.R, 02720g.R, 02720h.R, 02720i.R, 02720j.r, 75O00c.R,					Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	1 762 100,51 Kč	Cena celkem	1 762 100,51 Kč	DPH 21 %	370 041,11 Kč	Cena včetně DPH	2 132 141,62 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč													
Cena přípočty	1 762 100,51 Kč													
Cena celkem	1 762 100,51 Kč													
DPH 21 %	370 041,11 Kč													
Cena včetně DPH	2 132 141,62 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): milion sedm set šedesát dva tisíc jedno sto korun českých padesát jeden haléřů (bez DPH)		Dopad do HMG: ANO												
ZH ST Ds														

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 031
PoZ vystavil:	Datum: 14.06.2024	
PoZ č. 031 na NOZ č. 031	na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:	osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 1 762 100,51 Kč bez DPH tj. 0,16 %, z toho: - odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 1 762 100,51 Kč bez DPH tj. 0,16 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.		
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů: viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 1 762 100,51 Kč	Provedení změny: 02/2023–06/2024	
Nová cena díla (bez DPH): 1 189 928 341,06 Kč	Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 1 762 100,51 Kč	
Důvod ke změně:		
Novými požadavky DP hl. města Prahy na čas realizace (do 05/2023) úpravy TT Podolské nábřeží. Zpracováním podrobného řešení etapizace TT v rámci RDS a vypracováním DIO. Jedná se o nepředvídanou změnu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poznámka:		
DOKUMENTACE ZAKÁZKY		

24.3.Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 32	
Komu: INV MHMP			Datum: 24.03.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 221 - Opěrné zdi - Hlubočepy, Část 100.1 - Záporové pažení - zeď jih		
na výkresy:		Přílohy 01 a 02		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL32 – SO 221 - Opěrné zdi - Hlubočepy,</u> <u>Část 100.1 - Záporové pažení - zeď jih</u> V rámci zpracování RDS dochází k této změně oproti dokumentaci DVZ: - Byla upravena poloha záporové stěny v příčném směru, tak aby byl zajištěn provoz v ulici „Na Zlíchově“ a současně aby pažení respektovalo novou polohu (půdorysnou i výškovou) jižní části zdi, která vyplynula z pokynu Objednatele č. 1/23 ke koordinaci se související akcí Lávka Zlíchov (Č.j.: MHMP 404143/2023 ze dne 24.02.2023). Poloha záporové stěny dále navazuje na SO 201 část 200.8 – Záporová stěna za O1. - V návaznosti na změnu pažení (viz předchozí bod) se upravuje plocha pažení, množství objemu výkopů, uložení na skládku a poplatky příslušející k SO 221. Kvůli zajištění bezpečnosti silničního provozu je podél záporové stěny doplněno dočasné betonové svodidlo. - Byly podrobně rozkresleny polohy a rozměry zápor, převázek a kotev na základě podrobných statických výpočtů a zohlednění kolizí se stávajícími sítěmi a odvodňovacími prvky ulice Na Zlíchově.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Nutností zachování a zajištění provozu v ulici Na Zlíchově dle požadavku Silničního správního úřadu a koordinací s navazujícími objekty. - Zpracováním podrobného statického řešení v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.				
změny (PoZ).				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 032	
NOZ zpracoval: Zhotovitel		Datum: 29.04.2024		
NOZ č. 032 navazuje na:	OZ č. 032	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
ZL32 – SO 221 - Opěrné zdi - Hlubočepy, Část 100.1 - Záporové pažení - zeď jih				
Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 032)				
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.				
Cena stavebních prací				
Cena odpočty 0,00 Kč				
Cena přípočty 122 124,31 Kč				
Cena celkem 122 124,31 Kč				
DPH 21 % 25 646,11 Kč				
Cena včetně DPH 147 770,42 Kč				
Seznam příloh/Počet listů příloh:				
- Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): jedno sto dvacet dva tisíc jedno sto dvacet čtyři korun českých třicet jeden haléřů (bez DPH)		Dopad do HMG: ANO		
ZHOC S STR Dat				

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 032	
PoZ vystavil:		Datum: 14.06.2024	
PoZ č. 032 na NOZ č. 032		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 122 124,31 Kč bez DPH tj. 0,01 %, z toho: - odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 122 124,31 Kč bez DPH tj. 0,01 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 122 124,31 Kč	Provedení změny: 07/2023–11/2023		
Nová cena díla (bez DPH): 1 190 050 465,37 Kč	Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 122 124,32 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč		
Důvod ke změně: Nutností zachování a zajištění provozu v ulici Na Zlíchově dle požadavku Silničního správního úřadu a koordinací s navazujícími objekty. Zpracováním podrobného statického řešení v rámci RDS. Jedná se o nepředvídanou změnu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Podpis zmocněnce Podpis zmocněnce Podpis zmocněnce			

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 33	
Komu: INV MHMP			Datum: 27.03.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 302 - Dešťová kanalizace - Podolí, Část 01 - Výstavba TT Podolské nábřeží		
na výkresy:		Přílohy 1,2 a 4		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL33 – SO 302 - Dešťová kanalizace - Podolí,</u> <u>Část 01 - Výstavba TT Podolské nábřeží</u> V rámci zpracování RDS dochází k této změně oproti dokumentaci DVZ: - Práce a činnosti, které vyplynuly z nového požadavku DP hl. m. Prahy na výstavbu tramvajové trati v ulici Podolské nábřeží vč. zabudování výhybek a přípravy odbočení na novou trať na budovaný nový tramvajový most přes řeku Vltavu v předstihu před výstavbou mostu oproti postupu prací předpokládaném v Zadávací dokumentaci nejdéle do 05/2023. - V rámci SO 302 je v této dílčí části RDS řešena úprava napojovacích míst pro dočasné připojení na stávající stokový systém a vyřešení detailů těchto napojení.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Novými požadavky DP hl. m. Prahy na čas realizace (do 05/2023) úpravy TT Podolské nábřeží. - Zpracováním podrobného řešení etapizace TT v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.				
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:		
Datum: Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování návrhu na účelovou změnu (NOZ). Neměly by být provedeny změny (PoZ).				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 033	
NOZ zpracoval: Zhotovitel		Datum: 29.04.2024		
NOZ č. 033 navazuje na:	OZ č. 033	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
ZL33 – SO 302 - Dešťová kanalizace - Podolí, Část 01 - Výstavba TT Podolské nábřeží				
Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 33)				
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.				
Cena stavebních prací:				
Cena odpočty	0,00 Kč			
Cena přípočty	91 031,77 Kč			
Cena celkem	91 031,77 Kč			
DPH 21 %	19 116,67 Kč			
Cena včetně DPH	110 148,44 Kč			
Seznam příloh/Počet listů příloh:				
- Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Příloha č. 1 Rozložení prací na dopracování a úpravu dokumentace RDS (po ZL 033) - Přehled nových položek - Formulář pro kalkulaci ceny pol.č.101 - 02943a.R				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Dopad do HMG:		
devadesát jedna tisíc třicet jedna korun českých sedmdesát sedm haléřů		ANO		
(bez DPH)				
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:		
D				

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 033	
PoZ vystavil:		Datum: 14.06.2024	
PoZ č. 033 na NOZ č. 033		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 91 031,77 Kč bez DPH tj. 0,01 %, z toho: - odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 91 031,77 Kč bez DPH tj. 0,01 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 91 031,77 Kč	Provedení změny: 04/2023		
Nová cena díla (bez DPH): 1 190 141 497,14 Kč	Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 91 031,77 Kč		
Důvod ke změně:			
Novými požadavky DP hl. m. Prahy na čas realizace (do 05/2023) úpravy TT Podolské nábřeží. Zpracováním podrobného řešení etapizace TT v rámci RDS. Jedná se o nepředvídanou změnu.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce
			

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 35	
Komu: INV MHMP			Datum: 28.03.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 314 - Vodovodní řad - Podolí, Část 01 - Výstavba TT Podolské nábřeží		
na výkresy:		Přílohy 01,02 a 03		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL35 – SO 314 - Vodovodní řad - Podolí,</u> <u>Část 01 - Výstavba TT Podolské nábřeží</u> V rámci zpracování RDS dochází k těmto změnám oproti dokumentaci DVZ: - Práce a činnosti, které vyplynuly z nového požadavku DP hl. m. Prahy na výstavbu tramvajové trati v ulici Podolské nábřeží vč. zabudování výhybek a přípravy odbočení na novou trať na budovaný nový tramvajový most přes řeku Vltavu v předstihu, před výstavbou mostu oproti postupu prací předpokládaném v Zadávací dokumentaci, nejdéle do 05/2023. - V rámci SO 314 je v této dílčí části RDS řešeno provedení tlakové zkoušky na budované části vodovodu a dále, na základě požadavku následného správce PVK v rámci projednání RDS dne 20.1.2023, je v úseku pod tramvajovou tratí doplněna chránička. Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Novými požadavky DP hl. m. Prahy na čas realizace (do 05/2023) úpravy TT Podolské nábřeží. - Zpracováním podrobného řešení etapizace TT v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.				
PŘÍKAZNÍK:		AUTORSKÝ DOZOR:		ZHOTOVITEL:
				
Ds Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 035											
NOZ zpracoval; Zhotovitel			Datum: 14.05.2024											
NOZ č. 035 navazuje na:	OZ č. 035	PZ č.												
Odesláno/ předáno:	osobně													
ZL35 – SO 314 - Vodovodní řad – Podolí, Část 01 - Výstavba TT Podolské nábřeží Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 35) V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy. Cena stavebních prací: <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>-1 767,77 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>83 131,86 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>81 364,09 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>17 086,46 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>98 450,55 Kč</td> </tr> </table> Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Příloha č. 1 Rozložení prací na dopracování a úpravu dokumentace RDS (po ZL 035) - kalkulace pol.č.101 - 02943n.R - Přehled nových položek v ZL 035					Cena odpočty	-1 767,77 Kč	Cena přípočty	83 131,86 Kč	Cena celkem	81 364,09 Kč	DPH 21 %	17 086,46 Kč	Cena včetně DPH	98 450,55 Kč
Cena odpočty	-1 767,77 Kč													
Cena přípočty	83 131,86 Kč													
Cena celkem	81 364,09 Kč													
DPH 21 %	17 086,46 Kč													
Cena včetně DPH	98 450,55 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): osmdesát jedna tisíc tři sta šedesát čtyři korun českých devět haléřů _____ (bez DPH)		Dopad do HMG: ANO												
ZHOTOVITEL	AUTORSKÝ ROZPOČET	PŘÍMÁ ZMĚNA												
Sdílí S Datum														

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 035	
PoZ vystavil:		Datum: 19.06.2024	
PoZ č. 035 na NOZ č. 035		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 81 364,09 Kč bez DPH tj. 0,01 %, z toho: - odpočty činí: -1 767,77 Kč bez DPH tj. -0,00 % - přípočty činí: 83 131,86 Kč bez DPH tj. 0,01 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 81 364,09 Kč	Provedení změny: 04/2023		
Nová cena díla (bez DPH): 1 190 222 861,23 Kč	Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 83 131,86 Kč		
Důvod ke změně:			
Novými požadavky DP hl. m. Prahy na čas realizace (do 05/2023) úpravy TT Podolské nábřeží. Zpracováním podrobného řešení etapizace TT v rámci RDS. Jedná se o nepředvídanou změnu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Objednatele	Podpis zmocněnce Objednatele	Podpis zmocněnce Příkazníka	Podpis zmocněnce Zhotovitele
Datum:			

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 54	
Komu: INV MHMP			Datum: 01.02.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu, Změna RDS část 100.3 - Změna technického řešení jímek P4 a P5		
na výkresy:		Změna „a“ RDS SO 201, část 100.3		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		

ZL54 – SO 201 Tramvajový most přes Vltavu

Změna RDS část 100.3 - Změna technického řešení jímek P4 a P5

Předmětem této Změny jsou práce na RDS spojené se změnou celkového technického řešení zajištění těsněných štětovnicových jímek pro pilíře P4 a P5 v korytě řeky Vltavy na základě realizovaných beranících pokusů pro instalaci štětovnic jímek, zkušeností a poznatků z vrtání pilot pro založení pilířů P4 a P5. Vlastní realizace těchto stavebních prací je předmětem **ZL 16**. Předmětem tohoto ZL je též spolupráce při návrhu a vyhodnocení doplňkového geologického průzkumu. Vlastní práce tohoto průzkumu jsou předmětem **ZL 17**.

V rámci změny technického řešení se pro jímky obou pilířů P4 a P5 mění v DVZ navržená dvouplášťová těsněná jímka na jímku jednoplášťovou, pro kterou budou samotné štětovnice realizovány technologií beranění do předem provedených předvrtů vyplněných jílocementovou směsí tvořící následně těsnění pat jímek.

Podrobné zdůvodnění víceprací je popsán níže:

Projektant RDS vypracoval v období 09-11/2022 koncept RDS pro štětovnicové jímky. **Koncept byl odevzdán k připomínkám TDI 11.12.2023.** Koncept RDS byl vypracován v souladu s DVZ, předmětem bylo především zapracování konkrétního použitého typu štětovnice, tedy přesné zkonstruování tvaru (dispozice) jímky, včetně vnitřních rozpěr (rozmístění do poloh dle návrhu skruže) a statické prověření. Již při realizaci beranícího pokusu dne 30. 11. 2022 se objevili pochybnosti o shodě geologické stavby podloží s předpoklady DVZ. Z důvodů podrobně popsanych v souvisejících vyjádřeních projektanta bylo rozhodnuto o změně návrhu štětovnicových jímek – nezbytnost jejich zahloubení patami do skalního podkladu s využitím jiné technologie – realizace jednoplášťové jímky s těsněnými zámky v předvrtech vyplněných jílocementovou suspenzí namísto dvouplášťové jímky s těsněním mezi pláště zaražených do předvrtů bez těsnění.

Další problémy a pochybnosti o shodě geologické skladby podloží s předpoklady DVZ se plně rozvinuly při vrtání pilot pro základ pilíře P4 dne 23. 1. 2023, kde se nedařilo dovtát pilotu na patřičnou hloubku navrženou v RDS dle podkladu geologické skladby podloží z DVZ.

Po problémech s realizací prvních 2 ks pilot pilíře P4 bylo na jednání dne 30. 1. 2023 rozhodnuto o nutnosti provést doplňkový IGP na pilíři P4. **Zhotovitel obdržel pokyn k provedení průzkumu dne 2. 2. 2023.** Projektant RDS spolupracoval na návrhu tohoto doplňkového průzkumu a následně na interpretaci

výsledků. Nové skutečnosti z doplňkového IGP musely pak být opět zohledněny ve výpočtu, jak pro úpravu návrhu pro založení pilíře P4, tak i pro návrh způsobu pažení a zajištění stavební jámy v korytě řeky Vltavy u pilířů P4 a P5.

Dne 22. 3. 2023 obdržel zhotovitel pokyn k vyhotovení RDS a provedení změny technologického řešení jímek pilířů P4 a P5.

V rámci RDS bylo nutné kompletně přepracovat skladbu štětovnic (pro jednopláštovou jámku byl použit jiný typ) i přeřešit detaily napojení. Což v důsledku znamenalo též upravit dispozici a detaily rozpěrných rámců. Dále bylo nutno kompletně přepracovat veškeré statické výpočty od předběžného po podrobné dimenzování jednotlivých prvků.

Upravené technické řešení bylo představeno na výrobním výboru dne 12.04.2023. Na žádost Státní plavební správy ze dne 13.04.2023 bylo do návrhu doplněno opeření jímek.

V průběhu prací na návrhu byl též na žádost objednatele paralelně řešen rozdílový soupis prací (podklad pro návrh ZBV). Vzhledem k výše zmíněným přibývajícím novým skutečnostem musel být rozdílový soupis prací několikrát přepracován.

Po zapracování připomínek z tohoto výrobního výboru a doplnění opeření byl vydán koncept jako změna „a“ RDS části 100.3 SO 201.

Po obdržení a zapracování připomínek TD byl 31.05. vydán čistopis změny „a“ RDS části 100.3. Tento čistopis není předmětem víceprací, neboť nebyl vydán čistopis původní RDS.

Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:

Aktuálně zastíženými geologickými a hydrogeologickými podmínkami v rámci provádění hlubinného založení mostu v korytě řeky Vltavy.

PŘÍKAZNÍK:

AUTORSKÝ DOZOR:

ZHOTOVITEL:

Sp

Datum

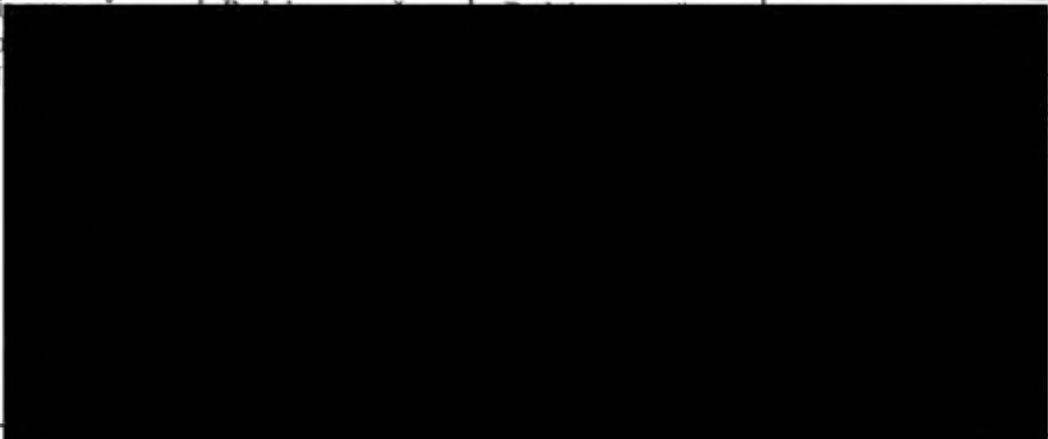
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). **Není tedy Potvrzením změny (PoZ).**

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 054	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 03.04.2024	
NOZ č. 054 navazuje na:		OZ č. 054	PZ č.	
Odesláno/ předáno:		osobně		
<u>ZL54 – SO 201 Tramvajový most přes Vltavu</u> <u>Změna RDS část 100.3 - Změna technického řešení jímek P4 a P5</u> Předmětem této Změny jsou vícepráce na RDS spojené se změnou celkového technického řešení zajištění těsněných štětovnicových jímek pro pilíře P4 a P5 v korytě řeky Vltavy na základě realizovaných beranících pokusů pro instalaci štětovnic jímek, zkušeností a poznatků z vrtání pilot pro založení pilířů P4 a P5. Vlastní realizace těchto stavebních prací je předmětem ZL 16. Předmětem tohoto ZL je též spolupráce při návrhu a vyhodnocení doplňkového geologického průzkumu. Vlastní práce tohoto průzkumu jsou předmětem ZL 17. Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 54). <u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.</u> Cena stavebních prací Cena odpočty -0,00 Kč Cena přípočty 1 683 600,00 Kč Cena celkem 1 683 600,00 Kč DPH 21 % 353 556,00 Kč Cena včetně DPH 2 037 156,00 Kč Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Příloha č. 1 Rozložení prací na dopracování a úpravu dokumentace RDS - Přehled nových položek - Formulář pro kalkulaci ceny Zhotovitele pol. 02943c.R + Přehled projekčních výkonů – změna řešení jímek - Ocenění stavebních prací, které jsou předmětem projekčních prací - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) + formulář NOZ č.16 - Posouzení vícenákladů na rev. RDS SO 201, část 100.3 _Změna technického řešení jímek P4 a P5, zpracované spol. Stavebně investorský servis s.r.o. ze dne 12.04.2024				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Jeden milion šest set osmdesát tři tisíc šest set korun českých _____ (bez DPH)		Dopad do HMG: ANO, zpracováno v Dodatku č. 3 SOD		
ZH ST Da				

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 054	
PoZ vystavil:		Datum: 19.06.2024	
PoZ č. 054 na NOZ č. 054		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 1 683 600,00 Kč bez DPH tj. 0,16 %, z toho: - odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 % - připočty činí: 1 683 600,00 Kč bez DPH tj. 0,16 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 1 683 600,00 Kč	Provedení změny: 04/2023		
Nová cena díla (bez DPH): 1 191 906 461,23 Kč	Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 1 683 600,00 Kč		
Důvod ke změně: Aktuálně zastíženými geologickými a hydrogeologickými podmínkami v rámci provádění hlubinného založení mostu v korytě řeky Vltavy. Dopracováním podrobného statického řešení v rámci RDS. Jedná se o nepředvídanou změnu.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Objednatel	Podpis zmocněnce Objednatel	Podpis zmocněnce Objednatel	Podpis zmocněnce Objednatel
Datum:			

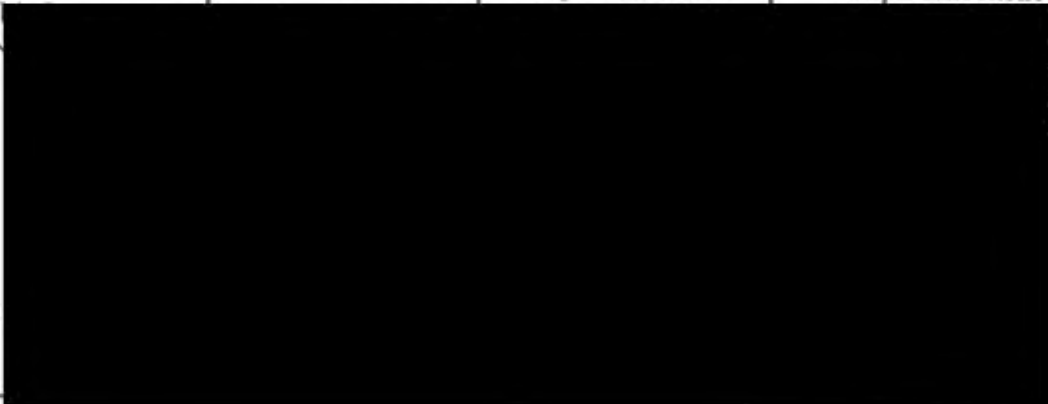
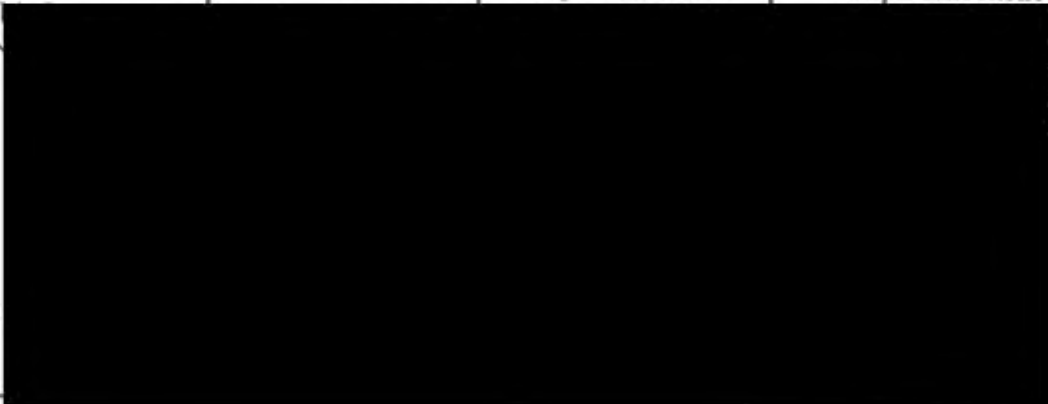
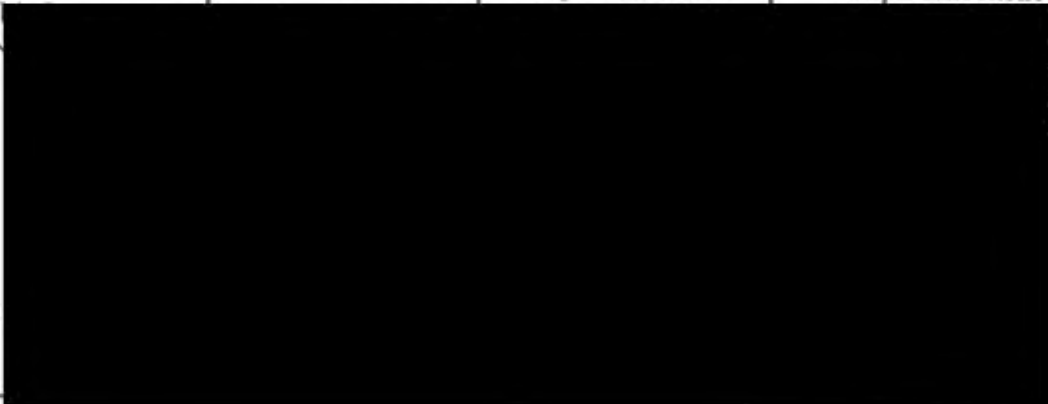
Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 62	
Komu: INV MHMP			Datum: 8.8.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 202 – Cyklolávka - Hlubočepy Část 100 Založení		
na výkresy:		Přílohy 01, 02 a Pokyn objednatele ze dne 24.2.2023		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL62 – SO 202 – Cyklolávka - Hlubočepy,</u> <u>Část 100 - Založení</u> V rámci zpracování RDS dochází k následujícím změnám oproti dokumentaci DVZ: - S ohledem na koordinaci s SO 192 – Terénní úpravy - Hlubočepy do podrobností RDS a v návaznosti na pokyn Objednatele z 24.2.2023 (MHMP 404143/2023) ke koordinaci s akcí Lávka Zlíchov byly provedeny úpravy kubatur výkopů a zpětných zásypů, dále bylo upřesněno množství k uložení na skládku a množství záporového pažení.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Zpracováním podrobného návrhu v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.				
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:		
				
změny (102).				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 062	
NOZ zpracoval: Zhotovitel		Datum: 15.04.2024		
NOZ č. 062 navazuje na:	OZ č. 062	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
ZL62 – SO 202 – Cyklolávka – Hlubočepy, Část 100 – Založení				
Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 062).				
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.				
Cena stavebních prací				
Cena odpočty	-37 580,23 Kč			
Cena přípočty	73 713,36 Kč			
Cena celkem	36 133,13 Kč			
DPH 21 %	7 587,96 Kč			
Cena včetně DPH	43 721,09 Kč			
Seznam příloh/Počet listů příloh:				
- Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Přehled nových položek v ZL č.062				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): třicet šest tisíc jedno sto třicet tři korun českých třináct haléřů _____ (bez DPH)		Dopad do HMG: ANO		
ZHC				
S				
STR				
Dat				

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 062
PoZ vystavil:	Datum: 19.06.2024	
PoZ č. 062 na NOZ č. 062	na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:	osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 36 133,13 Kč bez DPH tj. 0,00 %, z toho: - odpočty činí: - 37 580,20 Kč bez DPH tj. -0,00 % - přípočty činí: 73 713,36 Kč bez DPH tj. 0,01 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.		
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů: viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 36 133,13 Kč	Provedení změny: 11/2023–05/2024	
Nová cena díla (bez DPH): 1 191 942 594,36 Kč	Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 73 713,36 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč	
Důvod ke změně:		
Zpracováním podrobného návrhu v rámci RDS.		
Jedná se o nepředvídanou změnu.		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poznámka:		
Podpis:		
Období:		
IN:		
Datum:		

Stavba č. 42821 Dvorecký most				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 63	
Komu: INV MHMP			Datum: 9.11.2023		
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně	
Týká se:			SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:			SO 202 – Cyklolávk - Hlubočepy Část 200 Spodní stavba		
na výkresy:			Přílohy 01, 02, 04 a 05		
na rozpočtové podklady:			Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:			Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:			ANO		
kategorizace položek:			Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL63 – SO 202 – Cyklolávk - Hlubočepy,</u> <u>Část 200 – Spodní stavba</u> V rámci zpracování RDS dochází k následujícím změnám oproti dokumentaci DVZ: - Upřesnění tvaru základů s ohledem na konstrukce objektů SO 201 a 221 a stability násypu tramvajové trati - Upřesnění množství izolace s ohledem na tvar základů - Upřesnění množství výztuže na základě podrobného statického výpočtu.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Zpracováním podrobného návrhu v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.					
PŘÍKAZNÍK:		AUTORSKÝ DOZOR:		ZHOTOVITEL:	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).					

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 063											
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 15.04.2024											
NOZ č. 063 navazuje na:	OZ č. 063	PZ č.												
Odesláno/ předáno:	osobně													
ZL63 – SO 202 – Cyklolávka - Hlubočepy, Část 200 – Spodní stavba V rámci zpracování RDS dochází k následujícím změnám oproti dokumentaci DVZ: - Upřesnění tvaru základů s ohledem na konstrukce objektů SO 201 a 221 a stability násypu tramvajové trati - Upřesnění množství izolace s ohledem na tvar základů - Upřesnění množství výztuže na základě podrobného statického výpočtu. <u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.</u> Cena stavebních prací <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>-6 369,07 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>65 074,48 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>58 705,41 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>12 328,14 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>71 033,55 Kč</td> </tr> </table> Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)					Cena odpočty	-6 369,07 Kč	Cena přípočty	65 074,48 Kč	Cena celkem	58 705,41 Kč	DPH 21 %	12 328,14 Kč	Cena včetně DPH	71 033,55 Kč
Cena odpočty	-6 369,07 Kč													
Cena přípočty	65 074,48 Kč													
Cena celkem	58 705,41 Kč													
DPH 21 %	12 328,14 Kč													
Cena včetně DPH	71 033,55 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): padesát osm tisíc sedm set pět korun českých čtyřicet jeden haléřů _____ (bez DPH)		Dopad do HMG: ANO												
ZHO — Sc STR Dat														

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03														
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 063														
PoZ vystavil:		Datum: 19.06.2024														
PoZ č. 063 na NOZ č. 063		na jiný dokument:														
Odesláno/ předáno:		osobně														
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 58 705,41 Kč bez DPH tj. 0,01 %, z toho: - odpočty činí: - 6 369,07 Kč bez DPH tj. -0,00 % - přípočty činí: 65 074,48 Kč bez DPH tj. 0,01 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny. Počet připojených listů viz F01, F02 specifikací: Počet připojených výkresů: viz F01 Změna ceny díla (bez DPH): 58 705,41 Kč Provedení změny: 01/2024–03/2024 Nová cena díla (bez DPH): 1 192 001 299,77 Kč Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 65 074,48 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Důvod ke změně: Zpracováním podrobného návrhu v rámci RDS. Jedná se o nepředvídanou změnu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Poznámka: <table><tr><td>Podpis zmocněnce</td><td>Podpis zmocněnce</td><td>Podpis zmocněnce</td><td>Podpis zmocněnce</td></tr><tr><td>O</td><td colspan="3" rowspan="2"></td></tr><tr><td>IN</td></tr><tr><td>Datum:</td><td colspan="3">D. STA CKY</td></tr></table>				Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	O				IN	Datum:	D. STA CKY		
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce													
O																
IN																
Datum:	D. STA CKY															

Stavba č. 42821 Dvorecký most				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 63a	
Komu: INV MHMP			Datum: 15.2.2024		
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně	
Týká se:			SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:			SO 202 – Cyklolávka - Hlubočepy Část 200 Spodní stavba – Změna „a“		
na výkresy:			Přílohy 01a, 07a		
na rozpočtové podklady:			Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:			Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:			ANO		
kategorizace položek:			Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL63a – SO 202 – Cyklolávka - Hlubočepy,</u> <u>Část 200 – Spodní stavba – Změna „a“</u> V rámci zpracování RDS dochází k následujícím změnám oproti dokumentaci DVZ: - Upřesnění rozsahu nátěrů a izolací zasypaných konstrukcí v návaznosti na analogická řešení na objektu SO 201 a v koordinaci s SO 202.3 - Upřesnění množství výztuže základů A a B.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Zpracováním podrobného návrhu v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.					
PŘÍKAZNÍK:		AUTORSKÝ DOZOR:		ZHOTOVITEL:	
S					
Datum:					
Toto oznámení bylo vypracováno a odesláno dne:					
změna:					

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 063a											
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 15.04.2024											
NOZ č. 063a navazuje na:	OZ č. 063a	PZ č.												
Odesláno/ předáno:	osobně													
ZL63a – SO 202 – Cyklolávka – Hlubočepy, Část 200 – Spodní stavba – Změna „a“ V rámci zpracování RDS dochází k následujícím změnám oproti dokumentaci DVZ: - Upřesnění rozsahu nátěrů a izolací zasypaných konstrukcí v návaznosti na analogická řešení na objektu SO 201 a v koordinaci s SO 202.3 - Upřesnění množství výztuže základů A a B. <u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.</u> Cena stavebních prací <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>-20 558,30 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>82 435,40 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>61 877,10 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>12 994,19Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>74 871,29 Kč</td> </tr> </table> Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)					Cena odpočty	-20 558,30 Kč	Cena přípočty	82 435,40 Kč	Cena celkem	61 877,10 Kč	DPH 21 %	12 994,19Kč	Cena včetně DPH	74 871,29 Kč
Cena odpočty	-20 558,30 Kč													
Cena přípočty	82 435,40 Kč													
Cena celkem	61 877,10 Kč													
DPH 21 %	12 994,19Kč													
Cena včetně DPH	74 871,29 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): šedesát jedna tisíc osm set sedmdesát sedm korun českých deset haléřů _____ (bez DPH)		Dopad do HMG: ANO												
ZH STR Datum														

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 063a
PoZ vystavil:		Datum: 19.06.2024
PoZ č. 063a na NOZ č. 063a		na jiný dokument:
Odesláno/ předáno:		osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 61 877,10 Kč bez DPH tj. 0,01 %, z toho: - odpočty činí: - 20 558,30 Kč bez DPH tj. -0,00 % - přípočty činí: 82 435,40 Kč bez DPH tj. 0,01 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.		
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů: viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 61 877,10 Kč	Provedení změny: 01/2024–05/2024	
Nová cena díla (bez DPH): 1 192 063 176,87 Kč	Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 82 435,40 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč	
Důvod ke změně:		
Zpracováním podrobného návrhu v rámci RDS.		
Jedná se o nepředvídanou změnu.		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poznámka:		
Po		
Datum		

A
Y
