


Úsek technického ředitele

■ Příloha č. 2 ke změnovému listu č. 2 stavby „Rozšíření odstavné plochy pro autobusy Hranečník“ – stanovisko a posouzení ceny změn během výstavby

Změnový list řeší změny výkazu výměr, ke kterým došlo během výstavby v důsledku upřesnění během realizace výstavby.

Jedná se o nutnost vybudování konstrukce zajišťující stabilitu svahu na severní straně plochy. Projektant zpracoval spádování plochy opačné než navazující původní odstavná plocha. Ve vzorových řezech PD D.1.2.-04 z 2/2022 použil špatné zaměření terénu a většinu odstavné plochy vyspádoval k obrubníkům na severní straně plochy. Špatné spádování pak vyvolalo nutnost zajištění svahu opěrnou konstrukcí. V 06/2024 pak projektant doplnil výkresy s částečně opravenými řezy terénu a s navrženou opěrnou stěnou ze svahových tvarovek.

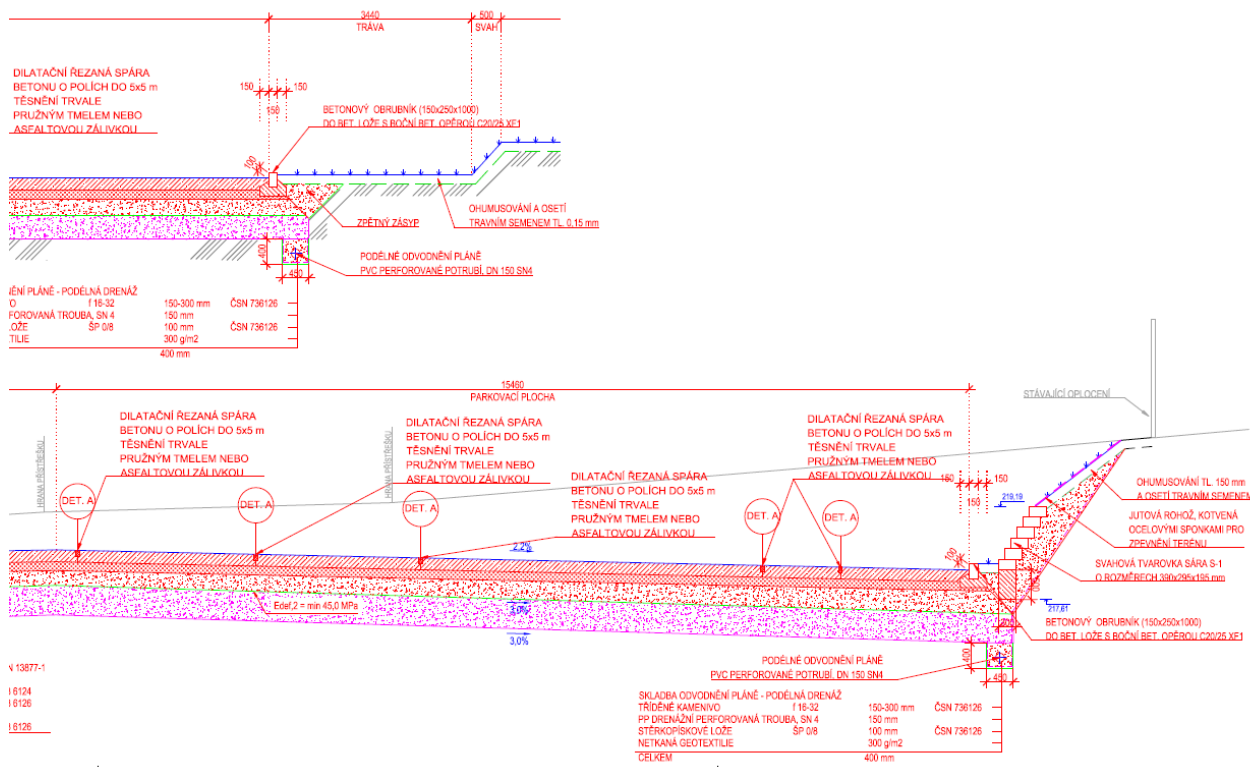

Na základě výše uvedeného je nezpochybnitelné, že projektant tuto vícepráci mohl předjímat, pokud by při projektování použil správné zaměření terénu.

Stanovení cen vícepráci je v souladu s ustanovením uzavřené smlouvy o dílo č. 20230499 (č. s. zhotovitele 231312642) č. 6.4, kdy se pro položky vícepráci použila nižší cena ze SOD nebo ceníku ÚRS 2024/II.

Souhlasím se změnovým listem.

V Ostravě dne 2. 10. 2024

technický dozor stavebníka
