

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 25. 10. 2024**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Ridera Stavební a.s.

se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava

IČ: 45192464

DIČ: CZ45192464

zastoupena: Ing. Vlastimilem Kaňovským, předsedou představenstva

Ing. Lenkou Peškovou, místopředsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 408

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2024, ev. č. Objednatele 001/OVZ/24/080-OD (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 25. 10. 2024, ev. č. Objednatele 001/OVZ/24/080-OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení prací na akci pod názvem „**Rekonstrukce a vybavení nových prostor specializovaných ambulancí Centra roztroušené sklerózy, objekt Polikliniky 4. NP**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku V. odst. 1. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

„1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na pevné ceně:

Celková cena bez DPH	17.931.767,10 Kč
DPH ve výši	3.765.671,09 Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	21.697.438,19 Kč

3. Přesná specifikace víceprací a méněprací, navýšení ceny o 1.976.096,39 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 1.307.011,59 Kč bez DPH je zaznamenáno v Oznámení o změnách akce č. 1, č. 2, č. 3, č. 6, č. 7, č. 9 a č. 10, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Příloha č. 1“).

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Dodatek č. 1 vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
- Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Oznámení o změnách akce č. 1, č. 2, č. 3, č. 6, č. 7, č. 9 a č. 10.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2025.04.04
16:38:17 +02'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Ostravě dne _____

Ing. Vlastimil Kaňovský
Digitálně podepsal Ing.
Vlastimil Kaňovský
Datum: 2025.03.26
12:33:41 +01'00'

Zhotovitel

Ing. Vlastimil Kaňovský
předseda představenstva

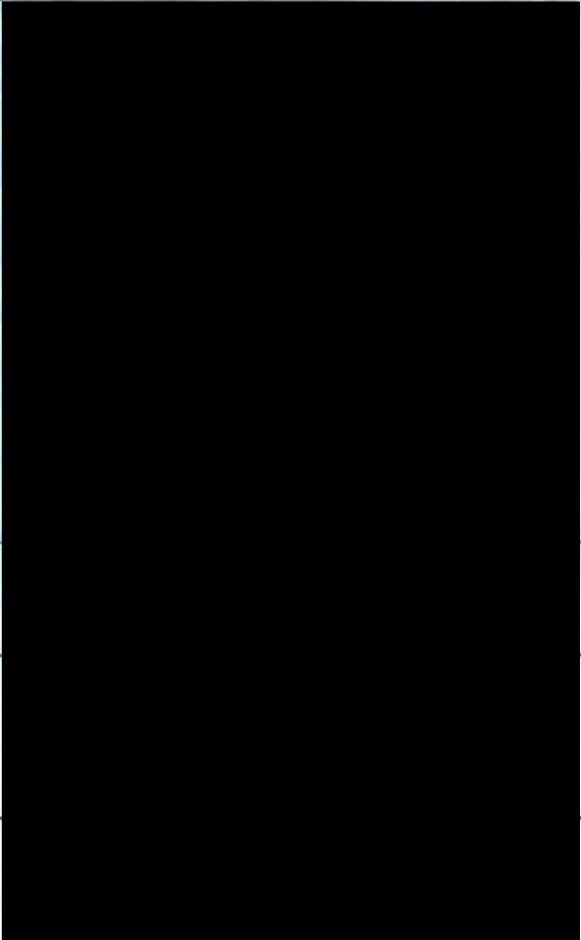
Ing. Lenka Pešková
Digitálně podepsal Ing.
Lenka Pešková
Datum: 2025.03.26
12:24:07 +01'00'

Zhotovitel

Ing. Lenka Pešková
místopředseda představenstva

Změnový list č 1. – Bourání podlah

Identifikační údaje akce			
Název		ZPŘ-04/24	
Rekonstrukce a vybavení nových prostor specializovaných ambulancí Centra roztroušené sklerózy, objekt Polikliniky 4.NP			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Ridera Stavební a.s., IČ: 45192464	
Adresa		Dělnická 382/32, Ostrava – Poruba 708 00	
Oznámení vystavil:			
Navrhované změny akce			
V rámci tohoto změnového listu jsou řešeny změny týkající se navýšení rozsahu bouraných konstrukcí podlah. Při bourání podlah byla zjištěna jejich tloušťka až 190mm. Skutečný rozsah bouraných konstrukcí byl ověřen zaměřením výšek podlah v jednotlivých místnostech před a po ukončení bouracích prací.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Po provedení sond před zahájením bouracích prací bylo zjištěno, že tloušťky podlahových konstrukcí jsou odlišné od specifikace v PD. Provedeno zaměření před demolicí a po demolici.			
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, a jejich provedení je pro provedení účelu díla nezbytné a změna v osobě dodavatele			
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení			
a			
b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00,-Kč		207.342,00,- Kč	

Výsledná cena změn bez DPH:	
	207.342,00,-Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	43.541,82,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	250.883,82,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Podpis zmocněnce zhotovitele: Rídera – Stavební a.s.	
Stanovisko TDI: souhlasím	
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet ZL 001 – bourání podlah; zaměření podlah před demolicí; zaměření podlah po demolici	

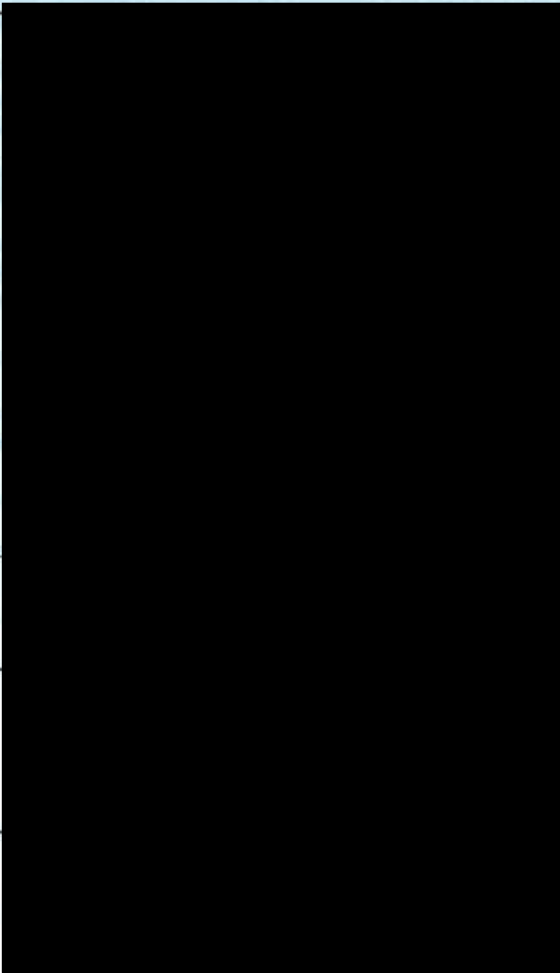
Změnový list č 2. – Demontáž zábradlí na chodbě

Identifikační údaje akce			
Název		ZPŘ-04/24	
Rekonstrukce a vybavení nových prostor specializovaných ambulancí Centra roztroušené sklerózy, objekt Polikliniky 4.NP			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Ridera Stavební a.s., IČ: 45192464	
Adresa		Dělnická 382/32, Ostrava – Poruba 708 00	
Oznámení vystavil:			
Navrhované změny akce			
V rámci tohoto změnového listu je zohledněna skutečnost rozsahu demontovaného zábradlí oproti předpokladu uvedenému ve výkazu výměr.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Provedena demontáž skutečného množství			
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, a jejich provedení je pro provedení účelu díla nezbytné a změna v osobě dodavatele			
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a			
b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.			
Odkazy na		specifikaci:	
		na výkresy:	
		na rozpočtové podklady:	
		na jinou část smlouvy:	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☒	
odstavec 6, § 222 ☐		odstavec 7, § 222 ☐	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 ,-Kč		6.895,25,- Kč	

Výsledná cena změn bez DPH:	
	6.895,25,-Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	1.448,00,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	8.343,25,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Podpis zmocněnce zhotovitele: Ridera – Stavební a.s.	
Stanovisko TDI: souhlasím	
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet ZL 002 – demontáž zábradlí na chodbě	

Změnový list č 3. – Podlahy

Identifikační údaje akce			
Název		ZPŘ-04/24	
Rekonstrukce a vybavení nových prostor specializovaných ambulancí Centra roztroušené sklerózy, objekt Polikliniky 4.NP			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Ridera Stavební a.s., IČ: 45192464	
Adresa		Dělnická 382/32, Ostrava – Poruba 708 00	
Oznámení vystavil:			
Navrhované změny akce			
V rámci tohoto změnového listu je řešena nová skladba podlahové konstrukce s ohledem na zjištěné skutečnosti po provedení sond do podlahových konstrukcí a zaměření stropu po vybourání podlah. Zároveň jsou v tomto ZL odečtené položky, které byly součástí zadání a tyto nebudou prováděné.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Po provedení sond před demolicí stávajících podlahových konstrukcí a samotném provedení demolice bylo zjištěno, že nelze provést nové podlahové konstrukce dle PD. Výškové rozdíly stropní konstrukce a její nosnost nedovolují použít projekční řešení, proto bylo přistoupeno k použití pěnobetonu, zvýšené vrstvy tepelné a kročejové izolace a anhydritu.			
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, a jejich provedení je pro provedení účelu díla nezbytné a změna v osobě dodavatele			
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení			
a			
b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
482.063,04,- Kč		563.648,70,- Kč	

Výsledná cena změn bez DPH:	
	81.585,66,-Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	17.132,99,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	98.718,65,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Podpis zmocněnce zhotovitele: Rídera – Stavební a.s.	
Stanovisko TDI: souhlasím	
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím	
Seznam přiložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet ZL 003 - podlahy	

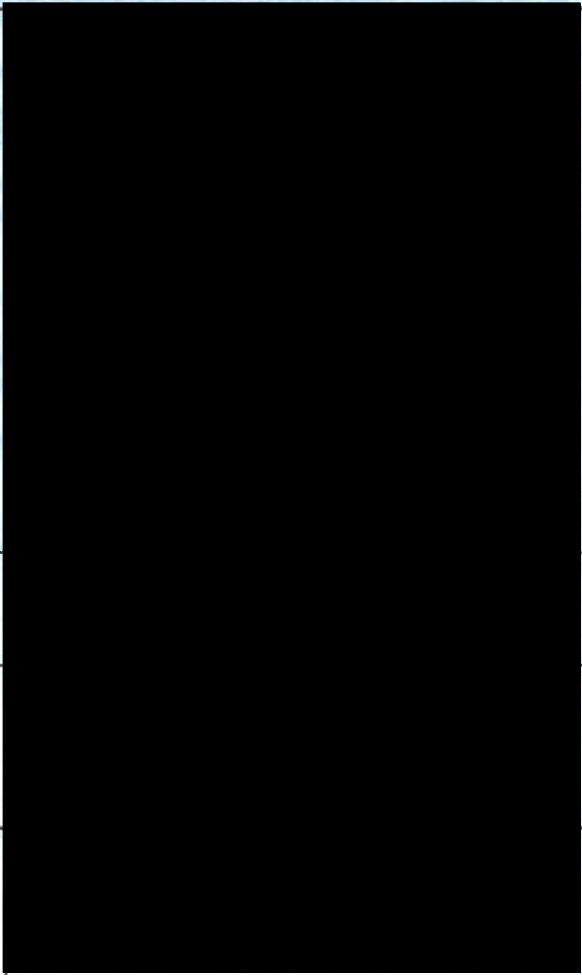
Změnový list č 6. – Ocelová konstrukce pro opláštění

Identifikační údaje akce				
Název		ZPŘ-04/24		
Rekonstrukce a vybavení nových prostor specializovaných ambulancí Centra roztroušené sklerózy, objekt Polikliniky 4.NP				
Objednatel:				
Název		Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel				
Název		Rídera Stavební a.s., IČ: 45192464		
Adresa		Dělnická 382/32, Ostrava – Poruba 708 00		
Oznámení vystavil:				
Navrhované změny akce				
V rámci tohoto změnového listu je řešena dodávka ocelové konstrukce pro následné interiérové opláštění a zároveň odpočet v projektu navržené SDK příčky.				
Zdůvodnění navrhovaných změn				
V rámci zpracování projektu interiéru bylo dohodnuto zejména na provozní požadavky v místnosti Infuze provést záměnu SDK příčky za interiérovou příčku s HPL deskami. Stavba musela pro tuto interiérovou stěnu zajistit dodávku ocelové konstrukce, které musela být kotvena do stropní konstrukce před betonáží podlah.				
Odkazy na		specifikaci:		
		na výkresy:		
		na rozpočtové podklady:		
		na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
10.972,06,-Kč		19.800,- Kč		

Výsledná cena změn bez DPH:	
	8.827,94,-Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	1.853,87,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	10.681,81,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Podpis zmocněnce zhotovitele: Ridera – Stavební a.s.	
Stanovisko TDI: souhlasím	
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet ZL 006 – Ocelová konstrukce pro opláštění	

Změnový list č 7. - Slaboproud

Identifikační údaje akce				
Název		ZPŘ-04/24		
Rekonstrukce a vybavení nových prostor specializovaných ambulancí Centra roztroušené sklerózy, objekt Polikliniky 4.NP				
Objednatel:				
Název		Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel				
Název		Ridera Stavební a.s., IČ: 45192464		
Adresa		Dělnická 382/32, Ostrava – Poruba 708 00		
Oznámení vystavil:				
Navrhované změny akce				
V rámci tohoto změnového listu jsou řešeny změny v Slaboproudu s vazbou na zpracovaný projekt Interiéru.				
Zdůvodnění navrhovaných změn				
V rámci koordinace se zpracovávaným projektem Interiéru došlo k vyvolaným změnám v slaboproudu. Toto se týkalo umístění koncových prvků a přívodů k nim vedeným, tlačítka pro otevírání dveří, odpočet jednoho televizoru, změna držáků a další drobné práce. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, a jejich provedení je pro provedení účelu díla nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.				
Odkazy na		specifikaci:		
		na výkresy:		
		na rozpočtové podklady:		
		na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
57.870,68,- Kč		89.473,42,- Kč		

Výsledná cena změn bez DPH:	
	31.602,74,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	6.636,58,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	38.239,32,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Podpis zmocněnce zhotovitele: Rídera – Stavební a.s.	
Stanovisko TDI: souhlasím	
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet ZL 007 – Slaboproud	

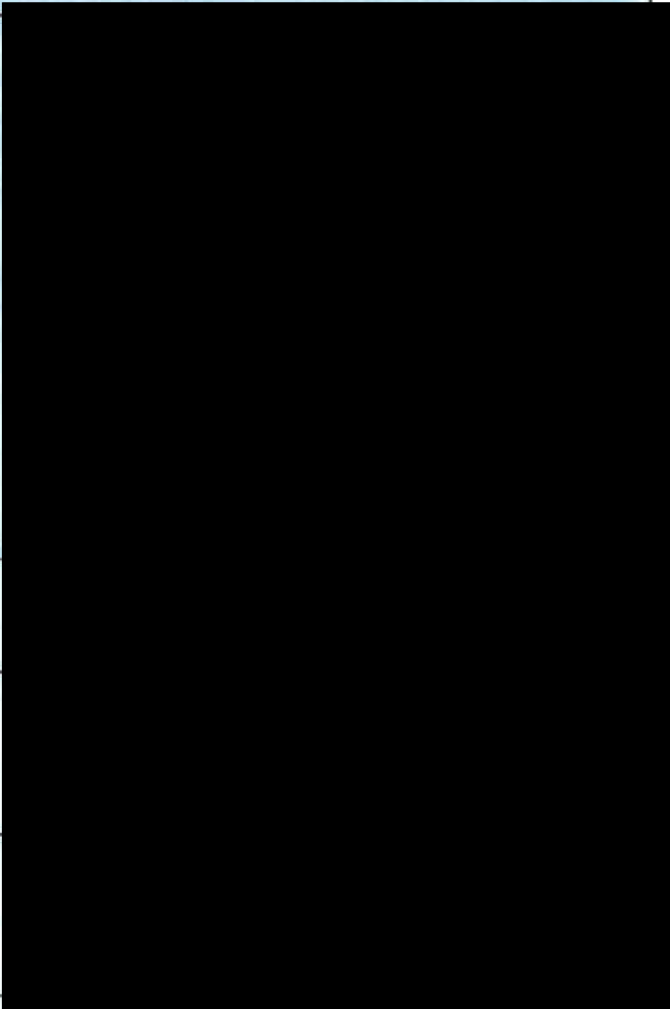
Změnový list č 9. – Silnoproud

Identifikační údaje akce			
Název		ZPŘ-04/24	
Rekonstrukce a vybavení nových prostor specializovaných ambulancí Centra roztroušené sklerózy, objekt Polikliniky 4.NP			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Ridera Stavební a.s., IČ: 45192464	
Adresa		Dělnická 382/32, Ostrava – Poruba 708 00	
Oznámení vystavil:			
Navrhované změny akce			
V rámci tohoto změnového listu jsou řešeny změny v části Silnoproudu, a to změna kabeláže za bezhalogenovou, výměna kabeláže v místnostech, kde měla být dle zadávací PD ponechána a doplnění rozvodů pro germicidní lampy.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
S ohledem na nově platnou ČSN 332130, platnou od 1.1.2025, byla provedena změna typu kabeláže za bezhalogenovou. Dále bylo v průběhu bouracích prací zjištěno, že v místnostech, kde měla být kabeláž ponechána, je část rozvodů vedená v podlaze. S ohledem na tuto skutečnost a platnost nové výše uvedené normy bylo rozhodnuto o výměně silnoproudé elektroinstalace i v těchto místnostech.			
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, a jejich provedení je pro provedení účelu díla nezbytné a změna v osobě dodavatele			
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a			
b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
584.169,20,- Kč		1.057.962,02,- Kč	

Výsledná cena změn bez DPH:	
	473.792,82,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	99.496,49,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	573.289,31,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Podpis zmocněnce zhotovitele: Ridera – Stavební a.s.	
Stanovisko TDI: souhlasím	
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet ZL 009 - Silnoproud	

Změnový list č 10. – Fototapety

Identifikační údaje akce				
Název		ZPŘ-04/24		
Rekonstrukce a vybavení nových prostor specializovaných ambulaní Centra roztroušené sklerózy, objekt Polikliniky 4.NP				
Objednatel:				
Název		Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel				
Název		Ridera Stavební a.s., IČ: 45192464		
Adresa		Dělnická 382/32, Ostrava – Poruba 708 00		
Oznámení vystavil:				
Navrhované změny akce				
V rámci tohoto změnového listu jsou řešené změny v rozsahu a provedení fototapet.				
Zdůvodnění navrhovaných změn				
V souladu se zpracovaným projektem interiéru bylo ze strany projektanta upřesněné řešení rozsahu, materiálů a vzorů fototapet.				
Jedná se o stavební práce – resp. úpravu jejich rozsahu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.				
Odkazy na		specifikaci:		
		na výkresy:		
		na rozpočtové podklady:		
		na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
171.936,61,- Kč		30.975,00,- Kč		

Výsledná cena změn bez DPH:	
	-140.961,61,-Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	-29.601,94,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	-170.563,54,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Podpis zmocněnce zhotovitele: Ridera – Stavební a.s.	
Stanovisko TDI: souhlasím	
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet ZL 010 - Fototapety	
