

Dodatek č. 2 k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-000480

Číslo smlouvy konzultanta: TS/01/19800

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 126 7020

Název související veřejné zakázky:

D48 MÚK Běloutín – Rybí, stavební dozor

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následujícími smluvní strany:

Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: [redacted] ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech technických: vedoucí úseku výstavby
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Společnost „MORAVA TDI: R48 MÚK Běloutín“

SHP TS s.r.o.

se sídlem: Šumavská 524/31, 602 00 Brno
IČO: 283 42 771
DIČ: CZ28342771
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: [redacted] jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] jednatel
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted], jednatel
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
vedoucí společník společnosti „MORAVA TDI: R48 MÚK Běloutín“

a

Mott Mac Donald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní č.p. 984/15, 10 00 Praha 1
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051
zastoupená: [redacted] jednatelem, na základě
plné moci

společník společnosti „MORAVA TD: R48 MÚK Běloutín“

a

SHP SK s.r.o.

se sídlem: Mlynské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 449 38 209
DIČ: 2022899186
IČ k DPH: SK2022899186
zápis v obchodním rejstříku: u Okresného soudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 90543/B

zastoupená: [redacted], jednatelem, na základě plné moci

společník společnosti „MORAVA TDI: R48 MÚK Bělotín“
a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zastoupená: [redacted], jednatelem, na základě plné moci

společník společnosti „MORAVA TDI: R48 MÚK Bělotín“
a

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno

IČO: 25564901

DIČ: CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

zastoupená: [redacted], jednatelem, na základě plné moci

společník společnosti „MORAVA TDI: R48 MÚK Bělotín“
a

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 28571690

DIČ: CZ28571690

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

zastoupená: [redacted], jednatelem, na základě plné moci

společník společnosti „MORAVA TDI: R48 MÚK Bělotín“
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

(objednatel a konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“)

v souladu s ustanovením § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“), kterým mění původní ujednání Souhrnu smluvních dohod č. objednatele: 16PT-000480 (č. konzultanta: TS/01/19800), (dále jen „**Smlouva**“).

Preamble

Smluvní strany spolu uzavřely dne 12. 2. 2019 Smlouvu, jejímž předmětem je zajištění činnosti stavebního dozoru na stavbě D48 MÚK Bělotín – Rybí. Dále Smluvní strany uzavřely dne 7. 5. 2021 ke Smlouvě Dodatek č. 1, jehož předmětem byla změna Smlouvy spočívající v doplnění 5 pozic expertů konzultanta.

Smluvní strany přistupují k uzavření Dodatku č. 2 z důvodu potřeby prodloužení doby plnění činností stavebního dozoru v rámci stavby „D48 MÚK Bělotín – Rybí, I. etapa“. K prodloužení doby

plnění dochází v návaznosti na změnu termínu dokončení stavby, která vyplývá z Dohody uzavřené mezi objednatelem stavby (Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.) a zhotovitelem stavby, společností COLAS CZ-FIRESTA-Fišer (společníci ve sdružení). Tato změna termínu, sjednaná v Dohodě č. 3 ze dne 9. 1. 2025, se týká prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3 OP/ZP.

V souladu s článkem 22.1 VOP/ZOP byla vyhodnocena nezbytnost zajištění výkonu činností stavebního dozoru u vybraných pozic v rámci týmu technického dozoru investora (TDI) až do nového termínu dokončení stavby, tj. **do 15. 8. 2026**.

Uzavřením tohoto Dodatku č. 2 jsou upraveny smluvní podmínky tak, aby odpovídaly aktuálnímu harmonogramu realizace stavby, a byla tak zajištěna kontinuita a kvalita výkonu stavebního dozoru po celou dobu trvání stavby.

Tato úprava Smlouvy představuje nepodstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani její základní parametry.

S ohledem na výše uvedené Smluvní strany přistoupily k uzavření Dodatku č. 2 v následujícím znění:

Článek I. Předmět Dodatku č. 2

- 1.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli dohodly na změně Článku 22.1 VOP/ZOP. Tato změna se sjednává následovně:

Původní znění:

*Předpokládaný termín pro dokončení: **48 měsíců od předání staveniště zhotoviteli + 1 měsíc na dokončení stavby.***

se **ruší a nahrazuje** tímto zněním:

Předpokládaný termín pro dokončení: 65 měsíců od předání staveniště zhotoviteli + 1 měsíc na dokončení stavby.

Ostatní ujednání Článku 22.1 VOP/ZOP zůstávají beze změny.

- 1.2 Dále se Smluvní strany ~~dohodly~~ na skutečnosti uvedené v Preambuli dohodly na změně Článku 22.1 VOP/ZOP. Tato změna se sjednává následovně:

- 1.3 V návaznosti na změnu Smlouvy uvedenou v odst. 1.1 Dodatku č. 2 se Smluvní strany dohodly na odpovídající úpravě a nahrazení Přílohy A (ROZSAH SLUŽEB) - ROZPIS SLUŽEB SLOUŽÍCÍCH K NACENĚNÍ. Aktualizované znění této přílohy tvoří nedílnou součást Dodatku č. 2 jako jeho příloha č. 1. Tímto Dodatkem č. 2 dochází k úpravě rozsahu poskytovaných služeb, spočívající zejména ve snížení počtu zapojeného personálu konzultanta a úpravě časového rámce výkonu činností, a to až do skutečného dokončení a předání stavby ze strany zhotovitele.

Článek II. Závěrečná ustanovení


- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou výslovně upravena Dodatkem č. 2 zůstávají beze změny a nadále platí ve svém původním znění.

- 2.2 Dodatek č. 2 je sepsán v osmi stejnopisech s platností originálu, přičemž po podpisu obdrží objednatel dva a konzultant šest stejnopisů.
- 2.3 Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů objednatelem.
- 2.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jeho uzavření objednatel.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 2.5 Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 2.6 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je jeho příloha č. 1 - ROZPIS SLUŽEB SLOUŽÍCÍCH K NACENĚNÍ.

za objednatele:



ředitel Správy Ostrava

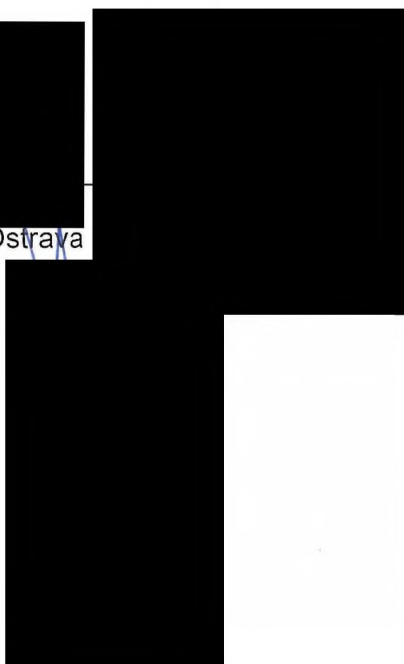


za konzultanta:

25.03.2025



na základě plné moci



Příloha č. 1 Dodatku č. 2
OCENĚNÝ ROZSAHU SLUŽEB

D48 MÚK Bělotín - Rybí, stavební dozor

Pozice	Souhrn smluvních dohod (SSD)					Dodatek č. 1					Dodatek č. 2					Celková cena Smlouvy vč. Dodatků				
	počet	počet dní	počet dní celkem	denní sazba	cena	počet	počet dní	počet dní celkem	denní sazba	cena	počet	počet dní	počet dní celkem	denní sazba	cena	počet	počet dní celkem	denní sazba	cena	
	měsíců	v měsíci			Kč bez DPH	měsíců	v měsíci			Kč bez DPH	měsíců	v měsíci			Kč bez DPH	měsíců	v měsíci		Kč bez DPH	
A) Tým asistenta správce stavby	Činnost TDS (od 2.3.2021-31.3.2025)										Činnost TDS (od 1.4.2025-15.7.2026)					Činnost TDS (od 2.3.2021-15.7.2026)				
Asistent správce stavby - vedoucí TDS nebo zástupce vedoucího	49	21	1029	6 700	6 894 300						15	14	210	6 700	1 407 000	64	1239	6 700	8 301 300	
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	49	21	1029	6 300	6 482 700						15	14	210	6 300	1 323 000	64	1239	6 300	7 805 700	
Pomocný asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	48	15	720	5 300	3 816 000						15	0	0	5 300	0	63	720	5 300	3 816 000	
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	49	21	1029	6 300	6 482 700						15	14	210	6 300	1 323 000	64	1239	6 300	7 805 700	
Pomocný asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	48	15	720	5 300	3 816 000						15	0	0	5 300	0	63	720	5 300	3 816 000	
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	49	14	686	3 800	2 606 800						15	16	240	3 800	912 000	64	926	3 800	3 518 800	
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	48	4	192	5 100	979 200						15	3	45	5 100	229 500	63	237	5 100	1 208 700	
Koordinátor BOZP	48	10	480	5 100	2 448 000						15	4	60	5 100	306 000	63	540	5 100	2 754 000	
A) Tým asistenta správce stavby – celkem				CELKEM	33 525 700				CELKEM	0				CELKEM	5 500 500			CELKEM	39 026 200	
B) Technická dozorčí správa	Činnost TDS (od 2.3.2021-31.3.2025)										Činnost TDS (od 1.4.2025-15.7.2026)					Činnost TDS (od 2.3.2021-15.7.2026)				
Asistent specialista geotechnika	48	7	336	6 200	2 083 200						15	6	90	6 200	558 000	63	426	6 200	2 641 200	
Asistent specialista trubní vedení	48	10	480	6 200	2 976 000						15	3	45	6 200	279 000	63	525	6 200	3 255 000	
Asistent specialista elektro	48	7	336	5 700	1 915 200						15	2	30	5 700	171 000	63	366	5 700	2 086 200	
Asistent specialista geodet ÚOZI	48	18	864	5 300	4 579 200						15	7	105	5 300	556 500	63	969	5 300	5 135 700	
Asistent specialista ekodozor	48	4	192	5 300	1 017 600						15	4	60	5 300	318 000	63	252	5 300	1 335 600	
Asistent specialista PKO	48	4	192	5 300	1 017 600						15	0	0	5 300	0	63	192	5 300	1 017 600	
Asistent specialista pro přejímky OK	48	4	192	6 000	1 152 000						15	0	0	6 000	0	63	192	6 000	1 152 000	
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti	48	21	1008	5 300	5 342 400						15	16	240	5 300	1 272 000	63	1248	5 300	6 614 400	
Právník	48	3	144	5 700	820 800						15	0	0	5 700	0	63	144	5 700	820 800	
B) Technická dozorčí správa - celkem				CELKEM	20 904 000				CELKEM	0				CELKEM	3 154 500			CELKEM	24 058 500	
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci	Činnost TDS (od 2.3.2021-31.3.2025)					Činnost TDS (od 2.3.2021-31.3.2025)					Činnost TDS (od 1.4.2025-15.7.2026)					Činnost TDS (od 2.3.2021-15.7.2026)				
Expert – mosty a inženýrské konstrukce						48	4	192	6 300	1 209 600	15	0	0	6 300	0	63	192	6 300	1 209 600	
Expert - pozemní komunikace						48	4	192	6 300	1 209 600	15	0	0	6 300	0	63	192	6 300	1 209 600	
Expert – vodohospodářské objekty a trubní vedení						48	1	48	6 300	302 400	15	0	0	6 300	0	63	48	6 300	302 400	
Expert - elektrotechnická zařízení						48	1	48	6 300	302 400	15	0	0	6 300	0	63	48	6 300	302 400	
Expert – tunelové stavby a rozsáhlé zemní práce						48	2	96	6 300	604 800	15	0	0	6 300	0	63	96	6 300	604 800	
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	0				CELKEM	3 628 800				CELKEM	0			CELKEM	3 628 800	
A) Tým zástupce správce stavby - celkem:	CELKEM (SSD)				33 525 700	CELKEM (Dodatek č.1)				0	CELKEM (Dodatek č. 2)				5 500 500	CELKEM (SSD + Dod.č. 1 + Dod.č. 2)				39 026 200
B) Technická dozorčí správa - celkem:	CELKEM)SSD)				20 904 000	CELKEM (Dodatek č.1)				0	CELKEM (Dodatek č. 2)				3 154 500	CELKEM (SSD + Dod.č. 1 + Dod.č. 2)				24 058 500
B) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem:	CELKEM (SSD)				0	CELKEM (Dodatek č.1)				3 628 800	CELKEM (Dodatek č. 2)				0	CELKEM (SSD + Dod.č. 1 + Dod.č. 2)				3 628 800
Celkem (bez DPH) :					54 429 700					3 628 800					8 655 000				66 713 500	
