



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 105

SO 07.07 . Revitalizace řeky – úprava dna 37,055 - 39,910 km

Čerpání pro provedení úprav v toku



SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Povodí Moravy -graf průtoků Brno-Riviera	2
Stanovisko Autorského dozoru	3
příloha č. 7	NEOBSAZENO
příloha č. 8	4
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Povolení k nakládání s povrchovými vodami	7
Fotodokumentace	8

"Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"


Důvodová zpráva – změnový list č. 105. Čerpání vody pro provedení úprav v toku

Čerpání vody z jímek během stavby, u SO 07.07, která je obsahem uzavřené SOD se předpokládalo čerpání vody v délce 365 dnů, oceněná jako kpl. 1,000, cena celkem 9.500 tis. Kč.


Vlivem zvýšeného průtoku vody v řece Svatce byla ovlivněna plynulá realizace Díla. Tato nepředpokládaná událost byla vyvolána zásahy třetí strany, konkrétně Povodí Moravy, s. p., jež podniklo nezbytné kroky k ochraně veřejnosti a majetku, což mělo přímé dopady na průběh realizace díla, způsobilo omezení stavební činnosti zhotovitele a nebylo možné provádět práce v plném rozsahu v korytě řeky Svatky.

Většina stavebních prací v korytech řeky, zejména ty, které zahrnují mechanizaci a zásahy do dna nebo břehů, vyžaduje kontinuální čerpání vody, aby byl zajištěn suchý a bezpečný pracovní prostor. Bez tohoto kroku je realizace stavebních objektů v řekách značně ztížena, a to z důvodů bezpečnosti, efektivity a kvality provedení.

Na základě těchto skutečností předkládá zhotovitel prodloužení doby čerpání vody nad rámec ZL.č.84 o dalších 83 dnů.



Hlavní stavbyvedoucí
za Společnost: „PPO nábřeží Svatky – Brno“



Odesílatel e-mailu informuje, že není za OHLA oprávněn uzavírat jakékoliv smlouvy, s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen ze strany OHLA a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi e-mailu nebo osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známa.

From: [REDACTED]
Sent: Thursday, January 23, 2025 11:05 AM
To: [REDACTED]
Subject: FW: odtoky VD Brno

Dobrý den,
dle tel. domluvy posílám v příloze data ze stanice Svratka-Brno (Riviera).

S pozdravem
[REDACTED]

[REDACTED]
vodohospodářský dispečink

T [REDACTED] M [REDACTED]




Povodi Moravy, s.p.
ředitelství podniku
Dřevařská 11, 602 00 Brno
www.pmo.cz


From: [REDACTED]
Sent: Wednesday, January 22, 2025 5:50 PM
To: [REDACTED]
Subject: FW: odtoky VD Brno

Ahoj,
prosím, pošli jim data z odtoku z Brna.
Děkuji.


Svratka - Brno - Poříčí (Riviera) - září 2024

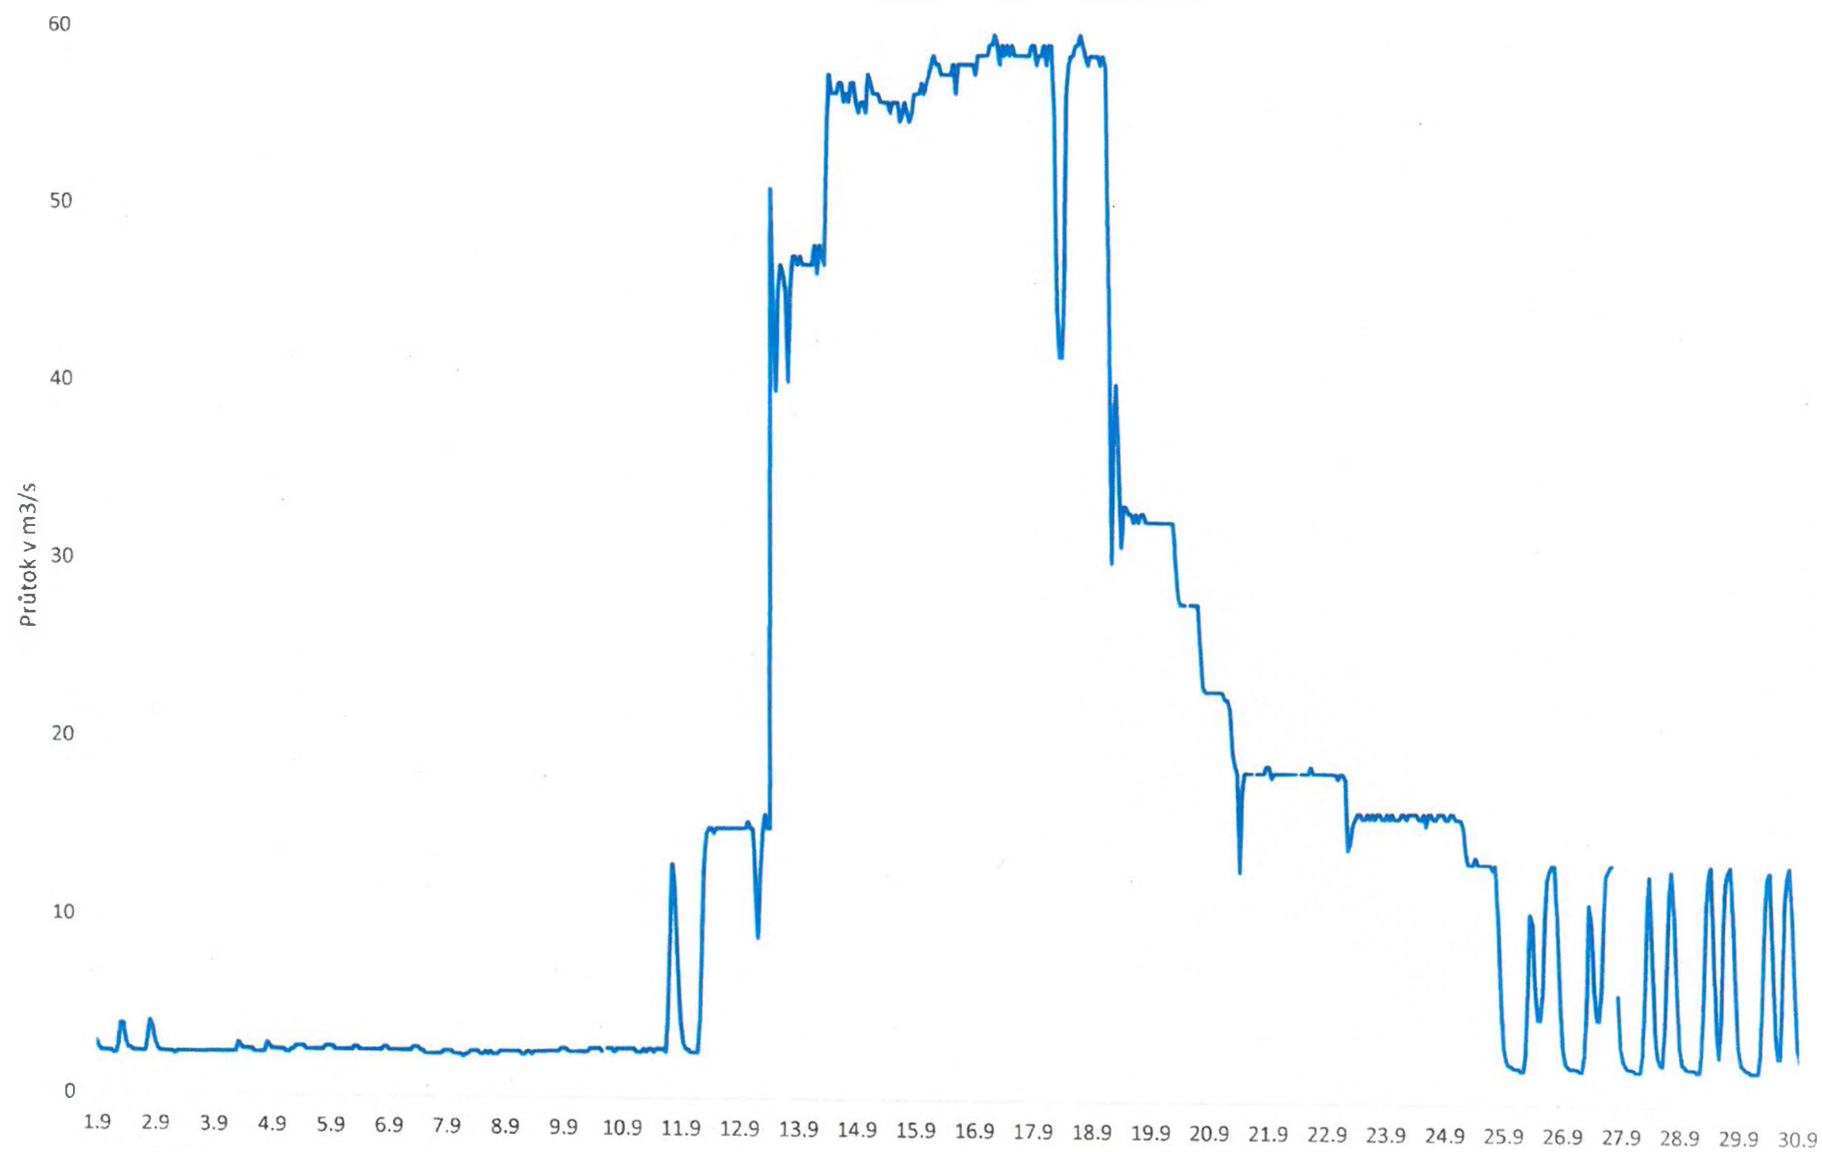


Svratka - Brno - Poříčí (Riviera) - říjen 2024

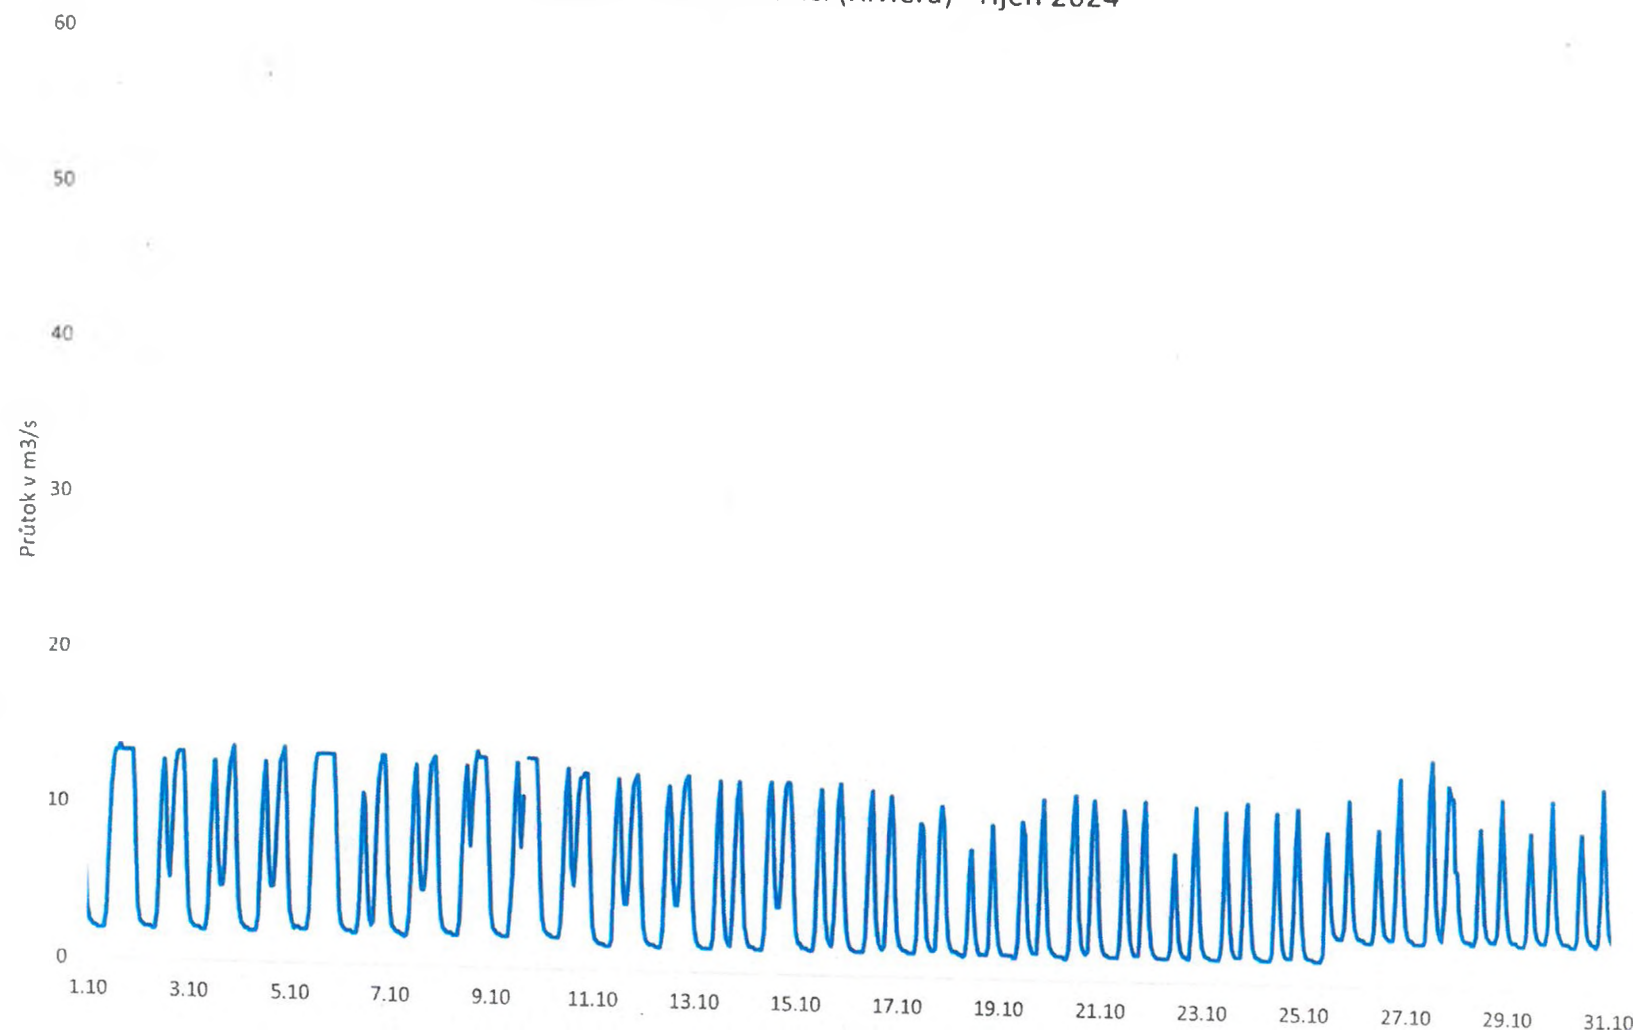

Svratka - Brno - Poříčí (Riviera) - listopad 2024

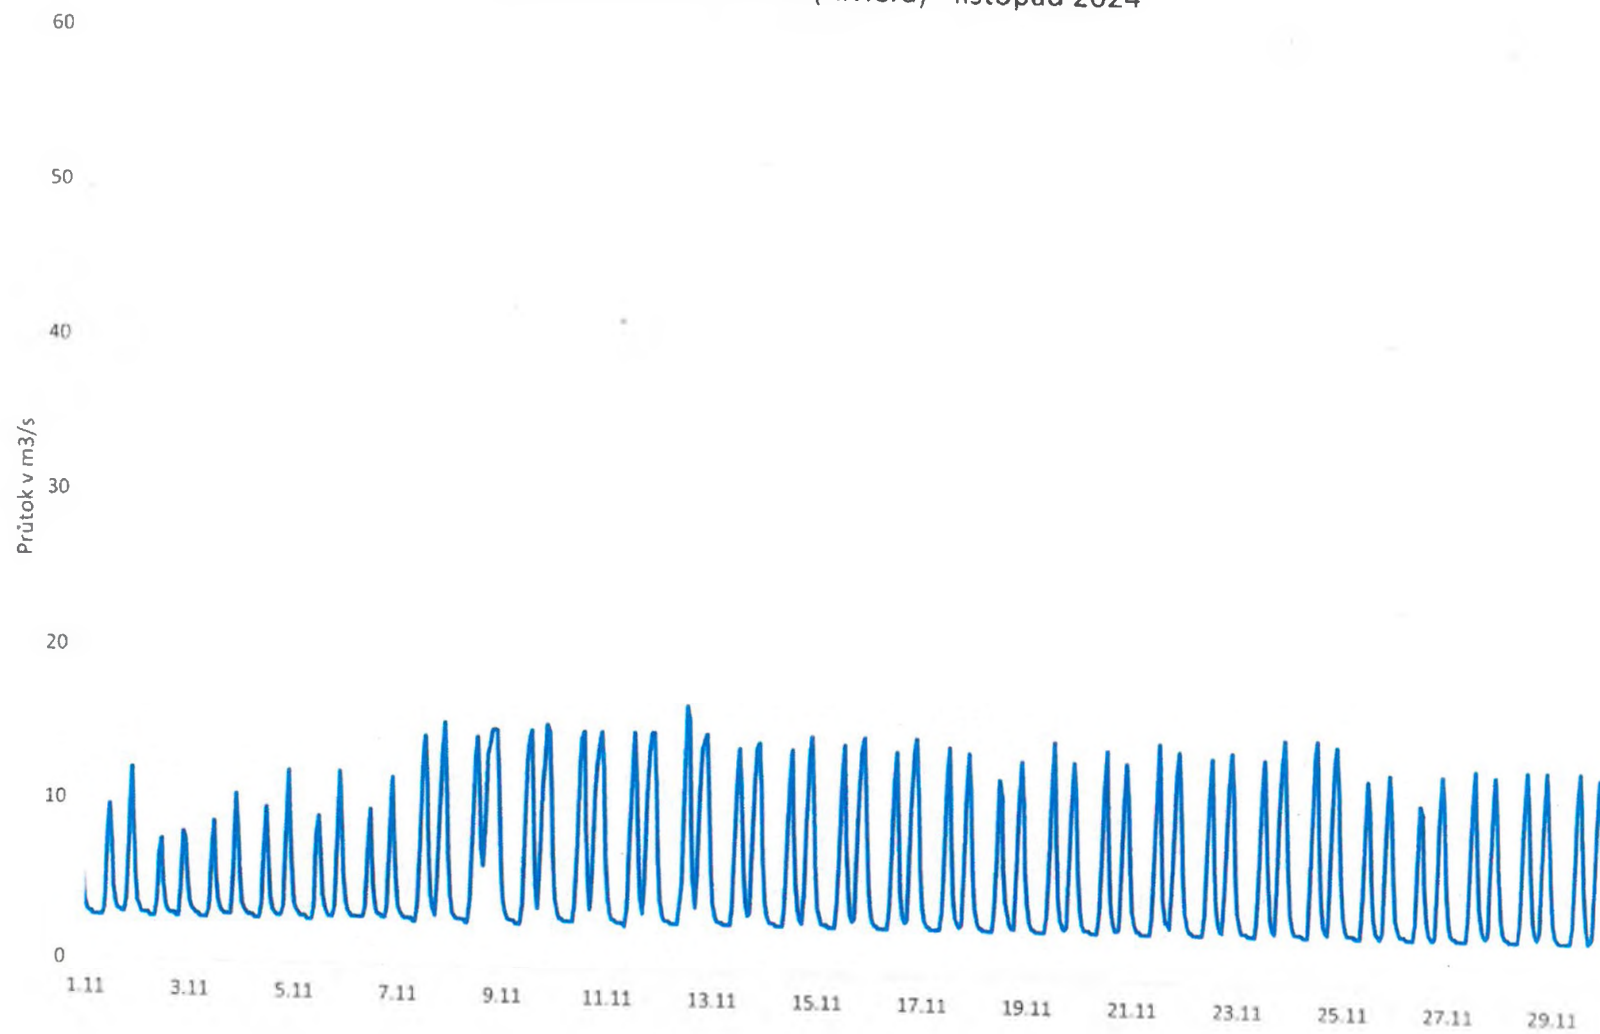

Svratka - Brno - Poříčí (Riviera) - prosinec 2024

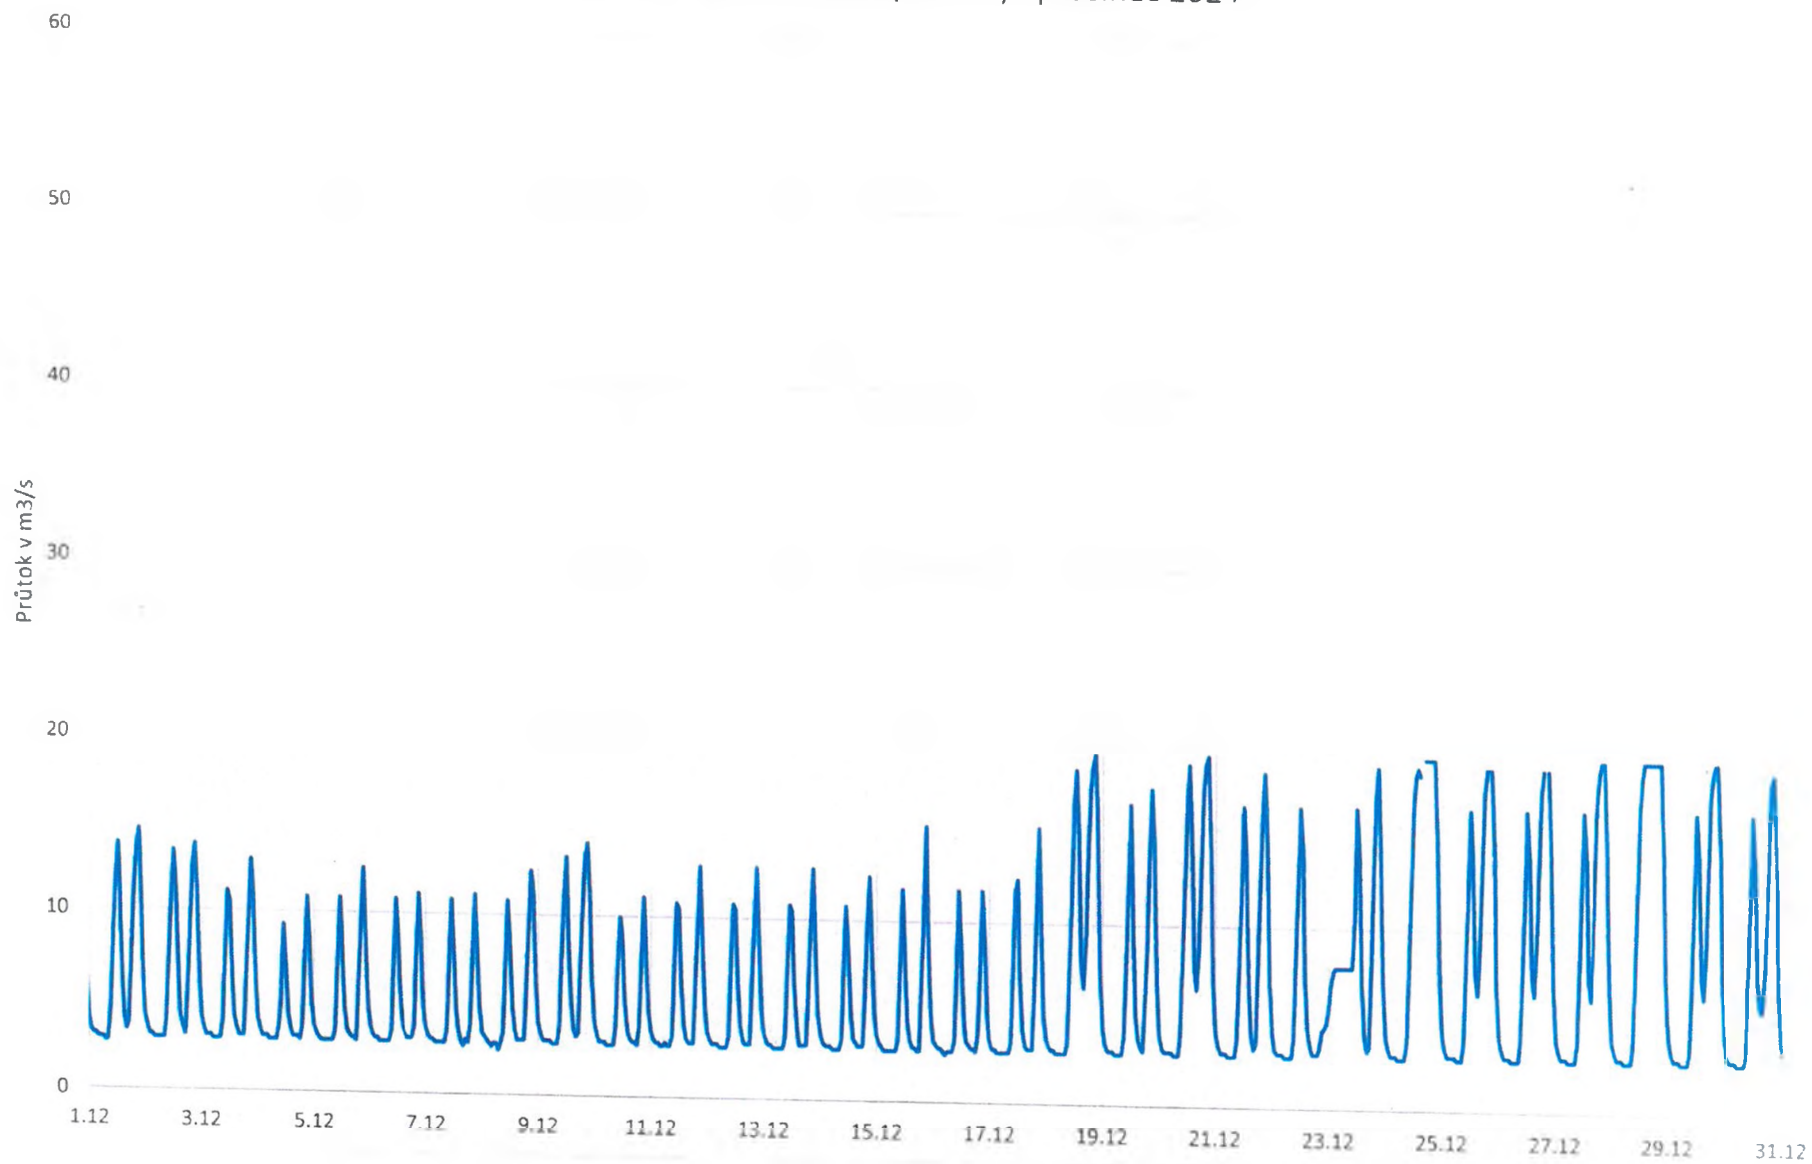

OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b
627 00 Brno

Váš dopis

Naše značka

Vyřizuje

Brno

25.11.2024

Zakázkové číslo: 20160382

Akce: „REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA BRNA – ETAPY VII A VIII“

Stanovisko projektanta

Vážení,

V průběhu stavby Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII požádal zástupce zhotovitele o vyjádření k důvodové zprávě změnového listu řešící čerpání vody z jímek především SO 07.07. Na základě tohoto požadavku sdělujeme k připomínkám zhotovitele následující:

- Během stavby došlo k řadě projekčních změn na základě objevených nových skutečností i skutečného stavu odkrytých stávajících konstrukcí v korytě řeky. Tyto změny společně s klimatickými vlivy měly vliv na dobu prací v jednotlivých jímkách a dobu jejich čerpání.
- Klimatické vlivy v průběhu roku včetně několika mimořádných, způsobily zvýšené průtoky ať už přímo, nebo manipulací přehrady a elektrárny, vedly k zaplavení jímek, případně byla omezena práce v jímkách, nebo byla omezena změna polohy jímek a tím prodloužena doba čerpání.
- Čerpání SO 07.08 Revitalizace v prostoru Červeného kopce, tzv. „Mokřad“ bylo uvažováno v rámci realizace koryta SO 07.07. Vlivem změn stavby, zvýšenými průtoky v korytě a vysokou propustností geologických vrstev společně se zvýšenými průtoky v korytě se ukázalo, že je nezbytné provádět snižování hladiny podzemní vody i v místě samotného objektu.

Závěr:

- Výše jmenované skutečnosti měly vliv na dobu a rozsah čerpání.



2-105

PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344)		Změnový list č. 105
ÚSEK: D_02 Revitalizace		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		PŘÍKAZ Č.:
SO 07.07 . Revitalizace řeky – úprava dna 37,055-39,910 km - Čerpání vody z jímek		
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Čerpání vody v rámci jímkování pro provedení úprav v toku DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.07 . Revitalizace řeky – úprava dna 37,055-39,910 km ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A- plus s.r.o. – ZL 105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.105“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: 1. SO 07.07- Revitalizace řeky – úprava dna 37,055-39,910. Tento stavební objekt je nutné během stavební činnosti zabezpečit odčerpáním vody. Po uzavření Dodatku č.4 došlo ke zvýšeným průtokům v řece Svratce v rámci nepředpokládané události se zásahem 3.osoby. Na základě uvedeného zhotovitel bude uplatňovat prostřednictvím ZL vícepráce (VCP) související s čerpáním vody z jímek během stavby v délce 83 dní NAVRHL: [REDACTED] PŘÍKAZ VYDAL: [REDACTED]		
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, BKOM, [REDACTED]	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, [REDACTED] [REDACTED]	

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344)		105												
ÚSEK: D 02 Revitalizace														
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: SO 07.07 . Revitalizace řeky – úprava dna 37,055-39,910 km - Čerpání vody z jímek														
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svatky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail														
PŘEDMĚT ZMĚNY: Čerpání vody v rámci jímkování pro provedení úprav v toku DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.07. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A plus s.r.o. – ZL 105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.105“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:														
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%; text-align: right;">DPH</th> <th style="width: 20%; text-align: right;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce SO 07.07:</td> <td style="text-align: right;">2.160 273,97 Kč</td> <td style="text-align: right;">453 657,53 Kč</td> <td style="text-align: right;">2 613 931,50 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem:</td> <td style="text-align: right;">2.160 273,97 Kč</td> <td style="text-align: right;">453 657,53 Kč</td> <td style="text-align: right;">2 613 931,50 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce SO 07.07:	2.160 273,97 Kč	453 657,53 Kč	2 613 931,50 Kč	Celkem:	2.160 273,97 Kč	453 657,53 Kč	2 613 931,50 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH											
Vícepráce SO 07.07:	2.160 273,97 Kč	453 657,53 Kč	2 613 931,50 Kč											
Celkem:	2.160 273,97 Kč	453 657,53 Kč	2 613 931,50 Kč											
PODPIS NAVRHOVATELE:														
VYJÁDRĚNÍ: OD: _____ PODPIS: _____ Sindlar s.r.o.														
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____														
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, BKOM, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI,														

Změnový list č.105. -KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Protipovodňová opatření města bma - etapa VII a VIII

Objekt

Soupis

KSCU

833 21 29

66-67

Datum:

Zadavatel

IC

Uchazeč

10

Projectant

IC

Zpracovatel

IC

Poznanika

Cena bez DPH

2 160 273 97

OPH

základní
SO 07.07.

Základ daně

2 160 273 97

Sazba daně
21.00%

Výše daně

453 657 53

0.00

Celkem

2 160 273.97

453 657.53

Cena & DPH

v

C7K

2 613 931 50

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

11/11/2011

Datum a podors

Razitko

Datum a podpis:

Razutko

Změnový list č.105. -KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Protipovodňová opatření města brna - etapa VII a VIII

Objekt

D_02 - Revitalizace

Soupis

03 - SO 07.07 Revitalizace řeky - úprava dna v km 37,055 - 39,910

KSO 833 21 29
Místo Nábřeží Svatky

CC-CZ
Datum

Zadavatel
Statutární město Brno

IČ 449 92 785
DIČ CZ44992785

Uchazeč
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVATKY - BRNO

IČ
DIČ

Projektant
A PLUS a.s.

IČ 262 36 419
DIČ CZ26236419

Zpracovatel
STAGA stavební agentura s.r.o

IČ 253 33 046
DIČ CZ25333046

Poznámka
Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu
práci/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a
úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH 2 160 273,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 160 273,97	21,00%	453 657,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 613 931,50

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

ZL č.105 - REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Protipovodňová opatření města Brna - etapa VII a VIII

Objekt

D_02 - Revitalizace

Soupis

03 - SO 07.07 Revitalizace řeky - úprava dna v km 37,055 - 39,910

Místo

Nábřeží Svatky

Datum

Zadavatel

Statutární město Brno

Projektant

A PLUS a.s.

Uchazeč

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVATKY - BRNO

Zpracovatel

STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
998 - Přesun hmot	2 160 273,97

Změnový list ,ZL č.105 -SOUPIS PRACÍ

Stavba

Protipovodňová opatření města brna - etapa VII a VIII

Objekt

D_02 - Revitalizace

Soupis

03 - SO 07.07 Revitalizace řeky - úprava dna v km 37,055 - 39,910

Místo

Nábřeží Svatky

Datum

Zadavatel

Statutární město Brno

Projektant

A PLUS a s

Uchazeč

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel

STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

37	K	RO51-2	Čerpání vody z jímek během stavby	kpl	1,000	9 500 000,00		
	PP		Čerpání vody z jímek během stavby					
	VV		včetně čerpadel, hadic, zdroje el. energie					
	VV		předpokládá se čerpání 24 h denně v celkové délce 365 dní					
	VV	1			1,000			
37	K	RO51-2	Čerpání vody z jímek během stavby	kpl	1,000	2 160 273,97	2 160 273,97	
	PP		Čerpání vody z jímek během stavby					
	VV		včetně čerpadel, hadic, zdroje el. energie					
	VV		poměrová část 365/507 = 0,71992 (988+115) dní x 0,71992 = 711,28 dní , délka 794 dní - 365- 346 = 83 dní					
	VV		výpočet převzatý ze ZL 84 prodloužení prací čerpání v období 21.2. - 15.6.2025 (95000000/346)*83		2160273,973			

Magistrát města Brna

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
Oddělení státní správy vodního hospodářství



SP. ZN.: OVLHZ/MMB/0316632/2022
Č. J.: MMB/0391311/2022

VYŘIZUJE:
TEL./E-MAIL:

Brno 27. 7. 2022

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (dále jen „Odbor VLHZ MMB“), jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

žadatelé (účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu):
OHLA ŽS, a.s., IČO 46342796, Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno
(dále jen „žadatel“)

vydává povolení

podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bodu 3 vodního zákona k nakládání s podzemními vodami – k čerpání podzemních vod ze stavebních výkopů za účelem snižování jejich hladiny v rámci stavby: „Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“,

v kraji Jihomoravském, ve městě Brně, na pozemcích:

k.ú. Štýřice	p.č. 192/1, 411, 412/1, 420/6, 640/1, 427/1, 385/2, 193/1, 193/2, 193/3, 207/50, 207/25, 136, 701/3, 764/1
k.ú. Staré Brno	p.č. 1408/1, 1630, 1680/1, 1388/1, 1388/2, 878/4, 878/1
k.ú. Pisárky	p.č. 889/3, 948/1, 1006/1, 889/2

v tomto rozsahu:

Průměrné povolené množství	10 l/s
Maximální povolené množství	20 l/s
Maximální měsíční povolené množství	25 000 m ³ /měsíc
Maximální roční povolené množství	300 000 m ³ /rok

Čerpání bude probíhat v průběhu stavby a čerpaná voda bude vypouštěna do významného vodního toku Svratka (ČHP 4-15-01-1530-0-00; IDVT 10100010, HGR 1643/6570).

Účel povoleného nakládání s vodami: snižování hladiny podzemní vody pro účely výstavby
Doba platnosti povolení se stanovuje do 31. 12. 2024.

Orientační určení polohy povolovaného nakládání s vodami v souřadnicovém systému S-JTSK:

	Y	X
ZÚ	598 355	1 162 076
KÚ	601 185	1 161 178

Pro povolení nakládání s vodami se podle ust. § 9 odst. 1 vodního zákona stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Čerpání podzemních vod bude prováděno v souladu s předloženým hydrogeologickým vyjádřením „22 0305 Brno – nábřeží Svatky, protipovodňová opatření, hg vyjádření“, které vypracovala Mgr. Pavlína Vylamová, odborná způsobilost v oboru hydrogeologie, č. 1710/2003, v červnu 2022.
2. Čerpání pozemních vod bude probíhat pod odborným dohledem hydrogeologa a sanačního geologa
3. Při čerpání nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Musí být rovněž zabráněno úniku těchto závadných látek do půdy nebo jejich smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
4. Žadatel bude dbát, aby při čerpání nepoškodil sousední majetek a dbát, aby nedocházelo k nadměrnému hluku, znečištění okolí stavby, ničení zeleně, poškozování majetku a k nepořádku. Veškeré škody způsobené při čerpání budou hrazeny na náklad žadatele.
5. Při čerpání podzemních vod musí být dodrženy požadavky společnosti Povodi Moravy, s.p., které byly dány ve vyjádření pod zn. PM-5282/2022/5203/Kr ze dne 7. 2. 2022:
 - Povodi Moravy, s.p., provozu Brno jako přímému správci vodního toku Svatka budou oznámeny konkrétní termíny zahájení a ukončení vypouštění do vodního toku včetně přímého kontaktu na zodpovědnou osobu; se zástupcem provozu budou také řešeny v průběhu prací případné technické detaily místa a způsobu vypouštění na jednotlivých lokalitách
 - vypouštění do vodního musí být řešeno tak, aby nedocházelo k poškozování koryta nebo břehů; pro vyloučení rozplavování a vzniku erozních rýh ve běhu toku je obecně optimální zaústění potrubí pod stálou hladinu toku; v případě vyššího vypouštěného množství nebo pokud bude zjištěno poškození vymíláním, bude koryto v místě vypouštění dočasně opevněno
 - provizorní vypouštěcí potrubí bude po ukončení vypouštění odstraněno z pozemků Povodi Moravy, s.p. a z průtočného profilu toku a dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu
 - v případě poškození koryta toku nebo pozemků ve správě Povodi Moravy, s.p. bude zhotovitel povinen odstranit vzniklé škody na vlastní náklady; způsob a rozsah technických úprav musí být odsouhlasen zástupce provozu
 - vypouštění čerpané vody musí splňovat podmínky Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. a nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových vod toku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách; kvalita vypouštěné vody bude průběžně vizuálně kontrolována pro včasné zjištění zhoršení kvality nebo kontaminace ze stavební mechanizace (ropný film, zápach)
 - bude minimalizováno vnášení plavenin do toku (především při čerpání přímo ze stavební jámy); v případě zvýšeného zakalení čerpané vody bude voda před vypuštěním do toku přefiltrována sedimentací

6. Záměr bude dokončen v termínu do 31. 12. 2024.
7. Po ukončení čerpání podzemních vod žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu ukončení čerpání a současně předloží závěrečnou písemnou zprávu o průběhu čerpání a závěrečnou zprávu oprávněného hydrogeologa, který dozoroval stavbu.

Odůvodnění

Odbor VLHZ MMB obdržel dne 7. 6. 2022 žádost žadatele.

Podle ust. § 115 vodního zákona a ust. § 47 správního řádu oznámil vodoprávní úřad Odboru VLHZ MMB zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům oznámením č.j. MMB/0340674/2022 ze dne 20. 6. 2022, s upozorněním, že k námítkám, které nebudou vzneseny nejpozději do 10 dnů ode dne doručení, nebude přihlédnuto, podle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona.

Dále vodoprávní úřad rovněž účastníky řízení upozornil ve smyslu ust. § 36, 37 a 38 správního řádu na právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, vyjádřit v řízení své stanovisko, navrhnout důkazy, nahlížet do spisu a činit jiné návrhy ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) Hydrogeologický posudek vypracovala [REDAKCE] odborná způsobilost v oboru hydrogeologie, č. 1710/2003, v červnu 2022.
- b) Podle stanoviska Povodí Moravy, s.p., pod zn. PM-5282/2022/5203/Kr ze dne 7. 2. 2022, je z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Dále se předpokládá, že záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.
- c) Správce recipientu – významného vodního toku Svratka, kterým je Povodí Moravy, s.p., dal svůj souhlas se záměrem svým vyjádřením zn. PM-5282/2022/5203/Kr ze dne 7. 2. 2022.
- d) Posouzení vodoprávního úřadu:
Vzhledem k tomu, že žadatelem navrhované řešení je technicky a ekonomicky zdůvodněné předloženou dokumentací a ostatními doklady, a nejsou ohroženy ani poškozeny vodohospodářské a ostatní veřejné zájmy ani dotčena práva účastníků, vyhověl vodoprávní úřad žádosti, jak je výše uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Odboru VLHZ MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

pověřená vedením
oddělení státní správy
vodního hospodářství

POČET LISTŮ: 2

OBDRŽÍ:

Účastníci řízení:

1. OHLA ŽS, a.s., Tufanka 1554/115b, 627 00 Brno – DS
2. statutární město Brno, zastoupené MČ Brno-střed - DS
3. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno - DS
4. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - DS
5. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno - DS
6. Spielberk Business Park, spol. s r.o., CTPark Humpolec 1571, 396 01 Humpolec - DS
7. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - DS
8. STAREZ - SPORT, a.s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno – DS
9. Sharingham s.r.o., Vídeňská 223/1, 639 00 Brno - DS

NA VĚDOMÍ:

Dotčené orgány:

10. ÚMČ Brno-střed, stavební úřad – DS
11. Odbor životního prostředí MMB – I

Ostatní:

12. Odbor majetkový MMB – I
13. Odbor správy majetku MMB – I
14. Odbor investiční MMB – I

