

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 0297/2024/SOD/OMI

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

**Město Beroun**  
Husovo nám. 68  
Beroun – Centrum  
266 01 Beroun

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

**POHL cz, a.s.**  
Na Pomezí 2483  
Roztoky  
252 63

dále jen „Zhotovitel“

#### Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy

- ve věcech smluvních:

Objednatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Zhotovitel: Ing. Rafael Moreno  
tel.: 737 256 584

ve věcech technických:

Objednatel: místostarosta Ing. Michal Mišina  
tel.: +420 311 654 112  
e-mail: [mstar.misina@muberoun.cz](mailto:mstar.misina@muberoun.cz)  
datová schránka: 2gubtq5

Zhotovitel: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
datová schránka: tbyfqgv

#### Bankovní spojení:

Objednatel:  
Banka: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 312271571/0300

Zhotovitel:  
banka ČSOB a.s. Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 117569233/0300 8850392/0800

Identifikační číslo: 00233129

IČO 25606468

Daňové identifikační číslo: CZ00233129

CZ25606468

Objednatel je plátcem DPH,

Zhotovitel je plátcem DPH

Plnění dle této smlouvy nebude použito v souvislosti s ekonomickou činností objednatele a plnění tak nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 4934

Název veřejné zakázky: „MŠ Máchovna, Beroun“

Místo stavby: k.ú. Beroun, parc.č. 1261/138, 1261/336, 1261/337, 1261/148, 1261/338, 1261/365, 1261/112.

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2024 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „MŠ Máchovna, Beroun“ (dále jen „smlouva“).

2. V souladu s čl. II, odst. 3, písm. c); čl. IV, odst. 5, písm. d); čl. IV, odst. 6 a čl. XIX smlouvy uzavírají účastníci smlouvy po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající v úpravě předmětu smlouvy a rozsahu díla dle čl. II smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce, a na to navazující změna ceny díla. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy.
2. Předmětem tohoto dodatku je dále nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající v aktualizaci časového harmonogramu postupu prací na základě skutečného zahájení doby plnění veřejné zakázky a v úpravě termínů kontrolních bodů specifikovaných v čl. III, odst. 1. c) smlouvy z důvodu nárůstu objemu prováděných prací, jež jsou předmětem tohoto dodatku a úprav díla plynoucích z podmínek dotace, přičemž původní doba pro dokončení díla zůstává zachována a nemění se. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy. Harmonogram, který je Přílohou č. 2 tohoto dodatku, nahrazuje harmonogram, který byl přílohou č. 1 smlouvy v plném rozsahu.
3. Tímto dodatkem se upravuje předmět smlouvy a rozsah díla dle čl. II smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce, jejichž přesný popis a ocenění je součástí změnových listů ZL č. 1 a ZL č. 2, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. Změny dle změnového listu ZL č. 1 byly provedeny v souladu s § 222 odst. 5 zákona, přičemž tyto práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejich provedení je nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů.
5. Změny dle změnového listu ZL č. 2 byly provedeny v souladu s § 222 odst. 7 zákona, přičemž nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
6. Vyčíslení změn závazku ze smlouvy na základě změnových listů ZL č. 1 a ZL č. 2, které jsou přílohou tohoto dodatku:

a) Cena díla dle smlouvy:

| Cena                       | Kč bez DPH               | Kč DPH                  | Kč s DPH                 |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Cena díla dle SoD          | 150.979.934,95 Kč        | 31.705.786,34 Kč        | 182.685.721,29 Kč        |
| Vyhrazená změna            | 13.500.000,00 Kč         | 2.835.000,00 Kč         | 16.335.000,00 Kč         |
| <b>CENA CELKEM DLE SOD</b> | <b>164.479.934,95 Kč</b> | <b>34.540.786,34 Kč</b> | <b>199.020.721,29 Kč</b> |

b) Úprava ceny dle změnových listů ZL č. 1 a ZL č. 2:

| Cena                                    | Kč bez DPH             | Kč DPH               | Kč s DPH               |
|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Vícepráce dle ZL č. 1                   | 2.079.060,41 Kč        | 436.602,69 Kč        | 2.515.663,10 Kč        |
| Méněpráce dle ZL č. 2                   | -260.240,82 Kč         | -54.650,58 Kč        | -314.891,40 Kč         |
| <b>Změna ceny dle ZL č. 1 a ZL č. 2</b> | <b>1.818.819,59 Kč</b> | <b>381.952,11 Kč</b> | <b>2.200.771,70 Kč</b> |

c) Celková cena ve znění dodatku č. 1:

| Cena                                | Kč bez DPH               | Kč DPH                  | Kč s DPH                 |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Cena díla dle dodatku č. 1          | 152.798.754,54 Kč        | 32.087.738,45 Kč        | 184.886.492,99 Kč        |
| Vyhrazená změna                     | 13.500.000,00 Kč         | 2.835.000,00 Kč         | 16.335.000,00 Kč         |
| <b>CENA CELKEM DLE DODATKU Č. 1</b> | <b>166.298.754,54 Kč</b> | <b>34.922.738,45 Kč</b> | <b>201.221.492,99 Kč</b> |

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek se vyhotovuje v elektronické formě.
4. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
5. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Beroun č. 191/60/RM/2025 dne 2. 4. 2025. Město Beroun prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
6. Přílohy  
Přílohou č. 1 jsou změnové listy ZL č. 1 a ZL č. 2  
Přílohou č. 2 je aktualizovaný časový harmonogram postupu prací

V Berouně dne elektronického podpisu

V Roztokách dne elektronického podpisu

Za objednatele:

**Město Beroun**

**RNDr. Soňa Chalupová**  
Digitálně podepsal  
RNDr. Soňa Chalupová  
Datum: 2025.04.22  
12:12:54 +02'00'

Starostka RNDr. Soňa Chalupová

Za zhotovitele:

**POHL cz, a.s.**

**Ing. Rafael Moreno**  
Digitálně podepsal  
Ing. Rafael Moreno  
Datum: 2025.04.17  
14:43:10 +02'00'

Ing. Rafael Moreno, člen představenstva



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                 |                                            |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY ModFond</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                 | číslo OZ: 1                                |                                            |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, Roztoky, 252 63 |                                 |                                            |                                            |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Město Beroun                                   | Datum: 18. 10. 2024             |                                            |                                            |
| Název akce: MŠ Máchovna, Beroun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                 |                                            |                                            |
| Způsob odeslání / předání<br>datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/>          | AIS SFŽP ČR x                              |
| Odkazy na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | specifikaci:                                   |                                 |                                            |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | na výkresy:                                    |                                 |                                            |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | na rozpočtové podklady:                        | příloha č.1                     |                                            |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | na jinou část smlouvy:                         |                                 |                                            |                                            |
| <b>Předmět změny:</b><br><br>Nutnost otevření výkopu u základových pasů a jejich rozšíření z důvodu možné montáže bednění. Zlepšování místního výkopku drceným kamenivem fr. 32/63 pro následný zpětný zásyp. Dále ZL obsahuje doplnění podkladního betonu na základě doporučení geologa, pro ochránění základové spáry. V rámci potvrzení požadavků DPS, zpracoval [REDAKCE] byl v rámci zemních prací přizván autorizovaný geolog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                 |                                            |                                            |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br><br>V projektové dokumentaci je postup základových pasů betonováním do rostlého terénu. Provedení armokošů základových pasů se ukázalo neproveditelné bez přístupu z boků. Postupy montáže byly diskutovány, variantní řešení konzultováno se statikem. Při dodržení konstrukčních zásad se nenašlo řešení bez umožnění přístupu z pasům z boku. V konstrukční části je předepsána výztuž v podkladním betonu, horní výztuž se nepromítla do výkazu výměr. Ochranný podkladní beton v tl. vrstvy 0,1 m je vynucená konstrukce na požadavek statika. Geolog upozornil ve své zprávě na pokles únosnosti podloží v případě zavllčení. V rozsahu stavby nelze ochránit základovou spáru bez vynucené přidané konstrukce. Změnový list má dopad na milník v harmonogramu prací, termín dokončení zemních prací a založení objektu, celková lhůta výstavby zůstává beze změny. |                                                |                                 |                                            |                                            |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | 5                               |                                            |                                            |
| Důvod vícepráce / méněpráce:<br><br>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                 |                                            |                                            |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | odstavec 5, § 222 x             | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává:<br><br>Město Beroun<br>Husovo nám. 68, Beroun – Centrum, 266 01 Beroun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                 |                                            |                                            |



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Technický dozor souhlasí s technologickým postupem vázání výztuže a nemá připomínky k požadavku statika.




**Stanovisko projektanta stavby:**

Hlavní inženýr projektu souhlasí s požadavky specialistů:

Statik: potvrdil, že není možné svařovat výztuž základových pasů, a proto jsou výkopy rozšířené a základové pasy betonovány do bednění. Pro zabránění znečištění výztuže musí být pod základy proveden podkladní beton.

Geolog: potvrdil způsob provádění zhutnění zásypové a obsypové zeminy dle požadavku statika.


*SOUHLASÍM*



**Stanovisko energetického specialisty:**

Změněný postup provádění základových pasů nemá vliv energetické uspořádání objektu.

*SOUHLASÍM*



Příloha:



Státní fond  
životního prostředí



Evropská  
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST ModFond</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | <b>číslo ZL: 1</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, Roztoky, 252 63</b> |                    |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                    |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p>Nutnost otevření výkopu u základových pasů a jejich rozšíření z důvodu možné montáže bednění. Zlepšování místního výkopku drceným kamenivem fr. 32/63 pro následný zpětný zásyp. Dále ZL obsahuje doplnění podkladního betonu na základě doporučení geologa, pro ochránění základové spáry. V rámci potvrzení požadavků DPS, zpracoval [redacted] byl v rámci zemních prací přizván autorizovaný geolog.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>V projektové dokumentaci je postup základových pasů betonováním do rostlého terénu. Provedení armokošů základových pasů se ukázalo neproveditelné bez přístupu z boků. Postupy montáže byly diskutovány, variantní řešení konzultováno se statikem. Při dodržení konstrukčních zásad se nenašlo řešení bez umožnění přístupu z pasům z boku. V konstrukční části je předepsána výztuž v podkladním betonu, horní výztuž se nepromítla do výkazu výměr. Ochranný podkladní beton v tl. vrstvy 0,1 m je vynucená konstrukce na požadavek statika. Geolog upozornil ve své zprávě na pokles únosnosti podloží v případě zvlhčení. V rozsahu stavby nelze ochránit základovou spáru bez vynucené přidané konstrukce. Změnový list má dopad na milník v harmonogramu prací, termín dokončení zemních prací a založení objektu, celková lhůta výstavby zůstává beze změny.</p> |                                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Počet připojených výkresů:                            |                    |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cena víceprací bez DPH:                               |                    |
| <b>0, - Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 079 060,41 Kč</b>                                |                    |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                   |                    |
| <b>2 079 060,41 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Konečný termín beze změny</b>                      |                    |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                    |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Podpis zmocněnce zhotovitele:                         |                    |
| Ing. Michal Mišina [redacted]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [redacted]                                            |                    |
| Datum: 10-04-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Datum: 08-01-2025 [redacted]                          |                    |

**Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č. 01 změna zakládání, zemní práce, podkladní beton

Objekt:

01 - ZL č. 01 - zemní práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 079 060,41

DPH základní  
snižená

Základ daně  
1 252 416,92  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
263 007,55  
0,00


Cena s DPH

v CZK

2 342 067,96

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel



Datum a podpis:

18. 10. 2024

Razítko



Datum a podpis:

18. 10. 2024

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba  
ZL č. 01 - změna zakládání, zemní práce, podkladní beton  
Objekt  
01 - ZL č. 01 - zemní práce

Místo:  
Datum: 30. 8. 2024  
Zadavatel:  
Projektant  
Zhotovitel:  
Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                           |    |           |              | 2 079 060,41      |                 |
| o HSV                  |     |           |                                                                                                                           |    |           |              | 1 993 728,82      |                 |
| D 1                    |     |           |                                                                                                                           |    |           |              | 923 919,83        |                 |
| 1                      | K   | 131251106 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně                               | m3 | 108,713   | 139,47       | 15 162,20         | SoD P.Č. 3      |
|                        | VV  |           | výkres č.D.1.1.b-1                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | podkladní beton pod desku                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 366,25*0,1                                                                                                                |    | 36,625    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 711,57*0,1                                                                                                                |    | 71,157    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                |    | 107,782   |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | VÝTAHOVÁ ŠACHTA                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | podkladní beton pod desku                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | od kóty -1,51 po kótu -1,36                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 9,31*0,1                                                                                                                  |    | 0,931     |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 132251104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně                  | m3 | 104,069   | 326,98       | 34 028,48         | SoD P.Č. 4      |
|                        | VV  |           | "D.1.1.b_02_1_výkopy půdorys.pdf                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | vodorovné pasy                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 7,7104395+13,41                                                                                                           |    | 21,120    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 0,7784235+0,68                                                                                                            |    | 1,458     |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 0,44634375+0,78                                                                                                           |    | 1,226     |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | svislé pasy                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 1,6544475+2,88                                                                                                            |    | 4,534     |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 14,214375+8,98                                                                                                            |    | 23,194    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 0,699867+1,22                                                                                                             |    | 1,920     |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 9,613033++3,87                                                                                                            |    | 13,483    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 1,51756875+2,64                                                                                                           |    | 4,158     |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 10,108+6,38                                                                                                               |    | 16,488    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 10,108+6,38                                                                                                               |    | 16,488    |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 132251253 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně                   | m3 | 340,771   | 326,98       | 111 425,30        | SoD P.Č. 5      |
|                        | VV  |           | "D.1.1.b_02_1_výkopy půdorys.pdf                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Vodorovné pasy                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 1,2679+7,61                                                                                                               |    | 8,878     |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 7,71401025+13,42                                                                                                          |    | 21,134    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 50,7927+32,08                                                                                                             |    | 82,873    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 52,101325+32,91                                                                                                           |    | 85,011    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 51,7719125+32,7                                                                                                           |    | 84,472    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 15,2899515+13,3                                                                                                           |    | 28,590    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 1,4665625+1,85                                                                                                            |    | 3,317     |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Svislé pasy                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 0,191+1,15                                                                                                                |    | 1,341     |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 0,976005+0,85                                                                                                             |    | 1,826     |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 6,723625+4,25                                                                                                             |    | 10,974    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 0,1275+0,77                                                                                                               |    | 0,898     |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 3,5874375+2,27                                                                                                            |    | 5,857     |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 3,4295+2,17                                                                                                               |    | 5,600     |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                       | m3 | 641,626   | 92,59        | 59 408,18         | SoD P.Č. 8      |
|                        | VV  |           | (((108,713+104,069+340,771)-168,391)/3)*2                                                                                 |    | 513,549   |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 128,077                                                                                                                   |    | 128,077   |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                    | m3 | 296,778   | 174,62       | 51 823,43         | SoD P.Č. 9      |
|                        | VV  |           | ((108,713+104,069+340,771)-168,391)/3                                                                                     |    | 128,387   |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | "výměra podkladní beton" 168,391                                                                                          |    | 168,391   |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 5 638,782 | 11,72        | 66 086,53         | SoD P.Č. 10     |
|                        | VV  |           | 296,778*19                                                                                                                |    | 5 638,782 |              |                   |                 |
| 7                      | M   | 58343959  | kamenivo drcené hrubé frakce 32/63                                                                                        | t  | 218,258   | 610,00       | 133 137,66        | CS URS 2024 02  |
|                        | VV  |           | ((108,713+104,069+340,771)-168,391)/3*1,7                                                                                 |    | 218,258   |              |                   |                 |
|                        | VV  |           |                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |





## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01  
Stavba: ZL č. 01 - změna zakládání; zemní práce; podkladní beton

KSO  
Místo:

CC-CZ  
Datum: 30. 8. 2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 079 060,41**

DPH základní  
Sazba daně 21,00%  
snížená 12,00%

Základ daně  
**1 252 416,92**  
**0,00**

Výše daně  
**263 007,55**  
**0,00**

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 342 067,96**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

**Stavba:** ZL č. 01 - změna zakládání; zemní práce; podkladní beton

Místo:

Datum: 30. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                                        | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                                              | <b>2 079 060,41</b> | <b>2 342 067,96</b> |
| 01                        | ZL01 - změna zakládání; zemní práce; podkladní beton; výztuž | 2 079 060,41        | 2 342 067,96        |



Evropská  
komise



Evropská  
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                            |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY ModFond</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | <b>číslo OZ: 2</b>                         |                                                                      |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, Roztoky, 252 63</b> |                                            |                                                                      |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Město Beroun</b>                                   | Datum: 9.12.2024                           |                                                                      |
| Název akce: <b>MŠ Máchovna, Beroun</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                            |                                                                      |
| Způsob odeslání / předání<br>datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | poštou <input type="checkbox"/>                       | e-mailem <input type="checkbox"/>          | AIS SFŽP ČR <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | specifikaci:                                          |                                            |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | na výkresy:                                           |                                            |                                                                      |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>příloha č.1</b>                                    |                                            |                                                                      |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                            |                                                                      |
| <b>Předmět změny:</b><br>Zárubně interiérových dveří.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                            |                                                                      |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Nahrazované zárubně Latente, šlo o zárubně zapuštěné se skrytými panty. Nově navržené jsou ocelové obložkové zárubně s přiznanými panty.<br>Změna vyvolána požadavkem objednatele hledání úspor.<br>Nově navržený typ zárubní představuje srovnatelný druh materiálu jako zárubně nahrazované.<br>Cena nových zárubní je nižší než cena původních zárubní. Nově navržené zárubně mají jednodušší profilaci zárubně a viditelné panty, poskytnou snazší údržbu a delší životnost. |                                                       |                                            |                                                                      |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 (příloha č.1) +3 (technické listy HSE)              |                                            |                                                                      |
| Důvod vícepráce / méněpráce:<br><br><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                            |                                                                      |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | odstavec 5, § 222                                     | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| Oznámení vydává:<br><br>Město Beroun<br>Husovo nám. 68, Beroun – Centrum, 266 01 Beroun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                            |                                                                      |



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Technický dozor souhlasí. Navržená změna nemá vliv na zkolaudování a bezpečné provozování stavby.




**Stanovisko projektanta stavby:**

Za podmínky dodržení části projektu PBŘ souhlasí.



**Stanovisko energetického specialisty:**

Tato změna nemá vliv na energetické provedení stavby.





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST ModFond</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | <b>číslo ZL: 2</b>         |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, Roztoky, 252 63</b>                                |                            |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                            |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25.2.2025                                                                            |                            |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:<br><br><b>Předmět změny:</b><br>Zárubně interiérových dveří.<br><br><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Nahrazované zárubně Latente, šlo o zárubně zapuštěné se skrytými panty. Nově navržené jsou ocelové obložkové zárubně s přiznanými panty.<br>Změna vyvolána požadavkem objednatele hledání úspor.<br>Nově navržený typ zárubní představuje srovnatelný druh materiálu jako zárubně nahrazované.<br>Cena nových zárubní je nižší než cena původních zárubní. Nově navržené zárubně mají jednodušší profilaci zárubně a viditelné panty, poskytnou snazší údržbu a delší životnost. |                                                                                      |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cena víceprací bez DPH:                                                              |                            |
| <b>-260 240,82 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,- Kč</b>                                                                        |                            |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |                            |
| <b>-260 240,82 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Konečný termín beze změny</b>                                                     |                            |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                            |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                            |
| Datum: 10-04-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Datum: 25-02-2025                                                                    |                            |

**Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

# SOUPIS PRACÍ


Stavba: ZL č. 02 - interiérové dveře - změna zárubní  
 Objekt: 02.1.- zárubně

Místo: Datum: 09.12.2024  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                               | MJ  | Množství | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK]  | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|--------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                     |     |          |              | <b>-260 240,82</b> |                 |
| D                             | PSV |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                 |     |          |              | -249 559,69        |                 |
| D                             | 766 |           | Konstrukce truhlářské                                                                                                               |     |          |              | -249 559,69        |                 |
| 1                             | M   | 61182307  | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm                                | kus | 24 000   | -14 868,26   | -356 838,24        | SoD p č 363     |
|                               | VV  |           | vykres č.D.1 1 b-20                                                                                                                 |     |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | viz. výpis vnitřní dveře - dřevěné                                                                                                  |     |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | "ozn. 1 1L/D - 700x2100mm, levé" 3                                                                                                  |     | 3 000    |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | "ozn. 1 1P/D - 700x2100mm, pravé" 3                                                                                                 |     | 3 000    |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | "ozn. 1 3L/D - 700x2100mm, levé" 1+1                                                                                                |     | 2 000    |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | "ozn. 1 3P/D - 700x2100mm, pravé" 1                                                                                                 |     | 1 000    |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | "ozn. 2 1L/D - 800x2100mm, levé" 3+3                                                                                                |     | 6 000    |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | "ozn. 2 2L/D - 800x2100mm, levé" 2                                                                                                  |     | 2 000    |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | "ozn. 2 2P/D - 800x2100mm, pravé" 3                                                                                                 |     | 3 000    |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | "ozn. 2 3L/D - 800x2100mm, levé" 1                                                                                                  |     | 1 000    |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | "ozn. 3 2P/D - 800x2100mm, pravé" 1+1                                                                                               |     | 2 000    |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | "ozn. 3 3P/D - 800x2100mm, pravé" 1                                                                                                 |     | 1 000    |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                              |     | 24 000   |              |                    |                 |
| 2                             | M   | 61182309  | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm                               | kus | 9 000    | -14 868,28   | -133 814,52        | SoD p č 365     |
|                               | VV  |           | vykres č.D.1 1 b-20                                                                                                                 |     |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | viz. výpis vnitřní dveře - dřevěné                                                                                                  |     |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | "ozn. 3 1L/D - 800x2100mm, levé" 6+3                                                                                                |     | 9 000    |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                              |     | 9 000    |              |                    |                 |
| 3                             | M   | 61182319  | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm        | kus | 9 000    | -13 532,52   | -121 792,68        | SoD p č 357     |
|                               | VV  |           | vykres č.D.1 1 b-20                                                                                                                 |     |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | viz. výpis vnitřních dveří - požárních                                                                                              |     |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | "ozn. 1 1L/po - 800x2100mm, levé" 3                                                                                                 |     | 3 000    |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | "ozn. 3L/PO - 700x2100mm, levé" 3                                                                                                   |     | 3 000    |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | "ozn. 2 1L/po - 900x2100mm, levé" 3                                                                                                 |     | 3 000    |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                              |     | 9 000    |              |                    |                 |
| 4                             | M   | 61182320  | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm        | kus | 5 000    | -12 744,10   | -63 720,50         | SoD p č 359     |
|                               | VV  |           | vykres č.D.1 1 b-20                                                                                                                 |     |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | viz. výpis vnitřních dveří - požárních                                                                                              |     |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | "ozn. 1 2P/PO - 800x2100mm, pravé" 2                                                                                                |     | 2 000    |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | "ozn. 2 2P/D - 800x2100mm, pravé" 3                                                                                                 |     | 3 000    |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                              |     | 5 000    |              |                    |                 |
| 5                             | M   | R-766-24  | zárubeň jednokřídlá smrková rámová tl stěny 75mm rozměru 900/1970mm - vnitřní dveře protipožární dveře osazené do obložkové zárubně | kus | 6 000    | -12 744,10   | -76 464,60         | SoD p č 361     |
|                               | VV  |           | vykres č.D.1 1 b-20                                                                                                                 |     |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | viz. výpis vnitřních dveří - požárních                                                                                              |     |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | - vnitřní dveře protipožární dveře osazené do obložkové zárubně                                                                     |     |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | "ozn. 2 3L/PO - 900x2100mm, levé" 2+2                                                                                               |     | 4 000    |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | "ozn. 2 3P/PO - 900x2100mm, pravé" 1+1                                                                                              |     | 2 000    |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                              |     | 6 000    |              |                    |                 |
| 6                             | M   | 61182307R | zárubeň ocelová jednokřídlá obložková s viditelným závěsem - tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm                        | kus | 24 000   | 10 159,59    | 243 830,16         | nová R položka  |
|                               | VV  |           | vykres č.D.1 1 b-20                                                                                                                 |     |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | viz. výpis vnitřní dveře - dřevěné                                                                                                  |     |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | "ozn. 1 1L/D - 700x2100mm, levé" 3                                                                                                  |     | 3 000    |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | "ozn. 1 1P/D - 700x2100mm, pravé" 3                                                                                                 |     | 3 000    |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | "ozn. 1 3L/D - 700x2100mm, levé" 1+1                                                                                                |     | 2 000    |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | "ozn. 1 3P/D - 700x2100mm, pravé" 1                                                                                                 |     | 1 000    |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | "ozn. 2 1L/D - 800x2100mm, levé" 3+3                                                                                                |     | 6 000    |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | "ozn. 2 2L/D - 800x2100mm, levé" 2                                                                                                  |     | 2 000    |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | "ozn. 2 2P/D - 800x2100mm, pravé" 3                                                                                                 |     | 3 000    |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | "ozn. 2 3L/D - 800x2100mm, levé" 1                                                                                                  |     | 1 000    |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | "ozn. 3 2P/D - 800x2100mm, pravé" 1+1                                                                                               |     | 2 000    |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | "ozn. 3 3P/D - 800x2100mm, pravé" 1                                                                                                 |     | 1 000    |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                              |     | 24 000   |              |                    |                 |
| 7                             | M   | 61182309R | zárubeň ocelová jednokřídlá obložková s viditelným závěsem - tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm                       | kus | 9 000    | 10 159,59    | 91 436,31          | nová R položka  |
|                               | VV  |           | vykres č.D.1 1 b-20                                                                                                                 |     |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |           | viz. výpis vnitřní dveře - dřevěné                                                                                                  |     |          |              |                    |                 |

| Č     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|       | VV  |           | "ozn 3 1L/D - 800x2100mm, levě" 6+3                                                                                                                           |     | 9,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                        |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 8     | M   | 61182319R | zárubeň ocelová jednokřídlá obložková s viditelným závěsem a protipožární úpravou tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm                            | kus | 9,000    | 8 823.85     | 79 414.65         | nová R položka  |
|       | VV  |           | vykres č.D.1.1 b-20                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | viz. výpis vnitřních dveří - požárních                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "ozn 1 1L/po - 800x2100mm, levě" 3                                                                                                                            |     | 3,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "ozn 3L/PO - 700x2100mm, levě" 3                                                                                                                              |     | 3,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "ozn 2 1L/po - 900x2100mm, levě" 3                                                                                                                            |     | 3,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                        |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 9     | M   | 61182320R | zárubeň ocelová jednokřídlá obložková s viditelným závěsem a protipožární úpravou tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm                            | kus | 5,000    | 8 035.43     | 40 177.15         | nová R položka  |
|       | VV  |           | vykres č.D.1.1 b-20                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | viz. výpis vnitřních dveří - požárních                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "ozn 1 2P/PO - 800x2100mm, pravě" 2                                                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "ozn 2 2P/D - 800x2100mm, pravě" 3                                                                                                                            |     | 3,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                        |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 10    | M   | R-766-24R | zárubeň ocelová jednokřídlá obložková s viditelným závěsem - tl stěny 75mm rozměru 900/2100mm - vnitřní dveře protipožární dveře osazené do obložkové zárubně | kus | 6,000    | 8 035.43     | 48 212.58         | nová R položka  |
|       | VV  |           | vykres č.D.1.1 b-20                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | viz. výpis vnitřních dveří - požárních                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | - vnitřní dveře protipožární dveře osazené do obložkové zárubně                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "ozn 2 3L/PO - 900x2100mm, levě" 2+2                                                                                                                          |     | 4,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "ozn 2 3P/PO - 900x2100mm, pravě" 1+1                                                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                        |     | 6,000    |              |                   |                 |
| D VRN |     |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                   |     |          | -10 681,13   |                   |                 |
| 11    | K   | VRN01R    | Vedlejší rozpočtové náklady dle SoD                                                                                                                           | %   | 4,280    | -2 495.59    | -10 681.13        | SoD VRN         |



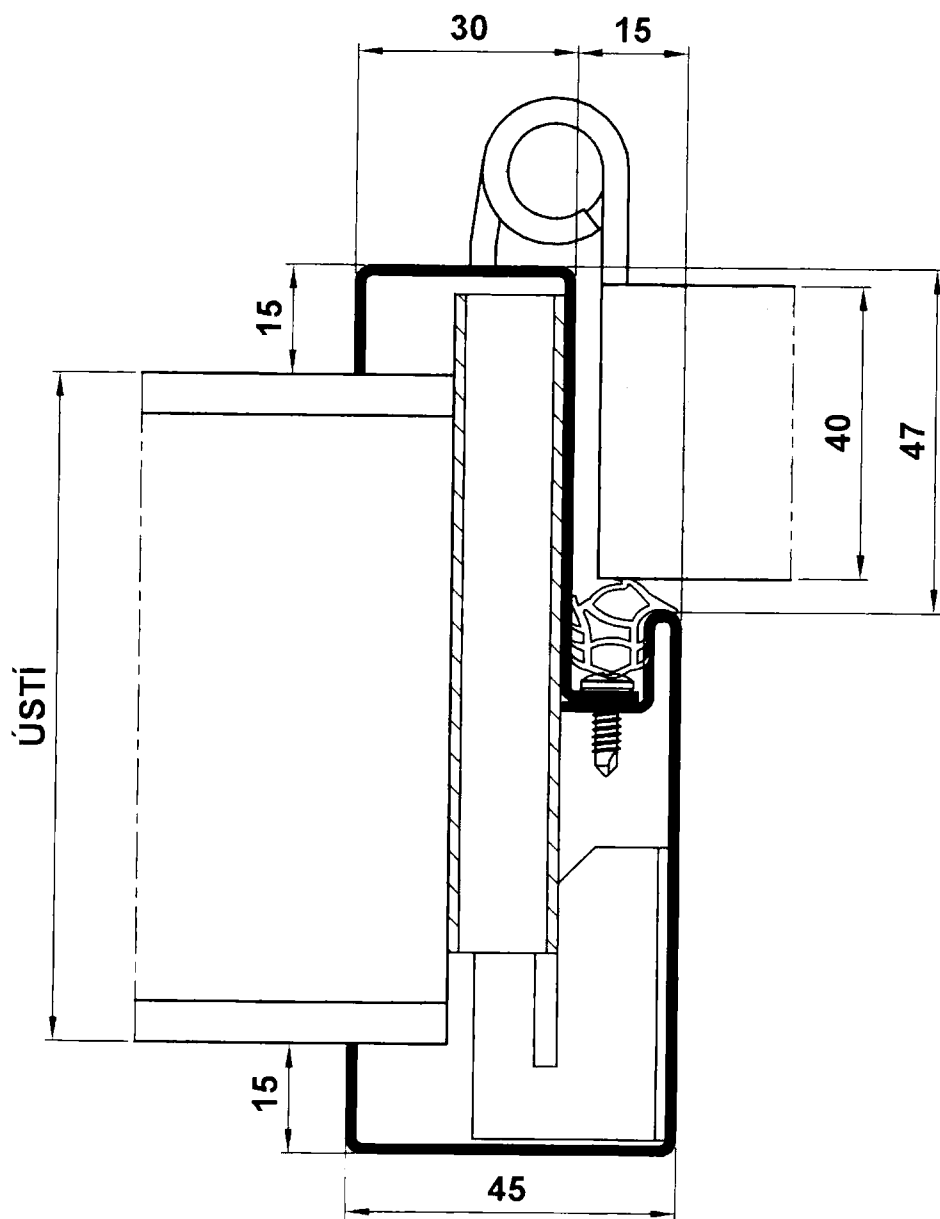

ST. FRANKL 187 8015 000 NET. ROZMĚRY 100 27/08 11.11.2023 100 27/08 11.11.2023

pozinkovaná ocel 1,5mm

MATERIAL

NÁZEV

DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TUPÁ - typ DZD-T

ČÍSLO V KRESL

MĚŘÍTKO



1:1

1:1

1:1

# 1. Introduction



1. The purpose of this document is to provide a clear and concise overview of the project's objectives, scope, and deliverables. It is intended to serve as a reference for all project stakeholders and to ensure that everyone is aligned on the project's goals and expectations.




2. The project is a critical component of the organization's strategic plan and is expected to deliver significant value to the business. It is a high-priority initiative that requires the full support and commitment of all project team members.

3. The project is a complex and multi-faceted endeavor that involves a wide range of stakeholders and resources. It is a challenging task that requires a high level of coordination and communication.

4. The project is a key driver of the organization's growth and success. It is a strategic initiative that is essential for the organization's long-term sustainability and competitive advantage.

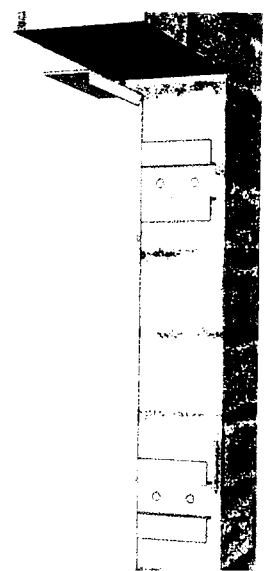



1. The first step in the process is to determine the location of the existing structure. This is done by using a surveying instrument to measure the distance from a known point to the structure. The distance is then used to determine the location of the structure.




2. The second step is to determine the height of the structure. This is done by using a surveying instrument to measure the angle of elevation from a known point to the top of the structure. The angle is then used to determine the height of the structure.

3. The third step is to determine the width of the structure. This is done by using a surveying instrument to measure the distance between two points on the structure. The distance is then used to determine the width of the structure.

4. The fourth step is to determine the area of the structure. This is done by using the measurements from the previous steps to calculate the area of the structure.



5. The fifth step is to determine the volume of the structure. This is done by using the measurements from the previous steps to calculate the volume of the structure.

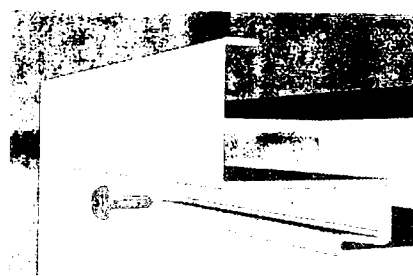

6. The sixth step is to determine the cost of the structure. This is done by using the measurements from the previous steps to calculate the cost of the structure.

## HMG MŠ Máchovna

| ID | Název úkolu                                                    | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | K | Č | 26.06. | 24.07. | S | Z | Ř | L | P | Ú | B | D | K | Č | Č | Příloha 2, 2025 | Příloha 1, 2025 | L | P | Ú | B |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|-----------------|---|---|---|---|
| 1  | nabýtní účinnosti smlouvy                                      | 0 dny       | 26.06.24 | 26.06.24  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 2  | předání a převzetí stavu                                       | 0 dny       | 24.07.24 | 24.07.24  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 3  | HTU+ ZS                                                        | 30 dny      | 24.07.24 | 03.09.24  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 4  | připojka kanalizace+ vo                                        | 5 dny       | 04.09.24 | 10.09.24  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 5  | hlavní trasy ležaté kanalizace+ referen                        | 30 dny      | 11.09.24 | 22.10.24  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 6  | základové pásy+ zemině                                         | 30 dny      | 09.10.24 | 19.11.24  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 7  | dokončení zemních prací (výkopky) a založení Vlastního říčního | 0 dny       | 17.12.24 | 17.12.24  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 8  | základ kanalizace+ rozvod vody                                 | 12 dny      | 13.11.24 | 28.11.24  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 9  | základová deska                                                | 20 dny      | 29.11.24 | 26.12.24  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 10 | spodní vodorovná hydroizolace                                  | 10 dny      | 27.12.24 | 09.01.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 11 | nosné kce I.NP                                                 | 37 dny      | 10.01.25 | 03.03.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 12 | nosné kce II.NP                                                | 37 dny      | 18.02.25 | 09.04.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 13 | dokončení monolitických kci                                    | 0 dny       | 21.05.25 | 21.05.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 14 | nenosné stěny                                                  | 14 dny      | 10.04.25 | 29.04.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 15 | parotěsná izolace střech                                       | 10 dny      | 28.04.25 | 09.05.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 16 | spodní hydroizolace sví                                        | 10 dny      | 10.04.25 | 23.04.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 17 | drénáž a zasyp objektu                                         | 14 dny      | 24.04.25 | 13.05.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 18 | ext. Vypíneň otvorů                                            | 20 dny      | 12.05.25 | 06.06.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 19 | lešení                                                         | 10 dny      | 09.06.25 | 20.06.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 20 | střecha- nosné kce technologie                                 | 10 dny      | 23.06.25 | 04.07.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 21 | střešní plášť                                                  | 80 dny      | 23.06.25 | 10.10.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 22 | FVE                                                            | 25 dny      | 13.10.25 | 14.11.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 23 | fasáda vč. ext. žaluzii                                        | 78 dny      | 07.07.25 | 22.10.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 24 | dokončení střešního plá                                        | 0 dny       | 21.11.25 | 21.11.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 25 | ext. Ocel schodiště                                            | 14 dny      | 23.10.25 | 11.11.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 26 | venkovní dlažba                                                | 20 dny      | 12.11.25 | 09.12.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 27 | čistě terénní úpravy                                           | 15 dny      | 10.12.25 | 30.12.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 28 | plot                                                           | 8 dny       | 31.12.25 | 09.01.26  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 29 | hrací prvky                                                    | 15 dny      | 12.01.26 | 30.01.26  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 30 | komunikace (park. Stán                                         | 45 dny      | 23.10.25 | 24.12.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 31 | hlavní trasy řemesel                                           | 50 dny      | 12.05.25 | 18.07.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 32 | int. Omítky                                                    | 30 dny      | 01.07.25 | 11.08.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 33 | podlahové topení                                               | 14 dny      | 29.07.25 | 15.08.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 34 | dokončení rozvodů a instalací bez koncových zařízení (bez      | 0 dny       | 12.09.25 | 12.09.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 35 | náhledových tras) mazaniny                                     | 14 dny      | 18.08.25 | 04.09.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 36 | dokončení vnitřních povrchových úprav (omítek) a hrubých výřeh | 0 dny       | 06.11.25 | 06.11.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 37 | int. Prosklené příčky                                          | 14 dny      | 19.09.25 | 08.10.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 38 | int. Prosklené příčky                                          | 8 dny       | 19.09.25 | 30.09.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 39 | obklady a dlažby                                               | 40 dny      | 19.09.25 | 13.11.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 40 | saniární příčky                                                | 5 dny       | 31.10.25 | 06.11.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 41 | podhledy                                                       | 40 dny      | 17.10.25 | 11.12.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 42 | gasro                                                          | 12 dny      | 26.11.25 | 11.12.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 43 | malby                                                          | 14 dny      | 12.12.25 | 31.12.25  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 44 | vinyl                                                          | 15 dny      | 05.01.26 | 23.01.26  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 45 | kompletace řemesla                                             | 11 dny      | 26.12.25 | 09.01.26  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 46 | int. Dveře                                                     | 7 dny       | 20.01.26 | 28.01.26  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 47 | úklid                                                          | 3 dny       | 29.01.26 | 02.02.26  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |
| 48 | předání a převzetí                                             | 22 dny      | 03.02.26 | 04.03.26  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |                 |   |   |   |   |

| Úkol      | Souhrn projektu | Neaktivní milník     | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | Konečný termín              |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Rozdělení | Vnější úkoly    | Neaktivní souhrn     | Ruční souhrn                           | Průběh                      |
| Mezník    | Vnější milník   | Ruční úkol           | Pouze zahájení                         | Průběh ručně zadáného úkolu |
| Souhrnný  | Neaktivní úkol  | Pouze s dobou trvání | Pouze s datem dokončení                |                             |
