

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátee)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.

Sídlo: Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 28606582

DIČ: CZ28606582

Zastoupená: 

na základě plné moci ze dne 11.12.2024

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. účtu: 4312807389/0800

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 4229

(dále jen „zhotovitel“)

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	poř. číslo	rel	dob. přílohy
Příloha 350				

II. Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 06.11.2024 smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/594/2024), jejímž předmětem je provedení havarijních oprav elektroinstalace (silnoproud) u IVC Ostrava-Přívoz po zatopení v 9/2024 (dále jen „smlouva o dílo“), kterou doplnily dodatkem č. 1 ze dne 11.12.2024 a dodatkem č. 2 ze dne 14.03.2025.
- Během plnění smlouvy o dílo Smluvní strany zjistily, že pro dokončení díla v celém jeho rozsahu je nutné provést opravu fasády budovy IVC na adrese Slovenská 1149/5, 702 00 Ostrava, kde se nachází místo plnění smlouvy o dílo. Bez této opravy nelze dílo provést původně dohodnutým způsobem. Tuto opravu zajistí na své náklady objednatel. V rámci opravy objednatel provede dokončení svrchní stěrky probarvené fasády vnějšího pláště budovy IVC. O dokončení opravy fasády bude objednatel zhotovitele neprodleně písemně informovat.
- Vzhledem k tomu, že potřeba opravy fasády ovlivňuje proveditelnost jen části díla sjednaného ve smlouvě o dílo, Smluvní strany sjednávají, že dílo bude předáno objednateli ve dvou etapách. První etapa díla v rozsahu specifikovaném přílohou č. 1 tohoto dodatku (dále jen „etapa č. 1“) bude objednateli předána nejpozději do 30.04.2025. Druhá etapa díla v rozsahu specifikovaném přílohou č. 1 tohoto dodatku (dále jen „etapa č. 2“) bude předána objednateli nejpozději do 2 měsíců od doručení písemné informace o dokončení opravy fasády podle poslední věty odst. 2 tohoto článku zhotoviteli. Zhotovitel je povinen obě etapy díla v uvedeném rozsahu a uvedených termínech objednateli předat, objednatel je povinen etapy převzít.
- Staveniště vrátí zhotovitel objednateli při předání etapy č. 2, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
- Záruční doba sjednaná ve smlouvě o dílo poběží vzhledem k částem díla předaným objednateli v jednotlivých etapách zvlášť. Tzn., vzhledem k části díla předané v etapě č. 1 poběží od předání etapy č. 1 objednateli, vzhledem k části díla předané v etapě č. 2 poběží od předání etapy č. 2 objednateli.

6. Pro vyloučení možných pochybností Smluvní strany sjednávají, v důsledku předání díla v etapách, jak je popsáno výše, objednatel vůči zhotoviteli nebude za dobu do uplynutí doby plnění etapy č. 2 uplatňovat smluvní pokutu podle čl. XIII. smlouvy o dílo; takovéto předání nepředstavuje vadu díla a zhotovitel se popsaným předáním díla po etapách nedostane do prodlení.
7. V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že je nutné opravit další poškozené a nefunkční komponenty elektrického výstroje budovy (např. brány a kryty rozvaděčů, viz změnový list č. 3), jejichž oprava však nebyla předmětem smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 tohoto dodatku. Tyto dodatečné stavební práce budou provedeny v rámci etapy č. 2. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.
8. Vzhledem k ceně víceprací specifikovaných v příloze č. 2 tohoto dodatku se mění celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo podle položkového rozpočtu je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

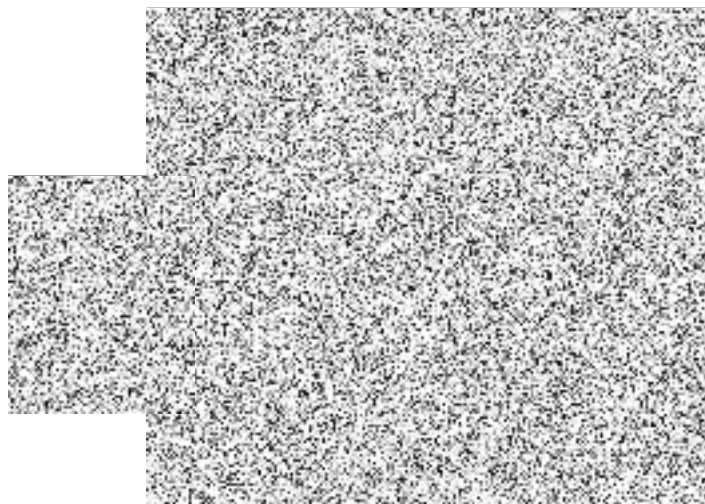
Cena bez DPH	4 597 434,00 Kč
DPH 21 %	965 461,14 Kč
Cena včetně DPH	5 562 895,14 Kč

9. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Specifikace etap a příloha č. 2 - změnový list č. 3 a soupis víceprací.

Podpisy smluvních stran:



užeb,

.....

za objednatele:

brig. gen. Ing. Radim Kuchař

ředitel

II ZS Moravskoslezského kraje

IVC Slovenská - rozpočet opravy po zaplavení při povodni 2024

Oprava elektro silnoproudu

Oprava elektrovýstroje NN rozvaděčů	Specifikace rozsahu viz tento rozpočet a dále viz samostatný podrobný popis rozsahu požadovaného plnění a prováděných činností
Oprava rozvaděčů a záložových UPS	
Oprava koncových prvků silnoproudu	

Hlavní SoD						
Pol.	Název položky	Počet	MJ	Cena za materiál	Cena za demontáž a montáž	ETAPA
1	Výměna výzbroje rozvaděče RS 13	1	kptl	99 428,30 Kč	76 020,00 Kč	Etapa I
2	Výměna výzbroje rozvaděče RM 1	1	kptl	34 571,40 Kč	32 613,00 Kč	Etapa I
3	Výměna výzbroje rozvaděče RS 1	1	kptl	46 618,90 Kč	51 366,00 Kč	Etapa I
4	Výměna výzbroje rozvaděče RS 11.1	1	kptl	81 483,80 Kč	58 779,00 Kč	Etapa I
5	Výměna výzbroje rozvaděče RS 11.2	1	kptl	55 723,40 Kč	64 281,00 Kč	Etapa I
6	Výměna výzbroje rozvaděče R-DP1	1	kptl	72 600,50 Kč	78 960,00 Kč	Etapa I
7	Výměna výzbroje rozvaděče HR 2 (pole č.1 a pole č.2 - Městská policie)	1	kptl	75 358,00 Kč	62 310,00 Kč	Etapa I
8	Výměna výzbroje rozvaděče R UPS (Městská policie)	1	kptl	42 620,00 Kč	38 560,00 Kč	Etapa I
9	Výměna výzbroje rozvaděče R UPS 1 (pole č.1 a pole č.2 - HZS)	1	kptl	63 231,00 Kč	39 655,00 Kč	Etapa I
10	Výměna výzbroje rozvaděče R UPS 2 (HZS)	1	kptl	34 058,00 Kč	18 569,00 Kč	Etapa I
11	Výměna kabeláže do 150 m v dimenzi CYKY 5x2,5, 3x2,5 a 3x1,5mm2 150 v každé zde uvedené	1	kptl	31 486,20 Kč	40 814,00 Kč	Etapa I
12	Dodávka UPS pro technologii PČR do 10kVA vč. rozv. Bypassu	1	kptl	0,00 Kč	0,00 Kč	Etapa I
13	Dodávka UPS pro technologii HZS do 15kVA vč. rozv. Bypassu	1	kptl	299 620,00 Kč	22 900,00 Kč	Etapa I
14	Dodávka UPS pro technologii MP do 10kVA vč. rozv. Bypassu	1	kptl	184 523,00 Kč	21 500,00 Kč	Etapa I
15	Výměna výzbroje rozvaděče RS 12	1	kptl	43 415,80 Kč	82 247,00 Kč	Etapa I
16	Výměna výzbroje rozvaděče pro venkovní hřiště RS V0	1	kptl	72 310,40 Kč	69 732,00 Kč	Etapa I
17	Přepětová zásuvka s optickou signalizací - 31ks	1	kptl	49 992,20 Kč	8 936,00 Kč	Etapa I
18	Zásuvka jednoduchá - 325ks	1	kptl	97 226,40 Kč	81 540,00 Kč	Etapa I
19	Rámeček jedno/dvou/trojnásobný - 20ks	1	kptl	4 987,80 Kč	5 100,00 Kč	Etapa I
20	Vypínač schodišťový - 83ks	1	kptl	19 012,80 Kč	17 440,00 Kč	Etapa I
21	Tlačítko s přepínacím kontaktem - 74ks	1	kptl	25 287,80 Kč	19 660,00 Kč	Etapa I
22	Tlačítko s doutnavkou orientační - 6ks	1	kptl	1 664,60 Kč	1 430,00 Kč	Etapa I
23	Tlačítko na povrch IP 44 - 16ks	1	kptl	4 324,80 Kč	4 980,00 Kč	Etapa I
24	Vypínač č.6 na povrch IP44 - 11ks	1	kptl	2 703,40 Kč	3 670,00 Kč	Etapa I
25	Vypínač č.5 na povrch IP44 - 3ks	1	kptl	659,00 Kč	600,00 Kč	Etapa I
26	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem - 3ks	1	kptl	765,00 Kč	780,00 Kč	Etapa I
27	Zásuvka PRAKTIK IP44 - 13ks	1	kptl	3 415,00 Kč	2 600,00 Kč	Etapa I
28	Venkovní kovové tlačítko IP66 na zeď vodotěsné - 5ks	1	kptl	4 098,40 Kč	1 620,00 Kč	Etapa I
29	Zásuvka 230/400V/16A 5kolík na panel - 4ks	1	kptl	2 899,90 Kč	2 210,00 Kč	Etapa I
30	Zásuvka na stěnu 32 A Společná 400 V - 5ks	1	kptl	8 904,60 Kč	2 310,00 Kč	Etapa I
31	Zásuvkové panelové rozvodnice - 18ks	1	kptl	149 513,00 Kč	45 320,00 Kč	Etapa I
32	Zásuvka na stěnu 16 A 5 pólová 400V, IP-44 - 16ks	1	kptl	4 892,00 Kč	4 950,00 Kč	Etapa I
33	Vačkový spínač v krytu I SEZ KR S25 JPD 1103 A6 - 2ks	1	kptl	2 947,80 Kč	1 244,00 Kč	Etapa I
34	Vačkový spínač s čelní deskou v krytu IP65, 10A - 1ks	1	kptl	1 550,40 Kč	492,00 Kč	Etapa I

35	Ovládací krabice 3SU1853-0AB00 - 3ks	1 kptl	13 728,20 Kč	3 109,00 Kč	Etapa I
36	Drobný instalační materiál	1 kptl	71 910,00 Kč	56 700,00 Kč	Etapa I
37	Doprava materiálů a techniků, přesuny hmot	1 kptl		130 000,00 Kč	Etapa I
38	Projektové řízení a inženýrská činnost	1 kptl		85 500,00 Kč	Etapa I
39	Zkoušky a oživení systému	1 kptl		88 200,00 Kč	Etapa I
40	Zaškolení obsluhy	1 kptl		20 000,00 Kč	Etapa I
41	Dokumentace skutečného stavu v elektronické podobě formou zaznamenání opravy ve stávající dokumentaci + 2 x tištěné paré	1 kptl		75 200,00 Kč	Etapa I
42	Revizní zprávy elektro	1 kptl		175 000,00 Kč	Etapa I
43	VRN (místní šetření, měření izolačních stavů, nutné koordinace s ostatními dodavateli, jako profese SLP, elektro, stavební, stavební přípomoc, úklid)	1 kptl	35 430 Kč	138 000,00 Kč	Etapa I
celková cena v Kč bez DPH				3 477 859 Kč	



Dodatek č.1					
Pol.	Popis činnosti	materiál	práce	Cena celkem bez DPH	ETAPA
1	Výměna výzbroje v rozvodných skříních sloupech venkovního osvětlení u hřiště - 4ks	9 990 Kč	6 660 Kč	16 650 Kč	Etapa I
2	Výměna zásuvkového boxu pro Wallbox u MP na venkovní fasádu, materiál, revizní zpráva, oprava projektové dokumentace	13 320 Kč	6 670 Kč	19 990 Kč	Etapa I
3	Osazování instalačních krabic KP pro vypínače a zásuvky u MP, PČR	2 000 Kč	29 290 Kč	31 290 Kč	Etapa I
4	Odpojování provizorních přívodů a zapojení do původního stavu u MP, PČR	0 Kč	19 970 Kč	19 970 Kč	Etapa I
5	Odstanění a ukončení kabeláže po dispečinku Klimkovičského tunelu	1 330 Kč	11 980 Kč	13 310 Kč	Etapa I
6	Doplnění výzbroje v rozvaděči RS12 (PČR)	57 520 Kč	12 650 Kč	70 170 Kč	Etapa I
7	Oprava Venkovního osvětlení komunikací	23 970 Kč	35 950 Kč	59 920 Kč	Etapa I
8	Oprava systému nouzového osvětlení - ZUMTOBEL včetně 2ks ovl. Panelu	63 910 Kč	58 590 Kč	122 500 Kč	Etapa I
9	Dodávka a montáž podlahových zásuvek u PČR 9ks včetně vnitřní výzbroje zás. 230V + 230V UPS + Dat. zás. RJ45 systém unica /demontáž stávajících, montáž nových, propojení kabeláže, zkoušky, revize	82 560 Kč	18 640 Kč	101 200 Kč	Etapa I
10	Přepojování UPS dle požadavku	6 660 Kč	13 320 Kč	19 980 Kč	Etapa I
11	Místnost sprchy a umývárny - výměna nefunkčního zařízení - 3ks rozvodné krabice včetně vybavení (zásuvky 230V včetně přípravy na 380 V), montáž kabeláže a kabelové trasy. Úprava dokumentace a revizní zpráva	21 470 Kč	16 410 Kč	37 880 Kč	Etapa I
celková cena v Kč bez DPH				512 860 Kč	

Dodatek č.2					
Pol.	Popis činnosti	Materiál	Práce	Cena celkem bez DPH	ETAPA
1	Osvětlení na budově světlo LED 5 x BVP165 LED157/840 PSU 150W	21 000 Kč	10 500 Kč	31 500 Kč	Etapa II
2	Osvětlení na budově světlo LED 16 x BVP167 LED36/830 40 65 PSU 30W	15 540 Kč	38 850 Kč	54 390 Kč	Etapa II
3	Osvětlení vchodu u MP, HZS a PČR nad dveřmi 8x LED se senzorem Capricorn, 5,5 W	8 400 Kč	16 800 Kč	25 200 Kč	Etapa II
4	Ochrana Waidmuler VPUAC 3+1 2x do rozvaděče za výtahovou šachtou	11 760 Kč	2 100 Kč	13 860 Kč	Etapa I
5	Vyhledávání přerušného kabelu na venkovním osvětlení	3 250 Kč	26 250 Kč	29 500 Kč	Etapa I
6	Oprava osvětlení Zumtobel - výměna a programování bez 3ks Touchpanelu	93 660 Kč	114 555 Kč	208 215 Kč	Etapa I
7	Oprava osvětlení Parkoviště PČR 7x LED na stožár 50W+ kabel, výkop	34 650 Kč	18 900 Kč	53 550 Kč	Etapa I
8	Oprava přívodů napájení pro venkovní žaluzie	33 600 Kč	49 850 Kč	83 450 Kč	Etapa I
Celková cena v Kč bez DPH				499 665 Kč	

Dodatek č.3					
Pol.	Popis činnosti	Materiál	Práce	Cena celkem bez DPH	ETAPA
1	Oprava ovládání žaluzií v kancelářích	1 800	10 800	12 600	<i>Etapa II</i>
2	Oprava svítidel ve vestibulu, oprava konstrukce svítidel	3 600	7 200	10 800	<i>Etapa II</i>
3	Dopojení antistatických podlah	1 200	5 000	6 200	<i>Etapa II</i>
4	Revizní zpráva pro rozvaděč R-VZT	0	9 500	9 500	<i>Etapa II</i>
5	Oprava kabeláže pro brány odstavného parkoviště	600	10 200	10 800	<i>Etapa II</i>
6	Rozebrání podhledů, identifikace příčin a výměna vadných ventilů u HZS; Oprava kabeláží pro technologii chlazení (RS31); Identifikace kabeláže a ukončení v místnosti dozorčího MP	8 500	45 900	54 400	<i>Etapa II</i>
7	Oprava krytů rozvaděčů	1 250	1 500	2 750	<i>Etapa II</i>
Celková cena v Kč bez DPH				107 050 Kč	

	Etapy pro rozsah: SoD + dodatek č. 1 + dodatek č.2 + dodatek č.3		Celkem v Kč bez DPH
	Cena celkem pro Etapu I :		4 379 294 Kč
	Cena celkem pro Etapu II :		218 140 Kč

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 03	
Identifikace akce: Provedení havarijních oprav elektroinstalace (silnoproud) Integrovaného výjezdového centra Ostrava- Přívoz po zatopení v rozsahu dle soupisu prací v příloze č. 1 této smlouvy.		
Název akce:	IVC Přívoz - provedení havarijních oprav elektroinstalace	
Číslo akce EDS/SMVS:		
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,	
Zhotovitel:	VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., Cihelní 1575/14 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava	
Projektant:		
Předmět změnového listu: Rozšíření předmětu plnění o další komponenty které se ukázaly jako poškozené a nefunkční a je tak nutno je opravit, resp. vyměnit, přitom nebyly předmětem smlouvou původně sjednaného plnění.		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Venkovní prostory (brány) Prostory 1 NP, Prostory 2 NP (kryty rozváděčů)		
Popis změny, popis technického řešení:		
Provedení dodatečných oprav v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele. Jedná se o soubor drobných změn, jejichž provedení nebylo možno předpokládat a přitom jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
Nové řešení:		
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVS:		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Původní hodnota díla dle dodatku č. 2 ke SML č. 594/2024 bez DPH:	4 490 384,00 Kč	
Méněpráce celkem bez DPH:	0,00 Kč	
Vícepráce celkem bez DPH:	107 050,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	107 050,00 Kč	
Hodnota díla po uzavření dodatku č. 3ke sml. dle tohoto ZL bez DPH	4 597 434,00 Kč	
DPH:	965 461,14 Kč	
Hodnota díla po uzavření dodatku č. 3 ke sml. dle tohoto ZL vč DPH:	5 562 895,14 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavebníka:
		
Datum:	Datum:	Datum:
	Za investora:	
	ČR – HZS MSK 	
	Datum:	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

Cenový souhrn nabídky

REKAPITULACE:

Pol.	Popis činnosti	Materiál	Práce	Celkem
1	Oprava ovládání žaluzií v kancelářích 1NP	1 800	10 800	12 600
2	Oprava svítidel ve vestibulu, oprava konstrukce svítidel	3 600	7 200	10 800
3	Dopojení antistatických podlah	1 200	5 000	6 200
4	Revizní zpráva pro rozvaděč R-VZT	0	9 500	9 500
5	oprava kabeláže pro brány odstavného parkoviště	600	10 200	10 800
6	Rozobraání podhledů, identifikace příčin a výměna vadných ventilů u HZS; Oprava kabeláží pro technologii chlazení (RS31); Identifikace kabeláže a ukončení v místnosti dozorčího MP	8 500	45 900	54 400
7	Oprava krytů rozvaděčů	1 250	1 500	2 750
Celková cena v Kč bez DPH				107 050 Kč

