


Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 28	
Komu: INV MHMP			Datum: 10.03.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 102 - Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Podolí Část 02 - Výstavba TT Podolské nábřeží		
na výkresy:		Přílohy 01,03, 05 a 06		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL28 – SO 102 - Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Podolí</u> <u>Část 02 - Výstavba TT Podolské nábřeží</u> V rámci zpracování RDS dochází k této změně oproti dokumentaci DVZ: - Práce a činnosti, které vyplynuly z nového požadavku DP hl. m. Prahy a následného pokynu Objednatele ze dne 6.12.2022 na výstavbu tramvajové trati v ulici Podolské nábřeží vč. zabudování výhybek a přípravy odbočení na novou trať na budovaný nový tramvajový most přes řeku Vltavu v předstihu před výstavbou mostu oproti postupu prací předpokládaném v Zadávací dokumentaci. - V rámci SO 102 jsou v této dílčí části RDS řešeny dočasné, krátkodobé a provizorní úpravy povrchů zpevněných ploch komunikací a chodníků, aby mohly být následně opět provozovány a využívány veřejným provozem do doby, než budou realizovány finální stavební úpravy spojené s dokončením stavby a navázáním ulice Podolské nábřeží na nový tramvajový most přes řeku Vltavu.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Novými požadavky DP hl.m. Prahy - Zpracováním podrobného řešení etapizace TT v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.				
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:		ZHOTOVITEL:	
				
Datum: 18.7.2023	Datum: 19.7.2023		Datum: 19.7.2023	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 028											
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 27.08.2024											
NOZ č. 028 navazuje na:	OZ č. 028	PZ č.												
Odesláno/ předáno:	osobně													
<u>ZL28 – SO 102 - Vozovky, chodníky a zpevněné plochy – Podolí,</u> <u>Část 02 - Výstavba TT Podolské nábřeží</u> Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 028). <u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.</u> Cena stavebních prací: <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>1 607 938,07 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>1 607 938,07 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>337 666,99 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>1 945 605,06 Kč</td> </tr> </table> Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - přehled nových položek v ZL č.028 - kalkulace pol.č. 02943a.R, - Příloha č. 1 Rozložení prací na dopracování a úpravu dokumentace RDS (po ZL028) - Příloha č. 02 Koordinační situace – Výstavba TT Podolské nábřeží					Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	1 607 938,07 Kč	Cena celkem	1 607 938,07 Kč	DPH 21 %	337 666,99 Kč	Cena včetně DPH	1 945 605,06 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč													
Cena přípočty	1 607 938,07 Kč													
Cena celkem	1 607 938,07 Kč													
DPH 21 %	337 666,99 Kč													
Cena včetně DPH	1 945 605,06 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): jeden milion šest set sedm tisíc devět set třicet osm korun českých sedm haléřů		Dopad do HMG: ANO												
(bez DPH)														
ZHOTOVITEL: 	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK: 												
														
STRABAG – DVORECKÝ MOST	Dvorecký most	Dvorecký most												
Datum: 4.9.2024	Datum:	Datum: 4.9.2024												

Stavba č. 42821 – Dvorecký most

Stanovisko AD k Návrhu ohodnocení změny č. 028

SO 102 – Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Podolí

Část 02 – Výstavba TT Podolské nábřeží


Autorský dozor bere na vědomí Návrh ohodnocení změny dle Změnového listu č. 28.

Popis a zdůvodnění změny byly doloženy v Oznámení změny č. 28, které bylo schváleno dne 19.7.2023


K ceně samotné se AD nevyjadřuje.

Ověření objemu provedených prací (tj. výměry provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou je odpovědností technického dozoru – příkazníka.

V Praze dne 30.9.2024



Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 028	
PoZ vystavil:		Datum: 22.11.2024	
PoZ č. 028 na NOZ č. 028		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 1 607 938,07 Kč bez DPH tj. 0,15 %, z toho: - odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 1 607 938,07 Kč bez DPH tj. 0,15 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací: viz F01, F02		Počet připojených výkresů: viz F01	
Změna ceny díla (bez DPH): 1 607 938,07 Kč		Provedení změny: 05/2023	
Nová cena díla (bez DPH): 1 193 671 114,94 Kč		Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 1 607 938,07 Kč	
Důvod ke změně: Nové požadavky DP hl. města Prahy. Zpracováním podrobného řešení etapizace TT v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP Ing. Petr Hankovec	Podpis zmocněnce Příkazníka Ing. Tomáš Krupka Společnost	Podpis zmocněnce Zhotovitele Ing. Robert Brož, Ph.D. Sdružení „TBR + FIRESTA

Stavba č. 42821 Dvorecký most				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 34	
Komu: INV MHMP			Datum: 07.11.2022		
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně	
Týká se:			SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:			SO 307 - Splašková přípojka - Podolí, Žluté lázně		
na výkresy:			Přílohy 1,2 a 4.3		
na rozpočtové podklady:			Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:			Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:			ANO		
kategorizace položek:			Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL34 – SO 307 - Splašková přípojka - Podolí, Žluté lázně</u> V rámci zpracování RDS dochází k těmto změnám oproti dokumentaci DVZ: - upřesnění délky kanalizace v rámci RDS – změna délky a skutečné pozice kanalizace - upřesnění druhu povrchu terénu dle skutečného polohového vedení kanalizace - upřesnění způsobu napojení na stávající systém splaškového odkanalizování a prostupu do čerpací jímky na základě místního šetření s provozním technikem Žlutých Lázní – nerezový propoj do čerpací jímky					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Zpracováním podrobného řešení v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.					
PŘÍKAZNÍK:		AUTORSKÝ DOZOR:		ZHOTOVITEL:	
					
D Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování návrhu na ocenění změny (NOZ). Neměly by být provedeny změny (PoZ).					

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 034											
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 19.06.2024											
NOZ č. 034 navazuje na:	OZ č. 034	PZ č.												
Odesláno/ předáno:	osobně													
<u>ZL34 – SO 307 - Splašková přípojka – Podolí, Žluté lázně</u> Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 034), V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy. Cena stavebních prací: <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>-19 453,32 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>66 309,88 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>46 856,56 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>9 839,88 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>56 696,44 Kč</td> </tr> </table> Seznam příloh/Počet listů příloh: - soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - kalkulace pol.č.21–02943.R - přehled nových položek v ZL č.034 - příloha č. 1 Rozložení prací na dopracování a úpravu dokumentace RDS (po ZL034)					Cena odpočty	-19 453,32 Kč	Cena přípočty	66 309,88 Kč	Cena celkem	46 856,56 Kč	DPH 21 %	9 839,88 Kč	Cena včetně DPH	56 696,44 Kč
Cena odpočty	-19 453,32 Kč													
Cena přípočty	66 309,88 Kč													
Cena celkem	46 856,56 Kč													
DPH 21 %	9 839,88 Kč													
Cena včetně DPH	56 696,44 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): čtyřicet šest tisíc osm set padesát šest korun českých padesát šest haléřů (bez DPH)		Dopad do HMG: ANO												
ZH	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:												
Datum: 7.8.2024		Datum:		Datum: 7.8.2024										

Stavba č. 42821 – Dvorecký most

Stanovisko AD k Návrhu ohodnocení změny č. 034

SO 307 – Splašková přípojka – Podolí, Žluté lázně


Autorský dozor bere na vědomí Návrh ohodnocení změny dle Změnového listu č. 34.

Popis a zdůvodnění změny byly doloženy v Oznámení změny č. 34, které bylo schváleno dne 13.9.2023.

K ceně samotné se AD nevyjadřuje.

Ověření objemu provedených prací (tj. výměry provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou je odpovědností technického dozoru – příkazníka.

V Praze dne 13.8.2024



Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 034	
PoZ vystavil:		Datum: 22.11.2024	
PoZ č. 034 na NOZ č. 034		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 46 856,56 Kč bez DPH tj. 0,00 %, z toho: - odpočty činí: -19 453,32 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 66 309,88 Kč bez DPH tj. 0,01 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 46 856,56 Kč	Provedení změny: 01-02/2023		
Nová cena díla (bez DPH): 1 193 717 971,50 Kč	Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 66 309,88 Kč		
Důvod ke změně: Zpracováním podrobného řešení v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Objednatel	Podpis zmocněnce Objednatel	Podpis zmocněnce Příkazníka	Podpis zmocněnce Zhotovitele
Datum:			

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 36	
Komu: INV MHMP			Datum: 15.03.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 412 - Veřejné osvětlení - Podolí, Část 01 - Výstavba TT Podolské nábřeží		
na výkresy:		Přílohy 1 a 3		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL36 – SO 412 - Veřejné osvětlení - Podolí,</u> <u>Část 01 - Výstavba TT Podolské nábřeží</u> V rámci zpracování RDS dochází k těmto změnám oproti dokumentaci DVZ: - Práce a činnosti, které vyplynuly z nového požadavku DP hl. m. Prahy na výstavbu tramvajové trati v ulici Podolské nábřeží vč. zabudování výhybek a přípravy odbočení na novou trať na budovaný nový tramvajový most přes řeku Vltavu v předstihu, před výstavbou mostu oproti postupu prací předpokládaném v Zadávací dokumentaci, nejdéle do 05/2023. - V rámci SO 412 jsou v této dílčí části RDS řešeny chráničky a schéma zapojení tak, aby nebylo v dalších etapách nutné kopat výkop mezi kolejemi. Protože je možné zbývající část objektu realizovat za více než rok, je nutné udržet v provozu veřejného osvětlení i dva sloupky VO/trakční přímo v projektované křižovatce včetně zajištění propojení na stávající stav.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Novými požadavky DP hl. m. Prahy na čas realizace (do 05/2023) úpravy TT Podolské nábřeží. - Zpracováním podrobného řešení etapizace TT v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.				
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:		
				
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro přípravu změny (PoZ).				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 036											
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 08.08.2024											
NOZ č. 036 navazuje na:	OZ č. 036	PZ č.												
Odesláno/ předáno:	osobně													
<u>ZL36 – SO 412 - Veřejné osvětlení – Podolí,</u> <u>Část 01 - Výstavba TT Podolské nábřeží</u> Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 036). V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy. Cena stavebních prací: <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>97 853,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>97 853,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>20 549,13 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>118 402,13 Kč</td> </tr> </table> Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk, sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk, sestava 3.6.21.9 Aspe) - Přehled nových položek v ZL č.036 - kalkulace pol.č. 101–02943.R - Příloha č.1 Rozložení prací na dopracování a úpravu dokumentace RDS (po ZL036)					Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	97 853,00 Kč	Cena celkem	97 853,00 Kč	DPH 21 %	20 549,13 Kč	Cena včetně DPH	118 402,13 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč													
Cena přípočty	97 853,00 Kč													
Cena celkem	97 853,00 Kč													
DPH 21 %	20 549,13 Kč													
Cena včetně DPH	118 402,13 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Dopad do HMG:												
devadesát sedm tisíc osm set padesát tři korun českých		ANO												
(bez DPH)														

Stavba č. 42821 – Dvorecký most

Stanovisko AD k Návrhu ohodnocení změny č. 036

SO 412 – Veřejné osvětlení - Podolí

Část 01 – Výstavba TT Podolské nábřeží

Autorský dozor bere na vědomí Návrh ohodnocení změny dle Změnového listu č. 36.

Popis a zdůvodnění změny byly doloženy v Oznámení změny č. 36, které bylo schváleno dne 13.9.2023.

K ceně samotné se AD nevyjadřuje.

Ověření objemu provedených prací (tj. výměry provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou je odpovědností technického dozoru – příkazníka.

V Praze dne 3.9.2024

In

TT



Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 036
PoZ vystavil:	Datum: 22.11.2024	
PoZ č. 036 na NOZ č. 036	na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí: 97 853,00 Kč bez DPH tj. 0,01 %, z toho: - odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 97 853,00 Kč bez DPH tj. 0,01 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.		
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů: viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 97 853,00 Kč	Provedení změny: 04/2023	
Nová cena díla (bez DPH): 1 193 815 824,50 Kč	Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 97 853,00 Kč	
Důvod ke změně: Novými požadavky DP hl. m. Prahy na čas realizace (do 05/2023) úpravy TT Podolské nábřeží. Zpracováním podrobného řešení etapizace TT v rámci RDS S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poznámka: 		
Datum:		

Stavba č. 42821 Dvorecký most				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 37	
Komu: INV MHMP				Datum: 07.03.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně	
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022			
Odkazy: na specifikaci:		SO 425 - Přípojka NN pro SSZ na křižovatce Podolské nábr. - Dvorecký most, Část 01 - Výstavba TT Podolské nábrží			
na výkresy:		Příloha 1 a 3			
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací			
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla			
dopad do HMG:		ANO			
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna			
<u>ZL37 – SO 425 - Přípojka NN pro SSZ na křižovatce Podolské nábr. - Dvorecký most,</u> <u>Část 01 - Výstavba TT Podolské nábrží</u> V rámci zpracování RDS dochází k této změně oproti dokumentaci DVZ: - Práce a činnosti, které vyplynuly z nového požadavku DP hl. m. Prahy na výstavbu tramvajové trati v ulici Podolské nábrží vč. zabudování výhybek a přípravy odbočení na novou trať na budovaný nový tramvajový most přes řeku Vltavu v předstihu, před výstavbou mostu oproti postupu prací předpokládaném v Zadávací dokumentaci, nejdéle do 05/2023. - V rámci SO 425 je v této dílčí části RDS řešeno položení přílehlých chrániček pro následné uložení kabelů pro SO 424, který je možné realizovat až následně.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Novými požadavky DP hl. m. Prahy na čas realizace (do 05/2023) úpravy TT Podolské nábrží. - Zpracováním podrobného řešení etapizace TT v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.					
PŘÍKAZNÍK:		AUTORSKÝ DOZOR:		ZHOTOVITEL:	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování návrhu na ocenění změny (NOZ). Nemí tedy Potvrzením změny (PoZ).					

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 037											
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 10.06.2024											
NOZ č. 037 navazuje na:	OZ č. 037	PZ č.												
Odesláno/ předáno:	osobně													
ZL37 – SO 425 - Přípojka NN pro SSZ na křižovatce Podolské nábf. - Dvorecký most, Část 01 - Výstavba TT Podolské nábreží Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 037). V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy. Cena stavebních prací: <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>-4 703,50 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>224 840,48 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>220 136,98 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>46 228,77 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>266 365,75 Kč</td> </tr> </table> Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Přehled nových položek v ZL č.037 - kalkulace pol.č. 02943.R, - Příloha č. 1 Rozložení prací na dopracování a úpravu dokumentace RDS (po ZL037)					Cena odpočty	-4 703,50 Kč	Cena přípočty	224 840,48 Kč	Cena celkem	220 136,98 Kč	DPH 21 %	46 228,77 Kč	Cena včetně DPH	266 365,75 Kč
Cena odpočty	-4 703,50 Kč													
Cena přípočty	224 840,48 Kč													
Cena celkem	220 136,98 Kč													
DPH 21 %	46 228,77 Kč													
Cena včetně DPH	266 365,75 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): dvě stě dvacet tisíc jedno sto třicet šest korun českých devadesát osm haléřů (bez DPH)		Dopad do HMG: ANO												

ZHO

—

Sc

STR

Dat

Stavba č. 42821 – Dvorecký most

Stanovisko AD k Návrhu ohodnocení změny č. 037

SO 425 – Přípojka NN pro SSZ na křižovatce Podolské nábřeží - Dvorecký most

Část 01 – Výstavba TT Podolské nábřeží

Autorský dozor bere na vědomí Návrh ohodnocení změny dle Změnového listu č. 37

Popis a zdůvodnění změny byly doloženy v Oznámení změny č. 37, které bylo schváleno dne 13.9.2023

K ceně samotné se AD nevyjadřuje.

Ověření objemu provedených prací (tj. výměry provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou je odpovědností technického dozoru – příkazníka.

V Praze dne 30.9.2024



Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 037
PoZ vystavil:	Datum: 22.11.2024	
PoZ č. 037 na NOZ č. 037	na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:	osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí: 220 136,98 Kč bez DPH tj. 0,02 %, z toho: - odpočty činí: - 4 703,50 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 224 840,48 Kč bez DPH tj. 0,02 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.		
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů: viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 220 136,98 Kč	Provedení změny: 03-04/2023	
Nová cena díla (bez DPH): 1 194 035 961,48 Kč	Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 224 840,48 Kč	
Důvod ke změně: Novými požadavky DP hl. m. Prahy na čas realizace (do 05/2023) úpravy TT Podolské nábřeží. Zpracováním podrobného řešení etapizace TT v rámci RDS S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poznámky:		
Datum:	05-06-2025	

Stavba č. 42821 Dvorecký most				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 38	
Komu: INV MHMP			Datum: 15.03.2023		
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně	
Týká se:			SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 611 - Tramvajová trať, Část 01 - Výstavba TT Podolské nábřeží			
na výkresy:		Příloha 1, 2 a 8			
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací			
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla			
dopad do HMG:		ANO			
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna			
<u>ZL38 – SO 611 - Tramvajová trať,</u> <u>Část 01 - Výstavba TT Podolské nábřeží</u> V rámci zpracování RDS dochází k těmto změnám oproti dokumentaci DVZ: - Práce a činnosti, které vyplynuly z nového požadavku DP hl. m. Prahy na výstavbu tramvajové trati v ulici Podolské nábřeží vč. zabudování výhybek a přípravy odbočení na novou trať na budovaný nový tramvajový most přes řeku Vltavu v předstihu, před výstavbou mostu oproti postupu prací předpokládaném v Zadávací dokumentaci, nejdéle do 05/2023. - V rámci SO 611 je v této dílčí části RDS řešeno rozdělení konstrukcí tak, aby se v této etapě zřídilo vše, co zasahuje do stávající profilu tramvajové trati, tj. zejména přímé koleje, 6x výměny a části spojovacích oblouků. - Dále došlo k těmto dílčím změnám: úprava odvodnění kolejí s ohledem na skutečnost, že kalové jímky (SO 612) jsou nově navrženy mimo tramvajové těleso; všech šest výměn bude uzamčeno do přímého směru (do doby uvedení trati přes most do provozu); stávající obrubníky podél vozovky do centra a částečně i podél vozovky z centra budou vyrovnány do výšky definitivního povrchu TT; před a za koncem úprav kolejí budou stávající obrubníky upraveny do sklopené polohy, která následně umožní dočasné převedení automobilové dopravy na koleje (v konečné fázi bude tato úprava obrub zrušena).					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Novými požadavky DP hl. m. Prahy na čas realizace (do 05/2023) úpravy TT Podolské nábřeží. - Zpracováním podrobného řešení etapizace TT v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.					
PŘÍKAZNÍK	AUTORSKÝ DOZOR		ZHOTOVITEL		
Datum: Totální změny (P6Z).					
Datum: Totální změny (P6Z).					

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 038											
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 13.08.2024											
NOZ č. 038 navazuje na:	OZ č. 038	PZ č.												
Odesláno/ předáno:	osobně													
<u>ZL38 – SO 611 - Tramvajová trať,</u> <u>Část 01 - Výstavba TT Podolské nábřeží</u>														
Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 038). V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy. Cena stavebních prací: <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>-16 925,33 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>1 395 081,94 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>1 378 156,61 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>289 412,89 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>1 667 569,50 Kč</td> </tr> </table> Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Přehled nových položek v ZL č.038 - kalkulace pol.č. 02943.R, - Příloha č. 1 Rozložení prací na dopracování a úpravu dokumentace RDS (po ZL038)					Cena odpočty	-16 925,33 Kč	Cena přípočty	1 395 081,94 Kč	Cena celkem	1 378 156,61 Kč	DPH 21 %	289 412,89 Kč	Cena včetně DPH	1 667 569,50 Kč
Cena odpočty	-16 925,33 Kč													
Cena přípočty	1 395 081,94 Kč													
Cena celkem	1 378 156,61 Kč													
DPH 21 %	289 412,89 Kč													
Cena včetně DPH	1 667 569,50 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): jeden milion tři sta sedmdesát osm tisíc jedno sto padesát šest korun českých šedesát jeden haléřů (bez DPH)		Dopad do HMG: ANO												
Z S I														

Stavba č. 42821 – Dvorecký most

Stanovisko AD k Návrhu ohodnocení změny č. 038

SO 611 – Tramvajová trať

Část 01 – Výstavba TT Podolské nábřeží


Autorský dozor bere na vědomí Návrh ohodnocení změny dle Změnového listu č. 38.

Popis a zdůvodnění změny byly doloženy v Oznámení změny č. 38, které bylo schváleno dne 13.9.2023

K ceně samotné se AD nevyjadřuje.

Ověření objemu provedených prací (tj. výměry provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou je odpovědností technického dozoru – příkazníka.

V Praze dne 30.9.2024

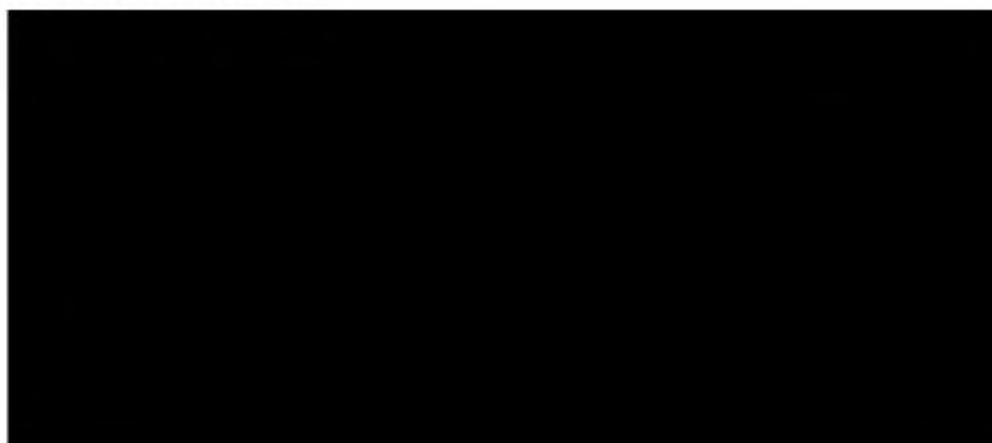

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 038
PoZ vystavil:	Datum: 22.11.2024	
PoZ č. 038 na NOZ č. 038	na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:	osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí: 1 378 156,61 Kč bez DPH tj. 0,13 %, z toho: - odpočty činí: - 16 925,33 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 1 395 081,94 Kč bez DPH tj. 0,13 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.		
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů: viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 1 378 156,61 Kč	Provedení změny: 04-05/2023	
Nová cena díla (bez DPH): 1 195 414 118,09 Kč	Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 1 395 081,94 Kč	
Důvod ke změně:		
Novými požadavky DP hl. m. Prahy na čas realizace (do 05/2023) úpravy TT Podolské nábřeží. Zpracováním podrobného řešení etapizace TT v rámci RDS S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poznámka:		

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 38a	
Komu: INV MHMP			Datum: 05.05.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
		Týká se:	SOD č. DIL/21/06/007480/2022	
Odkazy: na specifikaci:		SO 611 - Tramvajová trať, Část 01 - Výstavba TT Podolské nábreží		
na výkresy:		Vyjádření TDI ze dne 24.4.2023 Zajištění výměn, Potvrzení mechanické demontáže a montáže v trati od spol. Pražská Strojírna ze dne 5.5.2023		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL38a – SO 611 - Tramvajová trať,</u> <u>Část 01 - Výstavba TT Podolské nábreží</u> V rámci zpracování RDS dochází k těmto změnám oproti dokumentaci DVZ: - Práce a činnosti, které vyplynuly z nového požadavku DP hl. m. Prahy na výstavbu tramvajové trati v ulici Podolské nábreží vč. zabudování výhybek a přípravy odbočení na novou trať na budovaný nový tramvajový most přes řeku Vltavu v předstihu, před výstavbou mostu oproti postupu prací předpokládaném v Zadávací dokumentaci, nejdéle do 05/2023. - V souvislosti s Oznámením změny č. 38 a na požadavek DP hl. m. Prahy, Správy TT na pevné zajištění výměn v přímém směru bylo nutné provést demontáž částí vybavení výhybkových skříní konkrétně pohonů, tlumičů a soustav táhel. Dále bylo na jejich místo nutné zabudovat zajišťovací táhla, která mají funkci pevného zajištění polohy směru jízdy.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Novými požadavky DP hl. m. Prahy na čas realizace (do 05/2023) úpravy TT Podolské nábreží. - Požadavky DP hl. m. Prahy, Správy TT na pevné zajištění výměn v přímém směru. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 038a											
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 13.08.2024											
NOZ č. 038a navazuje na:	OZ č. 038a	PZ č.												
Odesláno/ předáno:	osobně													
<u>ZL38a – SO 611 - Tramvajová trať.</u> <u>Část 01 - Výstavba TT Podolské nábřeží – zajištění výhybek</u> Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 038a). <u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.</u> Cena stavebních prací: <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>114 540,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>114 540,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>24 053,40 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>138 593,40 Kč</td> </tr> </table> Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Přehled nových položek v ZL č.038a - CN pro kalkulaci pol.č.539520a.R - kalkulace pol.č.539520a.R,					Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	114 540,00 Kč	Cena celkem	114 540,00 Kč	DPH 21 %	24 053,40 Kč	Cena včetně DPH	138 593,40 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč													
Cena přípočty	114 540,00 Kč													
Cena celkem	114 540,00 Kč													
DPH 21 %	24 053,40 Kč													
Cena včetně DPH	138 593,40 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): jedno sto čtrnáct tisíc pět set čtyřicet korun českých (bez DPH)		Dopad do HMG: ANO												
Z S I														

Stavba č. 42821 – Dvorecký most

Stanovisko AD k Návrhu ohodnocení změny č. 038a

SO 611 – Tramvajová trať

Část 01 – Výstavba TT Podolské nábřeží


Autorský dozor bere na vědomí Návrh ohodnocení změny dle Změnového listu č. 38a.

Popis a zdůvodnění změny byly doloženy v Oznámení změny č. 38a, které bylo schváleno dne 25.10.2023

K ceně samotné se AD nevyjadřuje.

Ověření objemu provedených prací (tj. výměry provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou je odpovědností technického dozoru – příkazníka.

V Praze dne 30.9.2024




Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 038a	
PoZ vystavil:		Datum: 22.11.2024	
PoZ č. 038a na NOZ č. 038a		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí: 114 540,00 Kč bez DPH tj. 0,01 %, z toho: - odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 114 540,00 Kč bez DPH tj. 0,01 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 114 540,00 Kč	Provedení změny: 05/2023		
Nová cena díla (bez DPH): 1 195 528 658,09 Kč	Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 114 540,00 Kč		
Důvod ke změně:			
Novými požadavky DP hl. m. Prahy na čas realizace (do 05/2023) úpravy TT Podolské nábřeží. Požadavky DP hl. m. Prahy, Správy TT na pevné zajištění výměn v přímém směru. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
		TA KY	
		05-06-2025	22.11.2024

Stavba č. 42821 Dvorecký most				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 39	
Komu: INV MHMP				Datum: 29.03.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně	
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022			
Odkazy: na specifikaci:		SO 612 - Odvodnění Tramvajové trati, Část 01 - Výstavba TT Podolské nábřeží			
na výkresy:		Příloha 1 a 2			
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací			
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla			
dopad do HMG:		ANO			
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna			
<u>ZL39 – SO 612 – Odvodnění tramvajové trati,</u> <u>Část 01 - Výstavba TT Podolské nábřeží</u> V rámci zpracování RDS dochází k těmto změnám oproti dokumentaci DVZ: - Práce a činnosti, které vyplynuly z nového požadavku DP hl. m. Prahy na výstavbu tramvajové trati v ulici Podolské nábřeží vč. zabudování výhybek a přípravy odbočení na novou trať na budovaný nový tramvajový most přes řeku Vltavu v předstihu, před výstavbou mostu oproti postupu prací předpokládaném v Zadávací dokumentaci, nejdéle do 05/2023. - V rámci SO 612 je v této dílčí části RDS řešeno upřesnění napojovacích míst na stávající stokový systém, umístění kalových jímek KJ a podrobného dořešení budoucího napojení odvodňovačů tramvajové trati a trativodů dle výsledků místního šetření a odsouhlasení Správcem TT.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Novými požadavky DP hl. m. Prahy na čas realizace (do 05/2023) úpravy TT Podolské nábřeží. - Zpracováním podrobného řešení etapizace TT v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.					
PŘÍKAZNÍK:		AUTORSKÝ DOZOR:		ZHOTOVITEL:	

D

T

z

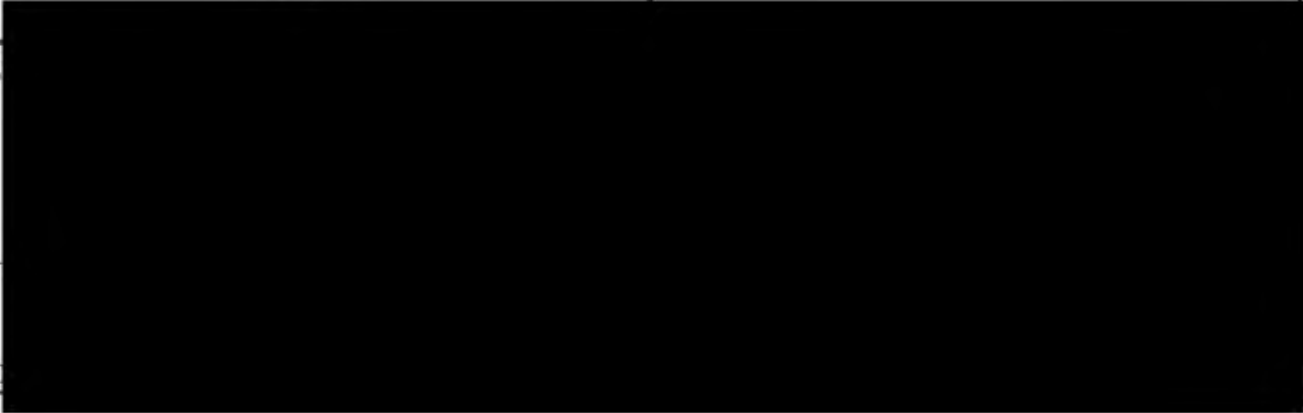Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 039	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 29.08.2024	
NOZ č. 039 navazuje na:		OZ č. 039	PZ č.	
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL39 – SO 612 – Odvodnění Tramvajové trati</u> <u>Část 01 - Výstavba TT Podolské nábřeží</u>				
Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 039).				
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.				
Cena stavebních prací:				
Cena odpočty	0,00 Kč			
Cena přípočty	61 418,93 Kč			
Cena celkem	61 418,93 Kč			
DPH 21 %	12 897,98 Kč			
Cena včetně DPH	74 316,91 Kč			
Seznam příloh/Počet listů příloh:				
- Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Přehled nových položek v ZL č.039 - kalkulace pol.č. 02943.R, - Příloha č. 1 Rozložení prací na dopracování a úpravu dokumentace RDS (po ZL039)				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): šedesát jedna tisíc čtyři sta osmnáct korun českých devadesát tři haléřů			Dopad do HMG: ANO	
(bez DPH)				
Z				
S				
D				

Stavba č. 42821 – Dvorecký most

Stanovisko AD k Návrhu ohodnocení změny č. 039

SO 612 – Odvodnění tramvajové trati

Část 01 – Výstavba TT Podolské nábřeží

Autorský dozor bere na vědomí Návrh ohodnocení změny dle Změnového listu č. 39.

Popis a zdůvodnění změny byly doloženy v Oznámení změny č. 39, které bylo schváleno dne 25.10.2023


K ceně samotné se AD nevyjadřuje.

Ověření objemu provedených prací (tj. výměry provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou je odpovědností technického dozoru – příkazníka.

V Praze dne 2.10.2024

I

T



Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 039
PoZ vystavil:		Datum: 22.11.2024
PoZ č. 039 na NOZ č. 039		na jiný dokument:
Odesláno/ předáno:		osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí: 61 418,93 Kč bez DPH tj. 0,01 %, z toho: - odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 61 418,93 Kč bez DPH tj. 0,01 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.		
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů: viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 61 418,93 Kč	Provedení změny: 04-05/2023	
Nová cena díla (bez DPH): 1 195 590 077,02 Kč	Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 61 418,93 Kč	
Důvod ke změně: Novými požadavky DP hl. m. Prahy na čas realizace (do 05/2023) úpravy TT Podolské nábřeží. Zpracováním podrobného řešení etapizace TT v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poz	[Redacted Signature Area]	
Da		

Stavba č. 42821 Dvorecký most				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 40	
Komu: INV MHMP			Datum: 07.03.2023		
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně	
Týká se:			SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:			SO 621 - Trolejové vedení TT, Část 01 - Výstavba TT Podolské nábřeží		
na výkresy:			Příloha 1 a 2		
na rozpočtové podklady:			Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:			Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:			ANO		
kategorizace položek:			Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL40 – SO 621 - Trolejové vedení TT,</u> <u>Část 01 - Výstavba TT Podolské nábřeží</u> V rámci zpracování RDS dochází k této změně oproti dokumentaci DVZ: - Práce a činnosti, které vyplynuly z nového požadavku DP hl. m. Prahy na výstavbu tramvajové trati v ulici Podolské nábřeží vč. zabudování výhybek a přípravy odbočení na novou trať na budovaný nový tramvajový most přes řeku Vltavu v předstihu před výstavbou mostu oproti postupu prací předpokládaném v Zadávací dokumentaci nejdéle do 05/2023. - V rámci SO 621 je v této dílčí části RDS řešena úprava převěsů nosné sítě pro napájecí svody EOv, obnova ukolejnění stávajícího napájecího bodu NB 162c, úprava trasy ukolejnění budoucího napájecího bodu NB 162d a úprava založení základů nových stožárů. Dále také provizorní úpravy trolejového vedení v průběhu této etapy pro odpojení napájení TV v dotčeném úseku stavby, posun stop stávajícího trolejového drátu dle potřeb stavby a související úpravy s předstihovým přesunem úsekového děliče UD159 včetně výzbroje.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Novými požadavky DP hl. m. Prahy na čas realizace (do 05/2023) úpravy TT Podolské nábřeží. - Zpracováním podrobného řešení etapizace TT v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.					
Příloha	[Redacted Content]				
Data					
Toto oznámení					

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 040	
NOZ zpracoval: Zhotovitel		Datum: 11.11.2024		
NOZ č. 040 navazuje na:	OZ č. 040	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL40 – SO 621 - Trolejové vedení TT,</u> <u>Část 01 - Výstavba TT Podolské nábřeží</u>				
Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 040).				
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.				
Cena stavebních prací:				
Cena odpočty	-168 953,66 Kč			
Cena připočty	641 971,35 Kč			
Cena celkem	473 017,69 Kč			
DPH 21 %	99 333,71 Kč			
Cena včetně DPH	572 351,40 Kč			
Seznam příloh/Počet listů příloh:				
- Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Přehled nových položek v ZL č.040 - CN pro kalkulaci pol.č. 02943.R, 74A210.R45, 74A210.R55 - kalkulace pol.č. 02943.R, 74A210.R45, 74A210.R55, - Příloha č. 1 Rozložení prací na dopracování a úpravu dokumentace RDS (po ZL040)				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): čtyři sta sedmdesát tři tisíc sedmnáct korun českých šedesát devět haléřů		Dopad do HMG: ANO		
(bez DPH)				

Stavba č. 42821 – Dvorecký most

Stanovisko AD k Návrhu ohodnocení změny č. 040

SO 621 – Trolejové vedení TT

Část 01 – Výstavba TT Podolské nábřeží

Autorský dozor bere na vědomí Návrh ohodnocení změny dle Změnového listu č. 40.

Popis a zdůvodnění změny byly doloženy v Oznámení změny č. 40, které bylo schváleno dne 25.10.2023

K ceně samotné se AD nevyjadřuje.

Ověření objemu provedených prací (tj. výměry provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou je odpovědností technického dozoru – příkazníka.

V Praze dne 11.12.2024

A large black rectangular box redacting the signature and stamp area of the document.

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 040	
PoZ vystavil:		Datum: 11.12.2024	
PoZ č. 040 na NOZ č. 040		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí: 473 017,69 Kč bez DPH tj. 0,04 %, z toho: - odpočty činí: -168 953,66 Kč bez DPH tj. -0,02 % - přípočty činí: 641 971,35 Kč bez DPH tj. 0,06 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací: viz F01, F02		Počet připojených výkresů: viz F01	
Změna ceny díla (bez DPH): 473 017,69 Kč		Provedení změny: 02-04/2023	
Nová cena díla (bez DPH): 1 196 063 094,71 Kč		Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 641 971,35 Kč	
Důvod ke změně: Novými požadavky DP hl. m. Prahy na čas realizace (do 05/2023) úpravy TT Podolské nábřeží. Zpracováním podrobného řešení etapizace TT v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 40a	
Komu: INV MHMP			Datum: 24.05.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 621 – Trolejové vedení TT, Část 01 - Výstavba TT Podolské nábřeží		
na výkresy:		Zápis o předání díla ze dne 24.5.2023		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL40a – SO 621 – Trolejové vedení TT,</u> <u>Část 01 - Výstavba TT Podolské nábřeží</u> V rámci změny postupu výstavby dochází k těmto změnám oproti dokumentaci DVZ: - Práce a činnosti, které vyplynuly z nového požadavku DP hl. m. Prahy na výstavbu tramvajové trati v ulici Podolské nábřeží vč. zabudování výhybek a přípravy odbočení na novou trať na budovaný nový tramvajový most přes řeku Vltavu v předstihu, před výstavbou mostu oproti postupu prací předpokládaném v Zadávací dokumentaci, nejdéle do 05/2023. - V souvislosti s Oznámením změny č. 38 bylo nutné provést v předstihu dodatečné vypnutí a opětovné zapnutí trakčního vedení v ulici Podolské nábřeží v oblasti napojení na nově budovaný Dvorecký most.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Novými požadavky DP hl. m. Prahy na čas realizace (do 05/2023) úpravy TT Podolské nábřeží. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.				
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:		
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 040a	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 11.11.2024	
NOZ č. 040a navazuje na:		OZ č. 040a	PZ č.	
Odesláno/ předáno:		osobně		
ZL40a – SO 621 - Trolejové vedení TT, Část 01 - Výstavba TT Podolské nábřeží – manipulace				
Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 040a).				
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.				
Cena stavebních prací:				
Cena odpočty		0,00 Kč		
Cena přípočty		28 750,00 Kč		
Cena celkem		28 750,00 Kč		
DPH 21 %		6 037,50 Kč		
Cena včetně DPH		34 787,50 Kč		
Seznam příloh/Počet listů příloh:				
- Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Přehled nových položek v ZL č.040a - CN pro kalkulaci pol.č. 74F332.R, - kalkulace pol.č. 74F332.R,				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): dvacet osm tisíc sedm set padesát korun českých (bez DPH)			Dopad do HMG: ANO	

Stavba č. 42821 – Dvorecký most

Stanovisko AD k Návrhu ohodnocení změny č. 040a

SO 621 – Trolejové vedení TT

Část 01 – Výstavba TT Podolské nábřeží - manipulace

Autorský dozor bere na vědomí Návrh ohodnocení změny dle Změnového listu č. 40a.

Popis a zdůvodnění změny byly doloženy v Oznámení změny č. 40a, které bylo schváleno dne 25.10.2023


K ceně samotné se AD nevyjadřuje.


Ověření objemu provedených prací (tj. výměry provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou je odpovědností technického dozoru – příkazníka.


V

In

TU



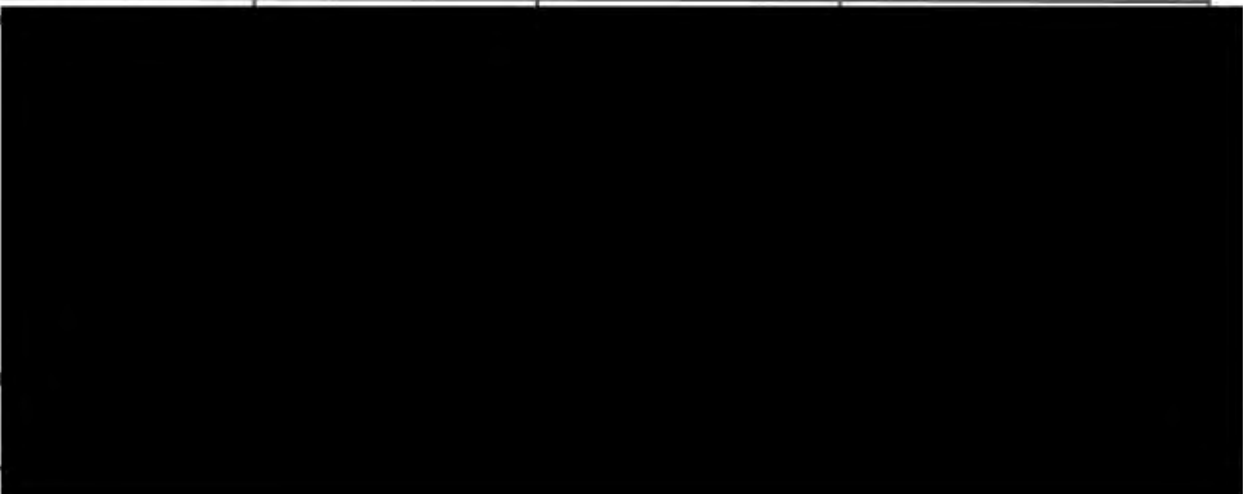Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 040a
PoZ vystavil:	Datum: 11.12.2024	
PoZ č. 040a na NOZ č. 040a	na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:	osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí: 28 750,00 Kč bez DPH tj. 0,00 %, z toho: - odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 28 750,00 Kč bez DPH tj. 0,00 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.		
Počet připojených listů specifikací: viz F01, F02	Počet připojených výkresů: viz F01	
Změna ceny díla (bez DPH): 28 750,00 Kč	Provedení změny: 04/2023	
Nová cena díla (bez DPH): 1 196 091 844,71 Kč	Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 28 750,00 Kč	
Důvod ke změně: Novými požadavky DP hl. m. Prahy na čas realizace (do 05/2023) úpravy TT Podolské nábřeží. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poznámka:		
P 		
Datum:		

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 41	
Komu: INV MHMP			Datum: 23.03.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:			SOD č. DIL/21/06/007480/2022	
Odkazy: na specifikaci:		SO 622 - Ovládání a vytápění výměn, Část 01 - Výstavba TT Podolské nábřeží		
na výkresy:		Příloha 1 a 2		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL41 – SO 622 - Ovládání a vytápění výměn,</u> <u>Část 01 - Výstavba TT Podolské nábřeží</u> V rámci zpracování RDS dochází k této změně oproti dokumentaci DVZ: - Práce a činnosti, které vyplynuly z nového požadavku DP hl. m. Prahy na výstavbu tramvajové trati v ulici Podolské nábřeží vč. zabudování výhybek a přípravy odbočení na novou trať na budovaný nový tramvajový most přes řeku Vltavu v předstihu před výstavbou mostu oproti postupu prací předpokládaném v Zadávací dokumentaci nejdéle do 05/2023 a zajištění vytápění výměn EOVS a EOVS4 přes zimní sezonu. - V rámci SO 622 je v této dílčí části RDS řešeno provizorní připojení napájecího kabelu EOVS3, instalace provizorního systému TVAM 4 na stávající stožár VO a změna kolejových obvodů u systému EOVS3 a EOVS4 na 10ti pinové provedení.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Novými požadavky DP hl. m. Prahy na čas realizace (do 05/2023) úpravy TT Podolské nábřeží. - Zpracováním podrobného řešení etapizace TT v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.				
PŘ				
Dat				
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 041											
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 11.11.2024											
NOZ č. 041 navazuje na:	OZ č. 041	PZ č.												
Odesláno/ předáno:	osobně													
<u>ZL41 – SO 622 - Ovládání a vytápění výměn,</u> <u>Část 01 - Výstavba TT Podolské nábřeží</u>														
Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 041). <u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.</u> Cena stavebních prací: <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>258 593,06 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>258 593,06 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>54 304,54 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>312 897,60 Kč</td> </tr> </table> Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Přehled nových položek v ZL č.041 - CN pro kalkulaci pol.č. 743951.R07, - kalkulace pol.č. 02943.R, 743951.R07 - Příloha č. 1 Rozložení prací na dopracování a úpravu dokumentace RDS (po ZL041)					Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	258 593,06 Kč	Cena celkem	258 593,06 Kč	DPH 21 %	54 304,54 Kč	Cena včetně DPH	312 897,60 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč													
Cena přípočty	258 593,06 Kč													
Cena celkem	258 593,06 Kč													
DPH 21 %	54 304,54 Kč													
Cena včetně DPH	312 897,60 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): dvě stě padesát osm tisíc pět set devadesát tři korun českých šest haléřů (bez DPH)		Dopad do HMG: ANO												
Datum: 11.12.2024		Datum:		Datum: 10.12.2024										

Stavba č. 42821 – Dvorecký most

Stanovisko AD k Návrhu ohodnocení změny č. 041

SO 622 – Ovládání a vytápění výměn

Část 01 – Výstavba TT Podolské nábřeží

Autorský dozor bere na vědomí Návrh ohodnocení změny dle Změnového listu č. 41.

Popis a zdůvodnění změny byly doloženy v Oznámení změny č. 41, které bylo schváleno dne 22.11.2023

K ceně samotné se AD nevyjadřuje.

Ověření objemu provedených prací (tj. výměry provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou je odpovědností technického dozoru – příkazníka.



Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 041	
PoZ vystavil:		Datum: 11.12.2024	
PoZ č. 041 na NOZ č. 041		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí: 258 593,06 Kč bez DPH tj. 0,02 %, z toho: - odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 258 593,06 Kč bez DPH tj. 0,02 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací: viz F01, F02		Počet připojených výkresů: viz F01	
Změna ceny díla (bez DPH): 258 593,06 Kč		Provedení změny: 03-05/2023	
Nová cena díla (bez DPH): 1 196 350 437,77 Kč		Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 258 593,06 Kč	
Důvod ke změně: Novými požadavky DP hl. m. Prahy na čas realizace (do 05/2023) úpravy TT Podolské nábřeží, Zpracováním podrobného řešení etapizace TT v rámci RDS S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP Ing. Petr Hankovec	Podpis zmocněnce Příkazníka Ing. Tomáš Krupka Společnost	Podpis zmocněnce Zhotovitele Ing. Robert Brož, Ph.D. Sdružení TPR + FIRESTA
Datum:			

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 43	
Komu: INV MHMP			Datum: 24.02.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 751 - Oplocení pozemků dotčených stavbou		
na výkresy:		Příloha 1, 2, 3 a 4		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL43 – SO 751 - Oplocení pozemků dotčených stavbou</u> V rámci zpracování RDS dochází k této změně oproti dokumentaci DVZ: - V návaznosti na upřesnění rozměru vjezdové brány dle skutečnosti a skladbu stávajícího oplocení areálu Žlutých lázní v místě nového vjezdu (rozmístění sloupků současného oplocení a velikost patek založení sloupků), zjištěných při provádění zemních prací, jsou do soupisu prací doplněny nové položky pro odbourání nezbytných částí stávajících základových patek oplocení areálu v místě nového vjezdu a nezbytná úprava části oplocení v rozsahu pracovního prostoru nové posuvné vjezdové brány do areálu Žlutých lázní. - S ohledem na vybraný konkrétní typ posuvné vjezdové brány a nezbytnou stavební přípravu pro montáž a osazení této vjezdové posuvné brány jsou navrhovány změny a upřesnění množství v položkách soupisu prací týkajících se zemních prací pro základové konstrukce vjezdové posuvné brány a v položkách soupisu prací pro betonové základové patky pro osazení vjezdové brány.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Zjištěným skutečným stavem stávajícího oplocení a zpracováním podrobného řešení v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.				
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:		ZHOTOVITEL:	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 043											
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 09.07.2024											
NOZ č. 043 navazuje na:	OZ č. 043	PZ č.												
Odesláno/ předáno:	osobně													
<u>ZL43 – SO 751 – Oplocení pozemků dotčených stavbou</u> Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 43) V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.														
Cena stavebních prací <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena připočty</td> <td>37 547,22 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>37 547,22 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>7 884,92 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>45 432,14 Kč</td> </tr> </table>					Cena odpočty	0,00 Kč	Cena připočty	37 547,22 Kč	Cena celkem	37 547,22 Kč	DPH 21 %	7 884,92 Kč	Cena včetně DPH	45 432,14 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč													
Cena připočty	37 547,22 Kč													
Cena celkem	37 547,22 Kč													
DPH 21 %	7 884,92 Kč													
Cena včetně DPH	45 432,14 Kč													
Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Přehled nových položek v ZL č.043														
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): třicet sedm tisíc pět set čtyřicet sedm korun českých dvacet dva haléřů _____ (bez DPH)		Dopad do HMG: ANO												
ZHOTOVITEL: 		AUTORSKÝ DOZOR:		PŘÍKAZNÍK: 										
In Sdru STRAB														
Datum														

Stavba č. 42821 – Dvorecký most

Stanovisko AD k Návrhu ohodnocení změny č. 043

SO 751 – Oplocení pozemků dotčených stavbou


Autorský dozor bere na vědomí Návrh ohodnocení změny dle Změnového listu č. 43.

Popis a zdůvodnění změny byly doloženy v Oznámení změny č. 43, které bylo schváleno dne 22.11.2023.

K ceně samotné se AD nevyjadřuje.

Ověření objemu provedených prací (tj. výměry provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou je odpovědností technického dozoru – příkazníka.

V Praze dne 13.8.2024



Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 043	
PoZ vystavil:		Datum: 02.12.2024	
PoZ č. 043 na NOZ č. 043		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí: 37 574,22 Kč bez DPH tj. 0,00 %, z toho: - odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 37 547,22 Kč bez DPH tj. 0,00 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 37 547,22 Kč		Provedení změny: 04-05/2023	
Nová cena díla (bez DPH): 1 196 387 984,99 Kč		Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 37 547,22 Kč	
Důvod ke změně: Zjištěným skutečným stavem stávajícího oplocení a zpracováním podrobného řešení v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce
Datum:			

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 45	
Komu: INV MHMP			Datum: 27.02.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 003 – Příprava území – pravý břeh Vltavy		
na výkresy:		Příloha – Záznam z KD č. 7 a 10 a Znalecký posudek č. 202 – 4 219/22		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL45 – SO 003 Příprava území - pravý břeh Vltavy</u> Na KD č. 7 dne 9.11.2022 byl vznesen požadavek arch. AD a Objednatele k provedení posudku topolu černého, rostoucího na pozemku p.č. 1131/1, v k.ú. Podolí, obec Praha. Účelem posudku je zhodnotit stav stromu pomocí tahové zkoušky s hlavní pozorností věnované jeho perspektivě a provozní bezpečnosti. Znalecký posudek č. 202 – 4 219/22 konstatoval, že strom vykazuje zásadní destabilizaci v obou hlavních parametrech, tedy odolnosti vůči vývratu a odolnosti vůči zlomu kmene. Zjištěné hodnoty odolnosti stromu jsou takového rázu, že nelze počítat se spolehlivou stabilizací stromu nedestruktivním péstebním zásahem, v důsledku čehož znalec doporučil strom odstranit. Na KD č. 10 bylo rozhodnuto o odstranění stromu. Z důvodu stavební rozpracovanosti v místě stromu bylo nutné přistoupit ke sнесení stromu pomocí mobilního jeřábu a výškové plošiny. Z důvodu nutnosti kácení v pozdější fázi výstavby a v souladu s výsledkem tahové zkoušky je změna zařazena pod objekt SO 003 – Příprava pravý břeh.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Požadavkem Objednatele na základě požadavku architekta stavby (arch. AD). S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.				
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:		
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 045											
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 09.07.2024											
NOZ č. 045 navazuje na:	OZ č. 045	PZ č.												
Odesláno/ předáno:	osobně													
<u>ZL45 – SO 003 – Příprava území – pravý břeh Vltavy - posouzení a kácení topolu</u> Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 45) <u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.</u> Cena stavebních prací <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>-12 021,54 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena připočty</td> <td>66 386,97 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>54 365,43 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>11 416,74 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>65 782,17 Kč</td> </tr> </table> Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - CN pro položky č.126 (029511.R) a č.127 (11212.R) - Kalkulace položky č.126 (029511.R) a pol.č.127 (11212.R) - Přehled nových položek v ZL č.045					Cena odpočty	-12 021,54 Kč	Cena připočty	66 386,97 Kč	Cena celkem	54 365,43 Kč	DPH 21 %	11 416,74 Kč	Cena včetně DPH	65 782,17 Kč
Cena odpočty	-12 021,54 Kč													
Cena připočty	66 386,97 Kč													
Cena celkem	54 365,43 Kč													
DPH 21 %	11 416,74 Kč													
Cena včetně DPH	65 782,17 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): padesát čtyři tisíc tři sta šedesát pět korun českých čtyřicet tři haléřů (bez DPH)		Dopad do HMG: ANO												
ZHO Sd STRA Datum														

Stavba č. 42821 – Dvorecký most

Stanovisko AD k Návrhu ohodnocení změny č. 045

SO 003 – Příprava území – pravý břeh Vltavy


Autorský dozor bere na vědomí Návrh ohodnocení změny dle Změnového listu č. 45.

Popis a zdůvodnění změny byly doloženy v Oznámení změny č. 45, které bylo schváleno dne 31.1.2024.

K ceně samotné se AD nevyjadřuje.

Ověření objemu provedených prací (tj. výměry provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou je odpovědností technického dozoru – příkazníka.

V Praze dne 3.9.2024

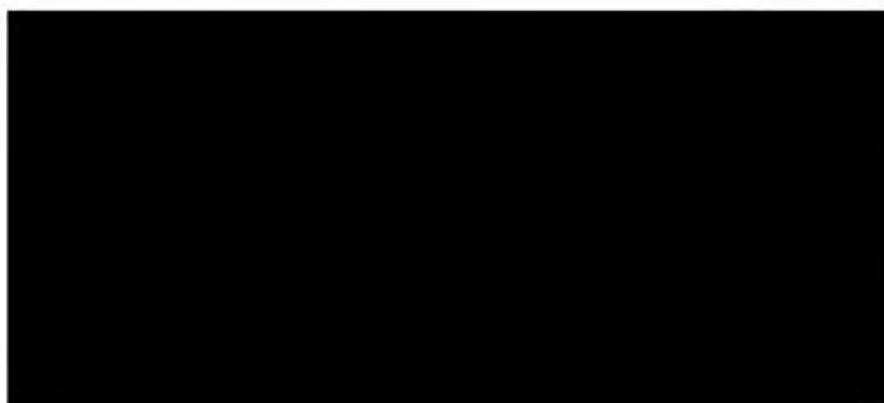

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 045	
PoZ vystavil:		Datum: 02.12.2024	
PoZ č. 045 na NOZ č. 045		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí: 54 365,43 Kč bez DPH tj. 0,01 %, z toho: - odpočty činí: -12 021,54 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 66 386,97 Kč bez DPH tj. 0,01 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 54 365,43 Kč		Provedení změny: 11/2022-02/2023	
Nová cena díla (bez DPH): 1 196 442 350,42 Kč		Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 66 386,97 Kč	
Důvod ke změně: Požadavkem Objednatele na základě požadavku architekta stavby (arch. AD). S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka: 			
D:		0 3 00 2023	

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 46	
Komu: INV MHMP			Datum: 30.11.2022	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 001 – Příprava území – levý břeh Vltavy		
na výkresy:		Příloha – Záznam z KD č. 9, Zpráva o georadarovém měření ze dne 30.11.2022, Oznámení Zhotovitele č.j. DM/2022/11		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL46 – SO 001 Příprava území – levý břeh Vltavy</u> Při místní šetření konaném dne 18.10.2022 v prostoru mezi objekty SK Zlíchov a VK Smíchov byl zjištěn neznámý mostní objekt, ke kterému nebyly k dispozici žádné bližší podklady a dokumentace. Na základě této skutečnosti zaslal Zhotovitel Oznámení č. j. DM/2022/11. S ohledem na výše uvedenou skutečnost bylo nutné provést dodatečné kopané sondy mimo pozemek ve vlastnictví River Business Centre (RBC) pro zjištění skutečné polohy IS. Objednatel zároveň na KD č. 8 dne 23.11.2022 vydal pokyn k provedení georadarového průzkumu, který byl dne 27.11.2022 proveden.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Požadavkem Objednatele na dodatečný průzkum podloží v místě nově zjištěného neznámého mostního objektu. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.				
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:		
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 046											
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 01.08.2024											
NOZ č. 046 navazuje na:	OZ č. 046	PZ č.												
Odesláno/ předáno:	osobně													
<u>ZL46 – SO 001 Příprava území – levý břeh Vltavy</u> Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 046). <u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.</u> Cena stavebních prací: <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena připočty</td> <td>68 825,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>68 825,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>14 453,25 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>83 278,25 Kč</td> </tr> </table> Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk, sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk, sestava 3.6.21.9 Aspe) - Přehled nových položek v ZL č.046 - kalkulace pol.č.48–02812.R - CN pro kalkulaci pol.č. 48–02812.R					Cena odpočty	0,00 Kč	Cena připočty	68 825,00 Kč	Cena celkem	68 825,00 Kč	DPH 21 %	14 453,25 Kč	Cena včetně DPH	83 278,25 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč													
Cena připočty	68 825,00 Kč													
Cena celkem	68 825,00 Kč													
DPH 21 %	14 453,25 Kč													
Cena včetně DPH	83 278,25 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Dopad do HMG:												
šedesát osm tisíc osm set dvacet pět korun českých		ANO												
(bez DPH)														
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:												
ST														
Da														

Stavba č. 42821 – Dvorecký most

Stanovisko AD k Návrhu ohodnocení změny č. 046

SO 001 – Příprava území – levý břeh Vltavy

Autorský dozor bere na vědomí Návrh ohodnocení změny dle Změnového listu č. 46.

Popis a zdůvodnění změny byly doloženy v Oznámení změny č. 46, které bylo schváleno dne 31.1.2024.

K ceně samotné se AD nevyjadřuje.

Ověření objemu provedených prací (tj. výměry provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou je odpovědností technického dozoru – příkazníka.

V Praze dne 3.9.2024

In

TU



Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 046	
PoZ vystavil:		Datum: 02.12.2024	
PoZ č. 046 na NOZ č. 046		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí: 68 825,00 Kč bez DPH tj. 0,01 %, z toho: - odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 68 825,00 Kč bez DPH tj. 0,01 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací: viz F01, F02		Počet připojených výkresů: viz F01	
Změna ceny díla (bez DPH): 68 825,00 Kč		Provedení změny: 12/2022-02/2023	
Nová cena díla (bez DPH): 1 196 511 175,42 Kč		Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 68 825,00 Kč	
Důvod ke změně: Požadavkem Objednatele na základě nově zjištěného neznámého mostního objektu. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce
Datum:	03.00.2023		

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 47	
Komu: INV MHMP			Datum: 9.02.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 001 - Příprava území – levý břeh Vltavy Pokyn Objednatele MHMP 2216967/2022 ze dne 28.11.2022, upřesnění Příkazníka k pokynu Objednatele a Pokyn Příkazníka č. 8		
na výkresy:		Situace sítí PREdi v prostoru OP1		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL47 – SO 001 - Příprava území - levý břeh Vltavy</u> Na základě Pokynu Objednatele č.j.: MHMP 2216967/2022 ze dne 28.11.2022, upřesnění Příkazníka k pokynu Objednatele ze dne 18.1.2023 a Pokynu příkazníka č. 8 ze dne 8.2.2023 k provedení změny Díla „Přeložka optokabelu PREdi do provizorní polohy mimo O1“. Změna spočívá v: - Odhalení stávajícího vedení OPTO kabelů v prostoru OP1. - Přeložení kabelů mimo prostor nově budovaného základu opěry OP1. - Nezbytné stavební práce související s odhalením a přeložkami kabelů VN a NN spol. PREdi.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Přítomností stávajícího kabelového vedení PREdi v místě nově budovaného základu opěry OP1 S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.				
PŘÍKAZNÍK:		AUTORSKÝ DOZOR:		ZHOTOVITEL:
Datum: Toto (P02).				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 047											
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 01.08.2024											
NOZ č. 047 navazuje na:	OZ č. 047	PZ č.												
Odesláno/ předáno:	osobně													
<u>ZL47 – SO 001 Příprava území – levý břeh Vltavy</u> Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 047). V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy. Cena stavebních prací: <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>334 393,76 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>334 393,76 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>70 222,69 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>404 616,45 Kč</td> </tr> </table> Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Přehled nových položek v ZL č.047 - kalkulace pol.č.30–029113.R, 52-03730.R, 57-744Z01.R, 58-75I8.R - CN pro kalkulaci pol.č.30–029113.R, 52-03730.R, 57-744Z01.R, 58-75I8.R					Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	334 393,76 Kč	Cena celkem	334 393,76 Kč	DPH 21 %	70 222,69 Kč	Cena včetně DPH	404 616,45 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč													
Cena přípočty	334 393,76 Kč													
Cena celkem	334 393,76 Kč													
DPH 21 %	70 222,69 Kč													
Cena včetně DPH	404 616,45 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Dopad do HMG:												
tři sta třicet čtyři tisíc tři sta devadesát tři korun českých sedmdesát šest haléřů		ANO												
(bez DPH)														
ZHOTOVITEL: //	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK: //												
I Sdr STRAJ														
Datum														

Stavba č. 42821 – Dvorecký most

Stanovisko AD k Návrhu ohodnocení změny č. 047

SO 001 – Příprava území – levý břeh Vltavy

Autorský dozor bere na vědomí Návrh ohodnocení změny dle Změnového listu č. 47.



Popis a zdůvodnění změny byly doloženy v Oznámení změny č. 47, které bylo schváleno dne 6.12.2023.

K ceně samotné se AD nevyjadřuje.

Ověření objemu provedených prací (tj. výměry provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou je odpovědností technického dozoru – příkazníka.

V Praze dne 3.9.2024



Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 047	
PoZ vystavil:		Datum: 02.12.2024	
PoZ č. 047 na NOZ č. 047		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí: 334 393,76 Kč bez DPH tj. 0,03 %, z toho: - odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 334 393,76 Kč bez DPH tj. 0,03 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací: viz F01, F02		Počet připojených výkresů: viz F01	
Změna ceny díla (bez DPH): 334 393,76 Kč		Provedení změny: 11/2022-02/2023	
Nová cena díla (bez DPH): 1 196 845 569,18 Kč		Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 334 393,76 Kč	
Důvod ke změně: Přítomností stávajícího kabelového vedení PREDi v místě nově budovaného základu opěry OP1. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce
			
Datum:			

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 48	
Komu: INV MHMP			Datum: 6.11.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 221 – Opěrné zdi – Hlubočepy Část 100.2 – Založení zeď jih změna „a“		
na výkresy:		01a, 02a		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL48 – SO 221 – Opěrné zdi – Hlubočepy</u> <u>Část 100.2 – Založení – zeď jih – změna „a“</u> Na základě Pokynu Objednatele č.j.: MHMP 1015014/2023 ze dne 15.05.2023 k provedení 4 ks pilot a v souvislosti s Pokynem Objednatele č.j.: 404143/2023 ze dne 24.02.2023 ke koordinaci s akcí Lávka Zlíchov. Změna spočívá v: - Úpravě polohy a rozsahu jižní části zdi tak, aby jí bylo v budoucnu možné plynule navázat na křídla opěry lávky. - Úprava polohy a délky pilot a kubatura podkladního betonu. - Zhotovení 4 ks pilot pro založení základu lávky Zlíchov.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Koordinací s akcí Lávka Zlíchov S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.				
PŘÍKAZNÍK:		AUTORSKÝ DOZOR:		ZHOTOVITEL:
Datum: _____ Toto oznámení je součástí změny (PoZ).				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 048											
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 19.06.2024											
NOZ č. 048 navazuje na:	OZ č. 048	PZ č.												
Odesláno/ předáno:	osobně													
<u>ZL48 – SO 221 – Opěrné zdi – Hlubočepy</u> <u>Část 100.2 – Založení – zeď jih – změna „a“</u> Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 048). <u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.</u> Cena stavebních prací: <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>247 817,89 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>247 817,89 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>52 041,76 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>299 859,65 Kč</td> </tr> </table> Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Přehled nových položek v ZL č.048 - kalkulace pol.č.37- 029113.R a pol.č.38-02943a,R - CN pro kalkulaci pol.č. 37 – 029113R - Příloha č. 1 Rozložení prací na dopracování a úpravu dokumentace RDS (po ZL048)					Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	247 817,89 Kč	Cena celkem	247 817,89 Kč	DPH 21 %	52 041,76 Kč	Cena včetně DPH	299 859,65 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč													
Cena přípočty	247 817,89 Kč													
Cena celkem	247 817,89 Kč													
DPH 21 %	52 041,76 Kč													
Cena včetně DPH	299 859,65 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): dvě stě čtyřicet sedm tisíc osm set sedmnáct korun českých osmdesát devět haléřů _____ (bez DPH)		Dopad do HMG: ANO												
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:												

Stavba č. 42821 – Dvorecký most

Stanovisko AD k Návrhu ohodnocení změny č. 048

SO 221 – Opěrné zdi Hlubočepy

Část 100.2 Založení – zeď jih – změna „a“

Autorský dozor bere na vědomí Návrh ohodnocení změny dle Změnového listu č. 48.

Popis a zdůvodnění změny byly doloženy v Oznámení změny č. 48, které bylo schváleno dne 6.12.2023.

K ceně samotné se AD nevyjadřuje.

Ověření objemu provedených prací (tj. výměry provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou je odpovědností technického dozoru – příkazníka.

V Praze dne 13.8.2024



Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 048	
PoZ vystavil:		Datum: 02.12.2024	
PoZ č. 048 na NOZ č. 048		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí: 247 817,89 Kč bez DPH tj. 0,02 %, z toho: - odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 247 817,89 Kč bez DPH tj. 0,02 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací: viz F01, F02		Počet připojených výkresů: viz F01	
Změna ceny díla (bez DPH): 247 817,89 Kč		Provedení změny: 04/2023–01/2026	
Nová cena díla (bez DPH): 1 197 093 387,07 Kč		Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 34 292,89 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 213 525,00 Kč	
Důvod ke změně: Koordinací s akcí Lávka Zlíchov. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Objednatele	Podpis zmocněnce Objednatele	Podpis zmocněnce Příkazníka	Podpis zmocněnce Zhotovitele
Da			

Stavba č. 42821 Dvorecký most				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 49	
Komu: INV MHMP			Datum: 19.05.2023		
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně	
Týká se:			SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:			SO 404 – PRE – Přeložky kabelů NN - Podolí		
na výkresy:			Přílohy – A (TZ), 404.1a, 404,2b, pokyn Příkazníka č.1 ze dne 18.1.2023		
na rozpočtové podklady:			Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:			Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:			ANO		
kategorizace položek:			Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL49 – SO 404 – PRE – Přeložky kabelů NN - Podolí</u> Zástupce Příkazníka dle čl. 4.8 smlouvy o Dílo vydal dne 18.1.2023 pokyn k provedení změny Díla, a to k realizaci stavebního objektu SO 404 PREdistribuce: Přeložky kabelů NN – Podolí, část v místě nového vjezdu do Žlutých lázní. Tyto práce nebyly předmětem plnění dle smlouvy Zhotovitele a jejich provedení podmiňovalo další postup prací. Práce byly provedeny dle předané projektové dokumentace SO 404 ve stupni DPS zpracované spol. Pronto Elektro Praha, s.r.o. v 11/2022.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Pokynem Příkazníka č. 1 ze dne 18.1.2023. S ohledem na výše uvedené se jedná o neodkladnou změnu.					
PŘÍKAZNÍK:		AUTORSKÝ DOZOR:		ZHOTOVITEL:	

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 049											
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 13.08.2024											
NOZ č. 049 navazuje na:	OZ č. 049	PZ č.												
Odesláno/ předáno:	osobně													
<u>ZL49 – SO 415 – Žluté lázně – úprava rozvodů NN a VO,</u> <u>Přeložky kabelů NN PRE – Podolí</u> Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 049). <u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.</u> Cena stavebních prací: <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>222 051,67 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>222 051,67 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>46 630,85 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>268 682,52 Kč</td> </tr> </table> Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Přehled nových položek v ZL č.049 - kalkulace pol.č. 72581a.R, - CN pro kalkulaci pol.č. 72581a.R,					Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	222 051,67 Kč	Cena celkem	222 051,67 Kč	DPH 21 %	46 630,85 Kč	Cena včetně DPH	268 682,52 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč													
Cena přípočty	222 051,67 Kč													
Cena celkem	222 051,67 Kč													
DPH 21 %	46 630,85 Kč													
Cena včetně DPH	268 682,52 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): dvě stě dvacet dva tisíc padesát jedna korun českých šedesát sedm haléřů (bez DPH)		Dopad do HMG: ANO												
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:												
Sdr STRA Datu														

Stavba č. 42821 – Dvorecký most

Stanovisko AD k Návrhu ohodnocení změny č. 049

SO 404 PRE – Přeložky kabelů NN - Podolí

Autorský dozor bere na vědomí Návrh ohodnocení změny dle Změnového listu č. 49.

Popis a zdůvodnění změny byly doloženy v Oznámení změny č. 49, které bylo schváleno dne 31.1.2024.

K ceně samotné se AD nevyjadřuje.

Ověření objemu provedených prací (tj. výměry provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou je odpovědností technického dozoru – příkazníka.

V Praze dne 30.9.2024

Ir

T



Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 049	
PoZ vystavil:		Datum: 02.12.2024	
PoZ č. 049 na NOZ č. 049		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí: 222 051,67 Kč bez DPH tj. 0,02 %, z toho: - odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 222 051,67 Kč bez DPH tj. 0,02 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací: viz F01, F02		Počet připojených výkresů: viz F01	
Změna ceny díla (bez DPH): 222 051,67 Kč		Provedení změny: 02-04/2023	
Nová cena díla (bez DPH): 1 197 315 438,74 Kč		Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 222 051,67 Kč	
Důvod ke změně: Pokynem Příkazníka č.1. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce
O IN	[Redacted Signature Area]		
Datum:			
	05-06-2025	02.12.2024	1

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 50	
Komu: INV MHMP			Datum: 22.2.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 201 – Tramvajový most přes Vltavu, Část 100.1 – Založení O1, P2, P6, O7		
na výkresy:		Příloha – Dopis Č.j.:MHMP 2282666/2022 Stavba č.42821 Dvorecký most – pokyn zhotoviteli, SO201 zakládání. Pokyn Příkazníka č. 2 k provedení změny Díla – provedení převrtávaných pilot v místě O1 SO201, Záznam z KD č. 19. Dopis Zhotovitele DM/2022/16 ze dne 1.12.2022, Dopis Zhotovitele DM/2022/18 ze dne 6.12.2022 Závěrečná zpráva o geofyzikálním měření v místě opěry O1 Dvoreckého mostu 01/2023		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL50 – SO 201 Tramvajový most přes Vltavu</u> <u>Část 100.1 – Založení O1, P2, P6, O7</u> Při provádění hlubinného založení pilíře P2 byly zjištěny velké nadspotřeby v extrémních případech až masivní úniky čerstvého betonu pilot (č. 204 a č. 207). Z tohoto důvodu bylo svoláno místní šetření, v rámci kterého byla prověřena lokalita včetně prověření možných úniků do kanalizačního vedení. Následně bylo konstatováno, že se jedná o závažnější poruchu podloží ve velkém rozsahu. Tato skutečnost byla Zhotovitelem oznámena dopisy ze dne 1.12.2022 a 6.12.2022. Následně Zhotovitel obdržel dopisem Č.j.:MHMP 2282666/2022 pokyn k nacenění sanace pilot pilíře P2 č. 204 a 207 a nacenění prevence havárie piloty 202 pomocí výplně prostým betonem. Při řešení neočekávaných geologických podmínek v místě pilíře P2 došlo nejen k nadspotřebě materiálu, ale i k přerušení technologických postupů zhotovitele uvažovaných v nabídce (neočekávaným prostořím), extrémnímu opotřebení vrtného zařízení při převrtávání pilot č. 204 a č. 207 včetně armokoše a opakované mobilizaci výrobních prostředků včetně lidských zdrojů. V rámci dopisu Č.j.:MHMP 2282666/2022 zhotovitel obdržel pokyn provést geofyzikální průzkum pro bližší poznání geotechnických poměrů v prostoru opěry O1. Zhotovitel provedl geofyzikální průzkum a dne 9.1.2023 zaslal Objednateli a Příkazníkovi Závěrečnou zprávu. Dále Zhotovitel obdržel pokyn Příkazníka č. 2 ze dne 20.1.2023 k provedení změny Díla spočívající v provedení 3 ks převrtávaných pilot v místě O1 SO 201 na základě provedeného geofyzikálního průzkumu. Zhotovitel tyto práce provedl, nadspotřeby betonu při provádění pilot se pohybovaly na úrovni 20 %, jak je uvedeno v záznamu z Kontrolního dne č. 19 ze dne 15.2.2023.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Neočekávanými geologickými podmínkami a neočekávanými konstrukcemi (kavernami a pozůstatky důlních jam). S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.				

PŘÍ			
S			T
Datum:	Datum:	Datum:	17.12.2017
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).			

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 050											
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 10.06.2024											
NOZ č. 050 navazuje na:	OZ č. 050	PZ č.												
Odesláno/ předáno:	osobně													
ZL 050 – SO 201 – Tramvajový most přes Vltavu Část 100.1 – Založení O1, P2, P6, O7 – sanace pilot Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 050). Vyjádření projektanta DM 004 – úprava provádění piloty č.207 a 202 <u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.</u> Cena stavebních prací: <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>2 308 135,99 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>2 308 135,99 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>484 708,56 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>2 792 844,55 Kč</td> </tr> </table> Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Přehled nových položek v ZL č.050 - kalkulace pol.č. 02812b.R, 02943f.R, 03540a.R, - CN pro kalkulaci pol.č. 02812b.R, 02943f.R, 03540a.R, - Příloha č. 1 Rozložení prací na dopracování a úpravu dokumentace RDS (po ZL050) - Tabulka nadspotřeby O1 a P2					Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	2 308 135,99 Kč	Cena celkem	2 308 135,99 Kč	DPH 21 %	484 708,56 Kč	Cena včetně DPH	2 792 844,55 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč													
Cena přípočty	2 308 135,99 Kč													
Cena celkem	2 308 135,99 Kč													
DPH 21 %	484 708,56 Kč													
Cena včetně DPH	2 792 844,55 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): dva miliony tři sta osm tisíc jedno sto třicet pět korun českých devadesát devět haléřů		Dopad do HMG: ANO												
(bez DPH)														
ZH														
S														
STF														
Da														

Stavba č. 42821 – Dvorecký most

Stanovisko AD k Návrhu ohodnocení změny č. 050

SO 201 – Tramvajový most přes Vltavu

Část 100.1. – Založení O1, P2, P6, O7 – sanace pilot

Autorský dozor bere na vědomí Návrh ohodnocení změny dle Změnového listu č. 50.

Popis a zdůvodnění změny byly doloženy v Oznámení změny č. 50, které bylo schváleno dne 14.2.2024.

K ceně samotné se AD nevyjadřuje.

Ověření objemu provedených prací (tj. výměry provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou je odpovědností technického dozoru – příkazníka.

V Praze dne 3.9.2024



Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 050	
PoZ vystavil:		Datum: 02.12.2024	
PoZ č. 050 na NOZ č. 050		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí: 2 308 135,99 Kč bez DPH tj. 0,21 %, z toho: - odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 2 308 135,99 Kč bez DPH tj. 0,21 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 2 308 135,99 Kč	Provedení změny: 11–12/2022		
Nová cena díla (bez DPH): 1 199 623 574,73 Kč	Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 2 308 135,99 Kč		
Důvod ke změně: Neočekávanými geologickými podmínkami a neočekávanými konstrukcemi (kavernami a pozůstatky důlních jam). S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Objednatele	Podpis zmocněnce Objednatele	Podpis zmocněnce Příkazníka	Podpis zmocněnce Zhotovitele
Datum			

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 52	
Komu: INV MHMP			Datum: 14.11.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 201 – Tramvajový most přes Vltavu,		
na výkresy:		Příloha – Záznam z KD č. 9, Zpráva o georadarovém měření ze dne 30.11.2022, Oznámení Zhotovitele č.j. DM/2022/11, Záznam z jednání ze dne 9.8.2023. VTD Skruž polí 2-5, č. p. 100-002, 100-010		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL52 – SO 201 Tramvajový most přes Vltavu</u> <u>Kolize založení bárky Pi2 pro dočasnou skruž s neznámým mostním objektem pod ulicí Strakonická</u> Při místní šetření konaném dne 18.10.2022 v prostoru mezi objekty SK Zlíchov a VK Smíchov byl zjištěn neznámý mostní objekt, ke kterému nebyly k dispozici žádné bližší podklady a dokumentace. Na základě této skutečnosti zaslal Zhotovitel Oznámení č. j. DM/2022/11. S ohledem na výše uvedenou skutečnost bylo nutné provést dodatečné kopané sondy mimo pozemek ve vlastnictví River Business Centre (RBC) pro zjištění skutečných poloh inženýrských sítí (IS). Objednatel zároveň na KD č. 8 dne 23.11.2022 vydal pokyn k provedení georadarového průzkumu, který byl dne 27.11.2022 proveden. Georadarový průzkum je předmětem Změnového listu č. 46. Dne 9.8.2023 se na zařízení staveniště stavby uskutečnilo jednání, na kterém Zhotovitel představil koncepci technického řešení založení skruže na pozemku RBC. Z důvodu nutnosti umístění podepření skruže NK (bárek PIŽMO) nad neznámým mostním objektem a do prostoru podzemního vedení IS a na základě nově provedeného statického výpočtu bylo nutné navrhnout hlubinné založení v počtu 10 ks pilot prům. 900 mm a délky 17m. Pro provedení pilot bude nutné provést kopané sondy v místě hlav pilot a ochranu IS. Součástí návrhu je i zřízení železobetonového roznášecího roštu a jeho následné odstranění namísto panelové rovnániny. Z důvodu přepracovaného návrhu založení bárky Pi2 nebylo možné realizovat původní řešení pěších vazeb v území. Z tohoto důvodu je nutné zbudovat dočasnou lávku pro pěší, která je umístěna tak, aby nekolidovala s železobetonovým roznášecím roštem. Lávka bude provozována po celou dobu podskružení NK v poli 2 a následně bude demontována. Související dopravně – inženýrské opatření bude řešeno v samostatném Změnovém listu.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Nově zjištěnými skutečnostmi o charakteru podloží v místě založení bárky Pi2. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.				
PŘÍKAZNÍK:		AUTORSKÝ DOZOR:		ZHOTOVITEL:
Da Tot změny (P02).				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 052											
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 08.10.2024											
NOZ č. 052 navazuje na:	OZ č. 052	PZ č.												
Odesláno/ předáno:	osobně													
<u>ZL52 – SO 201 Tramvajový most přes Vltavu</u> <u>Kolize založení bérky Pi2 pro dočasnou skruž s neznámým mostním objektem pod ulicí Strakonická</u> Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 052). <u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.</u> Cena stavebních prací <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>-496 890,51 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>7 276 204,38 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>6 779 313,87 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>1 423 655,91 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>8 202 969,78 Kč</td> </tr> </table> Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Přehled nových položek v ZL č.052 - CN pro kalkulaci pol.č.250-027122.R, 251-027421a.R, 252-027422a.R, 253-027423a.R, 254-02750a.R, 255-029113.R, 256-02940a.R, 257-02943g.R, 258-02950a.R, 260-02720.R - SO 201 kalkulace pol.č.250-027122.R, 251-027421a.R, 252-027422a.R, 253-027423a.R, 254-02750a.R, 255-029113.R, 256-02940a.R, 257-02943g.R, 258-02950a.R, 259-02950b.R, 260-02720.R, 261-03730.R - Příloha č. 1 Rozložení prací na dopracování a úpravu dokumentace RDS (po ZL052)					Cena odpočty	-496 890,51 Kč	Cena přípočty	7 276 204,38 Kč	Cena celkem	6 779 313,87 Kč	DPH 21 %	1 423 655,91 Kč	Cena včetně DPH	8 202 969,78 Kč
Cena odpočty	-496 890,51 Kč													
Cena přípočty	7 276 204,38 Kč													
Cena celkem	6 779 313,87 Kč													
DPH 21 %	1 423 655,91 Kč													
Cena včetně DPH	8 202 969,78 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Dopad do HMG:												
šest milionů sedm set sedmdesát devět tisíc tři sta třináct korun českých osmdesát sedm haléřů		ANO												
(bez DPH)														
ZHOTOVITEL:	1/2	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKLADY:											
ST														
D														

Stavba č. 42821 – Dvorecký most

Stanovisko AD k Návrhu ohodnocení změny č. 052

SO 201 Tramvajový most přes Vltavu

Kolize založení bárky Pi2 pro dočasnou skruž s neznámým mostním objektem pod ulicí Strakonická

Autorský dozor bere na vědomí Návrh ohodnocení změny dle Změnového listu č. 52.

Popis a zdůvodnění změny byly doloženy v Oznámení změny č. 52, které bylo schváleno dne 31.1.2024

K ceně samotné se AD nevyjadřuje.

Ověření objemu provedených prací (tj. výměry provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou je odpovědností technického dozoru – příkazníka.

V Praze dne 13.12.2024



Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 052	
PoZ vystavil:		Datum: 13.12.2024	
PoZ č. 052 na NOZ č. 052		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí: 6 779 313,87 Kč bez DPH tj. 0,63 %, z toho: - odpočty činí: -496 890,51 Kč bez DPH tj. -0,05 % - přípočty činí: 7 276 204,38 Kč bez DPH tj. 0,68 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací: viz F01, F02		Počet připojených výkresů: viz F01	
Změna ceny díla (bez DPH): 6 779 313,87 Kč		Provedení změny: 09/2023–02/2025	
Nová cena díla (bez DPH): 1 206 402 888,60 Kč		Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 3 587 668,99 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 3 688 535,39 Kč	
Důvod ke změně:			
Nově zjištěnými skutečnostmi o charakteru podloží v místě založení bérky Pi2. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce

Dá

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 59	
Komu: INV MHMP		Datum: 12.7.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022	
Odkazy: na specifikaci:		SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu, Část 200.6 - Spodní stavba P4	
na výkresy:		Přílohy 01,03,04,05,06 a 07	
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací	
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla	
dopad do HMG:		ANO	
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna	
<u>ZL59 – Tramvajový most přes Vltavu,</u> <u>Část 200.6 - Spodní stavba P4</u> V rámci zpracování RDS dochází k následujícím změnám oproti dokumentaci DVZ: - Bylo provedeno zkrácení délky základu pilíře P4 z délky 26,0 m na 24,5 m na základě úpravy způsobu založení pilíře P4 na vrtaných pilotách a změně průměru pilot dle doplňkových průzkumných prací a vlivem podrobného statického výpočtu založení a spodní stavby. - Byla upřesněna spotřeba betonu dřívku pilíře stanovená z odsouhlaseného přesného 3D modelu. - Byla upřesněna spotřeba betonářské výztuže základu pilíře a betonářské výztuže dřívku pilíře. Předchozí projektový stupeň PDPS (DVZ) byl vypracován v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění. V rámci DVZ byla spotřeba betonářské výztuže stanovena odborným odhadem, ve spotřebě 200 kg/m³ pro základ i dřív pilíře P4. V rámci RDS je proveden podrobný statický výpočet a rozkreslení výkresů výztuže základů i dřívů spodní stavby do podrobnosti potřebných pro realizaci stavby. Změna spotřeby množství betonářské výztuže základu i dřívku pilíře P4 je způsobena podrobnějším rozkreslením na základě podrobného statického výpočtu ve stupni RDS. - Úprava a upřesnění způsobu a rozsahu provedení izolace základů spodní stavby proti zemní vlhkosti.			
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Zpracováním podrobného návrhu pilíře s ohledem na změnu založení (viz změna č. ZL 15a) a zpracováním podrobného statického řešení v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.			
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:	
			
změny (PoZ).			

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 059	
NOZ zpracoval: Zhotovitel		Datum: 20.11.2024		
NOZ č. 059 navazuje na:	OZ č. 059	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL59 – SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu,</u> <u>Část 200.6 - Spodní stavba P4</u> Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 59) <u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.</u> Cena stavebních prací Cena odpočty -1 256 733,01 Kč Cena přípočty 2 020 652,47 Kč Cena celkem 763 919,46 Kč DPH 21 % 160 423,09 Kč Cena včetně DPH 924 342,55 Kč Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Přehled nových položek v ZL 059				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): sedm set šedesát tři tisíc devět set devatenáct korun českých čtyřicet šest haléřů (bez DPH)		Dopad do HMG: ANO		
ZH ST D				

Stavba č. 42821 – Dvorecký most

Stanovisko AD k Návrhu ohodnocení změny č. 059

SO 201 – Tramvajový most přes Vltavu

Část 200.6 – Spodní stavba P4

Autorský dozor bere na vědomí Návrh ohodnocení změny dle Změnového listu č. 59.

Popis a zdůvodnění změny byly doloženy v Oznámení změny č. 59, které bylo schváleno dne 20.3.2024

K ceně samotné se AD nevyjadřuje.

Ověření objemu provedených prací (tj. výměry provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou je odpovědností technického dozoru – příkazníka.

V Praze dne 11.12.2024



Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 059	
PoZ vystavil:		Datum: 11.12.2024	
PoZ č. 059 na NOZ č. 059		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí: 763 919,46 Kč bez DPH tj. 0,07 %, z toho: - odpočty činí: -1 256 733,01 Kč bez DPH tj. -0,12 % - přípočty činí: 2 020 652,47 Kč bez DPH tj. 0,19 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací: viz F01, F02		Počet připojených výkresů: viz F01	
Změna ceny díla (bez DPH): 763 919,46 Kč		Provedení změny: 12/2023–07/2024	
Nová cena díla (bez DPH): 1 207 166 808,06 Kč		Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 1 937 524,61 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 83 127,86 Kč	
Důvod ke změně: Zpracováním podrobného návrhu pilíře s ohledem na změnu založení (viz změna č. ZL 15a) a zpracováním podrobného statického řešení v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce
Da			

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 59a	
Komu: INV MHMP			Datum: 11.3.2024	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu, Část 200.6 - Spodní stavba P4 – Změna „a“		
na výkresy:		Přílohy 01a,05a,06a a 07a		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL59a – Tramvajový most přes Vltavu,</u> <u>Část 200.6 - Spodní stavba P4 – Změna „a“</u> V rámci zpracování RDS dochází k následujícím změnám oproti dokumentaci DVZ: - Byla provedena úprava skladby betonářské výztuže dříku pilíře pro druhou etapu betonáže dříku pilíře P4. Dochází k úpravě skladby a tvarů některých vložek výztuže dle požadavků statického výpočtu a konstrukčních zásad.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Zpracováním podrobného návrhu pilíře v souladu se podrobným statickým řešením v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.				
P				
D				
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 059a	
NOZ zpracoval: Zhotovitel		Datum: 20.11.2024		
NOZ č. 059a navazuje na:	OZ č. 059a	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL59a – SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu,</u> <u>Část 200.6 - Spodní stavba P4 – Změna „a“</u> Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 59a) <u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.</u> Cena stavebních prací Cena odpočty 0,00 Kč Cena přípočty 127 536,68 Kč Cena celkem 127 536,68 Kč DPH 21 % 26 782,70 Kč Cena včetně DPH 154 319,38 Kč Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) Navrhovaná změna ceny díla (slovy): jedno sto dvacet sedm tisíc pět set třicet šest korun českých šedesát osm haléřů (bez DPH)				
ZHOTOVITEL: 14		AUTORSKÝ DOZOR:		PŘÍKAZNÍK: 14

Stavba č. 42821 – Dvorecký most

Stanovisko AD k Návrhu ohodnocení změny č. 059a

SO 201 – Tramvajový most přes Vltavu

Část 200.6 – Spodní stavba P4 – Změna „a“


Autorský dozor bere na vědomí Návrh ohodnocení změny dle Změnového listu č. 59a.

Popis a zdůvodnění změny byly doloženy v Oznámení změny č. 59a, které bylo schváleno dne 20.3.2024


K ceně samotné se AD nevyjadřuje.

Ověření objemu provedených prací (tj. výměry provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou je odpovědností technického dozoru – příkazníka.

V Praze dne 11.12.2024



Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 059a	
PoZ vystavil:		Datum: 11.12.2024	
PoZ č. 059a na NOZ č. 059a		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí: 127 536,68 Kč bez DPH tj. 0,01 %, z toho: - odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 127 536,68 Kč bez DPH tj. 0,01 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací: viz F01, F02		Počet připojených výkresů: viz F01	
Změna ceny díla (bez DPH): 127 536,68 Kč		Provedení změny: 05-07/2024	
Nová cena díla (bez DPH): 1 207 294 344,74 Kč		Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 127 536,68 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč	
Důvod ke změně: Zpracováním podrobného návrhu pilíře v souladu se podrobným statickým řešením v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce
Da			

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 60	
Komu: INV MHMP			Datum: 12.7.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu, Část 200.7 - Spodní stavba P5		
na výkresy:		Přílohy 01,03,04,05,06 a 07		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL60 – Tramvajový most přes Vltavu,</u> <u>Část 200.7 - Spodní stavba P5</u> V rámci zpracování RDS dochází k následujícím změnám oproti dokumentaci DVZ: - Byla upřesněna spotřeba betonu dříku pilíře stanovená z odsouhlaseného přesného 3D modelu. - Byla upřesněna spotřeba betonářské výztuže základu pilíře P5 a betonářské výztuže dříku pilíře. Předchozí projektový stupeň PDPS (DVZ) byl vypracován v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění. V rámci DVZ byla spotřeba betonářské výztuže stanovena odborným odhadem, ve spotřebě 200 kg/m3 pro základ i dřík pilíře P5. V rámci RDS je proveden podrobný statický výpočet a rozkreslení výkresů výztuže základů i dříků spodní stavby do podrobnosti potřebných pro realizaci stavby. Změna spotřeby množství betonářské výztuže základu i dříku pilíře P5 je způsobena podrobnějším rozkreslením na základě podrobného statického výpočtu ve stupni RDS. - Úprava a upřesnění způsobu a rozsahu provedení izolace základů spodní stavby proti zemní vlhkosti.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Zpracováním podrobného návrhu pilíře a zpracováním podrobného statického řešení v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.				
Př				
Da				
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 060	
NOZ zpracoval: Zhotovitel		Datum: 20.11.2024		
NOZ č. 060 navazuje na:	OZ č. 060	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL60 – SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu.</u> <u>Část 200.7 - Spodní stavba P5</u> Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 60) <u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.</u> Cena stavebních prací Cena odpočty -316 085,77 Kč Cena přípočty 2 070 692,35 Kč Cena celkem 1 754 606,58 Kč DPH 21 % 368 467,38 Kč Cena včetně DPH 2 123 073,96 Kč Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Přehled nových položek v ZL 060				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): jeden milion sedm set padesát čtyři tisíc šest set šest korun českých padesát osm haléřů (bez DPH)		Dopad do HMG: ANO		
ZHOTOVITEL: 10	AUTORSKÝ DOZOR:		PŘÍKAZNÍK:	

Stavba č. 42821 – Dvorecký most

Stanovisko AD k Návrhu ohodnocení změny č. 060

SO 201 – Tramvajový most přes Vltavu

Část 200.7 – Spodní stavba P5

Autorský dozor bere na vědomí Návrh ohodnocení změny dle Změnového listu č. 60.

Popis a zdůvodnění změny byly doloženy v Oznámení změny č. 60, které bylo schváleno dne 20.3.2024

K ceně samotné se AD nevyjadřuje.

Ověření objemu provedených prací (tj. výměry provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou je odpovědností technického dozoru – příkazníka.

V Praze dne 11.12.2024

In

TU

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 060	
PoZ vystavil:		Datum: 11.12.2024	
PoZ č. 060 na NOZ č. 060		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí: 1 754 606,58 Kč bez DPH tj. 0,16 %, z toho: - odpočty činí: -316 085,77 Kč bez DPH tj. -0,03 % - přípočty činí: 2 070 692,35 Kč bez DPH tj. 0,19 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 1 754 606,58 Kč		Provedení změny: 03/2024–09/2024	
Nová cena díla (bez DPH): 1 209 048 951,32 Kč		Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 1 993 386,19 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 77 306,16 Kč	
Důvod ke změně:			
Zpracováním podrobného návrhu pilíře a zpracováním podrobného statického řešení v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 60a	
Komu: INV MHMP			Datum: 15.3.2024	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu, Část 200.7 - Spodní stavba P5 – Změna „a“		
na výkresy:		Přílohy 01a,05a,06a a 07a		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL60a – Tramvajový most přes Vltavu,</u> <u>Část 200.7 - Spodní stavba P5 – Změna „a“</u> V rámci zpracování RDS dochází k následujícím změnám oproti dokumentaci DVZ: - Byla provedena úprava skladby betonářské výztuže dříku pilíře rozdělením několika vodorovně orientovaných vložek na dílčí části stykovaných přesahem a úpravou jejich zakončením dle požadavků statického výpočtu a konstrukčních zásad.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Zpracováním podrobného návrhu pilíře v souladu se podrobným statickým řešením v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.				
PŘÍKAZNÍK:		AUTORSKÝ DOZOR:		ZHOTOVITEL: 
Toto změny (PóZ).				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 060a	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 20.11.2024	
NOZ č. 060a navazuje na:	OZ č. 060a	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL60a – SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu,</u> <u>Část 200.7 - Spodní stavba P5 – Změna „a“</u>				
Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 60a)				
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.				
Cena stavebních prací				
Cena odpočty	0,00 Kč			
Cena přípočty	60 946,27 Kč			
Cena celkem	60 946,27 Kč			
DPH 21 %	12 798,72 Kč			
Cena včetně DPH	73 744,99 Kč			
Seznam příloh/Počet listů příloh:				
- Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):			Dopad do HMG:	
šedesát tisíc devět set čtyřicet šest korun českých dvacet sedm haléřů			ANO	
(bez DPH)				

Stavba č. 42821 – Dvorecký most

Stanovisko AD k Návrhu ohodnocení změny č. 060a

SO 201 – Tramvajový most přes Vltavu

Část 200.7 – Spodní stavba P5 – Změna „a“


Autorský dozor bere na vědomí Návrh ohodnocení změny dle Změnového listu č. 60a.

Popis a zdůvodnění změny byly doloženy v Oznámení změny č. 60a, které bylo schváleno dne 20.3.2024


K ceně samotné se AD nevyjadřuje.

Ověření objemu provedených prací (tj. výměry provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou je odpovědností technického dozoru – příkazníka.

V Praze dne 11.12.2024



Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 060a	
PoZ vystavil:		Datum: 11.12.2024	
PoZ č. 060a na NOZ č. 060a		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí: 60 946,27 Kč bez DPH tj. 0,01 %, z toho: - odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 60 946,27 Kč bez DPH tj. 0,01 % ceny díla bez D PH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 60 946,27 Kč		Provedení změny: 07-09/2024	
Nová cena díla (bez DPH): 1 209 109 897,59 Kč		Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 60 946,27 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč	
Důvod ke změně: Zpracováním podrobného návrhu pilíře v souladu se podrobným statickým řešením v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 71	
Komu: INV MHMP			Datum: 11.06.2024	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 416 – Úprava osvětlení parkoviště u hotelu Racek – změna „a“ na základě pokynu Příkazníka č.21		
na výkresy:		Přílohy č.02 a 03		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL71 – SO 416 – Úprava osvětlení parkoviště u hotelu Racek – změna „a“</u> Na základě Pokynu Příkazníka č.21 ze dne 29.05.2024 k vyprojektování a realizaci změny polohy sloupů č.1 parkoviště u hotelu Racek. Změna spočívá v: • Vyprojektování nové polohy a realizace sloupů č. 1 tak, aby byla možná jeho realizace vzhledem k podmínkám zastíženým na staveništi.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Pokynem Příkazníka č. 21 a podmínkami zastíženými na staveništi. - S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.				
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:		
				
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování návrhu na účelovou změnu (NÚZ). Změna je vyvolána změnou (PoZ).				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 071	
NOZ zpracoval: Zhotovitel		Datum: 29.10.2024		
NOZ č. 071 navazuje na:	OZ č. 071	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
ZL71 – SO 416 – Úprava osvětlení parkoviště u hotelu Racek, Změna „a“				
Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 71)				
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.				
Cena stavebních prací				
Cena odpočty	-2 166,87 Kč			
Cena přípočty	108 641,89 Kč			
Cena celkem	106 475,02 Kč			
DPH 21 %	22 359,75 Kč			
Cena včetně DPH	128 834,77 Kč			
Seznam příloh/Počet listů příloh:				
- Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Příloha č. 1 Rozložení prací na dopracování a úpravu dokumentace RDS (po ZL 071) - Přehled nových položek v ZL 071 - SO 416 kalkulace ceny pol.č.21-02943a.R				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Dopad do HMG:		
jedno sto šest tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých dva haléře		ANO		
(bez DPH)				
ZHOTOVITEL	AUTORSKÝ DOZOR	PŘÍKAZNÍK		
Da				

Stavba č. 42821 – Dvorecký most

Stanovisko AD k Návrhu ohodnocení změny č. 071

SO 416 – Úprava osvětlení parkoviště u hotelu Racek

Změna „a“

Autorský dozor bere na vědomí Návrh ohodnocení změny dle Změnového listu č. 71.

Popis a zdůvodnění změny byly doloženy v Oznámení změny č. 71, které bylo schváleno dne 12.6.2024

K ceně samotné se AD nevyjadřuje.

Ověření objemu provedených prací (tj. výměry provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou je odpovědností technického dozoru – příkazníka.

V P... 1... 11.12.2024

In

TU

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 071	
PoZ vystavil:		Datum: 11.12.2024	
PoZ č. 071 na NOZ č. 071		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí: 106 475,02 Kč bez DPH tj. 0,01 %, z toho: - odpočty činí: -2 166,87 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 108 641,89 Kč bez DPH tj. 0,01 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 106 475,02 Kč		Provedení změny: 08/2024	
Nová cena díla (bez DPH): 1 209 216 372,61 Kč		Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 57 946,52 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 50 695,37 Kč	
Důvod ke změně: Pokynem Příkazníka č. 21 a podmínkami zastiženými na staveništi. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce
Datum			

Stavba č. 42821 Dvorecký most						FO I	
OZNÁMENÍ ZMĚNY						OZ č. 78	
Komu: INV MHMP					Datum: 30.11.2023		
Odesláno/ předáno:			osobně			osobně	
Týká se:				SOD č. DIL/21/06/007480/2022			
Odkazy: na specifikaci:				SO 103 – Žluté lázně, vozovky a zpevněné plochy, změna „a“ – rozšíření sjezdu v areálu Žlutých lázní			
na výkresy:				Přílohy č.01, 02,			
na rozpočtové podklady:				Změnový soupis prací			
na jinou část smlouvy:				Čl. 4 Změny díla			
dopad do HMG:				NE			
kategorizace položek:				Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna			
<u>ZL78 – SO 103 – Žluté lázně, vozovky a zpevněné plochy Změna „a“ – Rozšíření sjezdu v areálu Žlutých lázní</u> V rámci zpracování RDS dochází k následující změně oproti dokumentaci DVZ: - Rozšíření plochy pro nájezd rozměrnějších vozidel. V souvislosti s realizací nového vjezdu do areálu a související úpravy vnitroareálového dopravního řešení je potřeba rozšířit plochu pro nájezd rozměrnějších vozidel.							
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Zpracováním podrobného řešení v rámci RDS. - Rozšíření sjezdu v areálu Žlutých lázní na základě úpravy dopravního řešení, - S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.							
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:			ZHOTOVITEL:			
Date							
Toto změní							

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 078	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 08.10.2024	
NOZ č. 078 navazuje na:		OZ č. 078	PZ č.	
Odesláno/ předáno:		osobně		
<u>ZL78 – SO 103 - Žluté lázně – vozovky a zpevněné plochy,</u> <u>Změna „a“- rozšíření sjezdu v areálu Žlutých lázní</u>				
Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 78)				
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.				
Cena stavebních prací				
Cena odpočty 0,00 Kč				
Cena připočty 132 162,01 Kč				
Cena celkem 132 162,01 Kč				
DPH 21 % 27 754,02 Kč				
Cena včetně DPH 159 916,03 Kč				
Seznam příloh/Počet listů příloh:				
- Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Příloha č. 1 Rozložení prací na dopracování a úpravu dokumentace RDS (po ZL 078) - Přehled nových položek v ZL 078 - SO 103 kalkulace ceny pol.č.17–02943.R				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): jedno sto třicet dva tisíc jedno sto šedesát dva korun českých jeden haléf (bez DPH)			Dopad do HMG: ANO	
ZHOTOVITEL: 		AUTORSKÝ DOZOR:		PŘÍKAZNÍK: 
ST D				

Stavba č. 42821 – Dvorecký most

Stanovisko AD k Návrhu ohodnocení změny č. 078

SO 103 Žluté lázně, vozovky a zpevněné plochy

Změna „a“ – Rozšíření sjezdu v areálu. Žlutých lázní


Autorský dozor bere na vědomí Návrh ohodnocení změny dle Změnového listu č. 78.

Popis a zdůvodnění změny byly doloženy v Oznámení změny č. 78, které bylo schváleno dne 7.8.2024.

K ceně samotné se AD nevyjadřuje.

Ověření objemu provedených prací (tj. výměry provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou je odpovědností technického dozoru – příkazníka.

V Praze dne 13.11.2024



Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 078
PoZ vystavil:	Datum: 02.12.2024	
PoZ č. 078 na NOZ č. 078	na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:	osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí: 132 162,01 Kč bez DPH tj. 0,01 %, z toho: - odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 132 162,01 Kč bez DPH tj. 0,01 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.		
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů: viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 132 162,01 Kč	Provedení změny: 03-04/2023	
Nová cena díla (bez DPH): 1 209 348 534,62 Kč	Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 132 162,01 Kč	
Důvod ke změně: Zpracováním podrobného řešení v rámci RDS. Rozšíření sjezdu v areálu Žlutých lázní na základě úpravy dopravního řešení. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poznámka: 		

Stavba č. 42821 Dvorecký most				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 87	
Komu: INV MHMP			Datum: 27.09.2024		
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně	
Týká se:			SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:			SO 133 - Přístupy na stavbu – pravý břeh Vltavy, Změna "a" Komunikace k botelu a na parkoviště, na základě pokynu Příkazníka č.19,		
na výkresy:			pokyn Příkazníka č.19, příloha č.02		
na rozpočtové podklady:			Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:			Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:			ANO		
kategorizace položek:			Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL87 – SO 133 Přístupy na stavbu – pravý břeh Vltavy</u> <u>Změna "a" Komunikace k botelu a na parkoviště</u> Na základě pokynu Příkazníka č.19 ze dne 29.04.2024 k podrobnému vyprojektování v rámci RDS a následné realizaci provizorního vjezdu do areálu Kondor Šán vč. komunikace k botelu Racek. Přístup na staveniště po nábrežní bermě není možné realizovat dle DVZ. Změna spočívá v podrobném vyprojektování a realizaci: - Provizorního vjezdu do areálu Kondor Šán. - Komunikace k botelu a na parkoviště botelu Racek (výškové a dispoziční úpravy).					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Na základě pokynu Příkazníka č.19. - Potřebou zásobování staveniště v dalších fázích výstavby, původní řešení dle DVZ není možné. - S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.					
PŘÍKAZNÍK:		AUTORSKÝ DOZOR:		ZHOTOVITEL:	
Dat Tot změ					

Stavba č. 42821 Dvorecký most						FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY							NOZ č. 087
NOZ zpracoval: Zhotovitel					Datum: 12.12.2024		
NOZ č. 087 navazuje na:			OZ č. 087	PZ č.			
Odesláno/ předáno:			osobně				
<u>ZL87 – SO 133 – Přístupy na stavbu – pravý břeh Vltavy,</u> <u>Změna "a" Komunikace k botelu a na parkoviště</u>							
Podrobný popis a zdůvodnění viceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 87)							
<u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.</u>							
Cena stavebních prací							
Cena odpočty	0,00 Kč						
Cena přípočty	1 322 485,68 Kč						
Cena celkem	1 322 485,68 Kč						
DPH 21 %	277 721,99 Kč						
Cena včetně DPH	1 600 207,67 Kč						
Seznam příloh/Počet listů příloh:							
- Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Příloha č. 1 Rozložení prací na dopracování a úpravu dokumentace RDS (po ZL 087) - Přehled nových položek v ZL 087 - SO 133 kalkulace ceny pol.č.23–02943.R							
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): jeden milion tři sta dvacet dva tisíc čtyři sta osmdesát pět korun českých šedesát osm haléřů (bez DPH)					Dopad do HMG: ANO		
ZHOTOVITEL: [signature]			AUTORSKÝ DOZOR:			PŘÍKAZNÍK: [signature]	
[Redacted Signature Area]							
Sd STRA Datum							

Stavba č. 42821 – Dvorecký most

Stanovisko AD k Návrhu ohodnocení změny č. 087

SO 133 – Přístupy na stavbu – pravý břeh Vltavy

Změna "a" Komunikace k botelu a na parkoviště

Autorský dozor bere na vědomí Návrh ohodnocení změny dle Změnového listu č. 87.

Popis a zdůvodnění změny byly doloženy v Oznámení změny č. 87, které bylo schváleno dne 2.10.2024

K ceně samotné se AD nevyjadřuje.

Ověření objemu provedených prací (tj. výměry provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou je odpovědností technického dozoru – příkazníka.

V

Ing

TU

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 087	
PoZ vystavil:		Datum: 11.12.2024	
PoZ č. 087 na NOZ č. 087		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí: 1 322 485,68 Kč bez DPH tj. 0,12 %, z toho: - odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 1 322 485,68 Kč bez DPH tj. 0,12 % ceny díla bez D PH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 1 322 485,68 Kč	Provedení změny: 10–11/2024		
Nová cena díla (bez DPH): 1 210 671 020,30 Kč	Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 1 144 009,42 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 178 476,26 Kč		
Důvod ke změně: Na základě pokynu Příkazníka č.19. Potřebou zásobování staveniště v dalších fázích výstavby, původní řešení dle DVZ není možné. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka: 			
Podpis zmocněnce Podpis zmocněnce Podpis zmocněnce Podpis zmocněnce			
Datum:			

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 92	
Komu: INV MHMP	Datum:	11.11.2024	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:	SOD č.	DIL/21/06/007480/2022	
Odkazy: na specifikaci:	SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu, Část 300.1-6 – Nosná konstrukce, Oznámení DM/2024/04, Vyjádření projektanta RDS č. DM-118,		
na výkresy:	příloha 01-02, 2-03-1c, 4-03-01, 5-03-01		
na rozpočtové podklady:	Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:	ANO		
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
ZL92 – SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu, Část 300.1-6 – Nosná konstrukce			
Zhotovitel v oznámení DM/2024/04 avizoval podstatnou změnu v množství a způsobu vyztužení nosné konstrukce SO 201 oproti návrhu vyztužení uvedeného v zadávací dokumentaci. Předchozí projektový stupeň PDPS (DVZ) byl vypracován v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění. V rámci DVZ byla spotřeba betonářské výztuže stanovena odborným odhadem. V rámci zpracování RDS dochází k následujícím změnám oproti dokumentaci DVZ: - Dopracováním RDS bylo upřesněno množství betonářské a předpínací výztuže pro každý takt nosné konstrukce SO 201. V rámci RDS byl proveden podrobný statický výpočet a rozkreslení výkresů výztuže do podrobností potřebných pro realizaci stavby. - Vzhledem k navýšenému množství betonářské výztuže, podrobného statického výpočtu a následnému průběhu (vedení) předpínacích kanálků byl upraven i vnitřní tvar nosné konstrukce. Vyšší stupeň vyztužení vyvolal nutnost zesílit v určitých částech mostní konstrukci desky, stěny a nálitky tak, aby se kanálky předpětí geometricky vešly do daného prostoru. Tím došlo i k navýšení množství betonu nosné konstrukce. Jedná se pouze o úpravy tvaru nepohledové části mostní konstrukce, vnější pohledová část mostní konstrukce je bez tvarových rozdílů vůči DVZ.			
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:			
- Oznámením zhotovitele DM/2024/04 - Zpracováním podrobného návrhu nosné konstrukce a zpracováním statického řešení v rámci RDS. - S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.			
Přijímající:	Ustanovené osobou:	Zhotovitel:	
změny (PoZ).			

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 092	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 20.11.2024	
NOZ č. 092 navazuje na:	OZ č. 092	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
ZL92 – SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu, Část 300.1-6 – Nosná konstrukce				
Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 92)				
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.				
Cena stavebních prací				
Cena odpočty	0,00 Kč			
Cena přípočty	36 748 543,63 Kč			
Cena celkem	36 748 543,63 Kč			
DPH 21 %	7 717 194,16 Kč			
Cena včetně DPH	44 465 737,79 Kč			
Seznam příloh/Počet listů příloh:				
- Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): třicet šest milionů sedm set čtyřicet osm tisíc pět set čtyřicet tři korun českých šedesát tři haléřů _____ (bez DPH)			Dopad do HMG: ANO	
ZHOTOVITEL: _____			PŘÍKAZNÍK: _____	
AUTORSKÝ DOZOR: _____				
S STR Dat				

Stavba č. 42821 – Dvorecký most

Stanovisko AD k Návrhu ohodnocení změny č. 092

SO 201 – Tramvajový most přes Vltavu


Část 300.1-6 – Nosná konstrukce

Autorský dozor bere na vědomí Návrh ohodnocení změny dle Změnového listu č. 92.

Popis a zdůvodnění změny byly doloženy v Oznámení změny č. 92, které bylo schváleno dne 27.11.2024

K ceně samotné se AD nevyjadřuje.

Ověření objemu provedených prací (tj. výměry provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou je odpovědností technického dozoru – příkazníka.



Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 092
PoZ vystavil:		Datum: 13.12.2024
PoZ č. 092 na NOZ č. 092		na jiný dokument:
Odesláno/ předáno:		osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí: 36 748 543,63 Kč bez DPH tj. 3,42 %, z toho: - odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 36 748 543,63 Kč bez DPH tj. 3,42 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.		
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů: viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 36 748 543,63 Kč	Provedení změny: 10/2024 -	
Nová cena díla (bez DPH): 1 247 419 563,93 Kč	Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 36 748 543,63 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč	
Důvod ke změně: Oznámením zhotovitele DM/2024/04. Zpracováním podrobného návrhu nosné konstrukce a zpracováním statického řešení v rámci RDS. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poznámka: 		

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 93	
Komu: INV MHMP		Datum: 14.11.2024		
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu, Část 200.6-7 – Spodní stavba, Oznámení DM/2024/10, Technický popis řešení		
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:		ANO		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<u>ZL93 – SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu, Část 200.6-7 – Spodní stavba P4 a P5</u>				
Zhotovitel v oznámení DM/2024/10 z 22.10.2024 informoval o změně v množství položky obsažené ve Smlouvě, a to konkrétně položky objektu SO 201 č.17–11511 “Čerpání vody do 500 l/min”. Změna množství této položky je způsobená prodloužením období, po které je nutné provádět danou činnost, která je podrobněji popsána v příloze Technický popis řešení. Dle zadání bylo čerpání vody ve výše uvedené položce plánováno po dobu 10 měsíců. S odkazem na aktuální stav, který je z způsoben dopadem již dříve schválených změn a skutečnosti zastižených na Díle, bude nutné čerpání vody provádět po dobu cca. 21 měsíců, a to do cca.08/2025 (do období po betonáži nosné konstrukce taktu 6, demontáži bednění a skruží, demontáži jeřábu v jímkách P4 a P5). Skutečná délka období, po které bude prováděno čerpání vody, bude sledováno a zaznamenáváno.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:				
- Oznámením zhotovitele DM/2024/10 - S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.				
Př				
Da				
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 093	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 20.11.2024	
NOZ č. 093 navazuje na:	OZ č. 093	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL93 – SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu,</u> <u>Část 200.6-7 – Spodní stavba P4 a P5</u>				
Podrobný popis a zdůvodnění víceprací je popsán ve formuláři pro oznámení změny (FO1 – OZ č. 93)				
<u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.</u>				
Cena stavebních prací				
Cena odpočty	0,00 Kč			
Cena přípočty	1 164 398,40 Kč			
Cena celkem	1 164 398,40 Kč			
DPH 21 %	244 523,66 Kč			
Cena včetně DPH	1 408 922,06 Kč			
Seznam příloh/Počet listů příloh:				
- Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Dopad do HMG:		
jeden milion jedno sto šedesát čtyři tisíc tři sta devadesát osm korun českých čtyřicet haléřů		ANO		
(bez DPH)				
ZHO				
—				
Sd				
STR				
Datu				

Stavba č. 42821 – Dvorecký most

Stanovisko AD k Návrhu ohodnocení změny č. 093

SO 201 – Tramvajový most přes Vltavu


Část 200.6-7 – Spodní stavba P4 a P5

Autorský dozor bere na vědomí Návrh ohodnocení změny dle Změnového listu č. 93.

Popis a zdůvodnění změny byly doloženy v Oznámení změny č. 93, které bylo schváleno dne 27.11.2024

K ceně samotné se AD nevyjadřuje.

Ověření objemu provedených prací (tj. výměry provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou je odpovědností technického dozoru – příkazníka.



Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 093
PoZ vystavil:	Datum: 13.12.2024	
PoZ č. 093 na NOZ č. 093	na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:	osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí: 1 164 398,40 Kč bez DPH tj. 0,11 %, z toho: - odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 % - přípočty činí: 1 164 398,40 Kč bez DPH tj. 0,11 % ceny díla bez DPH Jsou splněny podmínky pro schválení změny.		
Počet připojených listů specifikací: viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 1 164 398,40 Kč	Provedení změny: 11/2024 -	
Nová cena díla (bez DPH): 1 248 583 962,33 Kč	Orientační částky k valorizaci: Způsobitelná částka k valorizaci: 1 164 398,40 Kč Nezpůsobitelná částka k valorizaci: 0,00 Kč	
Důvod ke změně: Oznámením zhotovitele DM/2024/10. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poznámka:	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce
03.00.2023		
