

Revitalizace sportovního areálu Lipky – 2. etapa

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mirové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
registrován u: Městského v soudu; spis B 12459
zástupce: Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel, Ing. František Skala, ředitel Závodu
pozemních staveb Plzeň, oba na základě plné moci
IČO, DIČ: 28169522, CZ28169522
Bankovní spojení: 

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby se dohodly obě smluvní strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem č. 2- změnovými listy č. 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23. Uvedená změna rozsahu díla znamená zvýšení ceny o 2 920 405,45 Kč + DPH a úprava rozsahu dílčího termínového plnění dle kapitoly IV. Doba plnění, odstavec 1.c).

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se odstavec č. 2 doplňuje o písmeno f):

- f) rozpočtovým dodatkem – změnovými listy č. 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 (viz příloha č. 1 dodatku č. 2)

2. V čl. IV. se odstavec č. 1. první písm. c). v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým zněním:

- c) zprovoznění části díla pro veřejnost v rozsahu dokončení 15.6.2025
všech konstrukčních vrstev pod asfaltové vrstvy přístupové
středové komunikace P1 (p.č. 1130/8) a kolmé komunikace
k řece P2 včetně obratiště (p.č.1130/1)

3. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu 64.082.872,72 Kč bez DPH

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 18.4.2024 a dodatku č. 1 ze dne 03.12.2024.

Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 62. zasedání dne 02.06.2025.

Příloha č. 1: Změnové listy č. 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23

Příloha č. 2: Plná moc pro osoby zastupující zhotovitele

V Horažďovicích, dne 6. 6. 2025

Za objednatele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice



Za zhotovitele: GEOSAN GROUP a.s.

Ing. Kamil Vykydal
výkonný ředitel
na základě plné moci



Ing. František Skala
ředitel Závodu pozemních staveb Plzeň
na základě plné moci



Rekapitulace změn oproti PD - 27.5.2025

Stavba: Revitalizace sportovního areálu Lípky - 2. etapa - rekapitulace změnových listů pro dodatek č.2

Zl.	Název	více práce	menší práce	absolutní hodnota změny	změna celkem (připocty - odpady)	z toho §222 odst. 4 de minimis	z toho §222 odst. 5 - dodatečné stavební práce (nezbytné vícepráce pro dokončení díla)	z toho §222 odst. 6 - nepřidávadelné stavební práce (nové práce)	z toho §222 odst. 7 - změna obdobných položek kvalitativně stejných nebo lepší a cenově stejných nebo levnějších
7	doplnění mlatu								
10	zaměna asfaltu za dlažbu								
11	zaměna ohrubníků - žula/beton								
12	přípojky na MK1								
13	odpočet žulové dlažby								
14	doplnění výztuže do základu								
15	změna technického řešení vsaků								
16	kabelové propojení sáten s Aquaparkem								
17	úprava tlakové kanalizace								
18	doplnění odvodnění rampy, opěrných stěn a terpasí sádky u Aquaparku								
20	změna skladby fotbalového hřiště								
22	ochrana sloupů VO								
23	odpočet kontejneru na odpad								
CELKEM		4 259 524,29	-1 339 118,84	5 598 643,13	2 920 405,45				

Změnový list číslo**7****Identifikace akce**

Název akce:	Revitalizace sportovního areálu Lipky - 2. etapa
Číslo projektu:	AV.24014.1.190
Objednatel:	město Horažďovice - Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP, a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Projektant:	Bíza architekti s.r.o., Na Usedlosti 387/21, Praha 4

Předmět změnového listu

Doplnění vrstvy mlatového povrchu

Část díla dotčená změnovým listem

040 - SO 101.3 Fotbalové hřiště

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

PD obsahuje kompletní skladbu mlatového povrchu, ale VV neobsahuje vrstvu kamenné drti

Nové řešení :

Doplnění vrstvy mlatového povrchu

Zdůvodnění změny :

PD obsahuje kompletní skladbu mlatového povrchu, ale VV neobsahuje vrstvu kamenné drti

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

není

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: NE

Vliv na kvalitu: NE

Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH:**165 108,77 Kč****Odpočty z ceny díla bez DPH:****Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:****165 108,77 Kč**

Za zhotovitele:

Za TDS:

Za objednatele:

Rekapitulace změnového listu - ZL07

Přípočty k ceně díla bez DPH:	165 108,77 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	165 108,77 Kč

Změnový list číslo**10****Identifikace akce**

Název akce:	Revitalizace sportovního areálu Lipky - 2. etapa
Číslo projektu:	AV.24014.1.190
Objednatel:	město Horažďovice - Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP, a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Projektant:	Bíza architekti s.r.o., Na Usedlosti 387/21, Praha 4

Předmět změnového listu

Záměna asfaltového povrchu za betonovou dlažbu

Část díla dotčená změnovým listem

SO 200 Dopravní řešení

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Původní řešení obsahuje asfaltový povrch

Nové řešení :

Provedena záměna asfaltového povrchu za betonovou dlažbu

Zdůvodnění změny :

Sjednocení povrchu zpevněných ploch

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude řešeno v rámci skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: NE

Vliv na kvalitu: NE

Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH:	109 439,60 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-125 584,16 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-16 144,56 Kč	
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za objednatele:



Rekapitulace změnového listu - ZL10

Přípočty k ceně díla bez DPH:	109 439,60 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-125 584,16 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-16 144,56 Kč

Změnový list číslo**11****Identifikace akce**

Název akce:	Revitalizace sportovního areálu Lipky - 2. etapa
Číslo projektu:	AV.24014.1.190
Objednatel:	město Horažďovice - Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP, a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Projektant:	Bíza architekti s.r.o., Na Usedlosti 387/21, Praha 4

Předmět změnového listu

Záměna žulového krajníku za betonový

Část díla dotčená změnovým listem

SO 200 Dopravní řešení

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Původní řešení obsahuje žulový krajník

Nové řešení :

Provedena záměna žulového krajníku za betonový silniční

Zdůvodnění změny :

Provedena záměna žulového krajníku za betonový silniční

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude řešeno v rámci skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: NE

Vliv na kvalitu: NE

Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH:	25 084,53 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-77 790,43 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-52 705,90 Kč

Za zhotovitele:	Za TDS:	Za objednatele:
-----------------	---------	-----------------

		
--	--	--

Rekapitulace změnového listu - ZL11

Přípočty k ceně díla bez DPH:	25 084,53 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-77 790,43 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-52 705,90 Kč

Změnový list číslo**12****Identifikace akce**

Název akce:	Revitalizace sportovního areálu Lipky - 2. etapa
Číslo projektu:	AV.24014.1.190
Objednatel:	město Horažďovice - Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP, a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Projektant:	Bíza architekti s.r.o., Na Usedlosti 387/21, Praha 4

Předmět změnového listu

Doplnění kanalizačních a vodovodních přípojek v komunikaci MK1

Část díla dotčená změnovým listem

401a - SO 400 Veřejná kanalizace + 501a - SO 500 Veřejný vodovod

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Původní řešení neobsahuje přípojky

Nové řešení :

Doplnění vodovodních a kanalizačních přípojek

Zdůvodnění změny :

Doplnění vodovodních a kanalizačních přípojek

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude řešeno v rámci skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: ANO

Vliv na kvalitu: NE

Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH:**750 238,35 Kč****Odpočty z ceny díla bez DPH:****Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:****750 238,35 Kč**

Za zhotovitele:

Za TDS:

Za objednatele:



Rekapitulace změnového listu - ZL12

Přípočty k ceně díla bez DPH:	750 238,35 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	750 238,35 Kč

Změnový list číslo**13****Identifikace akce**

Název akce:	Revitalizace sportovního areálu Lipky - 2. etapa
Číslo projektu:	AV.24014.1.190
Objednatel:	město Horažďovice - Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP, a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Projektant:	Bíza architekti s.r.o., Na Usedlosti 387/21, Praha 4

Předmět změnového listu

Záměna žulové dlažby

Část díla dotčená změnovým listem

SO 200 Dopravní řešení

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Původní řešení obsahuje žulovou dlažbu

Nové řešení :

Provedená záměna žulové dlažby za dlažbu betonovou

Zdůvodnění změny :

Provedená záměna žulové dlažby za dlažbu betonovou

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude řešeno v rámci skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: NE

Vliv na kvalitu: NE

Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH:**107 671,00 Kč****Odpočty z ceny díla bez DPH:****-187 887,84 Kč****Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:****-80 216,84 Kč**

Za zhotovitele:

Za TDS:

Za objednatele:



Rekapitulace změnového listu - ZL13

Přípočty k ceně díla bez DPH:	107 671,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-187 887,84 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-80 216,84 Kč

Změnový list číslo		14	
Identifikace akce			
Název akce:	Revitalizace sportovního areálu Lipky - 2. etapa		
Číslo projektu:	AV.24014.1.190		
Objednatel:	město Horažďovice - Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP, a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III		
Projektant:	Bíza architekti s.r.o., Na Usedlosti 387/21, Praha 4		
Předmět změnového listu			
Doplnění výztuže do základových konstrukcí			
Část díla dotčená změnovým listem			
SO 101.1 Šatny, SO 101.2 Tribuna			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Původní řešení neobsahuje výztuž základových konstrukcí			
Nové řešení :			
Doplněna výztuž			
Zdůvodnění změny :			
Původní řešení neobsahuje výztuž základových konstrukcí			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
NE			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: ANO			
Vliv na kvalitu: NE			
Vliv na cenu: ANO			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		397 749,98 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:			
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		397 749,98 Kč	
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za objednatele:	
			

Rekapitulace změnového listu - ZL14

Přípočty k ceně díla bez DPH:	397 749,98 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	397 749,98 Kč

Změnový list číslo**15****Identifikace akce**

Název akce:	Revitalizace sportovního areálu Lipky - 2. etapa
Číslo projektu:	AV.24014.1.190
Objednatel:	město Horažďovice - Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP, a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Projektant:	Bíza architekti s.r.o., Na Usedlosti 387/21, Praha 4

Předmět změnového listu

Změna technického řešení vsaků

Část díla dotčená změnovým listem

SO 200 Dopravní řešení

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Původní řešení obsahuje dva vsakovací objekty

Nové řešení :

Nové řešení obsahuje záměnu za štěrkový vsakovací objekt a odvodnění do nových rozvodů pro odvod dešťových vod

Zdůvodnění změny :

Původní řešení nebylo možné realizovat vzhledem k výšce hladiny spodní vody.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

ANO

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: ANO

Vliv na kvalitu: NE

Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH:

267 094,12 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

-88 106,36 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

178 987,76 Kč

Za zhotovitele:

Za TDS:

Za objednatele:



Rekapitulace změnového listu - ZL15

Přípočty k ceně díla bez DPH:	267 094,12 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-88 106,36 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	178 987,76 Kč

Změnový list číslo**16****Identifikace akce**

Název akce:	Revitalizace sportovního areálu Lipky - 2. etapa
Číslo projektu:	AV.24014.1.190
Objednatel:	město Horažďovice - Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP, a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Projektant:	Bíza architekti s.r.o., Na Usedlosti 387/21, Praha 4

Předmět změnového listu

kabelové propojení šaten s Aquaparkem

Část díla dotčená změnovým listem

SO 101.1 Šatny

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Původní řešení neobsahuje propojení

Nové řešení :

Doplnění kabelového propojení šaten s Aquaparkem včetně doplnění přívodů pro čerpání vody

Zdůvodnění změny :

Doplnění kabelového propojení šaten s Aquaparkem včetně doplnění přívodů pro čerpání vody

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

ANO - bude řešeno ve skutečném provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: ANO

Vliv na kvalitu: NE

Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH:	524 097,49 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	524 097,49 Kč

Za zhotovitele:	Za TDS:	Za objednatele:
		

Rekapitulace změnového listu - ZL16

Přípočty k ceně díla bez DPH:	524 097,49 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	524 097,49 Kč

Změnový list číslo**17****Identifikace akce**

Název akce:	Revitalizace sportovního areálu Lipky - 2. etapa
Číslo projektu:	AV.24014.1.190
Objednatel:	město Horažďovice - Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP, a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Projektant:	Bíza architekti s.r.o., Na Usedlosti 387/21, Praha 4

Předmět změnového listu

Záměna veřejného a areálového vodovodu a doplnění armatur

Část díla dotčená změnovým listem

401b - SO 400 Areálová kanalizace + 401a - SO 400 Veřejná kanalizace

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

VV neobsahoval všechny potřebné armatury a nejsou zpracovány kladecí výkresy armatur

Nové řešení :

Došlo k doplnění armatur, k úpravě počtu přípojek dle upraveného zadání a k doplnění úpravy asfaltové komunikace v ulici Nábřežní (pro chráničku pro optický kabel)

Zdůvodnění změny :

Došlo k doplnění armatur, k úpravě počtu přípojek dle upraveného zadání a k doplnění úpravy asfaltové komunikace v ulici Nábřežní (pro chráničku pro optický kabel)

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

ANO - bude součástí PD skutečného provedení.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: ANO

Vliv na kvalitu: NE

Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH:		435 650,80 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	135 805,99 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		299 844,81 Kč

Za zhotovitele:

Za TDS:

Za objednatele:



Rekapitulace změnového listu - ZL17

Přípočty k ceně díla bez DPH:	435 650,80 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	135 805,99 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	299 844,81 Kč

Změnový list číslo**18****Identifikace akce**

Název akce:	Revitalizace sportovního areálu Lipky - 2. etapa
Číslo projektu:	AV.24014.1.190
Objednatel:	město Horažďovice - Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP, a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Projektant:	Bíza architekti s.r.o., Na Usedlosti 387/21, Praha 4

Předmět změnového listu

doplnění odvodnění rampy, opěrných stěn a čerpací šachty u Aquaparku

Část díla dotčená změnovým listem

401a - SO 400 Veřejná kanalizace

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Původní řešení neobsahuje odvod vody z prostoru ramp u Aquaparku a také neobsahuje opěrné zdi u servisního vstupu do Aquaparku

Nové řešení :

Doplňuje odvod vody z prostoru ramp u Aquaparku a také obsahuje opěrné zdi u servisního vstupu do Aquaparku

Zdůvodnění změny :

Původní řešení neobsahuje odvod vody z prostoru ramp u Aquaparku a také neobsahuje opěrné zdi u servisního vstupu do Aquaparku

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

ANO

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: ANO

Vliv na kvalitu: NE

Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH:	336 306,50 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	336 306,50 Kč

Za zhotovitele:

Za TDS:

Za objednatele:



Rekapitulace změnového listu - ZL18

Přípočty k ceně díla bez DPH:	336 306,50 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	336 306,50 Kč

Změnový list číslo		ZL 20	
Identifikace akce			
Název akce:	Revitalizace sportovního areálu Lipky - 2. etapa		
Číslo projektu:	AV.24014.1.190		
Objednatel:	město Horažďovice - Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP, a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III		
Projektant:	Bíza architekti s.r.o., Na Usedlosti 387/21, Praha 4		
Předmět změnového listu			
Změna skladby fotbalového hřiště			
Část díla dotčená změnovým listem			
041 - SO 101.3 Nový povrch, odvodnění			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Drenážní vrstva 70mm, vegetační vrstva 150mm, nejsou spojena jednotlivá drenážní pera do společného rozvodu			
Nové řešení :			
Nové řešení spojuje jednotlivá drenážní pera společným rozvodem včetně odvodu do akumulární nádrže a také doplňuje žlab na přechodu mlat/fotbalový trávník			
Zdůvodnění změny :			
Nové řešení spojuje jednotlivá drenážní pera společným rozvodem včetně odvodu do akumulární nádrže a také doplňuje žlab na přechodu mlat/fotbalový trávník			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
ANO			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: ANO			
Vliv na kvalitu: NE			
Vliv na cenu: ANO			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		1 113 803,85 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-692 225,78 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		421 578,07 Kč	
Za zhotovitele:		Za TDS:	Za objednatele:
			

Rekapitulace změnového listu - ZL 20

Přípočty k ceně díla bez DPH:	1 113 803,85 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-692 225,78 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	421 578,07 Kč

Změnový list číslo**22****Identifikace akce**

Název akce:	Revitalizace sportovního areálu Lipky - 2. etapa
Číslo projektu:	AV.24014.1.190
Objednatel:	město Horažďovice - Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP, a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Projektant:	Bíza architekti s.r.o., Na Usedlosti 387/21, Praha 4

Předmět změnového listu

Doplnění ocelové ochrany sloupů veřejného osvětlení

Část díla dotčená změnovým listem

SO 200 Dopravní řešení

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Původní řešení neobsahuje ochranu sloupů veřejného osvětlení v prostoru parkovacího stání

Nové řešení :

Nové řešení doplňuje ochranu sloupů veřejného osvětlení v prostoru parkovacího stání

Zdůvodnění změny :

Nové řešení doplňuje ochranu sloupů veřejného osvětlení v prostoru parkovacího stání

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

ANO

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: ANO

Vliv na kvalitu: NE

Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH:	27 279,30 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	27 279,30 Kč

Za zhotovitele:	Za TDS:	Za objednatele:
-----------------	---------	-----------------



Rekapitulace změnového listu - ZL22

Přípočty k ceně díla bez DPH:	27 279,30 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	27 279,30 Kč

Změnový list číslo**23****Identifikace akce**

Název akce:	Revitalizace sportovního areálu Lipky - 2. etapa
Číslo projektu:	AV.24014.1.190
Objednatel:	město Horažďovice - Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP, a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Projektant:	Bíza architekti s.r.o., Na Usedlosti 387/21, Praha 4

Předmět změnového listu

Odpočet kontejnerů na odpad

Část díla dotčená změnovým listem

150 - SO 150 Mobiliář

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Původní řešení obsahuje kontejnery na odpad

Nové řešení :

Nové řešení kontejnery na odpad neobsahuje

Zdůvodnění změny :

Odpočet proveden na základě požadavku investora

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

NE

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: NE

Vliv na kvalitu: NE

Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH:

0,00 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

-31 718,28 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

-31 718,28 Kč

Za zhotovitele:

Za TDS:

Za objednatele:



Rekapitulace změnového listu - ZL23

Přípočty k ceně díla bez DPH:	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-31 718,28 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-31 718,28 Kč

PLNÁ MOC

GEOSAN GROUP a. s., IČO: 281 69 522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III,
vložným rejstříkem Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Luděkem
Kostkou představenstva, a Ivanem Havlem, členem představenstva, tímto
z m o c ň u j e

výkonného ředitele společnosti,

ředitelku,

finanční

ředitele Závodu pozemních staveb Čechy,

ředitele Závodu pozemních staveb Plzeň,

ředitele Závodu pozemních staveb Ostrava,

ředitele Závodu pozemních staveb strategických projektů,

ředitele Závodu dopravních staveb,

ředitele Závodu pozemních staveb Brno,

ředitele Závodu pozemních staveb Hradec Králové,

náměstka,

výrobního

náměstka,

výrobního

náměstka,

výrobního náměstka,

náměstka pro ekologické stavby,

výrobního

obchodního náměstka,

obchodního náměstka,

obchodního

náměstka,

aby za společnost GEOSAN GROUP a. s. na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech, aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat alespoň jeden z dalších **patnácti** zmocněnců nebo alespoň jeden z dalších **patnácti** zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

Praha dne 2. ledna 2025




Luděk Kostka, předseda představenstva
GEOSAN GROUP a. s.



Ivan Havel, člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám zmocnění

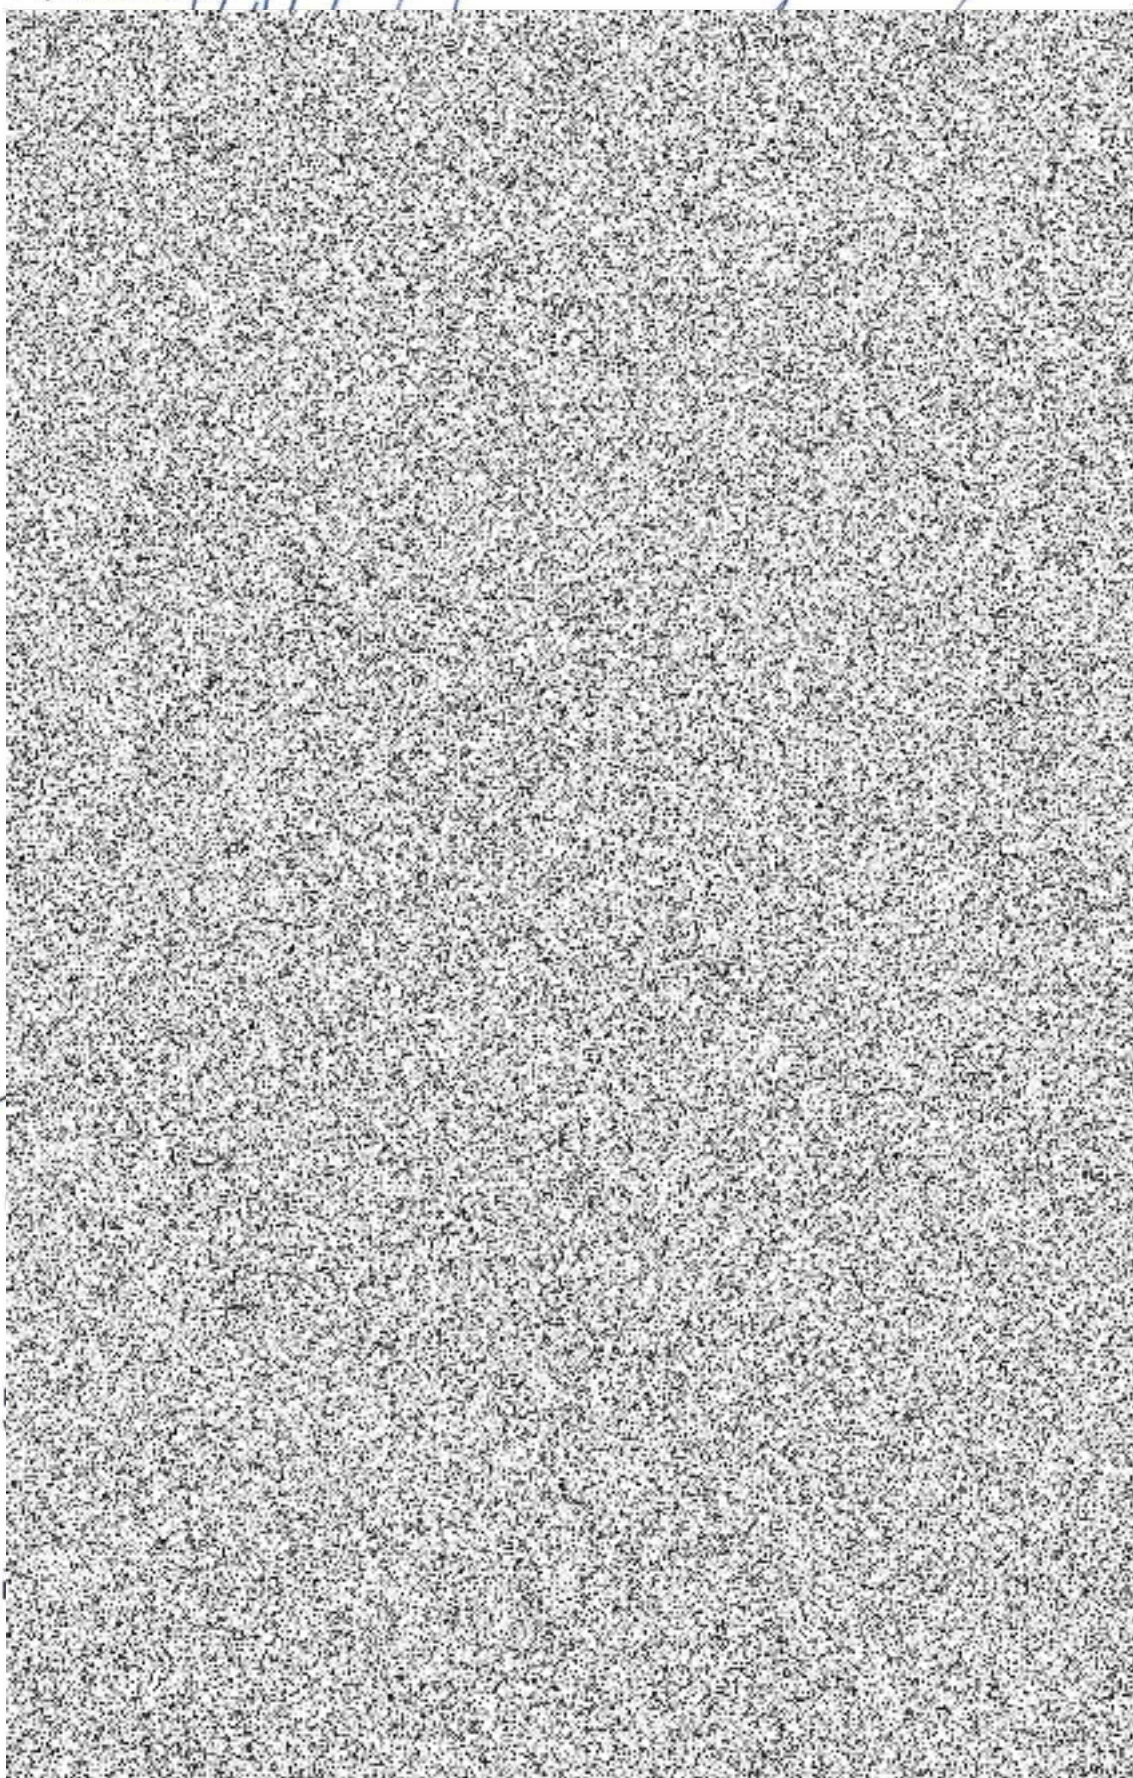

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **22879/031/2024**

Já, níže podepsaný



advokát

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v devatenácti (19) vyhotoveních podepsal:

jméno a příjmení	Luděk Kostka
datum narození	
bydliště	
místo narození	

jehož/jejíž totožnost byla prokázána z

typ dokladu	
číslo dokladu	
doklad vydal	
datum vydání dokladu	

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 2. 1. 2025

advokát

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 22879/032/2024

Já, níže podepsaný



advokát

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v devatenácti (19) vyhotoveních podepsal:

jméno a příjmení	Ivan Havel
datum narození	
bydliště	
místo narození	

jehož/jejíž totožnost byla prokázána z

typ dokladu	
číslo dokladu	
doklad vydal	
datum vydání dokladu	

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 2. 1. 2025



 advokát
