

Změnový list č. 5 ze dne 02.07.2025

Název stavby:	Oprava komunikací a chodníků - Etapa 1/2025		
Číslo smluvního vztahu:	2025038; MIROS25200154		
Název části stavby (PS, SO):	02 - Oprava komunikace konec ul. Z. Fibicha		
Objednatel:	Zhotovitel:		
Technické služby města Mostu a.s.	MI Roads a.s.		
Dělnická 164	Koželužská 2450/4		
434 01 Most	180 00 Praha 8, Libeň		
IČO: 64052265	IČO: 17331099		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dle zadání výběrového řízení a dle přiložené dokumentace.			
<u>Nové řešení:</u> Práce provedeny v souladu se zadáním - jedná se o zpřesnění rozsahu prací dle skutečného zaměření po dokončení. Posun termínu předání díla je vázán na vyřízení administrativy spojené se schválení ZL.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Zhotovitel provede práce dle pokynů objednatele. Práce je nutné realizovat k řádnému dokončení díla.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	1.449.736,07 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	-219.176,95 Kč		
Nová cena díla bez DPH:	1.230.559,12 Kč		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	06.07.2025		
Nový termín dokončení díla:	25.07.2025		

Změnu navrhuje

Datum: 2.7.2025

Podpis:

Změnový list vyhotovil:

Datum: 2.7.2025

Podpis

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu:

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

soupis prací
podklad pro zpracování změny
geodatické zaměření

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-02-05
Stavba: Oprava komunikací a chodníků - Etapa 1/2025

KSO:
Místo: MOST

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
SPOLEČNOST "POKLÁDKA ASFALTOVÉHO BETONU - MOST" (SPRÁVCE MI ROADS)

IČ: 173310099
DIČ: CZ17331099

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zpracovatel:
BAUM

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-219.176,95
--------------	-------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-219.176,95	-46.027,16
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-265.204,11
------------	---	-----	-------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25-02-05

Stavba: Oprava komunikací a chodníků - Etapa 1/2025

Místo: **MOST**

Datum: 16.06.2025

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY

Zhotovitel: SPOLEČNOST "POKLÁDKA ASFALTOVÉHO BETONU - MČ Zpracovatel:

MĚSTA MOSTU A.S.
BAUM

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-219.176,95	-265.204,11
02	OPRAVA KOMUNIKACE UL. Z. FIBICHA	-219.176,95	-265.204,11
ZL č. 1	DOMĚRKY - Zaměření rozsahu skutečně provedených prací	-219.176,95	-265.204,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací a chodníků - Etapa 1/2025

Objekt:

02 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. Z. FIBICHA

Soupis:

DOMĚRKY - Zaměření rozsahu skutečně provedených prací

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 16.06.2025

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

SPOLEČNOST "POKLÁDKA ASFALTOVÉHO BETONU - MOST" (SPRÁVCE MI ROAD)

IČ:

173310099

DIČ:

CZ17331099

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zpracovatel:

BAUM

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-219.176,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-219.176,95	21,00%	-46.027,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-265.204,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací a chodníků - Etapa 1/2025

Objekt:

02 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. Z. FIBICHA

Soupis:

DOMĚRKY - Zaměření rozsahu skutečně provedených prací

Místo:	MOST	Datum:	16.06.2025
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	Projektant:	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Zhotovitel:	SPOLEČNOST "POKLÁDKA ASFALTOVÉHO BETONU - MOST" (SPR Zpracovatel:	BAUM	

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

ROZPOČET CELKEM **-219.176,95**

001 - POLOŽKY Z RÁMCOVÉ SMLOUVY **-90.997,29**

HSV - Práce a dodávky HSV -90.997,29

1 - Zemní práce -6.049,50

5 - Komunikace pozemní -43.206,90

9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání -51.461,00

997 - Přesun sutě -4.488,28

998 - Přesun hmot 14.208,39

001 - POLOŽKY Z RÁMCOVÉ SMLOUVY **-128.179,66**

HSV - Práce a dodávky HSV -128.179,66

1 - Zemní práce -35.101,60

5 - Komunikace pozemní -62.010,56

8 - Trubní vedení 10.200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání -24.125,82

997 - Přesun sutě -55.182,38

998 - Přesun hmot 0,00

1000 - Nové položky - použité z jiných SO 38.040,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací a chodníků - Etapa 1/2025

Objekt:

02 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. Z. FIBICHA

Soupis:

DOMĚRKY - Zaměření rozsahu skutečně provedených prací

Místo: MOST

Datum: 16.06.2025

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel: SPOLEČNOST "POKLÁDKA ASFALTOVÉHO BETONU - MOST" (SPR Zpracovatel: BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

001 - POLOŽKY Z RÁMCOVÉ SMLOUVY

-90.997,29

D HSV Práce a dodávky HSV

-90.997,29

D 1 Zemní práce

-6.049,50

1	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	-109,000	55,50	-6.049,50
---	---	-----------	--	---	----------	-------	-----------

D 5 Komunikace pozemní

-43.206,90

2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě SD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-270,000	130,25	-35.167,50
3	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	-270,000	258,00	-69.660,00
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-51,200	228,00	-11.673,60
5	M	58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	52,920	1.385,00	73.294,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

-51.461,00

6	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-109,000	275,75	-30.056,75
7	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	-135,000	158,55	-21.404,25

D 997 Přesun sutě

-4.488,28

10	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-25,215	31,00	-781,67
11	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-252,150	7,20	-1.815,48
12	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17	t	-25,215	75,00	-1.891,13

D 998 Přesun hmot

14.208,39

13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	320,514	44,33	14.208,39
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

002 - POLOŽKY MIMO RÁMCOVOU SMLOUVU

-128.179,66

D HSV Práce a dodávky HSV

-128.179,66

D 1 Zemní práce

-35.101,60

1	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-270,000	98,00	-26.460,00
2	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-96,800	66,00	-6.388,80
3	K	113154553	Frézování živičného krytu tl 50 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	-51,200	44,00	-2.252,80

D 5 Komunikace pozemní

-62.010,56

4	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	-270,000	228,00	-61.560,00
5	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	-51,200	8,80	-450,56

D 8 Trubní vedení

10.200,00

6	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	-1,000	6.500,00	-6.500,00
7	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	2,000	5.500,00	11.000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	M	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 25 tun	kus	2,000	2.850,00	5.700,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				-24.125,82
19	K	919112222	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnicí zálivku v živičném krytu	m	-400,000	68,00	-27.200,00
20	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	10,000	70,00	700,00
21	K	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	28,000	99,00	2.772,00
10	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	-51,200	7,77	-397,82
D 997			Přesun sutě				-55.182,38
11	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-8,918	51,00	-454,82
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-89,180	9,25	-824,92
13	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-178,710	55,00	-9.829,05
14	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-1.787,100	12,00	-21.445,20
15	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17	t	-147,390	140,00	-20.634,60
16	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	-40,238	49,55	-1.993,79
D 998			Přesun hmot				0,00
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,000	77,77	0,00
D 1000			Nové položky - použité z jiných SO				38.040,70
1001	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla	kus	12,000	1.550,00	18.600,00
1002	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2.648,800	1,17	3.099,10
1003		890R	Příplatek za ruční pokládku asfaltového betonu	m2	297,120	55,00	16.341,60

PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo zakázky : 23045LN	Název zakázky : Oprava komunikací a chodníků - Etapa 1/2025 SO 01 - Oprava komunikace konec ul. J.Fibicha	ZL: 5
Požadavek zadal :	Datum zadání :	31.05.2025
Zpracovává :	Termín zpracování :	02.07.2025

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Práce dle skutečnosti

Před zahájením prací bylo provedeno místní šetření s doplněním požadavků objednatele, rovněž byl vytýčen začátek i konec opravovaného úseku.

Všecké práce byly provedeny v takto určeném rozsahu, včetně nezbytných vyrovnávek obrusné vrstvy- v souladu se zadáním. Zároveň bylo provedena výšková úprava všech dotčených vstupů IS a uličních vpustí, včetně výměny mříže. Po dokončení prací bylo provedeno geodetické zaměření plochy opravované části komunikace, včetně ručního přeměření ostních konstrukcí.


To zpřesňuje rozsah celkově provedených prací. Doplnění prací má vliv na cenu díla - soupis je přílohou (část RS + mimo RS).

PŘÍČINA / DŮVOD :

Zhotovitel bude postupovat dle pokynů objednatele.Po dokončení prací byl geodetem zaměřen rozsah prací a následně vyhotoven ZL č.1

Všechny objednatelům zadané práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.

POPIS / SCHEMA :

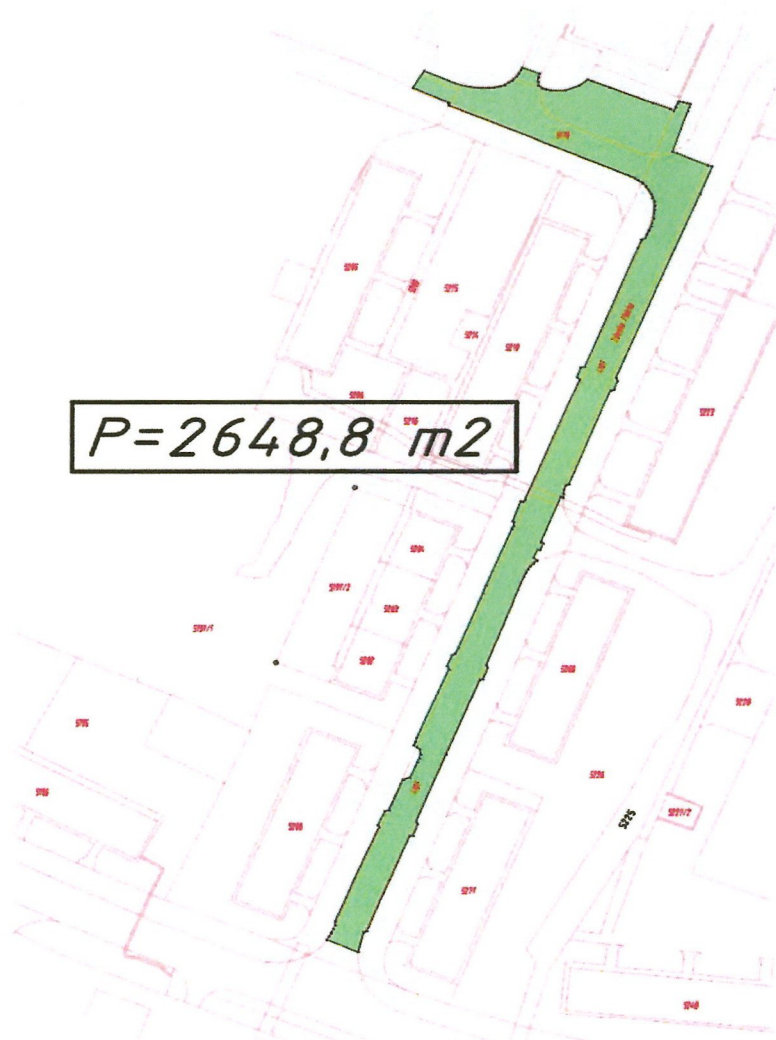



Vypracoval :		Odsouhlasil :	
--------------	--	---------------	--



GEODETICKÝ PROTOKOL



Dne	<u>27.06.2025</u>	bylo provedeno:	zam.plochy balené Most		
Kde:	<u>Ul.Fibichova</u>	úsek	<u>KÚ Most II</u>	Číslo protokolu	2025-033
Vytýčení bylo provedeno dle podkladů:-					
Který vyhotovil	-	v -	dne -	pod č. zak.	-
Způsob stabilizace	Kraj balené				
Seznam pevných bodů	<u>WRS NOW</u>				
Souřadnicový a výškový systém	<u>JTSK</u>				
Použité přístroje	<u>GPS R6 Trimble, TS Trimble S5 PCT7</u>		Počasí	<u>zataženo 32°C</u>	Strany <u>3</u>

Bylo provedeno:

1) Zaměřen byl kraj balené, obruba není součástí žádné plochy

3) Byl vyhotoven náčrt zaměření


4) Byla spočtena plocha balené dle skut.

Spočteno programem Trimble TBC, digitální zpracování je uloženo v PC fi GEOSTA

Viz náčrt

Plocha-silnice: 2648,8 m²

Datum: 27.06.2025, č. ověření: 2025/001-033



Náležitostmi a přesností odpovídá předpisům

Předal: ing. Ivan Kanta

Převzal:



GEODETICKÝ PROTOKOL



Náčrt:

$P = 2648,8 \text{ m}^2$

Předa

Převzal:



GEODETICKÝ PROTOKOL



Seznam souřadnic							
č.b.	y	x	z	č.b.	y	x	z
1	792046.509	990087.771		67	792031.606	990104.812	271.295
2	792051.610	990085.830		68	792025.037	990115.656	271.143
3	792094.808	990269.108		69	792028.007	990094.175	271.674
4	792075.316	990218.501	267.311	70	792027.686	990093.319	271.708
5	792076.082	990220.460	267.248	71	792027.335	990092.375	271.740
6	792081.758	990234.477	266.728	72	792028.184	990092.173	271.672
7	792082.576	990236.159	266.689	73	792029.141	990091.824	271.779
8	792083.288	990236.494	266.702	74	792030.130	990091.585	271.851
9	792084.470	990239.328	266.713	75	792030.363	990092.127	271.818
10	792084.029	990240.131	266.632	76	792030.772	990093.175	271.771
11	792091.520	990258.299	266.108	77	792031.216	990094.228	271.780
12	792091.799	990259.283	266.014	78	792032.108	990093.679	271.741
13	792092.320	990260.329	265.970	79	792036.264	990092.102	271.764
14	792091.653	990260.707	265.970	80	792060.481	990088.638	272.010
15	792090.879	990261.348	265.966	81	792061.524	990088.393	271.949
16	792090.700	990262.455	265.972	82	792062.499	990088.041	271.998
17	792090.945	990263.590	265.987	83	792063.346	990087.295	271.967
18	792091.412	990264.677	265.875	84	792063.501	990086.288	271.931
19	792093.090	990268.628	265.734	85	792063.422	990085.221	272.005
20	792099.012	990277.413	265.465	86	792063.148	990084.238	271.979
21	792098.097	990277.088	266.104	87	792067.277	990082.599	272.029
22	792100.427	990281.613	265.353	88	792067.483	990083.248	271.970
23	792100.670	990280.979	265.227	89	792067.917	990084.160	271.968
24	792100.705	990281.059	265.408	90	792068.602	990085.077	271.878
25	792110.661	990306.148	264.439	91	792069.429	990085.927	271.961
26	792110.676	990307.152	264.217	92	792070.374	990086.583	271.951
27	792111.102	990308.193	264.296	93	792071.319	990087.176	271.946
28	792111.553	990309.146	264.275	94	792072.343	990087.647	271.967
29	792112.065	990310.061	264.292	95	792083.046	990086.753	272.316
30	792112.697	990310.980	264.254	96	792090.357	990083.539	272.882
31	792105.262	990314.209	264.438	97	792092.924	990087.937	274.057
32	792103.989	990309.090	264.649	98	792084.742	990091.826	271.469
33	792103.249	990308.720	264.386	99	792084.417	990092.181	271.649
34	792093.195	990283.921	265.152	100	792084.503	990092.741	271.902
35	792092.423	990283.746	265.325	101	792041.466	990111.063	271.097
36	792091.274	990280.690	265.418	102	792040.421	990111.569	271.132
37	792091.714	990279.948	264.999	103	792039.516	990112.219	271.041
38	792084.777	990262.648	265.552	104	792038.531	990112.860	271.018
39	792076.737	990242.949	266.219	105	792037.746	990113.700	271.009
40	792076.040	990242.848	266.570	106	792037.092	990114.648	270.971
41	792074.834	990239.827	266.658	107	792036.520	990115.691	270.978
42	792075.220	990239.103	266.666	108	792036.105	990116.704	270.919
43	792066.534	990216.148	267.421	109	792035.756	990117.674	270.928
44	792066.001	990215.183	267.596	110	792035.668	990118.823	270.893
45	792065.478	990214.319	267.679	111	792035.739	990119.962	270.870
46	792064.888	990213.456	267.758	112	792035.807	990120.969	270.825
47	792064.192	990212.701	267.745	113	792035.995	990122.165	270.789
48	792063.405	990211.892	267.851	114	792036.537	990124.301	270.776
49	792064.126	990211.224	267.825	115	792037.010	990125.285	270.726
50	792063.179	990209.043	267.914	116	792037.450	990126.364	270.660
51	792062.653	990209.288	267.956	117	792037.870	990127.402	270.676
52	792061.896	990207.263	268.023	118	792038.667	990127.744	270.621
53	792062.399	990206.995	268.000	119	792052.113	990161.047	269.546
54	792062.393	990206.830	267.977	120	792053.077	990161.212	269.465
55	792057.712	990195.044	268.517	121	792053.973	990163.754	269.409
56	792057.079	990194.200	268.339	122	792053.362	990164.482	269.386
57	792056.887	990193.122	268.299	123	792066.237	990195.877	268.236
58	792056.575	990192.116	268.357	124	792066.659	990196.417	268.228
59	792055.801	990191.812	268.413	125	792067.219	990196.239	268.342
60	792045.990	990167.305	269.367	126	792069.146	990201.495	268.135
61	792045.174	990167.073	269.415	127	792068.900	990201.786	268.091
62	792044.278	990164.725	269.445	128	792068.881	990202.634	267.997
63	792044.705	990163.902	269.456	129	792069.352	990203.528	267.937
64	792022.224	990108.631	271.284	130	792056.930	990088.640	0.000
65	792023.438	990108.237	271.238	131	792053.650	990087.390	0.000
66	792030.500	990105.155	271.278	132	792057.240	990195.320	0.000

Předal: ing. Ivan Kanta

Převzal:
