

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 10. 1. 2025**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

BLOCK CRS a.s.

se sídlem: U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 07333366

DIČ: CZ07333366

zastoupena: Pavlem Frydrychem a Ing. Alešem Hubem, členy představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11061

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 1. 2025, ev. č. Objednatele 001/OVZ/24/104-OD, ev. č. Zhotovitele 101556/KOB/SD01 (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 10. 1. 2025, ev. č. Objednatele 001/OVZ/24/104-OD, ev. č. Zhotovitele 101556/KOB/SD01 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení prací na akci pod názvem „**Stavební úpravy pro instalaci sterilizační technologie na Centrální sterilizaci ve FN Ostrava**“ - zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost a výkon autorského dozoru“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.

2. Přesná specifikace víceprací a s tím související navýšení ceny o 584.900,- Kč bez DPH v části II. etapa, fáze 3A přílohy č. 1 Smlouvy je zaznamenáno v Oznámení o změnách akce č. 1, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Příloha č. 1“).

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Dodatek č. 1 vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Oznámení o změnách akce č. 1.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

MUDr. Zuzana
Čermáková Ph.D.

Digitálně podepsal MUDr.
Zuzana Čermáková Ph.D.
Datum: 2025.07.21 14:08:15
+02'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Ve Valašském Meziříčí dne _____

Pavel
Frydrych

Digitally signed by Pavel Frydrych
DN: cn=Pavel Frydrych, o=GZ,
o=BLOCK CRS a.s., ou=120380,
email=frydrych@blockcrs.cz
Date: 2025.07.15 18:44:33 +02'00'

Zhotovitel

Pavel Frydrych
člen představenstva spol. BLOCK CRS a.s.

Ing. Aleš
Hub

Digitálně podepsal
Ing. Aleš Hub
Datum: 2025.07.15
15:07:43 +02'00'

Zhotovitel

Ing. Aleš Hub
člen představenstva spol. BLOCK CRS a.s.

Oznámení o změnách akce č 1.

Identifikační údaje akce	
Název	Stavební úpravy pro instalaci sterilizační technologie na Centrální sterilizaci ve FN Ostrava - zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost a výkon autorského dozoru
001/OVZ/24/104-OD; CN-06/24s	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	BLOCK CRS a.s.
Adresa	U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí
Oznámení vystavil:	
	
Navrhované změny akce	
Název změnového listu: ZL 01 – Úpravy technického řešení provozu oddělení Centrální sterilizace	
Zdůvodnění navrhovaných změn	

V průběhu provádění projekčních prací došlo k úpravě (upřesnění) technického řešení výroby medicínální páry, která je pro provoz centrální sterilizace strategická. Studie vycházela ze zadání provozu oddělení Centrální sterilizace (CS), kdy sterilizátory měly mít vlastní vyvíječe páry. Nové řešení bylo navrženo s ohledem na provoz stávající parní kotelny. Samostatné vyvíječe páry nebudou osazeny v nově instalovaných sterilizátorech ale budou instalovány ve 2.NP strojovny vzduchotechniky nad prostorem centrální sterilizace. Docílí se tak možnosti kdykoliv parní strojovnu v případě plánovaných oprav odstavit, aniž by tato odstávka ohrozila chod CS. Tento požadavek projektant studie při jejím zpracování od objednatele neobdržel. Nárůst objemu projekčních prací jednotlivých profesí souvisí s těmito změnami:

1. Záloha médií pro technologická zařízení bude řešena (z výše uvedených důvodů) pomocí elektrických vyvíječů páry.
2. Změna velikosti a umístění nové UPS pro technologii - dle nového požadavku provozu CS nová UPS pokryje elektrickou potřebu technologických zařízení včetně rezervy 20% - celkový příkon 204 kW – po dobu 1 minuty, než naběhne záložní zdroj diesel, poté nová UPS pokryje elektrickou potřebu technologických zařízení – celkový příkon 152 kW x 0,7 (odsouhlasený koeficient současnosti chodu technologie pro dojetí procesů) = 107 kW – po dobu 60 minut. Nová UPS bude nově umístěna v m.č. A0208a ve 2.PP objektu energobloku EGB6 bez požadavku napojení UPS pro technologii na záložní zdroj diesel. V zadávací dokumentaci byla UPS navržena na dobu cca 10 minut a umístěna v m.č. C0119 v 1.PP objektu Centrální sterilizace.
3. Elektrické připojení ½ záložního zdroje páry na záložní zdroj diesel (DA) z elektrorozvodny vzdálené cca 200 m.
4. Vzhledem k novému prostoru a velikosti nové UPS pro technologii ve 2.PP objektu energobloku EGB6 bylo pro chlazení tohoto prostoru navrženo chlazení kondenzačními jednotkami s přímým výparníkem. Chlazení bude mít z hlediska bezpečnosti 100 % zálohu výkonu.
5. Napojení nových místností UPS pro technologii (m.č. A0207, m.č. A0208a) a místnost skladu filtrů (m.č. A0208) na stávající systém EPS ve FN Ostrava.
6. Projekční práce související se stavebními úpravami stávající místnosti č. A0208 (sklad filtrů). Souvisí s bodem 5.

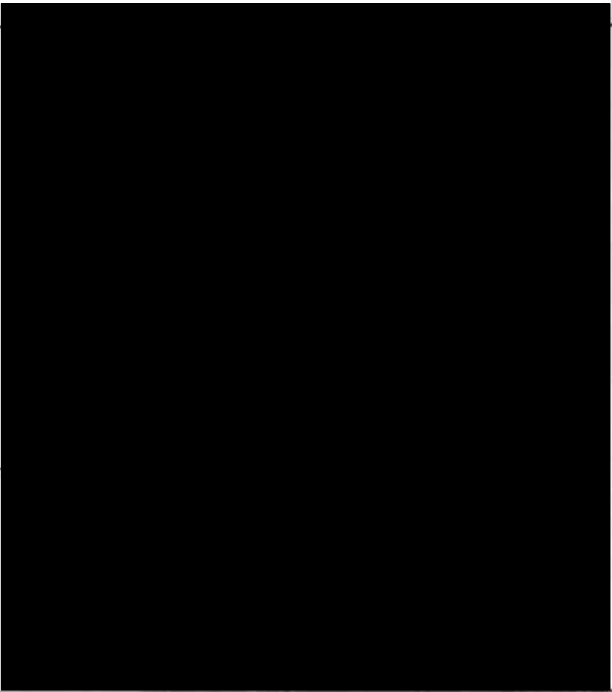
Dále došlo v průběhu provádění projekčních prací k úpravě požadavku na provoz pracoviště Centrální sterilizace v rozsahu:

7. Doplnění ultrazvukové myčky do prostoru centrální sterilizace v m.č. 0122.
8. Instalace automatických nakládacích a vykládacích dopravníků pro nové myčky.
9. Doplnění rozvodů stlačeného vzduchu pro setovací stoly.
10. Doplnění chlazení kanceláří m.č. 0137 – 0140 oddělení Centrální sterilizace.

Projektová dokumentace pro povolení stavby I. etapy, fáze 2A byla dokončena v řádném termínu dle SoD a předána stavebnímu úřadu. Tato PD již obsahuje výše popisované změny.

Vzniklé vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy, konkrétně II. etapy, fáze 3A projektové dokumentace pro provádění stavby. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické. Tyto změny zadavatel s péčí řádného hospodáře nemohl v době zadávání veřejné zakázky předvídat.

Odkazy na	specifikaci:	-
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	-
	na jinou část smlouvy:	-
Důvod vícepráce / méněpráce:		
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.		
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒
		odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
Kč	584 900 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	584 900 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	122 829 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	707 729 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 25.6.2025	
Datum: 25.6.2025	
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Stanovisko TDI:	Datum: Podpis TDI:
Stanovisko projektanta stavby:	Datum: Podpis projektanta stavby:
Seznam příložených dokladů:	
Příloha 1 – Cenová nabídka k ZL 01	
