

Evidence změny

(dále jen "Evidence")

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Strany smlouvy o dílo SMLD-0334 /00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.03.2025 (dále jen Smlouva):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Smluvní strany evidují s ohledem na znění čl. 6.7 písm. c) Smlouvy, ve smyslu čl. 7.2 a čl. 7.5. směrnice Objednatele R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice o změnách“) tuto změnu.

2. PŘEDMĚT EVIDENCE ZMĚNY

2. 1. Předmětem Evidence je vyhrazená Změna ze Smlouvy, jíž se rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“).

Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
- b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

2. 2. Doměrky jsou výhradně zpřesněním skutečně vykonaného množství oproti odhadovanému množství uvedenému v původním soupise prací, které nemění povahu zakázky ani jiné smluvní podmínky. Jakékoliv úpravy, které mění více než jen množství nebo mají vliv na povahu zakázky, nemohou být klasifikovány jako doměrky a musí být posuzovány jako potenciální změny smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

3. PROHLÁŠENÍ

3. 1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že tato Evidence je vyhrazenou změnou ve Skupině 1 Směrnice o změnách, pro níž platí čl. 7. 5. a 7. 6. Směrnice o změnách. Tato Evidence není změnou během výstavby (dále jen „ZBV“) ve smyslu úplné dokumentace Změny podle Směrnice o změnách (čl. 2.14 Směrnice o změnách).

4. PŘÍLOHY

4. 1. Přílohami této Evidence jsou krycí list, změnový list (dle čl. 7. 6. Směrnice o změnách), seznam dokladů a soupis prací SO po změnách.

4. 2. Přílohy jsou upraveny pro potřeby Evidence tak, aby z nich bylo patrné, že se nejedná o ZBV ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5. 1. Tato Evidence se uveřejňuje v registru smluv. Není-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, uveřejní tuto objednatel.

5. 2. Evidence je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

5. 3. Tato Evidence se s ohledem na čl. 7.5. Směrnice o změnách podepisuje elektronickými podpisy Smluvních stran.

Krycí list Evidence změny

Název Stavby dle SoD: III/10529 Sedlec - Kvasejovice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): silnice III/10529, km 10,500 - 13,200	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo Změny: 1
--	---	-------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Rekapitulace Změn č. 1 dle Skupiny 1

Změna č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-146 220,86	202 808,18	56 587,32

Části Změn se číslují číslem Změny, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

Evidence změny - krycí list

Změnový list			
Název Stavby dle SoD: III/10529 Sedlec - Kvasejovice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): silnice III/10529, km 10,500 - 13,200		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo Změny / Skupina změny: 1
Strany smlouvy o dílo SMLD-0334 /00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.03.2025 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov			
<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 6. Seznam dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po změně 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 27 počet listů		<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Upřesnění množství skutečně provedených prací (doměrky)			
Tato změna narovnává závěrečný stav množství položek po skončení stavebních prací na tomto stavebním objektu oproti stavu, jaký předpokládala PDPS. Jedná se o zjištění skutečně provedeného množství u položek č. 93818.A; 574C06; 574A44; 572213; 574A04; 113761 a 931312. Změna vychází z geometrického zaměření (protokol je přílohou této Evidence změny), skutečně dodaných tun směsi a zaměření skutečně provedeného stavu záливок silničním kolečkem. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena jako změna Vyhrazená do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu.			
Údaje v Kč bez DPH			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-146 220,86	202 808,18	56 587,32	349 029,04
Technická pomoc Objednatele: [v případě potřeby]			
jméno			
podpis			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
jméno			
Ing. Roman Wilkonský			
podpis			
Projektant (autorský dozor):			
jméno			
Petr Holub			
podpis			
Stavební dozor:			
jméno			
Petr Holub			
podpis			
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:			
jméno			
Ing. Jaroslava Jurková			
podpis			
Zástupce Objednatele:			
jméno			
Bc. Milan Jonszta			
podpis			

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list je povinnou přílohou Evidence podle čl. 7.5. Směrnice o změnách, která není Změnou během výstavby ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách. Evidence změny představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, Dis.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Freudl	podpis

Přehled dalších dokladů

Číslo Změny:	1
Název stavby:	III/10529 Sedlec - Kvasejovice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	silnice III/10529, km 10,500 - 13,200
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	- / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Oznámení Zhotovitele a Pokyn Objednatele	2
09 Sjetina z obalovny	7
10 Geometrické zaměření	18
Počet listů celkem	28

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: III/10529 Sedlec - Kvasejovice Číslo a název SO/PS: silnice III/10529, km 10,500 - 13,200 Číslo a název rozpočtu: silnice III/10529, km 10,500 - 13,200							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
							1						
							celkem po všech změnách						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO V Č. ZAJIŠTĚNÍ, ZAJIŠTĚNÍ A VYTÝČENÍ ING. SÍTÍ, ZAJIŠTĚNÍ STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY NA VDZ	KPL	1,000	1,000	0,000	70126,800	70 126,80	0,00	0,00	70 126,80	0,00	0,00%
2	113728.A	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH DO 5CM ODVOZ DO 20 KM	M3	3,000	3,000	0,000	720,700	2 162,10	0,00	0,00	2 162,10	0,00	0,00%
3	93818.A	OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	M2	15660,000	15787,970	127,970	0,700	10 962,00	0,00	89,58	11 051,58	89,58	0,82%
		EVIDENCE ZMĚNY 1: DLE GEODETICKÉHO PROTOKOLU = +127,970 M2											
4	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+	M3	783,000	747,610	-35,390	4131,700	3 235 121,10	-146 220,86	0,00	3 088 900,24	-146 220,86	-4,52%
		EVIDENCE ZMĚNY 1: DLE SJETINY Z OBALOVNY = 539,56+623,36+595,38 = 1758,30 TUN / Róbsd 2,3519 T/M3 = 747,610 M3											
5	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm	M2	15660,000	15787,970	127,970	214,100	3 352 806,00	0,00	27 398,38	3 380 204,38	27 398,38	0,82%
		EVIDENCE ZMĚNY 1: DLE GEODETICKÉHO PROTOKOLU = +127,970 M2											
6	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	31320,000	31575,940	255,940	6,400	200 448,00	0,00	1 638,02	202 086,02	1 638,02	0,82%
		EVIDENCE ZMĚNY 1: DLE GEODETICKÉHO PROTOKOLU = +2*127,970 = 255,940 M2											
7	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY 1M ŠÍŘE	M2	5382,000	5382,000	0,000	62,100	334 222,20	0,00	0,00	334 222,20	0,00	0,00%
8	113728.B	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20 KM	M3	215,000	215,000	0,000	720,700	154 950,50	0,00	0,00	154 950,50	0,00	0,00%
9	93818.B	OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	M2	5380,000	5380,000	0,000	0,700	3 786,00	0,00	0,00	3 786,00	0,00	0,00%
10	572223	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1 KG/M2	M2	5380,000	5380,000	0,000	6,400	34 432,00	0,00	0,00	34 432,00	0,00	0,00%
11	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 40 mm	M3	215,000	244,000	29,000	5943,600	1 277 874,00	0,00	172 364,40	1 450 238,40	172 364,40	13,49%
		EVIDENCE ZMĚNY 1: DLE SJETINY Z OBALOVNY = 150,72 + 240,82 + 178,10 = 569,64 TUN / Róbsd 2,3345 T/M3 = 244,000 M3											
12	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M2	1620,000	1620,000	0,000	35,400	57 348,00	0,00	0,00	57 348,00	0,00	0,00%
13	12932	ČIŠTĚNÍ PRIKOPU OD NÁNOSU DO 0,5M3/M S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M	2100,000	2100,000	0,000	104,200	218 820,00	0,00	0,00	218 820,00	0,00	0,00%
14	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	1818,000	1818,000	0,000	78,200	142 167,60	0,00	0,00	142 167,60	0,00	0,00%
15	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	1620,000	1620,000	0,000	58,300	94 446,00	0,00	0,00	94 446,00	0,00	0,00%
16	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM	M	20,000	20,000	0,000	52,100	1 042,00	0,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00%
17	113761	FŘEZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	20,000	31,000	11,000	57,300	1 146,00	0,00	630,30	1 776,30	630,30	55,00%
		EVIDENCE ZMĚNY 1: DLE RUČNÍHO ZAMĚŘENÍ KOLEČKEM NA STAVBĚ = +11,000 M2											
18	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR, ASE, ZALIVKOU	M	20,000	31,000	11,000	62,500	1 250,00	0,00	687,50	1 937,50	687,50	55,00%
		EVIDENCE ZMĚNY 1: DLE RUČNÍHO ZAMĚŘENÍ KOLEČKEM NA STAVBĚ = +11,000 M2											
19	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	675,000	675,000	0,000	85,500	57 712,50	0,00	0,00	57 712,50	0,00	0,00%
20	915211	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	675,000	675,000	0,000	273,000	184 275,00	0,00	0,00	184 275,00	0,00	0,00%
21	029113	OSTAT. POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	1,000	0,000	10420,800	10 420,80	0,00	0,00	10 420,80	0,00	0,00%
		Celkem						9 445 498,60	- 146 220,86	202 808,18	9 502 085,92	56 587,32	0,60%

Wilkonský Roman Ing.

Od: Milan Jonszta [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 26. června 2025 13:21
Komu: Wilkonský Roman Ing.
Kopie: Pospíšil Jan Ing.; Sládek Martin Ing.; Soukup Michal; Sládek Martin Ing.; Holub Petr
Předmět: RE: III/10529 Sedlec-Kvasejovice - ohlášení změny
Přílohy: přílohy 1-7 bez absolutní hodnoty 3 a 4.xlsx; ZBV - Evidence změny - VZOR.xlsx

Dobrý den, se zaslaným oznámením změn souhlasíme.
Jelikož se jedná o doměrky, budeme zařazovat do skupiny 1 a proto bude zpracováno do formuláře Evidence změny.

Prosím Vás tedy o zpracování do přiloženého souboru Evidence změny. Evidenci změny prosím pošlete v otevřeném formátu, ostatní přílohy v jednom PDF souboru – jako příloha k určení množství asfaltů postačí pouze sjetina (již není nutné dodávat vážní lístky).

V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat.

Děkuji a jsem s pozdravem,

S pozdravem,

Bc. Milan Jonszta

Vedoucí manažer

Zástupce vedoucího oblasti Benešov

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oblastní pracoviště: Křižíkova 1351, 256 01 Benešov



www.ksus.cz



From: Wilkonský Roman Ing. [REDACTED]
Sent: Wednesday, June 25, 2025 1:55 PM
To: Milan Jonszta [REDACTED]
Cc: Pospíšil Jan Ing. [REDACTED]; Sládek Martin Ing. [REDACTED]; Soukup Michal [REDACTED]
Subject: III/10529 Sedlec-Kvasejovice - ohlášení změny

Vážený objednateli,

Zasílám ohlášení doměření skutečnosti na konci stavby III/10529 Sedlec-Kvasejovice.

Dotčené položky jsou v příloze.

Ing. Roman Wilkonský

Vedoucí útvaru nakupování a řízení nákladů

B E S s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov u Prahy



odběratel - název - přehled expedice

B E S s.r.o.

Období: Od: 12.05.2025 4:00
Do: 12.05.2025 20:00

Podmínka: Období od 12.05.2025 4:00 do 12.05.2025 20:00, Místo určení - název=01100073 III/10529 Kvasej.cost code 20151000

Váženka	Datum	Zboží	SPZ	Netto	Cena	DPH	Celkem	Kč/t
Odběratel: B E S s.r.o.								
Místo určení: 01100073 III/10529 Kvasej.cost code 20151000								
18281	12.05.2025 8:08	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	3SH 8436	13,50				
18282	12.05.2025 8:11	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	3SH 8437	13,22				
18283	12.05.2025 8:17	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	3SV 6649	14,16				
18284	12.05.2025 8:23	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	8C4 4754	13,44				
18285	12.05.2025 8:25	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	3SP 7203	14,78				
18290	12.05.2025 10:02	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	3SH 8436	13,70				
18292	12.05.2025 10:30	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	3SH 8437	13,00				
18293	12.05.2025 10:55	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	8C4 4754	13,86				
18295	12.05.2025 11:11	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	3SV 6649	12,48				
18296	12.05.2025 11:18	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	3SP 7203	15,86				
18297	12.05.2025 12:19	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	3SH 8436	12,72				
Celkem za: 01100073 III/10529 Kvasej.cost code 20151000				150,72				
Celkem za: B E S s.r.o.				150,72				
Celkem:			11	150,72				

odběratel - název - přehled expedice

B E S s.r.o.

Období: Od: 13.05.2025 4:00
Do: 13.05.2025 20:00

Podmínka: Období od 13.05.2025 4:00 do 13.05.2025 20:00, Místo určení - název=01100073 III/10529 Kvasej.cost code 20151000

Váženka	Datum	Zboží	SPZ	Netto	Cena	DPH	Celkem	Kč/t
Odběratel: B E S s.r.o.								
Místo určení: 01100073 III/10529 Kvasej.cost code 20151000								
18314	13.05.2025 8:03	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	3SP 7203	12,18				
18315	13.05.2025 8:06	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	3SH 8436	13,20				
18317	13.05.2025 8:15	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	3SH 8437	13,46				
18318	13.05.2025 8:18	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	4SR 7101	12,26				
18320	13.05.2025 8:29	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	9S7 2755	9,30				
18322	13.05.2025 8:34	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	8C4 4754	13,52				
18323	13.05.2025 8:36	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	1S2 6032	11,54				
18328	13.05.2025 9:56	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	3SP 7203	13,14				
18331	13.05.2025 10:09	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	3SH 8436	14,42				
18335	13.05.2025 10:38	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	3SH 8437	13,80				
18338	13.05.2025 10:57	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	4SR 7101	12,24				
18340	13.05.2025 11:11	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	8C4 4754	15,32				
18342	13.05.2025 11:27	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	9S7 2755	7,82				
18343	13.05.2025 11:32	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	1S2 6032	10,94				
18345	13.05.2025 11:46	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	3SP 7203	13,72				
18350	13.05.2025 12:22	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	3SH 8436	13,64				
18352	13.05.2025 12:46	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	3SH 8437	12,62				
18353	13.05.2025 13:14	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	4SR 7101	13,84				
18354	13.05.2025 13:22	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	8C4 4754	13,86				
Celkem za: 01100073 III/10529 Kvasej.cost code 20151000				240,82				
Celkem za: B E S s.r.o.				240,82				
Celkem:			19	240,82				

odběratel - název - přehled expedice

B E S s.r.o.

Období: Od: 14.05.2025 4:00
Do: 14.05.2025 20:00

Podmínka: Období od 14.05.2025 4:00 do 14.05.2025 20:00, Místo určení - název=01100073 III/10529 Kvasej.cost code 20151000

Váženka	Datum	Zboží	SPZ	Netto	Cena	DPH	Celkem	Kč/t
Odběratel: B E S s.r.o.								
Místo určení: 01100073 III/10529 Kvasej.cost code 20151000								
18356	14.05.2025 6:39	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	3SP 7203	13,40				
18358	14.05.2025 6:49	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	3SH 8436	13,56				
18360	14.05.2025 7:01	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	4SK 5902	13,02				
18362	14.05.2025 7:09	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	3SH 8437	12,98				
18364	14.05.2025 7:24	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	4SR 7101	13,88				
18365	14.05.2025 7:37	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	8C4 4754	13,14				
18367	14.05.2025 7:46	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	3SV 6649	13,58				
18373	14.05.2025 8:13	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	1S2 6032	11,96				
18379	14.05.2025 8:47	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	3SP 7203	11,76				
18381	14.05.2025 8:58	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	3SH 8436	14,66				
18385	14.05.2025 9:28	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	4SK 5902	12,50				
18387	14.05.2025 9:45	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	3SH 8437	13,70				
18389	14.05.2025 10:03	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	4SR 7101	12,94				
18398	14.05.2025 11:37	ACO 11+ 50/70 +R CH 24-009	8C4 4754	7,02				
Celkem za: 01100073 III/10529 Kvasej.cost code 20151000				178,10				
Celkem za: B E S s.r.o.				178,10				
Celkem:			14	178,10				

odběratel - název - přehled expedice

B E S s.r.o.

Období: Od: 16.05.2025 4:00
Do: 16.05.2025 20:00

Podmínka: Období od 16.05.2025 4:00 do 16.05.2025 20:00, Místo určení - název=01100073 III/10529 Kvasej.cost code 20151000

Váženka	Datum	Zboží	SPZ	Netto	Cena	DPH	Celkem	Kč/t
Odběratel: B E S s.r.o.								
Místo určení: 01100073 III/10529 Kvasej.cost code 20151000								
18477	16.05.2025 7:43	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	2SZ 2664	17,20				
18478	16.05.2025 7:47	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SV 3848	17,18				
18479	16.05.2025 7:55	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	2SE 4673	23,00				
18482	16.05.2025 8:02	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SI 9641	17,58				
18483	16.05.2025 8:05	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	9S6 8739	16,36				
18484	16.05.2025 8:09	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	1AI A357	15,44				
18485	16.05.2025 8:18	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	6SU 4416	18,24				
18486	16.05.2025 8:20	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SM 4063	15,28				
18487	16.05.2025 8:23	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	8C4 4754	13,02				
18490	16.05.2025 8:40	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	9C7 8018	18,12				
18501	16.05.2025 9:51	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	2SZ 2664	17,44				
18503	16.05.2025 10:06	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SV 3848	17,14				
18504	16.05.2025 10:10	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SI 9641	16,50				
18508	16.05.2025 10:30	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	1AI A357	17,38				
18510	16.05.2025 10:35	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SM 4063	16,06				
18511	16.05.2025 10:37	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	8C4 4754	13,66				
18512	16.05.2025 10:42	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	6SU 4416	17,78				
18514	16.05.2025 10:57	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	2SE 4673	21,76				
18515	16.05.2025 11:03	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	9S6 8739	16,44				
18516	16.05.2025 11:18	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	3SH 8437	14,14				
18517	16.05.2025 11:21	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SK 5902	13,12				
18518	16.05.2025 11:26	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SF 2898	19,00				
18519	16.05.2025 11:35	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	9C7 8018	17,26				
18520	16.05.2025 11:39	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	2SE 4608	17,10				
18521	16.05.2025 11:44	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	3SV 6649	12,98				
18522	16.05.2025 11:48	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	6SH 1195	13,00				
18523	16.05.2025 11:53	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	2SZ 2664	15,38				
18524	16.05.2025 12:02	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	3SH 8436	13,92				
18525	16.05.2025 12:28	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SR 7101	12,90				
18526	16.05.2025 12:39	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SK 6926	17,86				
18527	16.05.2025 12:42	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SV 3848	17,06				
18528	16.05.2025 12:47	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SI 9641	15,48				
18529	16.05.2025 12:54	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SM 4063	14,78				
Celkem za: 01100073 III/10529 Kvasej.cost code 20151000				539,56				
Celkem za: B E S s.r.o.				539,56				
Celkem:			33	539,56				

odběratel - název - přehled expedice

B E S s.r.o.

Období: Od: 19.05.2025 4:00
Do: 19.05.2025 20:00

Podmínka: Období od 19.05.2025 4:00 do 19.05.2025 20:00, Místo určení - název=01100073 III/10529 Kvasej.cost code 20151000

Váženka	Datum	Zboží	SPZ	Netto	Cena	DPH	Celkem	Kč/t
Odběratel: B E S s.r.o.								
Místo určení: 01100073 III/10529 Kvasej.cost code 20151000								
18531	19.05.2025 6:46	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	2SZ 2664	15,68				
18533	19.05.2025 6:58	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SV 3848	16,54				
18535	19.05.2025 7:10	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	9C7 8018	16,62				
18540	19.05.2025 7:36	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SM 4063	16,64				
18542	19.05.2025 7:47	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SE 3709	17,94				
18545	19.05.2025 8:09	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SI 9641	17,84				
18547	19.05.2025 8:17	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	1AI A357	18,38				
18548	19.05.2025 8:23	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	8C4 4754	15,34				
18549	19.05.2025 8:29	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	6SU 4416	18,44				
18550	19.05.2025 8:36	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SR 5201	15,12				
18551	19.05.2025 8:39	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SR 5199	15,02				
18556	19.05.2025 9:17	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	2SZ 2664	18,16				
18557	19.05.2025 9:34	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SF 2898	18,10				
18558	19.05.2025 9:37	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SV 3848	18,12				
18559	19.05.2025 9:43	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	9C7 8018	18,18				
18560	19.05.2025 9:49	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	2SE 4608	18,38				
18561	19.05.2025 9:56	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SM 4063	18,08				
18562	19.05.2025 10:02	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SE 3709	17,98				
18563	19.05.2025 10:11	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	8C4 4754	13,60				
18564	19.05.2025 10:19	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SI 9641	18,26				
18565	19.05.2025 10:25	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	1AI A357	18,02				
18566	19.05.2025 10:38	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	6SU 4416	18,32				
18569	19.05.2025 10:45	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SR 5201	13,82				
18571	19.05.2025 10:52	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SR 5199	16,30				
18578	19.05.2025 11:37	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	2SZ 2664	15,08				
18579	19.05.2025 11:48	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SF 2898	18,30				
18580	19.05.2025 12:06	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	2SE 4608	17,54				
18582	19.05.2025 12:15	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	3SH 8436	14,08				
18583	19.05.2025 12:35	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SV 3848	16,74				
18584	19.05.2025 12:41	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	9C7 8018	16,90				
18585	19.05.2025 12:51	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SM 4063	14,44				
18586	19.05.2025 13:21	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SE 3709	18,24				
18587	19.05.2025 13:26	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	8C4 4754	15,12				
18588	19.05.2025 13:32	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SI 9641	18,24				
18589	19.05.2025 13:39	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	1AI A357	18,34				
18590	19.05.2025 13:45	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	6SU 4416	17,98				
18592	19.05.2025 13:55	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SR 5199	13,48				
Celkem za: 01100073 III/10529 Kvasej.cost code 20151000				623,36				
Celkem za: B E S s.r.o.				623,36				
Celkem:			37	623,36				

odběratel - název - přehled expedice

BES s.r.o.

Období: Od: 20.05.2025 4:00
Do: 20.05.2025 20:00

Podmínka: Období od 20.05.2025 4:00 do 20.05.2025 20:00, Místo určení - název=01100073 Sedlec - Kvasejovice / 20151000

Váženka	Datum	Zboží	SPZ	Netto	Cena	DPH	Celkem	Kč/t
Odběratel: BES s.r.o.								
Místo určení: 01100073 Sedlec - Kvasejovice / 20151000								
13686	20.05.2025 7:10	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	9S6 8739	16,56				
13687	20.05.2025 7:12	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	3SP 7203	13,58				
13688	20.05.2025 7:15	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	5SM 4063	16,14				
13689	20.05.2025 7:18	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	3SH 8436	15,98				
13690	20.05.2025 7:23	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	4SR 5199	16,42				
13691	20.05.2025 7:27	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	8C4 4754	14,52				
13692	20.05.2025 7:30	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	9C7 8018	16,64				
13693	20.05.2025 7:36	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	5SE 3709	17,66				
13694	20.05.2025 7:43	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	5SI 9641	17,26				
13695	20.05.2025 7:47	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	6SU 4416	16,52				
13696	20.05.2025 7:54	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	1AI A357	20,52				
13697	20.05.2025 8:38	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	3SP 7203	13,38				
13698	20.05.2025 8:46	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	5SM 4063	16,86				
13699	20.05.2025 8:49	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	3SH 8436	14,18				
13700	20.05.2025 8:56	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	4SR 5199	17,16				
13701	20.05.2025 8:59	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	8C4 4754	13,90				
13703	20.05.2025 9:03	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	9C7 8018	19,82				
13706	20.05.2025 9:15	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	5SE 3709	17,32				
13707	20.05.2025 9:19	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	5SI 9641	17,60				
13708	20.05.2025 9:26	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	6SU 4416	15,24				
13709	20.05.2025 9:32	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	1AI A357	18,54				
13710	20.05.2025 9:38	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	2SE 4673	21,56				
13711	20.05.2025 9:40	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	3SP 7203	13,44				
13712	20.05.2025 9:52	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	5SM 4063	15,72				
13713	20.05.2025 9:56	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	3SH 8436	13,44				
13714	20.05.2025 10:00	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	4SR 5199	17,94				
13715	20.05.2025 10:07	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	8C4 4754	13,48				
13716	20.05.2025 10:29	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	9C7 8018	17,92				
13717	20.05.2025 10:35	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	5SE 3709	17,02				
13718	20.05.2025 10:43	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	5SI 9641	17,32				
13719	20.05.2025 10:49	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	6SU 4416	16,96				
13720	20.05.2025 11:01	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006	2SE 4673	17,34				

Bilance podle položky: Místo určení - název

Období: Od: 20.05.2025 4:00
 Do: 20.05.2025 20:00

Podmínka: Období od 20.05.2025 4:00 do 20.05.2025 20:00, Místo určení - název=01100073 Sedlec - Kvasejovice / 20151000

Místo určení - název	Zboží	Cena bez DPH	Netto [t]	Počet vozů
	BES s.r.o.			
66	ACL 16+ 50/70 R15% f L25-006		595,38	36
	Celkem: 01100073 Sedlec - Kvasejovice / 20151000		595,38	36
		Celkem:	595,38	36

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zaměření nového asfaltového povrchu komunikace

Rekonstrukce komunikace III/10529 Sedlec – Kvasejovice

Zhotovitel:

BDS Benešov s.r.o.

Myslíč 30, 256 01 Benešov u Prahy

Investor:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov

Objednatel:

BES s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov

1. Zadaný úkol

Akce : Rekonstrukce silnice III/10529, Sedlec – Kvasejovice

Úkol : Zaměření nového asfaltového povrchu komunikace

Lokalita : ppč. 796, 820, 1364 a část přilehlých pozemků

Využití výsledků dřívějšího měření : soubor s katastrální mapou DKM

Podklady dodané objednatelem : snímek mapy

2. Geodetické práce

2.1 Popis zájmového území

a) Okres : Příbram

Obec : Sedlec - Prčice

Katastrální území : Sedlec, Měšetice, Kvasejovice

b) Lokalitu tvoří : komunikace dle zadaného rozsahu

c) Investor navíc žádá : ----

2.2 Souřadnicový a výškový systém

Polohopisné měření bylo provedeno v systému S-JTSK

Výškopisné měření bylo provedeno v systému Balt p.v.

2.3 Použité měřické metody a přístroje

Pro polohové i výškové připojení stanovisek byla použita vytyčovací síť určená technologií GNSS – přístroje SOUTH INNO7 + Doogee-model V30T a metoda RTK, Trimble VRS Now Czech.

Pro polohové připojení podrobných bodů byl použit přístroj NIKON XF2 a metoda polární. Pro výškové měření byl použit přístroj NIKON XF2 a metoda trigonometrického určování výšek.

2.4 Výpočetní a grafické práce

Souřadnice stanovisek v systému S-JTSK byly určeny technologií GNSS s využitím programu Transform MAX 1710 verze 6.

Pomocí PC a programu Geus 28.0 byly metodou polární vypočteny souřadnice a výšky podrobných bodů. Grafické práce byly provedeny pomocí programu Geus 28.0.

Výpočet výměry byl proveden v programu GEUS 28.0 automatickým výpočtem ploch.

Plocha nového asfaltového povrchu komunikace je 15787,97 m².

3. Rozbor přesnosti

Měřické a výpočetní práce byly provedeny ve 3. třídě přesnosti, žádná z dopustných odchylek nebyla překročena.

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

4. Jiné specifické údaje

5. Seznam elaborátů

- a) Technická zpráva
- b) Seznam souřadnic
- c) Digitální výstup (DXF, DWG, DGN, PDF) v měřítku 1 : 1000

6. Vyhotovitelé

<i>Měřické práce :</i>	Ivana Divišová, Martin Lisý
<i>Výpočetní práce :</i>	Martin Lisý
<i>Grafické práce :</i>	Martin Lisý

===== Výpočet výměry plochy nového asfaltového povrchu komunikace =====

přesnost vstupu souřadnic na [cm]

číslo bodu	oměrná	Y	X
0266		743917.88	1100505.82
0264	24.44	743942.14	1100508.82
0262	28.91	743970.86	1100512.16
0260	12.31	743983.13	1100513.09
0258	9.76	743992.88	1100513.49
0256	10.24	744003.12	1100513.22
0254	9.24	744012.33	1100512.42
0252	12.74	744024.97	1100510.82
0250	13.85	744038.69	1100508.93
0248	22.59	744061.00	1100505.38
0246	26.31	744087.01	1100501.40
0245	0.73	744087.73	1100501.54
0244	6.55	744094.17	1100500.34
0243	0.41	744094.53	1100500.14
0238	23.94	744118.18	1100496.42
0236	23.74	744141.64	1100492.76
0231	24.70	744166.06	1100489.03
0229	25.26	744191.02	1100485.12
0227	26.29	744216.99	1100481.05
0222	25.27	744241.95	1100477.08
0220	25.76	744267.43	1100473.29
0218	27.56	744294.72	1100469.45
0216	9.00	744303.61	1100468.04
0214	5.04	744308.53	1100466.95
0212	3.60	744312.00	1100465.99
0210	5.90	744317.54	1100463.96
0208	5.10	744322.14	1100461.75
0206	3.61	744325.25	1100459.92
0204	3.62	744328.29	1100457.96
0202	5.45	744332.70	1100454.76
0200	5.10	744336.57	1100451.44
0198	5.62	744340.44	1100447.37
0196	6.33	744344.46	1100442.48
0194	5.44	744347.64	1100438.07
0192	6.18	744351.00	1100432.88
0190	13.95	744358.15	1100420.90
0188	8.76	744362.44	1100413.26
0186	27.07	744375.83	1100389.73
0184	25.58	744388.35	1100367.42
0182	26.82	744401.55	1100344.07
0180	27.68	744414.96	1100319.85
0178	26.69	744427.96	1100296.54
0176	26.95	744441.18	1100273.06
0174	13.46	744447.87	1100261.38
0173	0.76	744448.41	1100260.85
0172	3.98	744450.30	1100257.35
0171	0.79	744450.46	1100256.58
0170	7.40	744453.97	1100250.07
0168	26.66	744467.17	1100226.91
0166	27.07	744480.51	1100203.36
0164	27.07	744493.84	1100179.80
0162	25.98	744506.54	1100157.13
0160	26.69	744519.46	1100133.77
0158	27.20	744532.69	1100110.01
0156	28.86	744546.78	1100084.82
0154	9.66	744551.65	1100076.48

0152	9.44	744556.85	1100068.60
0150	8.77	744561.91	1100061.44
0148	7.71	744566.59	1100055.31
0146	7.97	744571.64	1100049.15
0144	7.48	744576.60	1100043.55
0142	8.04	744582.14	1100037.73
0140	6.81	744587.04	1100033.00
0138	7.59	744592.62	1100027.86
0136	7.37	744598.30	1100023.16
0134	7.12	744603.98	1100018.87
0132	7.16	744609.83	1100014.75
0130	7.25	744615.91	1100010.80
0128	6.79	744621.76	1100007.35
0126	6.89	744627.82	1100004.07
0124	7.06	744634.12	1100000.89
0122	8.22	744641.63	1099997.55
0120	6.84	744647.95	1099994.93
0118	7.69	744655.19	1099992.34
0116	13.34	744667.85	1099988.12
0114	21.47	744688.63	1099982.71
0112	25.70	744713.54	1099976.40
0110	26.30	744739.05	1099970.01
0108	27.11	744765.26	1099963.08
0106	27.12	744791.47	1099956.10
0104	26.57	744817.19	1099949.42
0102	27.11	744843.45	1099942.68
0100	29.27	744871.76	1099935.24
0098	25.42	744896.40	1099929.01
0096	9.27	744905.43	1099926.90
0094	8.27	744913.56	1099925.36
0083	4.92	744918.45	1099924.85
0082	5.27	744923.72	1099924.66
0081	5.53	744929.24	1099924.98
0080	6.53	744935.71	1099925.88
0076	6.81	744942.40	1099927.17
0074	6.96	744949.15	1099928.85
0072	24.29	744972.40	1099935.88
0070	26.54	744997.63	1099944.13
0068	26.88	745023.12	1099952.67
0066	27.37	745048.98	1099961.64
0064	26.70	745074.22	1099970.34
0062	22.75	745095.71	1099977.82
0060	5.44	745100.86	1099979.56
0058	5.45	745105.99	1099981.41
0056	4.80	745110.46	1099983.15
0054	5.81	745115.74	1099985.58
0052	5.31	745120.32	1099988.27
0050	5.00	745124.48	1099991.05
0048	5.20	745128.44	1099994.42
0046	4.95	745131.83	1099998.03
0044	7.04	745136.34	1100003.43
0042	16.99	745146.26	1100017.22
0040	22.52	745158.46	1100036.15
0038	24.19	745171.34	1100056.62
0036	25.05	745184.81	1100077.74
0034	27.29	745199.43	1100100.78
0032	27.67	745214.15	1100124.21
0030	28.70	745229.20	1100148.65
0028	27.12	745243.35	1100171.79
0026	27.34	745257.62	1100195.11
0024	23.28	745269.96	1100214.85

0022	10.71	745275.19	1100224.20
0020	7.47	745278.40	1100230.95
0018	7.69	745281.00	1100238.19
0016	7.42	745282.97	1100245.34
0014	7.91	745284.68	1100253.06
0012	10.25	745285.93	1100263.23
0010	28.05	745287.86	1100291.21
0008	29.22	745289.89	1100320.36
0006	29.89	745291.82	1100350.19
0004	30.05	745293.87	1100380.17
0002	29.51	745296.04	1100409.60
0001	5.93	745301.95	1100409.10
0003	29.14	745299.81	1100380.04
0005	30.10	745297.75	1100350.01
0007	29.80	745295.86	1100320.27
0009	29.27	745293.88	1100291.07
0011	28.20	745291.67	1100262.96
0013	10.97	745290.34	1100252.07
0015	8.04	745288.95	1100244.15
0017	7.90	745286.85	1100236.53
0019	8.38	745283.86	1100228.70
0021	7.73	745280.57	1100221.71
0023	11.17	745274.97	1100212.05
0025	23.33	745262.61	1100192.26
0027	27.28	745248.19	1100169.10
0029	27.16	745233.90	1100146.00
0031	28.48	745218.94	1100121.77
0033	27.88	745204.14	1100098.14
0035	27.29	745189.67	1100075.00
0037	25.08	745176.54	1100053.63
0039	24.32	745163.87	1100032.87
0041	22.60	745151.84	1100013.74
0043	17.63	745141.76	1099999.27
0045	7.90	745136.77	1099993.14
0047	5.28	745133.04	1099989.40
0049	5.92	745128.58	1099985.50
0051	5.83	745123.77	1099982.20
0053	5.61	745118.80	1099979.59
0055	6.05	745113.26	1099977.16
0057	5.49	745108.16	1099975.14
0059	5.56	745102.94	1099973.22
0061	5.17	745098.04	1099971.58
0063	22.87	745076.39	1099964.22
0065	26.58	745051.20	1099955.73
0067	27.16	745025.42	1099947.18
0069	27.16	744999.64	1099938.62
0071	26.82	744974.19	1099930.17
0073	24.31	744951.01	1099922.85
0075	7.46	744943.77	1099921.07
0077	7.13	744936.83	1099919.43
0078	0.73	744936.61	1099918.73
0079	2.72	744936.74	1099916.01
0084	8.00	744928.77	1099915.29
0085	0.85	744928.00	1099915.65
0086	2.69	744925.34	1099916.02
0087	1.71	744923.63	1099915.92
0088	2.00	744921.63	1099915.92
0089	4.84	744916.82	1099916.50
0090	1.94	744914.95	1099917.00
0091	1.95	744913.20	1099917.87
0092	0.83	744912.91	1099918.65

0093	0.35	744912.65	1099918.89
0095	9.16	744903.66	1099920.65
0097	9.07	744894.84	1099922.77
0099	25.35	744870.40	1099929.51
0101	29.34	744842.09	1099937.23
0103	26.80	744816.15	1099943.98
0105	26.92	744790.10	1099950.76
0107	26.81	744764.15	1099957.50
0109	27.09	744737.92	1099964.29
0111	26.45	744712.31	1099970.90
0113	25.74	744687.38	1099977.29
0115	21.51	744666.53	1099982.58
0117	13.80	744653.33	1099986.59
0119	7.88	744645.96	1099989.38
0121	7.33	744639.20	1099992.22
0123	8.01	744631.88	1099995.47
0125	7.61	744625.09	1099998.91
0127	7.09	744618.89	1100002.35
0129	6.78	744613.04	1100005.78
0131	7.51	744606.77	1100009.91
0133	7.24	744600.89	1100014.14
0135	7.52	744595.00	1100018.82
0137	7.43	744589.25	1100023.53
0139	7.75	744583.41	1100028.62
0141	7.35	744578.18	1100033.79
0143	8.30	744572.46	1100039.80
0145	7.81	744567.20	1100045.57
0147	7.77	744562.37	1100051.66
0149	8.02	744557.51	1100058.04
0151	8.82	744552.43	1100065.25
0153	9.79	744547.01	1100073.40
0155	10.01	744541.83	1100081.96
0157	28.88	744527.46	1100107.01
0159	26.89	744514.37	1100130.50
0161	26.62	744501.48	1100153.79
0163	26.02	744488.82	1100176.52
0165	26.82	744475.67	1100199.90
0167	27.14	744462.28	1100223.51
0169	27.19	744449.05	1100247.26
0175	26.12	744436.31	1100270.06
0177	27.39	744422.80	1100293.89
0179	26.39	744409.85	1100316.88
0181	27.13	744396.55	1100340.53
0183	27.37	744383.09	1100364.36
0185	25.56	744370.50	1100386.60
0187	26.99	744357.13	1100410.04
0189	8.76	744352.72	1100417.61
0191	13.69	744345.58	1100429.29
0193	5.62	744342.55	1100434.02
0195	5.84	744338.99	1100438.65
0197	5.03	744335.57	1100442.34
0199	4.95	744331.91	1100445.67
0201	5.02	744328.03	1100448.85
0203	4.47	744324.41	1100451.48
0205	3.35	744321.58	1100453.27
0207	3.52	744318.52	1100455.01
0209	4.53	744314.47	1100457.05
0211	4.89	744310.00	1100459.03
0213	3.25	744306.96	1100460.18
0215	4.95	744302.23	1100461.65
0217	8.29	744294.10	1100463.27

0219	27.39	744267.01	1100467.31
0221	26.51	744240.80	1100471.32
0223	18.20	744222.80	1100474.00
0224	0.55	744222.26	1100473.92
0225	5.57	744216.75	1100474.72
0226	0.48	744216.29	1100474.87
0228	26.67	744189.94	1100478.99
0230	24.98	744165.26	1100482.88
0232	19.13	744146.37	1100485.90
0233	0.66	744145.73	1100485.73
0234	4.47	744141.31	1100486.38
0235	0.52	744140.84	1100486.61
0237	23.40	744117.74	1100490.34
0239	28.50	744089.59	1100494.78
0240	0.86	744088.74	1100494.62
0241	4.10	744084.69	1100495.24
0242	1.38	744083.42	1100495.78
0247	23.41	744060.30	1100499.48
0249	22.52	744038.05	1100502.97
0251	14.07	744024.12	1100504.96
0253	12.29	744011.92	1100506.41
0255	9.26	744002.70	1100507.32
0257	9.21	743993.49	1100507.54
0259	10.03	743983.47	1100507.18
0261	11.66	743971.86	1100506.15
0263	29.17	743942.87	1100502.91
0265	24.35	743918.71	1100499.88
0267	22.50	743896.38	1100497.16
0272	30.99	743865.62	1100493.40
0274	27.50	743838.34	1100489.95
0276	25.21	743813.31	1100486.92
0278	22.23	743791.24	1100484.24
0280	11.59	743779.74	1100482.83
0282	12.86	743766.94	1100481.56
0284	10.57	743756.40	1100480.75
0286	9.39	743747.02	1100480.26
0288	9.90	743737.12	1100480.13
0290	10.69	743726.44	1100480.60
0292	27.21	743699.30	1100482.50
0294	23.82	743675.54	1100484.18
0296	21.41	743654.17	1100485.56
0298	23.08	743631.14	1100487.10
0300	18.05	743613.13	1100488.37
0302	22.65	743590.53	1100489.94
0304	19.33	743571.25	1100491.31
0306	21.56	743549.74	1100492.80
0308	19.20	743530.59	1100494.13
0310	22.66	743507.98	1100495.69
0312	19.02	743489.00	1100496.93
0314	19.56	743469.48	1100498.18
0316	21.17	743448.36	1100499.63
0318	27.25	743421.18	1100501.57
0320	26.22	743395.02	1100503.29
0322	26.98	743368.10	1100505.07
0327	29.54	743338.62	1100506.91
0329	26.79	743311.89	1100508.68
0331	15.53	743296.40	1100509.74
0333	6.96	743289.45	1100510.18
0334	0.74	743288.76	1100509.92
0335	3.83	743284.94	1100510.19
0336	1.00	743284.01	1100510.55

0337	10.65	743273.40	1100511.47
0338	6.00	743267.41	1100511.76
0339	5.71	743267.86	1100517.45
0332	23.16	743290.97	1100515.99
0330	21.15	743312.08	1100514.68
0328	26.91	743338.94	1100512.98
0326	25.63	743364.53	1100511.60
0325	0.67	743365.18	1100511.75
0324	4.90	743370.07	1100511.45
0323	0.54	743370.58	1100511.26
0321	24.91	743395.44	1100509.61
0319	26.29	743421.67	1100507.82
0317	27.18	743448.78	1100505.83
0315	21.13	743469.86	1100504.43
0313	19.39	743489.21	1100503.14
0311	18.74	743507.90	1100501.82
0309	23.04	743530.89	1100500.25
0307	19.43	743550.27	1100498.92
0305	21.48	743571.69	1100497.37
0303	19.46	743591.11	1100496.10
0301	22.63	743613.69	1100494.59
0299	17.97	743631.62	1100493.39
0297	23.15	743654.71	1100491.78
0295	21.61	743676.27	1100490.29
0293	23.60	743699.81	1100488.59
0291	26.40	743726.15	1100486.83
0289	10.88	743737.01	1100486.22
0287	9.58	743746.58	1100486.53
0285	9.33	743755.90	1100486.96
0283	10.28	743766.15	1100487.80
0281	12.68	743778.77	1100489.02
0279	11.58	743790.28	1100490.29
0277	22.47	743812.59	1100492.99
0275	25.10	743837.50	1100496.04
0273	27.33	743864.62	1100499.43
0271	27.18	743891.60	1100502.73
0270	0.50	743892.03	1100502.98
0269	7.08	743899.07	1100503.69
0268	0.54	743899.61	1100503.63
0266	18.40	743917.88	1100505.82

Vypočtená výměra asfaltové plochy : 15787.97 m2


LEGENDA :

- vlastnická hranice
- vlastnická hranice-vnitřní kresba
- asfaltová komunikace - nový asfalt
- katastrální území



Souřadnicový systém : S-JTSK

Měřické práce : Ivana Divišová, Martin Lisý		BDS Benešov s.r.o. Myslíč 30 256 01 Benešov
Výpočetní práce : Lisý Martin	Grafické práce : Lisý Martin	
Okres : Příbram	Obec: Sedlec – Prčice	Kat. úz. : Sedlec, Měsetice, Kvasejovice
Investor: KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smrčhov		Datum : 26.5.2025
		Měřítko : 1 : 1000
Objednatel : BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov		Č.zakázky : 67/2025
Akce: Rekonstrukce silnice III/10529 Sedlec – Kvasejovice Zaměření nového asfaltového povrchu komunikace		

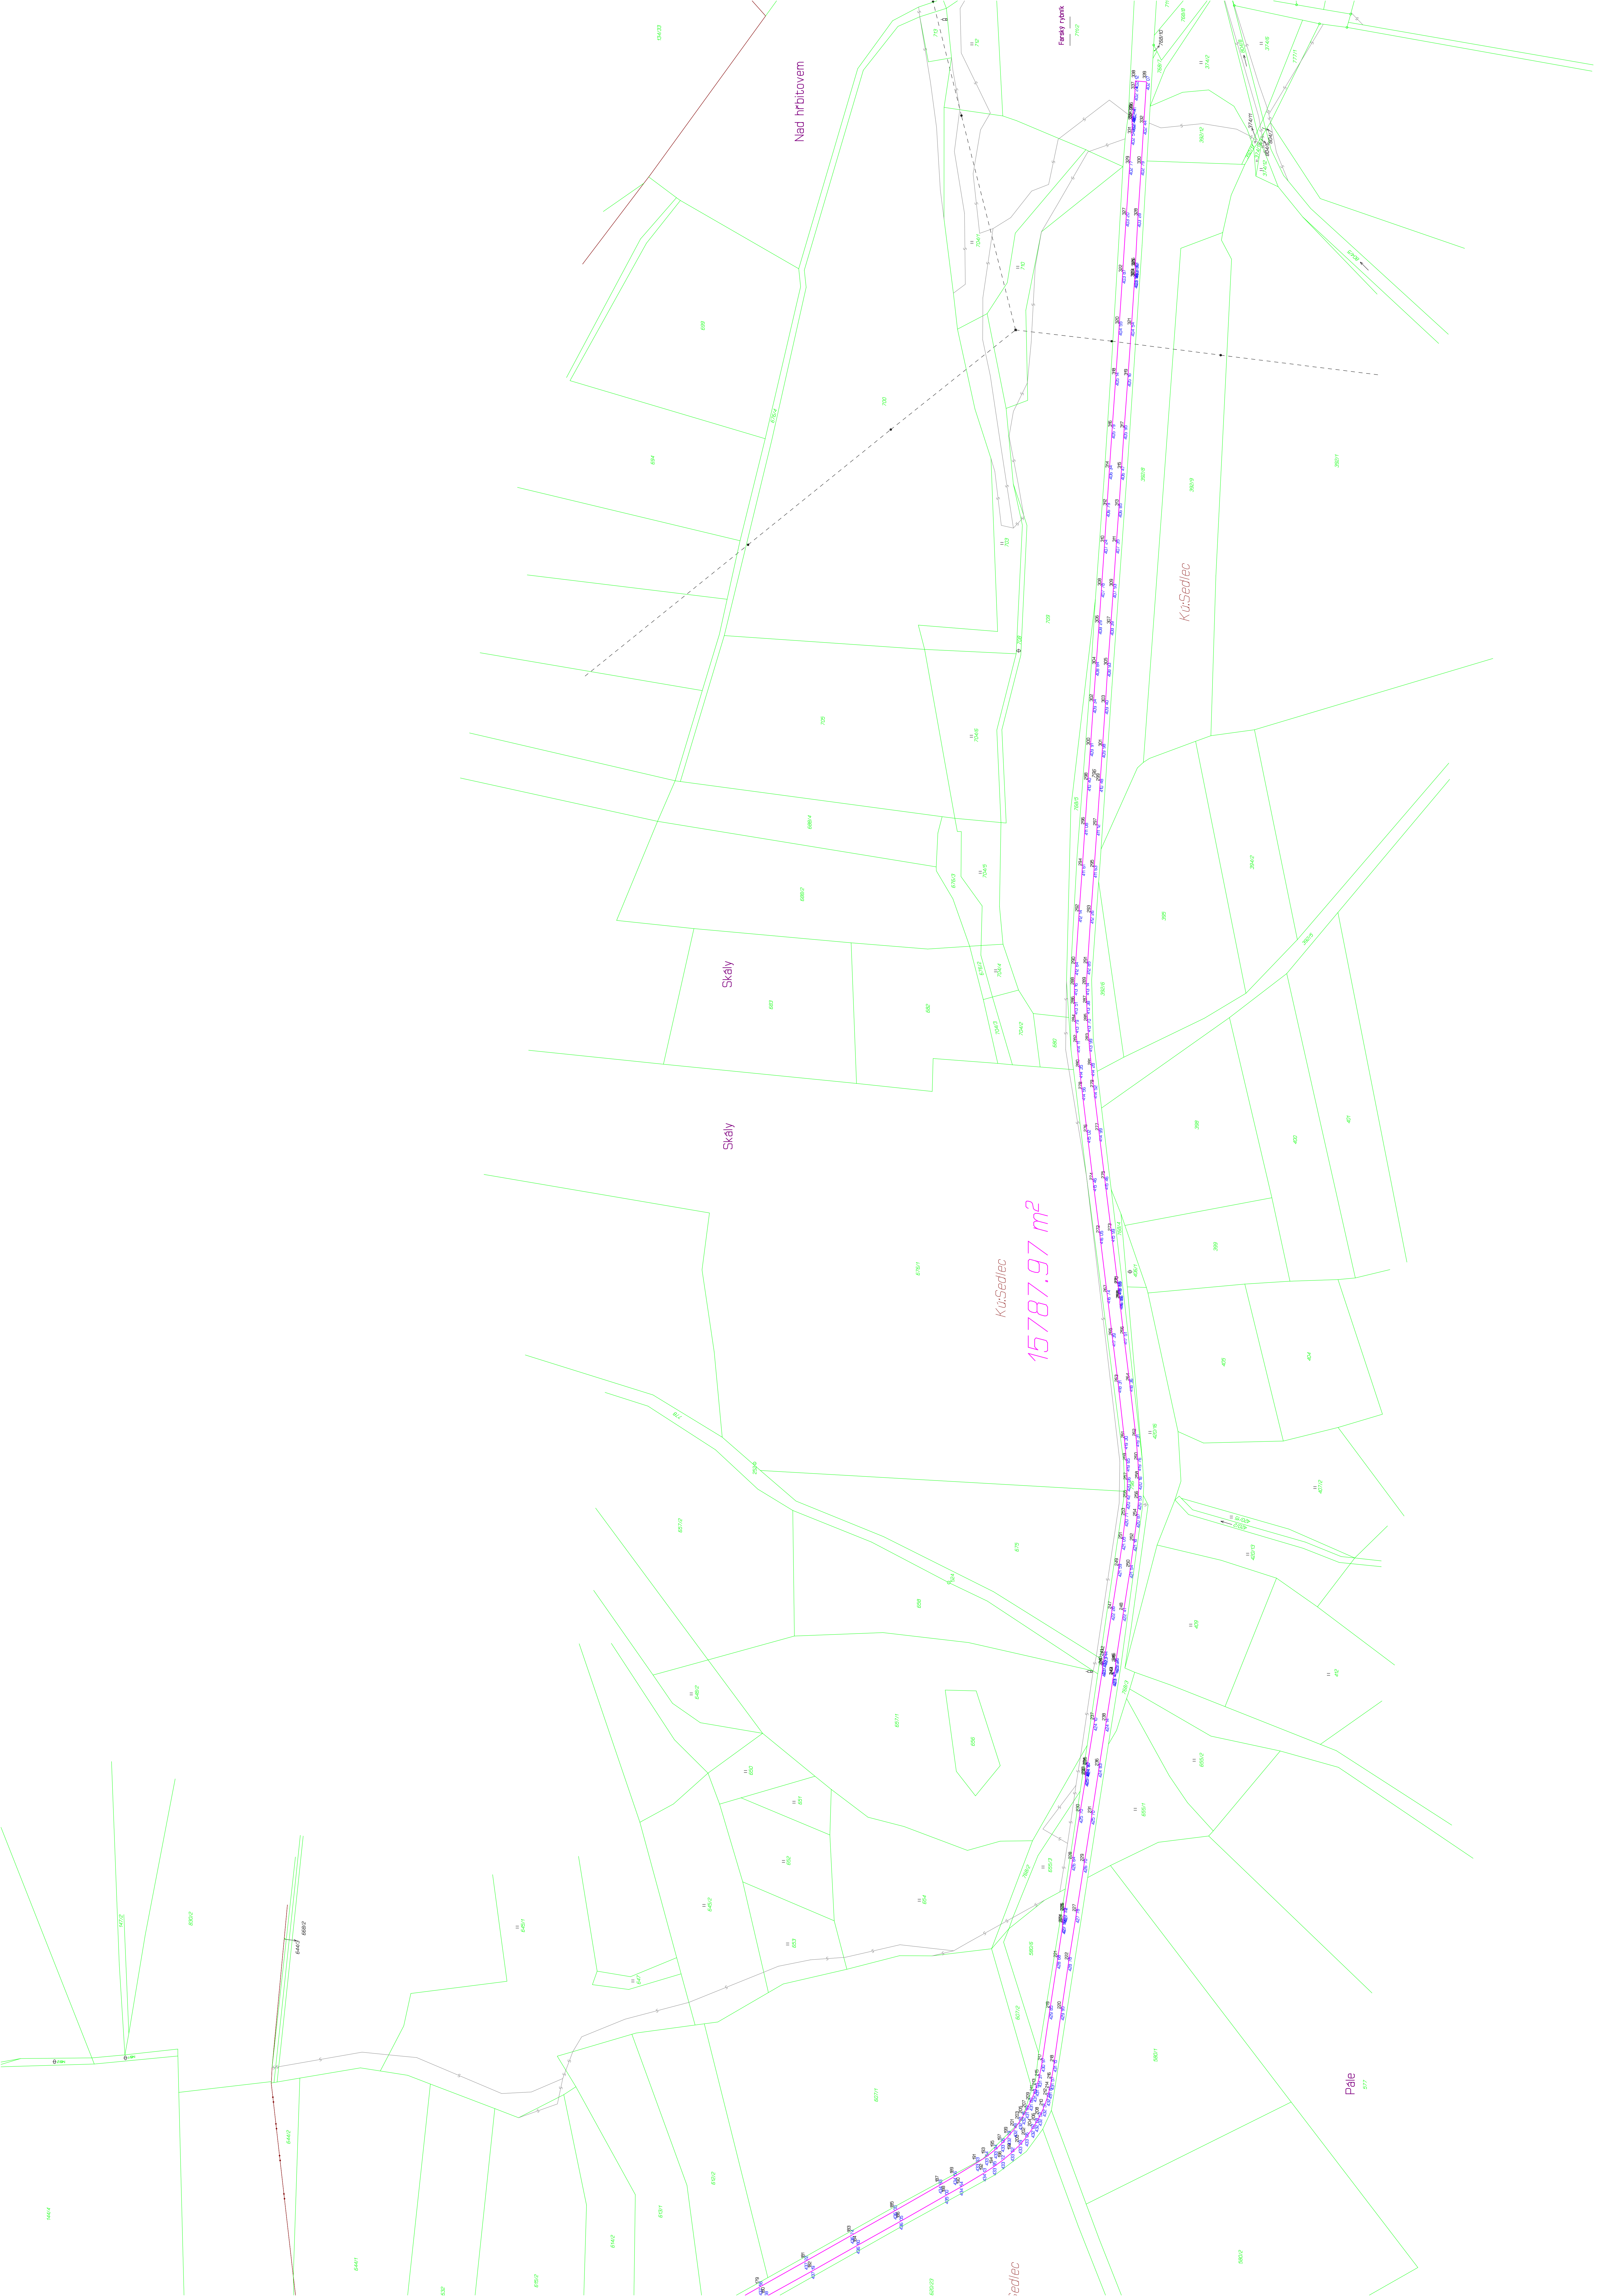

Rekonstrukce komunikace č. III/10529

Sedlec - Kvasejovice

Zaměření nového asfaltového povrchu komunikace

SEZNAM SOUŘADNIC

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: BPV

ČÍSLO BODU	Y	X	Z
1	745301.95	1100409.10	435.35
2	745296.04	1100409.60	435.49
3	745299.81	1100380.04	436.41
4	745293.87	1100380.17	436.57
5	745297.75	1100350.01	437.56
6	745291.82	1100350.19	437.66
7	745295.86	1100320.27	438.55
8	745289.89	1100320.36	438.70
9	745293.88	1100291.07	439.54
10	745287.86	1100291.21	439.74
11	745291.67	1100262.96	440.66
12	745285.93	1100263.23	440.74
13	745290.34	1100252.07	441.24
14	745284.68	1100253.06	441.06
15	745288.95	1100244.15	441.54
16	745282.97	1100245.34	441.30
17	745286.85	1100236.53	441.86
18	745281.00	1100238.19	441.66
19	745283.86	1100228.70	442.19
20	745278.40	1100230.95	442.13
21	745280.57	1100221.71	442.50
22	745275.19	1100224.20	442.48
23	745274.97	1100212.05	442.96
24	745269.96	1100214.85	442.93
25	745262.61	1100192.26	443.41
26	745257.62	1100195.11	443.54
27	745248.19	1100169.10	443.66
28	745243.35	1100171.79	443.85
29	745233.90	1100146.00	443.67
30	745229.20	1100148.65	443.87
31	745218.94	1100121.77	443.87
32	745214.15	1100124.21	444.00
33	745204.14	1100098.14	444.15
34	745199.43	1100100.78	444.18
35	745189.67	1100075.00	444.52
36	745184.81	1100077.74	444.50
37	745176.54	1100053.63	445.22
38	745171.34	1100056.62	445.08
39	745163.87	1100032.87	446.03
40	745158.46	1100036.15	446.00
41	745151.84	1100013.74	446.87
42	745146.26	1100017.22	446.79
43	745141.76	1099999.27	447.49
44	745136.34	1100003.43	447.27
45	745136.77	1099993.14	447.76
46	745131.83	1099998.03	447.47

47	745133.04	1099989.40	448.02
48	745128.44	1099994.42	447.62
49	745128.58	1099985.50	448.09
50	745124.48	1099991.05	447.75
51	745123.77	1099982.20	448.29
52	745120.32	1099988.27	447.88
53	745118.80	1099979.59	448.40
54	745115.74	1099985.58	448.08
55	745113.26	1099977.16	448.48
56	745110.46	1099983.15	448.28
57	745108.16	1099975.14	448.58
58	745105.99	1099981.41	448.40
59	745102.94	1099973.22	448.61
60	745100.86	1099979.56	448.59
61	745098.04	1099971.58	448.79
62	745095.71	1099977.82	448.79
63	745076.39	1099964.22	449.46
64	745074.22	1099970.34	449.47
65	745051.20	1099955.73	450.37
66	745048.98	1099961.64	450.38
67	745025.42	1099947.18	451.21
68	745023.12	1099952.67	451.40
69	744999.64	1099938.62	452.16
70	744997.63	1099944.13	452.34
71	744974.19	1099930.17	453.28
72	744972.40	1099935.88	453.30
73	744951.01	1099922.85	454.54
74	744949.15	1099928.85	454.45
75	744943.77	1099921.07	455.05
76	744942.40	1099927.17	454.76
77	744936.83	1099919.43	455.47
78	744936.61	1099918.73	455.45
79	744936.74	1099916.01	455.29
80	744935.71	1099925.88	455.11
81	744929.24	1099924.98	455.53
82	744923.72	1099924.66	455.85
83	744918.45	1099924.85	456.13
84	744928.77	1099915.29	455.71
85	744928.00	1099915.65	455.79
86	744925.34	1099916.02	455.85
87	744923.63	1099915.92	456.00
88	744921.63	1099915.92	456.10
89	744916.82	1099916.50	456.30
90	744914.95	1099917.00	456.47
91	744913.20	1099917.87	456.70
92	744912.91	1099918.65	456.73
93	744912.65	1099918.89	456.78
94	744913.56	1099925.36	456.38
95	744903.66	1099920.65	457.11
96	744905.43	1099926.90	456.71
97	744894.84	1099922.77	457.35
98	744896.40	1099929.01	457.12
99	744870.40	1099929.51	457.74
100	744871.76	1099935.24	457.70
101	744842.09	1099937.23	457.94
102	744843.45	1099942.68	457.89
103	744816.15	1099943.98	457.95
104	744817.19	1099949.42	457.94
105	744790.10	1099950.76	457.70
106	744791.47	1099956.10	457.75
107	744764.15	1099957.50	457.15

108	744765.26	1099963.08	457.13
109	744737.92	1099964.29	456.35
110	744739.05	1099970.01	456.37
111	744712.31	1099970.90	455.64
112	744713.54	1099976.40	455.70
113	744687.38	1099977.29	454.86
114	744688.63	1099982.71	455.03
115	744666.53	1099982.58	454.37
116	744667.85	1099988.12	454.46
117	744653.33	1099986.59	454.05
118	744655.19	1099992.34	454.10
119	744645.96	1099989.38	453.90
120	744647.95	1099994.93	453.82
121	744639.20	1099992.22	453.73
122	744641.63	1099997.55	453.61
123	744631.88	1099995.47	453.54
124	744634.12	1100000.89	453.43
125	744625.09	1099998.91	453.32
126	744627.82	1100004.07	453.24
127	744618.89	1100002.35	453.14
128	744621.76	1100007.35	453.03
129	744613.04	1100005.78	452.96
130	744615.91	1100010.80	452.80
131	744606.77	1100009.91	452.76
132	744609.83	1100014.75	452.58
133	744600.89	1100014.14	452.54
134	744603.98	1100018.87	452.41
135	744595.00	1100018.82	452.39
136	744598.30	1100023.16	452.28
137	744589.25	1100023.53	452.18
138	744592.62	1100027.86	452.12
139	744583.41	1100028.62	452.02
140	744587.04	1100033.00	451.91
141	744578.18	1100033.79	451.85
142	744582.14	1100037.73	451.73
143	744572.46	1100039.80	451.61
144	744576.60	1100043.55	451.50
145	744567.20	1100045.57	451.37
146	744571.64	1100049.15	451.32
147	744562.37	1100051.66	451.11
148	744566.59	1100055.31	451.02
149	744557.51	1100058.04	450.78
150	744561.91	1100061.44	450.74
151	744552.43	1100065.25	450.40
152	744556.85	1100068.60	450.35
153	744547.01	1100073.40	450.04
154	744551.65	1100076.48	449.94
155	744541.83	1100081.96	449.58
156	744546.78	1100084.82	449.46
157	744527.46	1100107.01	448.15
158	744532.69	1100110.01	448.02
159	744514.37	1100130.50	446.66
160	744519.46	1100133.77	446.59
161	744501.48	1100153.79	445.27
162	744506.54	1100157.13	445.20
163	744488.82	1100176.52	443.73
164	744493.84	1100179.80	443.76
165	744475.67	1100199.90	442.37
166	744480.51	1100203.36	442.37
167	744462.28	1100223.51	441.05
168	744467.17	1100226.91	441.01

169	744449.05	1100247.26	439.66
170	744453.97	1100250.07	439.70
171	744450.46	1100256.58	439.35
172	744450.30	1100257.35	439.29
173	744448.41	1100260.85	439.14
174	744447.87	1100261.38	439.09
175	744436.31	1100270.06	438.68
176	744441.18	1100273.06	438.58
177	744422.80	1100293.89	438.01
178	744427.96	1100296.54	437.98
179	744409.85	1100316.88	437.58
180	744414.96	1100319.85	437.58
181	744396.55	1100340.53	437.22
182	744401.55	1100344.07	437.19
183	744383.09	1100364.36	436.74
184	744388.35	1100367.42	436.80
185	744370.50	1100386.60	436.00
186	744375.83	1100389.73	436.05
187	744357.13	1100410.04	434.93
188	744362.44	1100413.26	435.00
189	744352.72	1100417.61	434.56
190	744358.15	1100420.90	434.64
191	744345.58	1100429.29	433.93
192	744351.00	1100432.88	434.13
193	744342.55	1100434.02	433.64
194	744347.64	1100438.07	433.95
195	744338.99	1100438.65	433.34
196	744344.46	1100442.48	433.72
197	744335.57	1100442.34	433.06
198	744340.44	1100447.37	433.52
199	744331.91	1100445.67	432.78
200	744336.57	1100451.44	433.29
201	744328.03	1100448.85	432.49
202	744332.70	1100454.76	433.06
203	744324.41	1100451.48	432.31
204	744328.29	1100457.96	432.82
205	744321.58	1100453.27	432.15
206	744325.25	1100459.92	432.68
207	744318.52	1100455.01	431.99
208	744322.14	1100461.75	432.52
209	744314.47	1100457.05	431.80
210	744317.54	1100463.96	432.31
211	744310.00	1100459.03	431.63
212	744312.00	1100465.99	432.01
213	744306.96	1100460.18	431.53
214	744308.53	1100466.95	431.81
215	744302.23	1100461.65	431.37
216	744303.61	1100468.04	431.57
217	744294.10	1100463.27	430.97
218	744294.72	1100469.45	431.15
219	744267.01	1100467.31	429.85
220	744267.43	1100473.29	429.95
221	744240.80	1100471.32	428.68
222	744241.95	1100477.08	428.78
223	744222.80	1100474.00	427.96
224	744222.26	1100473.92	427.94
225	744216.75	1100474.72	427.73
226	744216.29	1100474.87	427.72
227	744216.99	1100481.05	427.78
228	744189.94	1100478.99	426.64
229	744191.02	1100485.12	426.70

230	744165.26	1100482.88	425.70
231	744166.06	1100489.03	425.70
232	744146.37	1100485.90	425.06
233	744145.73	1100485.73	425.02
234	744141.31	1100486.38	424.90
235	744140.84	1100486.61	424.87
236	744141.64	1100492.76	424.83
237	744117.74	1100490.34	424.10
238	744118.18	1100496.42	424.14
239	744089.59	1100494.78	423.37
240	744088.74	1100494.62	423.35
241	744084.69	1100495.24	423.22
242	744083.42	1100495.78	423.14
243	744094.53	1100500.14	423.47
244	744094.17	1100500.34	423.43
245	744087.73	1100501.54	423.24
246	744087.01	1100501.40	423.25
247	744060.30	1100499.48	422.26
248	744061.00	1100505.38	422.41
249	744038.05	1100502.97	421.59
250	744038.69	1100508.93	421.54
251	744024.12	1100504.96	421.05
252	744024.97	1100510.82	421.18
253	744011.92	1100506.41	420.71
254	744012.33	1100512.42	420.87
255	744002.70	1100507.32	420.42
256	744003.12	1100513.22	420.53
257	743993.49	1100507.54	420.06
258	743992.88	1100513.49	420.18
259	743983.47	1100507.18	419.65
260	743983.13	1100513.09	419.76
261	743971.86	1100506.15	419.30
262	743970.86	1100512.16	419.31
263	743942.87	1100502.91	418.31
264	743942.14	1100508.82	418.36
265	743918.71	1100499.88	417.39
266	743917.88	1100505.82	417.51
267	743896.38	1100497.16	416.74
268	743899.61	1100503.63	416.89
269	743899.07	1100503.69	416.86
270	743892.03	1100502.98	416.65
271	743891.60	1100502.73	416.66
272	743865.62	1100493.40	416.05
273	743864.62	1100499.43	415.99
274	743838.34	1100489.95	415.46
275	743837.50	1100496.04	415.46
276	743813.31	1100486.92	415.02
277	743812.59	1100492.99	414.99
278	743791.24	1100484.24	414.56
279	743790.28	1100490.29	414.52
280	743779.74	1100482.83	414.35
281	743778.77	1100489.02	414.28
282	743766.94	1100481.56	414.11
283	743766.15	1100487.80	413.99
284	743756.40	1100480.75	413.79
285	743755.90	1100486.96	413.70
286	743747.02	1100480.26	413.51
287	743746.58	1100486.53	413.38
288	743737.12	1100480.13	413.16
289	743737.01	1100486.22	413.14
290	743726.44	1100480.60	412.84

291	743726.15	1100486.83	412.85
292	743699.30	1100482.50	412.14
293	743699.81	1100488.59	412.26
294	743675.54	1100484.18	411.61
295	743676.27	1100490.29	411.63
296	743654.17	1100485.56	411.08
297	743654.71	1100491.78	411.12
298	743631.14	1100487.10	410.40
299	743631.62	1100493.39	410.48
300	743613.13	1100488.37	409.91
301	743613.69	1100494.59	409.98
302	743590.53	1100489.94	409.34
303	743591.11	1100496.10	409.40
304	743571.25	1100491.31	408.84
305	743571.69	1100497.37	408.93
306	743549.74	1100492.80	408.29
307	743550.27	1100498.92	408.39
308	743530.59	1100494.13	407.78
309	743530.89	1100500.25	407.93
310	743507.98	1100495.69	407.24
311	743507.90	1100501.82	407.35
312	743489.00	1100496.93	406.79
313	743489.21	1100503.14	406.85
314	743469.48	1100498.18	406.34
315	743469.86	1100504.43	406.47
316	743448.36	1100499.63	405.79
317	743448.78	1100505.83	405.95
318	743421.18	1100501.57	405.14
319	743421.67	1100507.82	405.16
320	743395.02	1100503.29	404.55
321	743395.44	1100509.61	404.54
322	743368.10	1100505.07	403.87
323	743370.58	1100511.26	403.96
324	743370.07	1100511.45	403.93
325	743365.18	1100511.75	403.80
326	743364.53	1100511.60	403.83
327	743338.62	1100506.91	403.20
328	743338.94	1100512.98	403.28
329	743311.89	1100508.68	402.77
330	743312.08	1100514.68	402.79
331	743296.40	1100509.74	402.54
332	743290.97	1100515.99	402.44
333	743289.45	1100510.18	402.48
334	743288.76	1100509.92	402.47
335	743284.94	1100510.19	402.44
336	743284.01	1100510.55	402.41
337	743273.40	1100511.47	402.24
338	743267.41	1100511.76	402.12
339	743267.86	1100517.45	402.07
