



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**Dodatek č. 4 ke
SMLouvě o dílo**

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: **123/2025/B**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Luhačovice

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

nám. 28. října 543

Křižíkova 1566/19

763 26 Luhačovice

612 00 Brno

dále jen „objednatel“

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Marian Ležák, starosta

Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel

tel.: [REDACTED]

Ing. Petr Buchta, MBA, jednatel
tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení:

[REDACTED] pobočka [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

[REDACTED]

Identifikační číslo:

002 84 165

269 44 022

Daňové identifikační číslo:

CZ00284165. Pro tuto veřejnou zakázku
Objednatel není plátcem DPH.

CZ26944022



Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 47237

Název veřejné zakázky: **Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic**

1. Smluvní strany se dodatkem č. 3 dohodly, že objednatel po dokončení úseku cyklostezky ve staničení km 0,354–0,524 v cementobetonovém provedení a po dokončení všech prací a dodávek na úseku cyklostezky ve staničení km 0,354–1,060 protokolárně převezme řádně zhotovenou ucelenou část díla od zhotovitele, a to k datu 6. 9. 2024.
Zhotovitel se zavázal předat tuto dokončenou část díla vyklizenou a způsobilou k užívání tak, aby mohlo být požádáno o její kolaudaci. Dále byl povinen do 30 dnů od protokolárního předání díla převzetí doložit veškeré doklady potřebné pro kolaudaci této části díla, včetně dokumentace skutečného provedení stavby.
2. Objednatel převzal protokolárně danou část díla dne 06.09.2024, tímto dnem na něj přešla odpovědnost za škody pro tuto část díla. Tímto dnem začala běžet záruční doba pro část dokončeného díla dle smlouvy o dílo v délce 60 měsíců.
3. Důvodem pro převzetí části řádně dokončeného díla byla objektivní překážka, s níž byl zhotovitel seznámen od úvodního jednání ke stavbě a znovu při převzetí staveniště, a to zpoždění provedení Přeložky stožárů (SO 401 a SO 402) vlastníkem EG.D v staničení km 0,000-0,350 cyklostezky. EG.D ke dni protokolárního převzetí části díla cyklostezky v km 0,354-1,060 neprovedlo přeložku stožárů.
4. V důsledku skutečnosti uvedené v odst. 3 zhotovitel nemohl provádět práce na části díla v předmětném úseku km 0,000 – 0,350 cyklostezky, a proto nemohl celé dílo řádně a včas dokončit v termínu dle čl. III smlouvy o dílo.
5. Smluvní strany se dodatkem č. 3 dohodly na následujícím:
 - a) Zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli zahájí práce na nedokončené části díla a převezme staveniště, a to do 30 dnů od doručení písemné výzvy.
 - b) Práce budou zahájeny v termínu od 01.05.2025 do 01.09.2025. Pokud objednatel bude požadovat zahájení prací mimo tento termín, tak pouze po vzájemné dohodě se zhotovitelem.
 - c) Doba provádění nedokončené části stavebních prací bude max. 12 týdnů.
 - d) Zhotovitel předloží objednateli do 15 dnů od doručení výzvy harmonogram postupu prací pro nedokončenou část díla.
 - e) Před zahájením provádění nedokončené části díla uzavrou smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo, kde bude upravena doba provádění nedokončené části díla a dohodnuta náhrada nákladů spojené s přerušením prací na části díla a uvedena cena za nedokončenou část díla.
 - f) Zhotovitel dofakturuje poměrnou část Vedlejších a Ostatních nákladů uvedených v položkovém



- rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo.
- g) Zhotovitel může požadovat náhradu nákladů souvisejících s přerušením prací (ve smyslu jejich navýšení v porovnání se smlouvou o dílo), a to zejména:
- ga) správní, režijní, výrobní náklady v roce 2025 po dobu provádění části díla v roce 2025
 - gb) náklady na dovoz, montáž a odvoz buněk, které jsou v rámci zařízení staveniště
 - gc) náklady na přechodné dopravní značení v roce 2025
 - gd) dovoz a odvoz strojů na staveniště v roce 2025
 - ge) náklady na převoz uskladněných materiálů na pozemcích objednatele na staveniště
 - gf) náklady na prodloužení poskytnuté bankovní záruky, která musí být platná i po celou záruční dobu dokončené části díla v roce 2025
 - gg) valorizaci na stavební práce, dodávky a služby fakturované v roce 2025. Smluvní strany se dohody na valorizaci – Průměrné roční míry inflace vyhlášené ČSÚ za rok 2024. Valorizace bude vypočtena a fakturována samostatným daňovým dokladem po protokolárním předání a převzetí dokončené části díla v roce 2025.
- h) Zhotovitel je povinen k bodům ga-gf doložit 15 dnů od doručení výzvy dle písmene a) návrh obsahující přesnou specifikaci nákladů spojených s přerušením prací a doložit jednotlivé požadavky podklady (faktury, interní doklady, smlouvy apod.).
6. Objednatel dne 17.03.2025 doručil zhotoviteli informaci o tom, že EG.D jako vlastník provádí přeložku stožárů (SO 401 a SO 402) v staničení km 0,000-0,350 cyklostezky a že tedy nic nebrání v pokračování provádění nedokončené části díla. Tímto zároveň vyzval zhotovitele v souladu s odst. 7 písm. a) a h) dodatku č. 3 k předložení požadovaných dokladů (specifikaci nákladů spojených s přerušením prací).
7. Zhotovitel předložil dne 31.03.2025 doklady s vyčíslením nákladů spojených s přerušením prací. Objednatel s tímto nesouhlasil. Proběhla jednání týkající se vysvětlení výpočtu nákladů a na základě připomínek objednatele předložil zhotovitel konečné vyčíslení nákladů spojených s přerušením prací.
8. Objednatel odsouhlasil vyčíslení nákladů spojených s přerušením prací ve výši **1 195 962,32 Kč** bez DPH (slovy: jeden milion jedno sto devadesát pět tisíc devět set šedesát dva korun třicet dva haléřů). Vyčíslení těchto nákladů je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4.
9. Smluvní strany se dohodly, že částka uvedená v odst. 8 bude zhotovitelem fakturována prostřednictvím dvou samostatných daňových dokladů, a to následovně:
- 1. k datu předání a převzetí staveniště (DUZP) ve výši 597 981,16 Kč bez DPH,
 - 2. k datu předání a převzetí díla ve výši 597 981,16 Kč bez DPH.
- Splatnost těchto daňových dokladů se sjednává v souladu se splatnostní lhůtou uvedenou v čl. V Obchodních podmínek.
10. Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s přerušením prací na díle uvedeném výše nebude uplatňovat žádné další náklady, nároky vůči objednateli uhrazením částky 1 195 962,32 Kč bez DPH.



11. Nedokončená část díla, která bude realizována v roce 2025, činí **3 725 027,63 Kč bez DPH**. Tato částka vychází z naceněného rozpočtu zhotovitele a ze schválených zjišťovacích protokolů k provedeným pracím v roce 2024.
12. Objednatel schvaluje harmonogram postupu prací pro část díla prováděnou v roce 2025, který zhotovitel objednateli předložil. Staveniště pro nedokončenou část díla bude protokolárně předáno a převzato dne 18.8.2025. Doba provádění nedokončené části díla je max. 12 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
13. Objednatel schvaluje, že záruční doba na betonové výrobky (obrubníky, dlažba, palisády, uliční vpusti apod.) a plastové výrobky (potrubí, drenáže, plastové šachty apod.), které byly prokazatelně dodány na stavbu v roce 2024 a následně uskladněny v areálu Technických služeb v Luhačovicích, bude zkrácena o dobu, která uplynula od předání první části dokončené stavby. Záruka na všechny tyto výrobky bude končit k 5. září 2029, tedy ve stejný den, kdy končí záruční doba za dílo z I. etapy. Seznam těchto betonových a plastových výrobků je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 4 smlouvy o dílo, spolu s kopií faktur č. 2024036, 2024049, 2024056, 2024070, 2024082, na základě kterých byl tento materiál v roce 2024 zaplacen.
Nadále platí, že dle čl. XIII. odst. 4 obchodních podmínek se na část díla realizovaného v roce 2025 vztahuje záruka v délce 60 měsíců.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Vyčíslením nákladů spojených s přerušením prací

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací pro část díla prováděnou v roce 2025

Příloha č. 3 Seznam betonových a plastových výrobků dle odst. 13 tohoto dodatku, kopie uhrazených faktur č. 2024036, 2024049, 2024056, 2024070, 2024082 na tyto výrobky

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 4 řádně přečetly, s jeho obsahem se seznámily, porozuměly mu a bezvýhradně s ním souhlasí. Na důkaz toho jej podepisují na základě své pravé, vážné a svobodné vůle, prostě omylu.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě a je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem: Rada města Luhačovice

schůze konaná dne: 23.06.2025

č. usnesení: 187/R16/2025

V Luhačovicích dne

Za objednatele:

město Luhačovice

Ing. Marian Ležák, starosta


V Brně dne


Za zhotovitele:

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel

Ing. Petr Buchta, MBA, jednatel

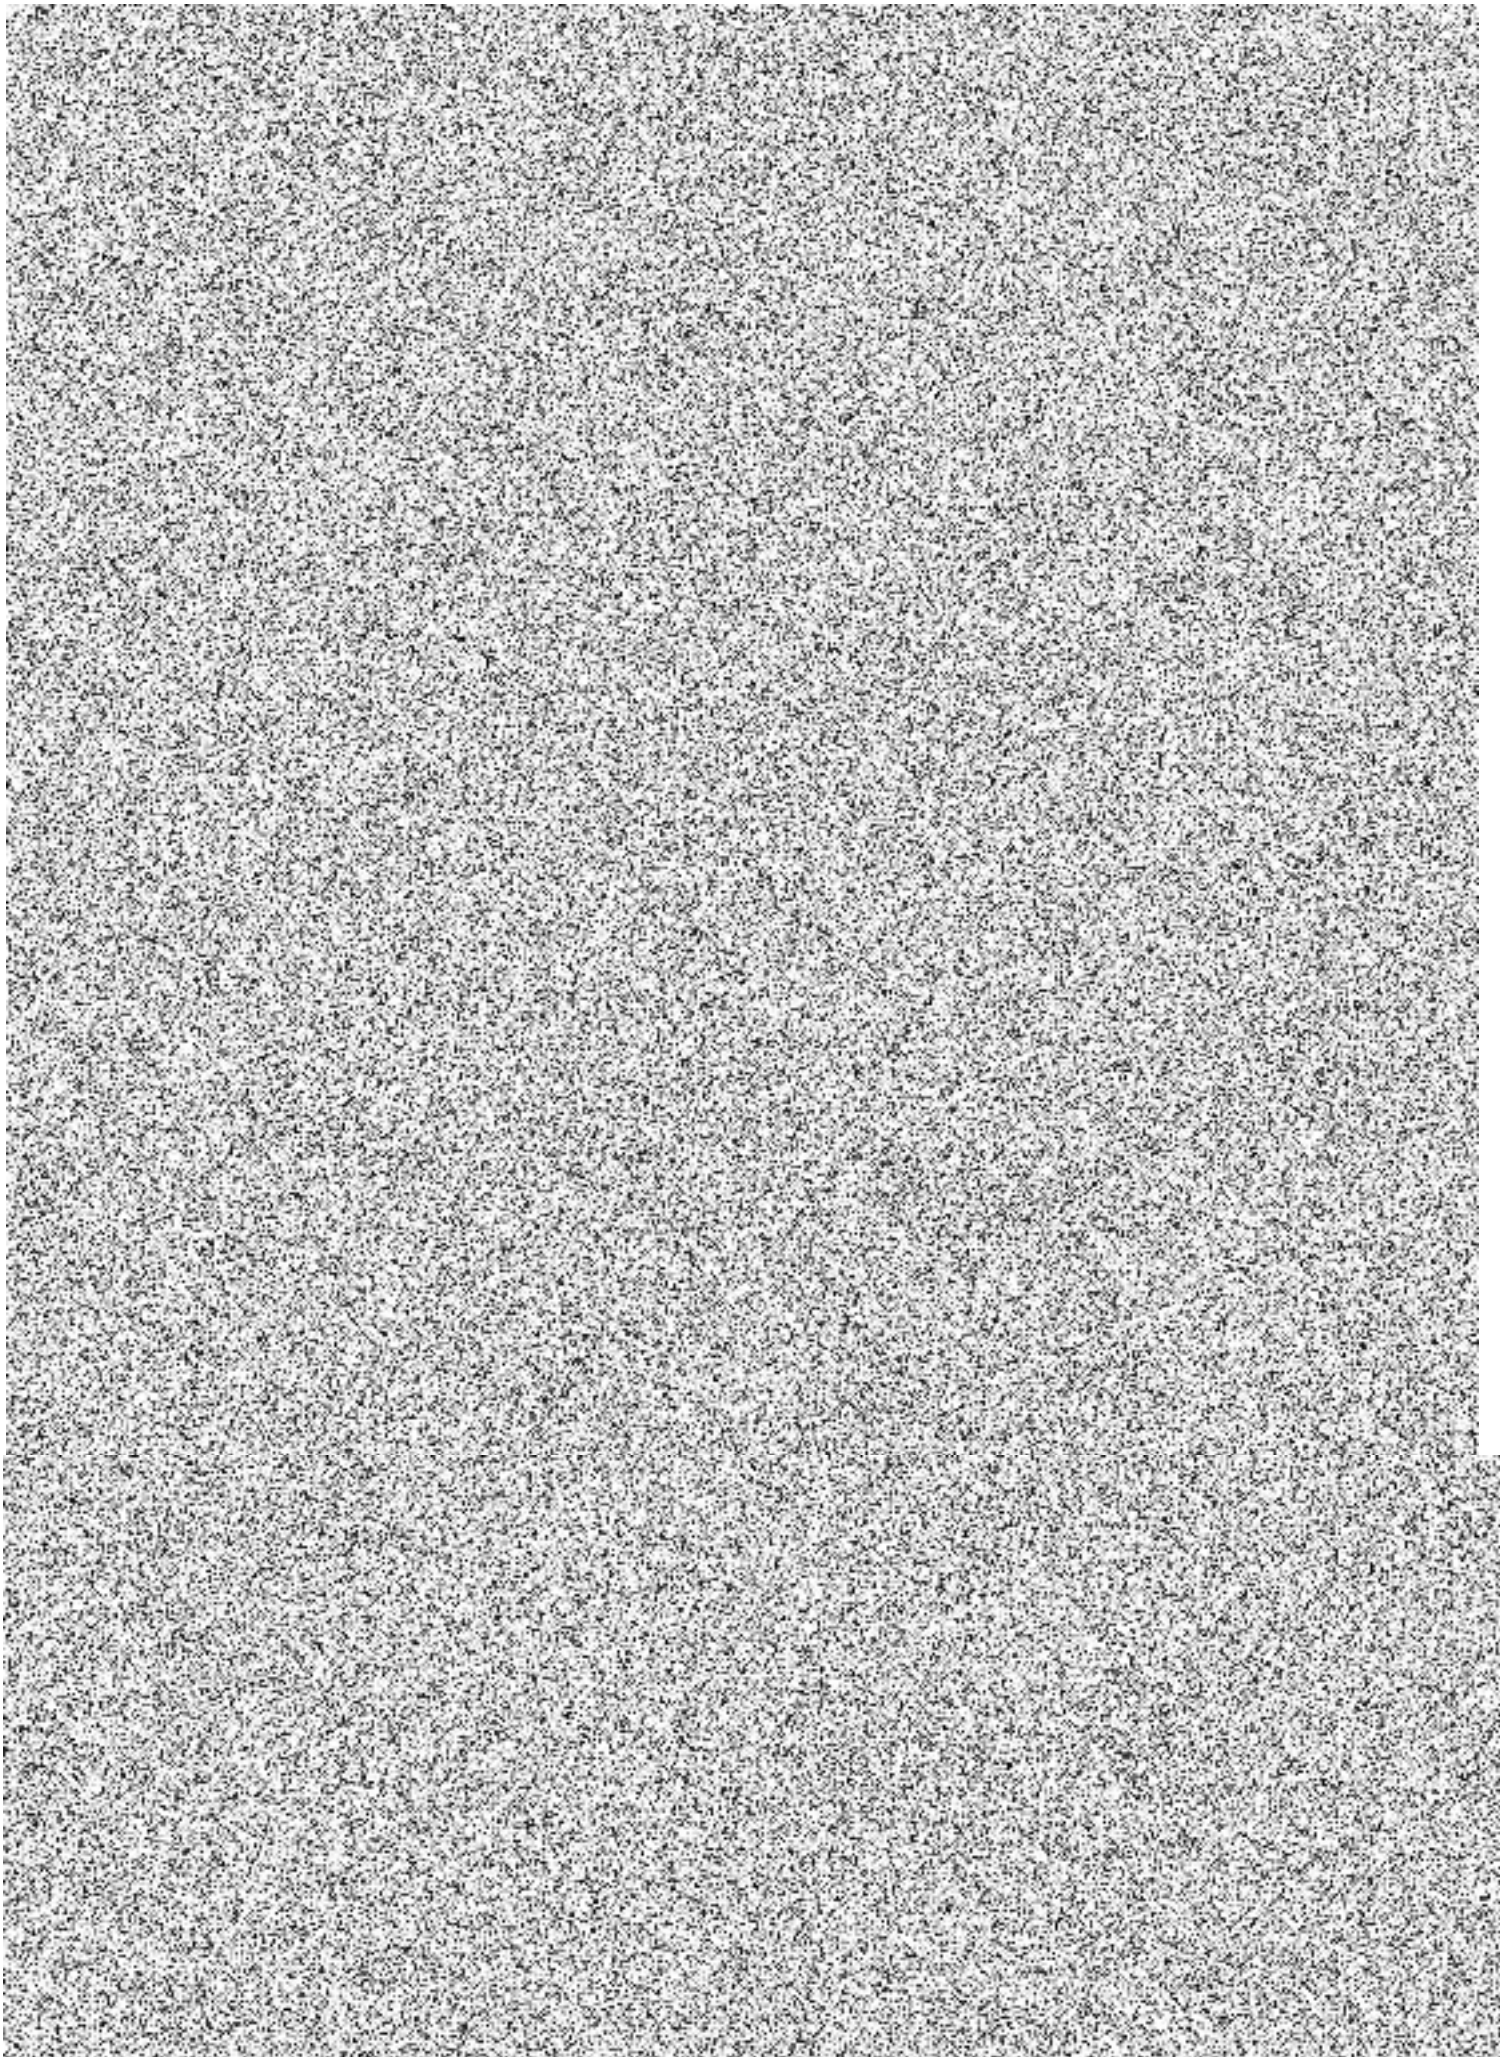

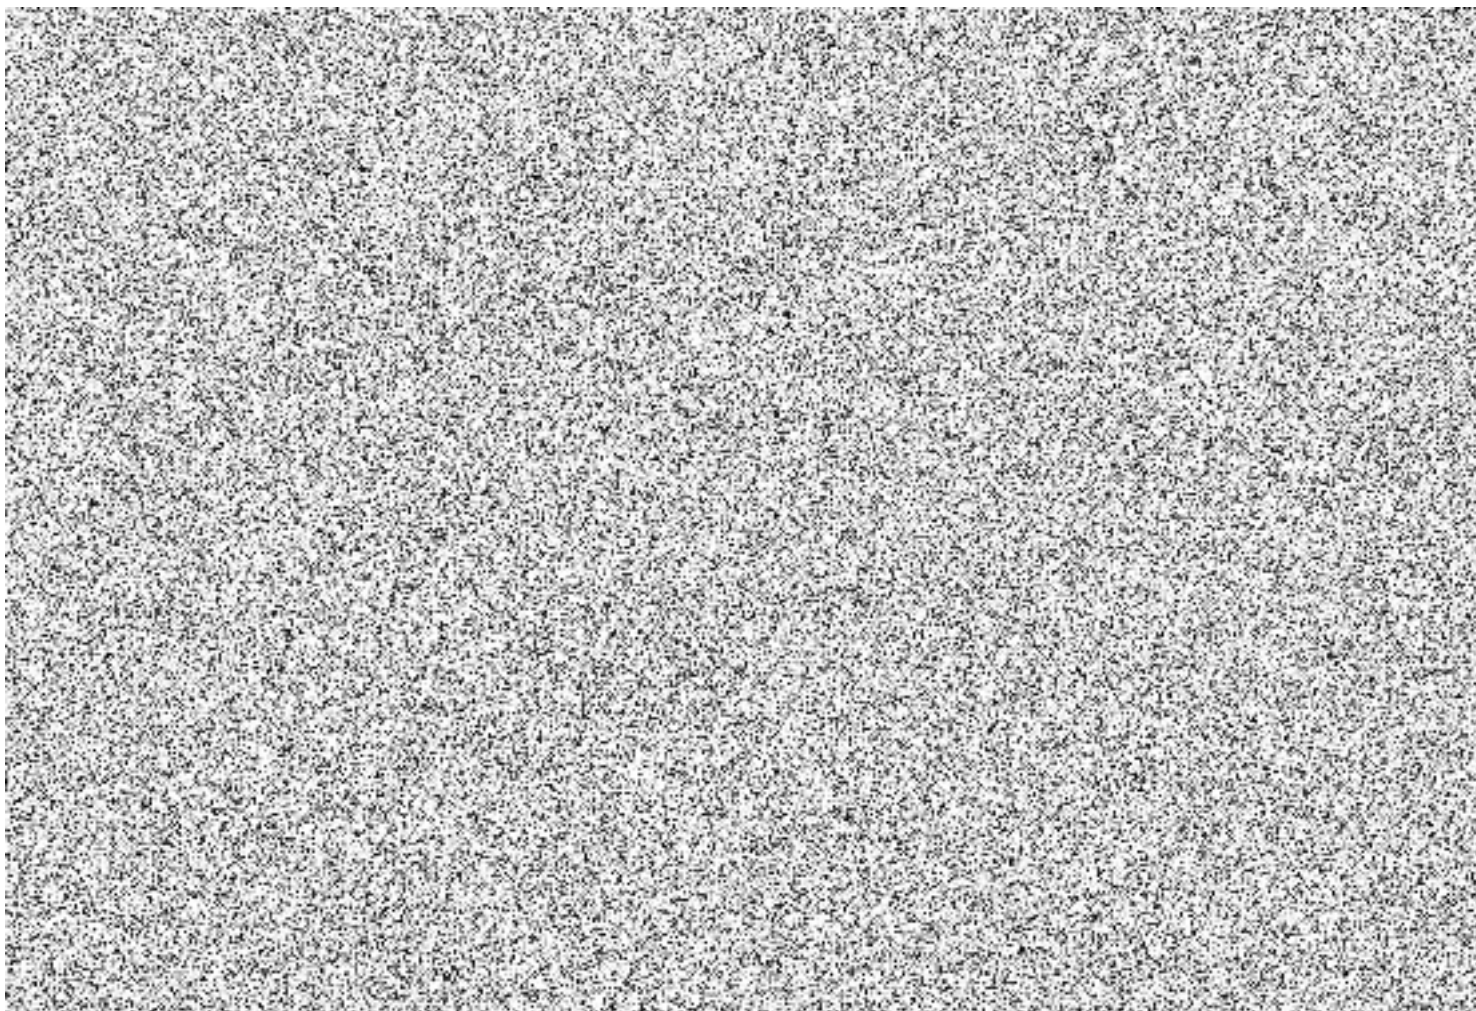

Stavba : Cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic				
№	druh materiálu (popis)	m.j.	počet	poznámka
1	potrubí Agrosil DN 250 , SN 8 Agrosil , černá barva	m	207	
2	potrubí Agrosil DN 300 , SN 8 Agrosil , černá barva	m	96	
3	potrubí Agrosil DN 160, SN 8 Agrosil , černá barva	m	75	
4	Geotextilie netkaná 300 g/m2 (2,8 role , jedna role: 500 m2)	m2	1400	
5	uliční vpusti (dna, skruže, koše, vyrovnávací prstence, mříž D 400)	komplet	5	
6	šachtové dna DN 600 (oranžové, prodlužovací potrubí černé DN 600, betonový prstenec, litinový poklop D 400)	komplet	5	
7	liniové odvodňovače , polymer , šířka 200 mm včetně litinové mříže	m	14	
8	liniové odvodňovače , polymer , šířka 300 mm včetně litinové mříže	m	8	
9	Geotextilie tkaná 200 g/m2 (1,8 role, jedna role: 500 m2)	m2	900	750
10	drenáže DN 80 (žlutá barva, 3 x balík po 50 m)	m	150	200
11	dlažba tvar čtverec beton. 200x200x60, bez fasety, BEST KARO, 12,5 palety x 11,52 m2)	m2	144	
12	betonová přídlažba 500 x 250 x 80 mm (2 palety)	ks	120	
13	betonová dlažba 100 x 100 x 80 mm (1 paleta)	m2	8	
14	betonová dlažba 200 x 100 x 60 mm (2 palety)	m2	22	
15	chodníkové obruby 100/200/100	m	288	
16	přechodové silniční obrubníky, levé 8 ks, pravé 8 ks	ks	16	
17	nájezdové silniční obrubníky	ks	75	
18	obrubníky silniční přímé 100/25/15	ks	330	
19	betonové palisády, výška 1,0 m	ks	1220	894 ks
20	horské vpusti (včetně rámu, litinové mříže, montážní oka 4 ks)	ks	2	
21	potrubí PE DN 160 (oranžová barva) 11 ks x 6 m	m	66	
22	potrubí PE DN 200 hladké(oranžová barva) 5 ks x 6 m	m	30	
23	potrubí PE DN 200 korugované (oranžová barva) 1 ks x 6 m	m	6	
24	potrubí PE DN 500 korugované (oranžová barva) 1 ks x 6 m	m	6	
25	potrubí PE DN 600 korugované (oranžová barva) 1 ks x 6 m	m	6	
26	redukce, přechodky,	ks	10	
		převzal:	Ing. Blahová	
	Datum naskladnění: 3.9.2024	předal: ing. Václav Vintr, Mitrenga - stavby, spol. s r.o.		
	Místo naskladnění: Technické služby , p.o., Uherskobrodská 188, 763 26 Luhačovice			

TDI Vaculík



7.9.2024



Faktura/Daňový doklad - dílčí faktura

Dodavatel:

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
Křížíkova 1566/19
612 00 Brno, Královo Pole

IČO: 26944022

DIČ: CZ26944022

Banka: POZOR ZMĚNA ÚČTU!!!

Číslo účtu:

Spisová značka:

Krajský obchodní soud v Brně oddíl C,
vložka 47237.

Konstantní symbol: 308

Forma úhrady: bankovním převodem

HS - č. objednávky: SoD ze dne 14.2.2024

Akce/zakázka: Luhačovice - Polichno cyklostezka

Středisko: 545

Zpracoval:

tel.:

Faktura číslo: 2024036

Variabilní symbol: 2024036

Odběratel:

Město Luhačovice
nám. 28.října 543
763 26 Luhačovice

IČ: 00284165

DIČ: CZ00284165

Bankovní spojení:

Datum vystavení: 03.05.2024

Termín splatnosti: 02.06.2024

Dat. usk. zd. plnění: 30.04.2024

Fakturujeme Vám za provedené práce v měsíci dubnu na základě Smlouvy o dílo
ze dne 14.2.2024, název akce:

"Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic", částku:

Základ daně 1 745 898,00 Kč

DPH 21% 366 638,58 Kč

Celkem s DPH 21% 2 112 536,58 Kč

Celkem k úhradě:

2 112 536,58 Kč

Přílohy: Rekapitulace čerpání stavby

Jsme plátcí DPH



razítko a podpis

fakturu převzal

Tento doklad je hrazen v rámci projektu, registrační číslo: CZ.06.06.01/00/22_035/0002126,
z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu".

PROLICONOM

REKAPITULACE ČERPÁNÍ STAVBY BEZ DPH (ŘSD)

STAVBA
Zhotovitel: Mirenga-stavby, spol. s r.o.
od: 4/2024 do: 4/2024

123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic

REKAPITULACE		Značka		Cena		Čerpáno do konce předchozího období		Čerpáno za období		Čerpáno celkem		Čerpáno po valorizaci bez DPH		K čerpání zbývá	
11	SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu			18 396 327,47 Kč		0,00 Kč		1 661 488,00 Kč		1 661 488,00 Kč		1 661 488,00 Kč		16 734 839,47 Kč	
12	Vedlejší a ostatní náklady - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu			105 000,00 Kč		0,00 Kč		42 000,00 Kč		42 000,00 Kč		42 000,00 Kč		63 000,00 Kč	
21	SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu			719 447,43 Kč		0,00 Kč		25 610,00 Kč		25 610,00 Kč		25 610,00 Kč		693 837,43 Kč	
25	Vedlejší a ostatní náklady - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu			60 000,00 Kč		0,00 Kč		12 000,00 Kč		12 000,00 Kč		12 000,00 Kč		48 000,00 Kč	
31	Vedlejší a ostatní náklady - nepřímé náklady			149 000,00 Kč		0,00 Kč		4 800,00 Kč		4 800,00 Kč		4 800,00 Kč		144 200,00 Kč	
Celkem				19 429 774,90 Kč		0,00 Kč		1 745 898,00 Kč		1 745 898,00 Kč		1 745 898,00 Kč		17 683 876,90 Kč	

Za dodavatele:

Za stavební dozor:

30.04.2024

ing. Václav Vintř

Jan Pačlčík



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH PRACÍCH

INFORMACE

123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic

Objekt: 11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Číslo zjišťovacího protokolu: duben 2024

Sledované období: duben 2024

Číslo smlouvy objednatele:

OBJEDNATEL

Město Luhačovice

IČO

00284165

Sídlo

ZHOTOVITEL

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

IČO

26944022

Sídlo

Křížíkova 1566/19, 61200 Královo Pole

Za objednatele
Město Luhačovice
pan Jan Vaculík



Za zhotovitele
Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
Ing. Václav Víntr
stavbyvedoucí



Další podpis

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

ROZPOČET VČETNĚ ZMĚN

Cena	18 396 327,47 Kč
Valorizace	0,00 Kč
Cena po valorizaci	18 396 327,47 Kč

OD POČÁTKU

Cena	0,00 Kč
Valorizace	0,00 Kč
Cena po valorizaci	0,00 Kč

ZA OBDOBÍ

Cena	1 661 488,00 Kč
DPH	348 912,48 Kč
Valorizace	0,00 Kč
Cena s DPH	2 010 400,48 Kč

CELKEM

Cena	1 661 488,00 Kč
Valorizace	0,00 Kč
Cena po valorizaci	1 661 488,00 Kč

ZBÝVÁ

Cena	16 734 839,47 Kč
Valorizace	0,00 Kč
Cena po valorizaci	16 734 839,47 Kč

Za objednatele
Město Luhačovice
pan Jan Vaculík



Za zhotovitele
Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
ing. Václav Vintr
stavbyvedoucí



Další podpis

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

INFORMACE

123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic

Objekt: 11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Číslo zjišťovacího protokolu: duben 2024

Sledované období: duben 2024

Rozpočet

Prostaveno do období

Prostaveno za období

Zbývá

P.č.	Značka	Var.	Název	M.J.	Množství	JOC	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1	111211101		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	M2	35.000	200,00	7 000,00	0,000	0,00	35.000	7 000,00	0,000	0,00
2	1112123-R1		Odstranění porostů průměru kmene do 500 mm výšky přes 2 m s frézováním patřezů v rovině nebo na svahu do 1:5, včetně naložení a odvozu dřevní hmoty do 20 km	M2	864.000	200,00	172 800,00	0,000	0,00	864.000	172 800,00	0,000	0,00
5	112101104		Odstánění stromů lastavých průměru kmene přes 700 do 900 mm	KUS	19.000	7 000,00	133 000,00	0,000	0,00	19.000	133 000,00	0,000	0,00
6	112155311		Stěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	M2	35.000	100,00	3 500,00	0,000	0,00	35.000	3 500,00	0,000	0,00
7	112251221		Odstánění patřezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m	M2	46.000	250,00	11 500,00	0,000	0,00	42.750	10 687,50	3.250	812,50
15	121151123		Sejmutí omíčky plochy přes 500 m2 tl vstřivy do 200 mm strojně	M2	1 837.000	60,00	110 220,00	0,000	0,00	159.000	9 540,00	1 678.000	100 680,00
16	121151125		Sejmutí omíčky plochy přes 500 m2 tl vstřivy přes 250 do 300 mm strojně	M2	3 127.000	75,00	234 525,00	0,000	0,00	3 127.000	234 525,00	0,000	0,00
17	122252206		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sáhnice a dálnice v hornaté třídě těžitelnosti I objem do 5000 m3, strojně	M3	3 392.600	180,00	610 668,00	0,000	0,00	900.000	162 000,00	2 492.600	448 668,00
18	122911121		Odstánění vyfrézované dřevní hmoty hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	46.000	150,00	6 900,00	0,000	0,00	42.750	6 412,50	3.250	487,50

Za objednatele

Město Luhačovice

pan Jan Vaculík




Za zhotovitele

Mitrena-stavby, spol. s r.o.

ing. Václav Vintr

stavbyvedoucí



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH PRACÍCH

INFORMACE

123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic

Objekt: 12 - Vedlejší a ostatní náklady - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Číslo zjišťovacího protokolu: duben 2024

Sledované období: duben 2024

Číslo smlouvy objednatele:

OBJEDNATEL

Město Luhačovice

IČO

00284165

Sídlo

ZHOTOVITEL

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

IČO

26944022

Sídlo

Křížíkova 1566/19, 61200 Královo Pole

Za objednatele
Město Luhačovice
p. Jan Vaculík
TDI



Za zhotovitele
Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
ing. Václav Víntr
stavbyvedoucí

5/16



Další podpis



ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

ROZPOČET VČETNĚ ZMĚN

Cena	105 000,00 Kč
Valorizace	0,00 Kč
Cena po valorizaci	105 000,00 Kč

OD POČÁTKU

Cena	0,00 Kč
Valorizace	0,00 Kč
Cena po valorizaci	0,00 Kč

ZA OBDOBÍ

Cena	42 000,00 Kč
DPH	8 820,00 Kč
Valorizace	0,00 Kč
Cena s DPH	50 820,00 Kč

CELKEM

Cena	42 000,00 Kč
Valorizace	0,00 Kč
Cena po valorizaci	42 000,00 Kč


ZBÝVÁ

Cena	63 000,00 Kč
Valorizace	0,00 Kč
Cena po valorizaci	63 000,00 Kč

Za objednatele
Město Luhačovice
p. Jan Vaculík
TDI



Za zhotovitele
Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
ing. Václav Vintř
stavbyvedoucí



Další podpis

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

INFORMACE

123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic

Objekt: 12 - Vedlejší a ostatní náklady - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Číslo zjišťovacího protokolu: duben 2024

Sledované období: duben 2024

Rozpočet										Prostaveno do období				Prostaveno za období				Zbývá	
P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem	Množství	Celkem	Prostaveno do období		Prostaveno za období		Zbývá					
1	012203000		Geodetické práce při provádění stavby	KČ	1,000	90 000,00	90 000,00	0,000	0,00										
2	012103000		Geodetické práce před výstavbou	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000	0,00										
Celkem																			
Valorizace																			
Celkem po valorizaci																			

Za objednatele
Město Luhačovice
p. Jan Vaculík
TDI



Za zhotovitele
Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
ing. Václav Vntr
stavbyvedoucí



Další podpis



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH PRACÍCH

INFORMACE

123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic

Objekt: 21 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Číslo zjišťovacího protokolu: duben 2024

Sledované období: duben 2024

Číslo smlouvy objednatele:

OBJEDNATEL

Město Luhačovice

IČO

00284165

Sídlo

ZHOTOVITEL

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

IČO

26944022


Sídlo

Křižíkova 1566/19, 61200 Královo Pole

Za objednatele
Město Luhačovice
p. Jan Vaculík
TDI



Za zhotovitele
Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
ing. Václav Vintř
stavbyvedoucí



Další podpis

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

ROZPOČET VČETNĚ ZMĚN

Cena	719 447,43 Kč
Valorizace	0,00 Kč
Cena po valorizaci	719 447,43 Kč

OD POČÁTKU

Cena	0,00 Kč
Valorizace	0,00 Kč
Cena po valorizaci	0,00 Kč

ZA OBDOBÍ

Cena	25 610,00 Kč
DPH	5 378,10 Kč
Valorizace	0,00 Kč
Cena s DPH	30 988,10 Kč

CELKEM

Cena	25 610,00 Kč
Valorizace	0,00 Kč
Cena po valorizaci	25 610,00 Kč

ZBÝVÁ

Cena	693 837,43 Kč
Valorizace	0,00 Kč
Cena po valorizaci	693 837,43 Kč

Za objednatele
Město Luhačovice
p. Jan Vaculík
TDI



Za zhotovitele
Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
ing. Václav Vintr
stavbyvedoucí



Další podpis

9/1



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

INFORMACE

123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic

Objekt: 21 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Číslo zjišťovacího protokolu: duben 2024

Sledované období: duben 2024

P.č.	Značka	Var.	Název	Rozpočet				Prostaveno do období			Prostaveno za období			Zbývá	
				MJ	Množství	JOC	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
12	348001-R1		Dočasné oplocení - smrkové kůly průměr 20 cm, zaraženy do hl. 0,5 m, rozteč kůlů 4-5 m, výška 160-170 cm - kompletní provedení, dodávka, montáž, demontáž	KUS	35,000	150,00	5 250,00	0,000	0,00	17,500	2 625,00	17,500	2 625,00	17,500	2 625,00
13	348001-R2		Dočasné oplocení - smrková tyčovina o průměru 5-15 cm, umístěna ve 2-3 vrstvách - kompletní provedení, dodávka, montáž, demontáž	M	390,000	80,00	31 200,00	0,000	0,00	195,000	15 600,00	195,000	15 600,00	195,000	15 600,00
30	919726122		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm. přes 200 do 300 g/m2	M2	211,000	35,00	7 385,00	0,000	0,00	211,000	7 385,00	0,000	0,00	0,000	0,00


Celkem
Valorizace
Celkem po valorizaci

25 610,00 Kč
0,00 Kč
25 610,00 Kč

Za objednatele
Město Luhačovice
p. Jan Vaculík
TDI



Za zhotovitele
Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
ing. Václav Vintř
stavbyvedoucí



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH PRACÍCH

INFORMACE

123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic

Objekt: 25 - Vedlejší a ostatní náklady - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Číslo zjišťovacího protokolu: duben 2024

Sledované období: duben 2024

Číslo smlouvy objednatele:

OBJEDNATEL

Město Luhačovice

IČO

00284165

Sídlo

ZHOTOVITEL

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

IČO

26944022


Sídlo

Křižíkova 1566/19, 61200 Královo Pole

Za objednatele
Město Luhačovice
p. Jan Vaculík
TDI



Za zhotovitele
Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
ing. Václav Vintř
stavbyvedoucí



Další podpis

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

ROZPOČET VČETNĚ ZMĚN

Cena	60 000,00 Kč
Valorizace	0,00 Kč
Cena po valorizaci	60 000,00 Kč

OD POČÁTKU

Cena	0,00 Kč
Valorizace	0,00 Kč
Cena po valorizaci	0,00 Kč

ZA OBDOBÍ

Cena	12 000,00 Kč
DPH	2 520,00 Kč
Valorizace	0,00 Kč
Cena s DPH	14 520,00 Kč

CELKEM

Cena	12 000,00 Kč
Valorizace	0,00 Kč
Cena po valorizaci	12 000,00 Kč


ZBÝVÁ

Cena	48 000,00 Kč
Valorizace	0,00 Kč
Cena po valorizaci	48 000,00 Kč

Za objednatele
Město Luhačovice
p. Jan Vaculík
TDI



Za zhotovitele
Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
ing. Václav Vintr
stavbyvedoucí



Další podpis

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

INFORMACE

123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic

Objekt: 25 - Vedlejší a ostatní náklady - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Číslo zjišťovacího protokolu: duben 2024

Sledované období: duben 2024

			Rozpočet			Prostaveno do období			Prostaveno za období			Zbývá		
P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	
1	R-001		Přechodné a provizorní dopravní zařízení	Kč	1 000	60 000,00	60 000,00	0,000	0,00	0,200	12 000,00	0,800	48 000,00	
Celkem							12 000,00 Kč				0,00 Kč			
Valorizace							0,00 Kč				12 000,00 Kč			
Celkem po valorizaci														

Za objednatele
Město Luhačovice
p. Jan Vaculik
TDI



Za zhotovitele
Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
ing. Václav Votr
stavbyvedoucí



Další podpis



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH PRACÍCH

INFORMACE

123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic

Objekt: 31 - Vedlejší a ostatní náklady - nepřímé náklady

Číslo zjišťovacího protokolu: duben 2024

Sledované období: duben 2024

Číslo smlouvy objednatele:

OBJEDNATEL

Město Luhačovice

IČO

00284165

Sídlo

ZHOTOVITEL

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

IČO

26944022


Sídlo

Křížíkova 1566/19, 61200 Královo Pole

Za objednatele
Město Luhačovice
p. Jan Vaculík
TDI



Za zhotovitele
Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
ing. Václav Vintř
stavbyvedoucí



Další podpis

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

ROZPOČET VČETNĚ ZMĚN

Cena	149 000,00 Kč
Valorizace	0,00 Kč
Cena po valorizaci	149 000,00 Kč

OD POČÁTKU

Cena	0,00 Kč
Valorizace	0,00 Kč
Cena po valorizaci	0,00 Kč

ZA OBDOBÍ

Cena	4 800,00 Kč
DPH	1 008,00 Kč
Valorizace	0,00 Kč
Cena s DPH	5 808,00 Kč

CELKEM

Cena	4 800,00 Kč
Valorizace	0,00 Kč
Cena po valorizaci	4 800,00 Kč

ZBÝVÁ


Cena	144 200,00 Kč
Valorizace	0,00 Kč
Cena po valorizaci	144 200,00 Kč

Za objednatele
Město Luhačovice
p. Jan Vaculík
TDI



Za zhotovitele
Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
ing. Václav Vintř
stavbyvedoucí

1



Další podpis

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

INFORMACE

123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic

Objekt: 31 - Vedlejší a ostatní náklady - nepřímé náklady

Číslo zjišťovacího protokolu: duben 2024

Sledované období: duben 2024

			Rozpočet			Prostaveno do období			Prostaveno za období			Zbývá		
P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Celkem
4	030001000		Zařízení staveníště	Kč	1,000	24 000,00	24 000,00	0,000	0,00	0,200	4 800,00	0,800		19 200,00
Celkem											4 800,00 Kč			
Valorizace											0,00 Kč			
Celkem po valorizaci											4 800,00 Kč			

Za objednatele
Město Luhačovice
p. Jan Vaculík
TDI



Za zhotovitele
Milrenga-stavby, spol. s r.o.
ing. Václav Votr
stavbyvedoucí



Další podpis



PROHLÁŠENÍ K FAKTUŘE Č. 2024036

- a) nemáme v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“)
- b) nejsou nám známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostaneme do postavení, kde nemůžeme daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenacházíme,
- c) nezkrátíme daň nebo nevylákáme daňovou výhodu,
- d) úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny,
- e) úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
- f) nebudeme nespolehlivým plátcem,
- g) budeme mít u správce daně registrovaný bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- h) souhlasíme s tím, že pokud bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o nás zveřejněna správcem daně skutečnost, že jsme nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně
- i) souhlasíme s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci našeho bankovního účtu určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.


V Brně dne 3.5.2024



----- Doručovací adresa: Mitrenga – stavby, spol. s r.o., Malešovice 144, 664 65 -----

Sídlo:
Křižíkova 1566/19
612 00 Brno

Tel. + Fax. : 
E – mail : 
WWW : www.mitrenga.net

IČ : 26944022
DIČ : CZ26944022
Bankovní spojení : 

Faktura/Daňový doklad - dílčí faktura

Dodavatel:

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

Křižíkova 1566/19

612 00 Brno, Královo Pole

IČO: 26944022

DIČ: CZ26944022

Banka: POZOR ZMĚNA ÚČTU!!!

Číslo účtu:

Spisová značka:

Krajský obchodní soud v Brně oddíl C,
vložka 47237.

Konstantní symbol: 308

Forma úhrady: bankovním převodem

HS - č. objednávky: SoD ze dne 14.2.2024

Akce/zakázka: Luhačovice - Polichno cyklostezka

Středisko: 545

Zpracoval:

tel.:

Faktura číslo: 2024049

Variabilní symbol: 2024049

Odběratel:

Město Luhačovice

nám. 28.října 543

763 26 Luhačovice

IČ: 00284165

DIČ: CZ00284165

Bankovní spojení:

Datum vystavení: 10.06.2024

Termín splatnosti: 10.07.2024

Dat. usk. zd. plnění: 31.05.2024

Fakturujeme Vám za provedené práce v měsíci květnu na základě Smlouvy o dílo
ze dne 14.2.2024 a dodatku č. 1 ze dne 9.6.2024, název akce:

"Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic", částku:

Základ daně 5 416 723,90 Kč

DPH 21% 1 137 512,02 Kč

Celkem s DPH 21% 6 554 235,92 Kč

Celkem k úhradě:**6 554 235,92 Kč**

Přílohy: Rekapitulace čerpání stavby

Soupis provedených prací

Prohlášení DPH

Jsme plátcí DPH

razítko a podpis

fakturu převzal

**Tento doklad je hrazen v rámci projektu, registrační číslo: CZ.06.06.01/00/22_035/0002126,
z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu".**

PROLICONOM
REKAPITULACE ČERPÁNÍ STAVBY BEZ DPH (ŘSD)

STAVBA

Zhotovitel: Mltrenga-stavby, spol. s r.o.

od: 5/2024

do: 5/2024


123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic

REKAPITULACE

Značka	Název	Cena	Čerpáno do konce předchozího období	Čerpáno za období	Čerpáno celkem	Čerpáno po valorizaci bez DPH	K čerpání zbývá
11	SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu	18 361 897,39 Kč	1 661 488,00 Kč	5 371 123,90 Kč	7 032 611,90 Kč	7 032 611,90 Kč	11 329 285,49 Kč
12	Vedlejší a ostatní náklady - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu	105 000,00 Kč	42 000,00 Kč	18 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	45 000,00 Kč
21	SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu	719 447,43 Kč	25 610,00 Kč	0,00 Kč	25 610,00 Kč	25 610,00 Kč	693 837,43 Kč
25	Vedlejší a ostatní náklady - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu	60 000,00 Kč	12 000,00 Kč	9 000,00 Kč	21 000,00 Kč	21 000,00 Kč	39 000,00 Kč
31	Vedlejší a ostatní náklady - nepřímé náklady	149 000,00 Kč	4 800,00 Kč	18 600,00 Kč	23 400,00 Kč	23 400,00 Kč	125 600,00 Kč
	Celkem	19 395 344,82 Kč	1 745 898,00 Kč	5 416 723,90 Kč	7 162 621,90 Kč	7 162 621,90 Kč	12 232 722,92 Kč

Za dodavatele:
ing. Václav Vlntr

Za stavební dozor:

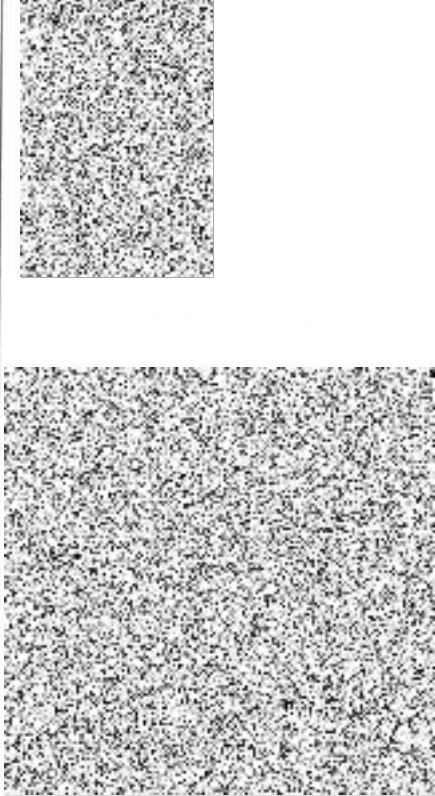

REKAPITULACE ČERPÁNÍ POLOŽEK

Stavba: 123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic
Objekt: 11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Období: 5/2024 - 5/2024

P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Celkem	Prostaveno za období	Celkem	Do konce sled. období	Celkem	Zbývá	Celkem
227	98225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace a korytem z kamenné, monolitickým betonovým nebo železným	T	6 167,747	10,00		61 677,47	0,000	0,00	3 000,000	30 000,00	3 000,000	30 000,00	3 167,747	31 677,47
								61 677,47	0,00	0,00		30 000,00		30 000,00		31 677,47
P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Celkem	Prostaveno za období	Celkem	Do konce sled. období	Celkem	Zbývá	Celkem
197	28617044		trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x600mm SN10	M	2,030	250,00		507,50	0,000	0,00	2,030	507,50	2,030	507,50	0,000	0,00
199	28617048		trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x600mm SN10	M	2,030	250,00		507,50	0,000	0,00	2,030	507,50	2,030	507,50	0,000	0,00
201	28614350		trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 600x600mm SN8	M	7,714	900,00		6 942,60	0,000	0,00	7,714	6 942,60	7,714	6 942,60	0,000	0,00
202	91972612		Geotextilie pro ochrannou, separační a filtrační nekaná	M2	6 156,000	35,00		215 460,00	4 546,000	159 110,00	1 610,000	56 350,00	6 156,000	215 460,00	0,000	0,00
			mléčná hm. př. 200 do 300 g/m2					223 417,60		159 110,00		64 307,60		223 417,60		0,00
			Celkem za SO 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání													0,00
P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Celkem	Prostaveno za období	Celkem	Do konce sled. období	Celkem	Zbývá	Celkem
125	28617267		trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x600mm SN12	M	2,030	250,00		507,50	0,000	0,00	2,030	507,50	2,030	507,50	0,000	0,00
129	28611508		redukce kanalizační PVC 300/160	KUS	3,000	750,00		2 250,00	0,000	0,00	3,000	2 250,00	3,000	2 250,00	0,000	0,00
131	28611512		redukce kanalizační PVC 350/200	KUS	4,000	750,00		3 000,00	0,000	0,00	4,000	3 000,00	4,000	3 000,00	0,000	0,00
133	28611514		redukce kanalizační PVC 315/250	KUS	1,000	750,00		750,00	0,000	0,00	1,000	750,00	1,000	750,00	0,000	0,00
136	5922427R		drátka betonová zákrutová šachetní přechodová	KUS	1,000	2 500,00		2 500,00	0,000	0,00	1,000	2 500,00	1,000	2 500,00	0,000	0,00
			čvercová 150x150x15cm													0,00
141	894812201		Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	KUS	3,000	2 500,00		7 500,00	0,000	0,00	3,000	7 500,00	3,000	7 500,00	0,000	0,00
142	894812231		Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová	KUS	3,000	2 500,00		7 500,00	0,000	0,00	3,000	7 500,00	3,000	7 500,00	0,000	0,00
143	894812249		roura korugovaná bez hrubé světlé hloubky 1500	KUS	3,000	2 500,00		7 500,00	0,000	0,00	3,000	7 500,00	3,000	7 500,00	0,000	0,00
144	894812262		Připlatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užití šachtové roury	KUS	3,000	5,00		15,00	0,000	0,00	3,000	15,00	3,000	15,00	0,000	0,00
155	592-R-301		Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový	KUS	3,000	5 000,00		15 000,00	0,000	0,00	3,000	15 000,00	3,000	15 000,00	0,000	0,00
			přijíždí do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400													0,00
			uliční vpust klasická 50 x 50 cm s mechanismem proti odcižení, včetně rámu a mlže													0,00
157	28661770		poklop šachtový litinový+ rám betonový DN 400 pro třídu zatížení B125	KUS	6,000	9 000,00		54 000,00	0,000	0,00	6,000	54 000,00	6,000	54 000,00	0,000	0,00
			Celkem za SO 8 - Trubní vedení					100 522,50		0,00		7 500,00		100 522,50		0,00
																0,00
P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Celkem	Prostaveno za období	Celkem	Do konce sled. období	Celkem	Zbývá	Celkem
95	564561111		Zřízení podlahy nebo podkladu za sypaniny plochy přes 100 m2 tl. 200 mm	M2	5 200,000	90,00		468 000,00	0,000	0,00	3 681,000	331 290,00	3 681,000	331 290,00	1 519,000	136 710,00
96	58344229E		Podkladní desky z betonu prostého tl. C 16/20	T	2 132,000	300,00		639 600,00	0,000	0,00	1 509,210	452 763,00	1 509,210	452 763,00	622,790	186 837,00
			šetrností frakce 0/90					1 107 600,00		0,00		784 053,00		784 053,00		323 547,00
			Celkem za SO 5 - Komunikace pozemní													0,00
P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Celkem	Prostaveno za období	Celkem	Do konce sled. období	Celkem	Zbývá	Celkem
92	4515/3111		Lože pod potrubí otevírání výtok ze šterkopu	M3	9,516	400,00		3 806,40	0,000	0,00	2,796	1 118,40	2,796	1 118,40	6,720	2 688,00
93	452311141		Podkladní desky z betonu prostého tl. C 16/20	M3	1,060	3 500,00		3 710,00	0,000	0,00	0,420	1 470,00	0,420	1 470,00	0,640	2 240,00
			otevírání výtok					7 516,40		0,00		2 588,40		2 588,40		4 928,00
			Celkem za SO 4 - Vodovodné konstrukce													0,00
P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Celkem	Prostaveno za období	Celkem	Do konce sled. období	Celkem	Zbývá	Celkem
76	327323127		Opěrná zdi a vally ze žb tl. C 25/30	M3	66,000	6 500,00		429 000,00	0,000	0,00	66,000	429 000,00	66,000	429 000,00	0,000	0,00
78	327351211		Bednění opěrných zdí a valů svahových sklonových	M2	729,230	250,00		182 307,50	0,000	0,00	89,200	22 300,00	89,200	22 300,00	640,030	160 007,50
79	327351221		Bednění opěrných zdí a valů svahových sklonových odstředění	M2	729,230	150,00		109 384,50	0,000	0,00	89,200	13 380,00	89,200	13 380,00	640,030	96 004,50

80	327261006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonu	3,003	25 000,00	75 075,00	0,00	0,00	3,003	75 075,00	0,00	0,00
81	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných ocelí	45,144	25 000,00	1 128 600,00	0,00	0,00	45,144	1 128 600,00	0,00	0,00
Celkem za SD 3 - Svařované kompletní konstrukce					1 924 367,90	0,00	0,00		1 668 355,00		256 012,90

P.č.	Značka	Var.	Název	M.J.	Množství	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Množství	Celkem	Do konce sled. období	Množství	Celkem	Zbývá	Množství	Celkem
49	211531111		Výplň odvodňovacích žebírek nebo tratičů	M3	386,435	600,00		231 861,00	0,00		220,550	132 330,00	220,550	132 330,00	165,885		99 531,00
51	211971121		Kamenivka hrubým drcením frakce 16 až 63 mm	M3	1 994,000	35,00		69 794,00	0,00		1 139,000	39 865,00	1 139,000	39 865,00	855,000		29 925,00
53	212572111		Zřízení opláštění žebírek nebo tratičů geotextilií v	M2	28,538	400,00		11 415,20	0,00		10,965	4 386,00	10,965	4 386,00	17,573		7 029,20
60	273313511		Lože pro tratičky ze šlákovitého řídkého	M3	22,000	3 500,00		77 000,00	0,00		22,000	77 000,00	22,000	77 000,00	0,000		0,00
61	273351121		Zřízení bednění základových desek	M2	22,380	250,00		5 595,00	0,00		22,380	5 595,00	22,380	5 595,00	0,000		0,00
62	273351122		Odstavení bednění základových desek	M2	22,380	150,00		3 357,00	0,00		22,380	3 357,00	22,380	3 357,00	0,000		0,00
Celkem za SD 2 - Zakládání								399 018,20	0,00		262 533,00	262 533,00		262 533,00		136 485,20	

P.č.	Značka	Var.	Název	M.J.	Množství	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Množství	Celkem	Do konce sled. období	Množství	Celkem	Zbývá	Množství	Celkem
5	112101104		Odstavení stromů listnatých průměru kmen přes 700 do 900 mm	KUS	20,000	7 000,00		140 000,00	19,000		133 000,00	1,000	7 000,00	140 000,00	0,000		0,00
8	113107243		Odstavení podkladu živičného tl. přes 100 do 150 mm stroje plíže 200 m2	M2	145,000	150,00		21 750,00	0,000		0,000	30,000	4 500,00	4 500,00	115,000		17 250,00
11	115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	1 446,000	50,00		72 000,00	0,000		0,000	480,000	24 000,00	24 000,00	960,000		48 000,00
12	115101301		Pokřovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	DEN	180,000	500,00		90 000,00	0,000		0,000	60,000	30 000,00	30 000,00	120,000		60 000,00
13	116951201		Uprava zemlin výměrem nebo směrnými hydraulickými polji	M3	843,600	250,00		210 900,00	0,000		0,000	843,600	210 900,00	210 900,00	0,000		0,00
14	58591002		poljivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50%	T	59,642	3 200,00		190 854,40	0,000		0,000	59,642	190 854,40	190 854,40	0,000		0,00
17	12252206		Odkopky a prokopky nezabírající pro sílnice a dílnice v hornině třídy těžnosti I a objem do 5000 m3 stroje	M3	2 877,000	180,00		517 860,00	900,000		162 000,00	1 495,000	269 100,00	2 395,000	431 100,00	482,000	86 760,00
25	162751117		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopu sypání z horniny třídy těžnosti I skupiny 1 až 3	M3	2 514,821	180,00		452 667,78	900,000		162 000,00	1 299,000	232 020,00	2 189,000	394 020,00	325,821	58 647,78
26	162751119		Příprava k vodorovnému přemístění výkopu sypání z horniny třídy těžnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	50 756,420	8,50		427 519,57	18 000,000		153 000,00	25 780,000	219 130,00	43 780,000	372 130,00	6 516,420	55 389,57
29	171151103		Uložení sypání z hornin soudržných do náspů zhuštěných stroje	M3	1 088,000	200,00		217 600,00	0,000		0,000	336,000	67 200,00	336,000	67 200,00	752,000	150 400,00
30	58981148		recyklat betonový frakce 0/90	T	2 393,600	150,00		359 040,00	0,000		0,000	1 751,200	262 680,00	262 680,00	642,400		96 360,00
31	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kůd odpadu 17 05 04	T	4 778,160	150,00		716 724,00	1 710,000		256 500,00	2 448,500	367 275,00	4 158,500	623 775,00	619,660	92 946,00
34	174151101		Zásep jam, šacht vrtů nebo kolem objektů sypání se zhuštěním	M3	482,029	200,00		96 405,80	0,000		0,000	167,000	33 400,00	167,000	33 400,00	315,029	63 005,80
39	181152002		Uprava pláně pro sílnice a dílnice v zářezích se zhuštěním	M2	4 546,000	25,00		113 650,00	0,000		0,000	2 511,000	62 775,00	2 511,000	62 775,00	2 035,000	50 875,00
Celkem za SD 1 - Zemní práce								3 626 971,55	866 500,00		1 980 834,40			2 847 334,40		779 637,15	

P.č.	Značka	Var.	Název	M.J.	Množství	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Množství	Celkem	Do konce sled. období	Množství	Celkem	Zbývá	Množství	Celkem
1000	964821111		podklad ze šlákovité SD plochy přes 1000 m2 tl. 80 mm	M2	2 529,000	104,00		263 016,00	0,000		0,000	2 529,000	263 016,00	263 016,00	0,000		0,00
Celkem za SD ZL 1-V - Dodatečná sanace km 0,325 - 1,060								263 016,00	0,000		0,000			263 016,00		0,00	
P.č.	Značka	Var.	Název	M.J.	Množství	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Množství	Celkem	Do konce sled. období	Množství	Celkem	Zbývá	Množství	Celkem
1005	NP1005		tratičky z hub PE 160 mm	M	731,000	284,00		214 914,00	0,000		0,000	731,000	214 914,00	214 914,00	0,000		0,00
Celkem za SD ZL 1-6-V - Drenáž profilu DN 160 mm z materiálu PE (místo PVC)								214 914,00	0,000		0,000			214 914,00		0,00	
Celkem Smlouva - ZBV								7 429 020,72	1 025 610,00		5 371 123,90			6 396 733,90		1 532 286,82	



Za objednatel:
 Město Luhačovice
 p. Jan Václav
 TDI



Za zhotovitele:
 Mitrena-stavby spol. s r.o.
 ing. Václav Votr
 starobýdovci



Další podpora

REKAPITULACE ČERPÁNÍ POLOŽEK

Stavba: 123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic
Objekt: 12 - Vadlejší a ostatní náklady - ZPUSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Období: 5/2024 - 5/2024

P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Prostaveno za období	Do konce sled. období	Zbývá
T	01203000		Geodetické práce při provádění staveb	KC	1,000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,300	0,200	0,500	0,500
			Celkem za SD VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce				90 000,00	90 000,00	27 000,00	18 000,00	45 000,00	45 000,00
			Celkem Smlouva + ZBV				90 000,00	90 000,00	27 000,00	18 000,00	45 000,00	45 000,00

Za objednatelé
Město Luhačovice
p. Jan Vaculík
TDI

Za zhotovitele
Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
Ing. Václav Vím
stavbyvedoucí

Další podpis

REKAPITULACE ČERPÁNÍ POLOŽEK

Stavba: 123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic
Objekt: 21 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Období: 5/2024 - 5/2024

Celkem Smlouva - ZBV

Za objednatele
Město Luhačovice
p. Jan Vaculík
TDI



Za zhotovitele
Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
Ing. Václav Votr
stavbyvedoucí



Další podpis

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REKAPITULACE ČERPÁNÍ POLOŽEK

Stavba: 123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic
Objekt: 25 - Vedlejší a ostatní náklady - ZPŮSOBITÉ VYDAJE - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Období: 5/2024 - 5/2024

P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Rozpočet		Prostaveno do konce před. období		Prostaveno za období		Do konce sled. období		Zbývá	
					Množství	JOC	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1	R-001		Přechodné a provizorní dopravní zařízení	KČ	1,000	60 000,00		60 000,00	0,150	9 000,00	0,350	21 000,00	0,650	39 000,00
Celkem za SD VRN9 - Ostatní náklady								60 000,00		9 000,00		21 000,00		39 000,00
Celkem Smlouva + ZBV								60 000,00		9 000,00		21 000,00		39 000,00

Za objednatele
Město Luhačovice
B. Jan Vavulík
TJ

Za zhotovitele
Mittrenga-stavby, spol. s r.o.
Ing. Václav Votr
stavbyvedoucí

Další podpis

REKAPITULACE ČERPÁNÍ POLOŽEK

Stavba: 123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic
Objekt: 31 - Vedlejší a ostatní náklady - nepřímé náklady
Období: 5/2024 - 5/2024

P.č.	Značka	Var.	Název	M.J.	Množství	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Množství	Celkem	Prostaveno za období	Množství	Celkem	Do konce sled. období	Množství	Celkem	Zbývá	Množství	Celkem
5	041903-R1		Přístomost a odborná konzultace geotechnika na stavbě	KČ	1,000	10 000,00		10 000,00	0,000		0,00	1,000		10 000,00	1,000		10 000,00	0,000		0,00
7	043002001		Zkoušky a ostatní měření	KČ	1,000	25 000,00		25 000,00	0,000		0,00	0,200		5 000,00	0,200		5 000,00	0,000		20 000,00
Celkem za SD VRN4 - inženýrská činnost								35 000,00			0,00			15 000,00			15 000,00			20 000,00
P.č.	Značka	Var.	Název	M.J.	Množství	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Množství	Celkem	Prostaveno za období	Množství	Celkem	Do konce sled. období	Množství	Celkem	Zbývá	Množství	Celkem
4	030001001		Zařízení staveniště	KČ	1,000	24 000,00		24 000,00	0,200		4 800,00	0,150		3 600,00	0,350		8 400,00	0,650		15 600,00
Celkem za SD VRN3 - Zařízení staveniště								24 000,00			4 800,00			3 600,00			8 400,00			15 600,00
Celkem Smlouva + ZBV								59 000,00			4 800,00			18 600,00			23 400,00			35 600,00

Za objednatele:
Město Luhačovice
p. Jan Vaculík
TD

Za zhotovitele:
Mitranga-stavby, spol. s r.o.
Ing. Václav Ventr
starobývedoucí

Další podpis



PROHLÁŠENÍ K FAKTUŘE Č. 2024049

- a) nemáme v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“)
- b) nejsou nám známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostaneme do postavení, kde nemůžeme daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenacházíme,
- c) nezkrátíme daň nebo nevyhláskáme daňovou výhodu,
- d) úplata za plnění dle této faktury není odchýlná od obvyklé ceny,
- e) úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
- f) nebudeme nespolehlivým plátcem,
- g) budeme mít u správce daně registrovaný bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- h) souhlasíme s tím, že pokud bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o nás zveřejněna správcem daně skutečnost, že jsme nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně
- i) souhlasíme s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci našeho bankovního účtu určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.


V Brně dne 10.6.2024



----- Doručovací adresa: Mitrenga – stavby, spol. s r.o., Malešovice 144, 664 65 -----

Sídlo:
Křížíkova 1566/19
612 00 Brno

Tel. + Fax. : 
E – mail : 
WWW : www.mitrenga.net

IČ : 26944022
DIČ : CZ26944022
Bankovní spojení : 

Faktura/Daňový doklad - dílčí faktura

Dodavatel: Mitrenga-stavby, spol. s r.o. Křižíkova 1566/19 612 00 Brno, Královo Pole IČO: 26944022 DIČ: CZ26944022 Banka: POZOR ZMĚNA ÚČTU!!! Číslo účtu:  Spisová značka: Krajský obchodní soud v Brně oddíl C, vložka 47237. Konstantní symbol: 308 Forma úhrady: bankovním převodem HS - č. objednávky: SoD ze dne 14.2.2024 Akce/zakázka: Luhačovice -Polichno cyklostezka Středisko: 545 Zpracoval:  tel.: 	Faktura číslo: 2024056 Variabilní symbol: 2024056
	Odběratel: Město Luhačovice nám. 28.října 543 763 26 Luhačovice IČ: 00284165 DIČ: CZ00284165 Bankovní spojení:   Datum vystavení: 08.07.2024 Termín splatnosti: 07.08.2024 Dat. usk. zd. plnění: 30.06.2024

Fakturujeme Vám za provedené práce v měsíci červnu na základě Smlouvy o dílo ze dne 14.2.2024 a dodatku č. 1 ze dne 9.6.2024, název akce:
"Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic", částku:

Základ daně	4 423 492,60 Kč
DPH 21%	928 933,45 Kč
Celkem s DPH 21%	5 352 426,05 Kč

Celkem k úhradě: 5 352 426,05 Kč

Přílohy: Rekapitulace čerpání stavby
Soupis provedených prací

Jsme plátcí DPH



razítko a podpis

fakturu převzal

Tento doklad je hrazen v rámci projektu, registrační číslo: CZ.06.06.01/00/22_035/0002126, z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu".

REKAPITULACE ČERPÁNÍ STAVBY BEZ DPH (ŘSD)

STAVBA
Zhotovitel: Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

od: 6/2024


do: 6/2024

123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic

REKAPITULACE		Název Značka	Cena	Čerpáno do konce předchozího období	Čerpáno za období	Čerpáno celkem	Čerpáno po valorizaci bez DPH	K čerpání zbývá
11		SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu	18 361 897,39 Kč	7 032 611,90 Kč	4 393 892,60 Kč	11 426 504,50 Kč	11 426 504,50 Kč	6 935 392,89 Kč
12		Vedlejší a ostatní náklady - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu	105 000,00 Kč	60 000,00 Kč	9 000,00 Kč	69 000,00 Kč	69 000,00 Kč	36 000,00 Kč
21		SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu	719 447,43 Kč	25 610,00 Kč	0,00 Kč	25 610,00 Kč	25 610,00 Kč	693 837,43 Kč
25		Vedlejší a ostatní náklady - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - přímé výdaje na doprovodnou část projektu	60 000,00 Kč	21 000,00 Kč	9 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
31		Vedlejší a ostatní náklady - nepřímé náklady	149 000,00 Kč	23 400,00 Kč	11 600,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	114 000,00 Kč
Celkem			19 395 344,82 Kč	7 162 621,90 Kč	4 423 492,60 Kč	11 586 114,50 Kč	11 586 114,50 Kč	7 809 230,32 Kč

Za dodavatele:
ing. Václav Vintr

Za stavební dozor:



REKAPITULACE ČERPÁNÍ POLOŽEK

Stavba: 123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic
Objekt: 11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VYDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Období: 6/2024 - 6/2024

P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Celkem	Prostaveno za období	Celkem	Do konce sled. období	Celkem	Zbývá	Celkem
228	711112001		Provedení izolace proti zemi vlhkosti svislé za studeným sítím penetrací	M2	591,730	150,00		88 759,50	0,00	0,00	591,730	88 759,50	591,730	88 759,50	0,00	0,00
229	11163150		lak penetrací asfaltový	T	0,207	25 000,00		5 175,00	0,00	0,00	0,207	5 175,00	0,207	5 175,00	0,00	0,00
230	711122131		Provedení izolace proti zemi vlhkosti svislé za horkým natěrem asfaltovým	M2	591,730	120,00		71 007,60	0,00	0,00	591,730	71 007,60	591,730	71 007,60	0,00	0,00
231	11163178		lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trůb	T	1,006	25 000,00		25 150,00	0,00	0,00	1,006	25 150,00	1,006	25 150,00	0,00	0,00
232	711132101		Provedení izolace proti zemi vlhkosti pásy na suchu svislé AIP nebo staniou	M2	591,730	120,00		71 007,60	0,00	0,00	591,730	71 007,60	591,730	71 007,60	0,00	0,00
233	69311083		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2	M2	710,076	35,00		24 852,66	0,00	0,00	710,076	24 852,66	710,076	24 852,66	0,00	0,00
234	711142559		Provedení izolace proti zemi vlhkosti pásy přitvárním svislé NAP	M2	591,730	120,00		71 007,60	0,00	0,00	591,730	71 007,60	591,730	71 007,60	0,00	0,00
235	62832002		pás asfaltový natěrný oxidovaný tl. 4,2mm typu s vložkou ze skleněné rohože, hrubozrnným	M2	710,076	90,00		63 906,84	0,00	0,00	710,076	63 906,84	710,076	63 906,84	0,00	0,00
236	998711101		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	T	5,659	5,00		28,30	0,00	0,00	5,659	28,30	5,659	28,30	0,00	0,00
Celkem za SO 711 - izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								420 895,10		0,00		420 895,10				0,00

P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Celkem	Prostaveno za období	Celkem	Do konce sled. období	Celkem	Zbývá	Celkem
227	998223111		Přesun hmot pro požární komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	T	6 167,747	10,00		61 677,47	30 000,00	30 000,00	1 500,000	15 000,00	4 500,000	45 000,00	1 667,747	16 677,47
Celkem za SO 798 - Přesun hmot								61 677,47		30 000,00		15 000,00		45 000,00		16 677,47

P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Celkem	Prostaveno za období	Celkem	Do konce sled. období	Celkem	Zbývá	Celkem
217	997221551		Vodorovná doprava sudi ze sypkých materiálů do 1 km	T	155,555	5,00		777,78	0,00	0,00	18,060	90,30	18,060	90,30	137,495	687,48
218	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sudi ze sypkých materiálů	T	4 511,095	5,00		22 555,48	0,00	0,00	523,740	2 618,70	523,740	2 618,70	3 987,355	19 936,78
225	997013811		Poplatek za ložení na skládce (skládkové)	T	18,060	200,00		3 612,00	0,00	0,00	18,060	3 612,00	18,060	3 612,00	0,00	0,00
Celkem za SO 997 - Přesun sudi								26 945,26		0,00		6 321,00		6 321,00		20 624,26

P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Celkem	Prostaveno za období	Celkem	Do konce sled. období	Celkem	Zbývá	Celkem
163	911381813		Odtěraní alinického betonového svodidla dílky 2 m výšky 1,0 m	M	5,000	500,00		2 500,00	0,00	0,00	5,000	2 500,00	5,000	2 500,00	0,00	0,00
190	919111111		Rezaní dilatačních spár šl 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v derstvě CB krytu	M	408,000	120,00		48 960,00	0,00	0,00	381,000	45 720,00	381,000	45 720,00	27,000	3 240,00
191	919111211		Rezaní spár pro vytvoření kmitův šl 10 mm hl 15 mm pro těsnici zákluku v CB krytu	M	408,000	90,00		36 720,00	0,00	0,00	381,000	34 290,00	381,000	34 290,00	27,000	2 430,00
192	919123111		Těsnění spár provítracím těsnicím profilem	M	408,000	120,00		48 960,00	0,00	0,00	381,000	45 720,00	381,000	45 720,00	27,000	3 240,00
193	919124121		Dílační spárky skládavé v cementobetonovém krytu a vyplnění spár adalatorou zákluku	M	408,000	90,00		36 720,00	0,00	0,00	381,000	34 290,00	381,000	34 290,00	27,000	2 430,00
194	91913111F		Vyzružen dilatačních spár kusovými třídy 0 16 mm dl 500 mm v CB krytu, povlak PVC	KUS	816,000	160,00		130 560,00	0,00	0,00	762,000	121 920,00	762,000	121 920,00	54,000	8 640,00
205	592001-R1		polymerbetonový odvodňovací žlab šl 0,2 m s krycím litinovým roštem D400	M	8,500	1 500,00		12 750,00	0,00	0,00	8,500	12 750,00	8,500	12 750,00	0,00	0,00
215	966072811		Rozbrání ramenního oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	M	1,500	150,00		225,00	0,00	0,00	1,500	225,00	1,500	225,00	0,00	0,00
Celkem za SO 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání								317 395,00		0,00		297 415,00		297 415,00		19 980,00

P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Celkem	Prostaveno za období	Celkem	Do konce sled. období	Celkem	Zbývá	Celkem
134	894001-R1		Betonová šachta DN 1000 z prefabrik. poklop DN 600 B125, podkladní konstrukce - kompletní	KUS	1,000	22 000,00		22 000,00	0,00	0,00	1,000	22 000,00	1,000	22 000,00	0,00	0,00
145	894812321		Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno příločné	KUS	2,000	2 500,00		5 000,00	0,00	0,00	2,000	5 000,00	2,000	5 000,00	0,00	0,00

146	894812323	KUS	4,000	2 500,00	10 000,00	0,000	0,00	4,000	10 000,00	0,000	0,00	0,00
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250												
šachtové dno s přílohem tvaru T												
147	894812325	KUS	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000	0,00	1,000	2 500,00	0,000	0,00	0,00
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315												
šachtové dno průtočné												
148	894812327	KUS	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000	0,00	1,000	2 500,00	0,000	0,00	0,00
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315												
šachtové dno s přílohem tvaru T												
149	894812331	KUS	4,000	2 500,00	10 000,00	0,000	0,00	4,000	10 000,00	0,000	0,00	0,00
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová												
roura korupovaná světlé hloubky 1000 mm												
150	894812332	KUS	4,000	2 500,00	10 000,00	0,000	0,00	4,000	10 000,00	0,000	0,00	0,00
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová												
roura korupovaná světlé hloubky 2000 mm												
152	894812376	KUS	8,000	5 000,00	40 000,00	0,000	0,00	8,000	40 000,00	0,000	0,00	0,00
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 pulkavé litinový												
pro třídu zatížení D400 s betonovým přístěnkem												
Celkem za SD 8 - Truhlí vešleň												

P.č.	Značka	Var.	Název	Množství	JOC	Prostaveno do konce před. období	Celkem	Prostaveno za období	Celkem	Do konce sled. období	Zbývá	Celkem
110	581131312		Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III s	1 608,000	1 190,00	0,000	0,00	1 503,000	1 788 570,00	1 503,000	105,000	124 950,00
Celkem za SD 5 - Komunikace pozemní												

P.č.	Značka	Var.	Název	Množství	JOC	Prostaveno do konce před. období	Celkem	Prostaveno za období	Celkem	Do konce sled. období	Zbývá	Celkem
77	327323128		Opěrné zdi a vazy ze žb II. C 30/37	73,400	7 500,00	0,000	0,00	73,400	550 500,00	73,400	0,000	0,00
78	327351211		Bednění opěrných zdí a valů svahů i sklonových	729,230	250,00	89,200	22 300,00	640,030	160 007,50	729,230	0,000	0,00
79	327351221		Bednění opěrných zdí a valů svahů i sklonových	729,230	150,00	89,200	13 380,00	640,030	96 004,50	729,230	0,000	0,00
Celkem za SD 3 - Svislé a kompletní konstrukce												

P.č.	Značka	Var.	Název	Množství	JOC	Prostaveno do konce před. období	Celkem	Prostaveno za období	Celkem	Do konce sled. období	Zbývá	Celkem
11	115101201		Čerpací rody na dopravní výšku do 10 m průměrný	1 440,000	50,00	480,000	24 000,00	240,000	12 000,00	720,000	720,000	36 000,00
12	115101301		Pohotovost čerpad soupravy pro dopravní výšku	180,000	500,00	60,000	30 000,00	30,000	15 000,00	90,000	90,000	45 000,00
20	131251102		Houbení jam nezapažených v hornině třídy	36,470	350,00	0,000	0,00	8,950	3 132,50	8,950	29 520	10 332,00
21	132251103		Houbení jam nezapažených s do 800 mm v hornině	52,800	350,00	0,000	0,00	1,500	525,00	1,500	51,300	17 555,00
34	174151101		Zásyp jam, šacht a výrubů kolem objektů	482,029	200,00	167,000	33 400,00	137,000	27 400,00	304,000	178,029	35 605,80
36	175151101		Obypnou se zhutněním	27,050	200,00	0,000	0,00	10,200	2 040,00	10,200	16,850	3 370,00
37	58337331	T	Obypnou se zhutněním	55,915	200,00	0,000	0,00	20,910	4 182,00	20,910	33,005	6 601,00
Celkem za SD 1 - Zemní práce												

P.č.	Značka	Var.	Název	Množství	JOC	Prostaveno do konce před. období	Celkem	Prostaveno za období	Celkem	Do konce sled. období	Zbývá	Celkem
1001	562122111		profilací ze směsí stříelné cementem SC 8/10 (	2 140,000	364,00	778 660,00	0,00	2 100,000	764 400,00	2 100,000	40,000	14 560,00
Celkem za SD ZL1-1-V - Doplňková smáček km 0,525 - 1,060												

P.č.	Značka	Var.	Název	Množství	JOC	Prostaveno do konce před. období	Celkem	Prostaveno za období	Celkem	Do konce sled. období	Zbývá	Celkem
1003	NP1003		MEO SVS 3000 polymerního žlab šířky 300 mm a	7,500	13 400,00	100 500,00	0,00	7,500	100 500,00	7,500	100 500,00	0,00
Celkem za SD ZL1-3-V - Příčný odvodňovací žlab šířky 300 mm v km 0,350												

P.č.	Značka	Var.	Název	Množství	JOC	Prostaveno do konce před. období	Celkem	Prostaveno za období	Celkem	Do konce sled. období	Zbývá	Celkem
1004	NP1004		betonový atypického dna šachty	40,000	700,00	28 000,00	0,00	40,000	28 000,00	40,000	0,000	0,00
Celkem za SD ZL1-4-V - Atypická kanalizační šachta v km 0,492 troubou DN 500 přes základ zdi												

Celkem Smlouva + ZBV										4 393 892,60	4 546 972,60	351 655,53
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------------

Za objednatele
Město Luhačovice
p. Jan Vaculík
TDr

Za zhotovitele
Mihreng-stavby, spol. s r.o.
Ing. Václav Votr
stavební

Další podpis



REKAPITULACE ČERPÁNÍ POLOŽEK

Stavba: 123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic
Objekt: 12 - Vedlejší a ostatní náklady - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Období: 6/2024 - 6/2024

P.č.	Značka	Vár.	Název	Rozpočet		MJ	Množství	Prostaveno do konce před. období		Prostaveno za období		Do konce sled. období		Zbývá	
				JOC	Celkem			Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1	012203000		Geodetické práce při provádění stavby	90 000,00	90 000,00	KČ	1,000	0,500	45 000,00	0,100	9 000,00	0,500	54 000,00	0,400	36 000,00
Celkem za SD VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce					90 000,00				45 000,00		9 000,00		54 000,00		36 000,00
Celkem Smlouva + ZBV					90 000,00				45 000,00		9 000,00		54 000,00		36 000,00

Za objednatele
Město Luhačovice
p. Jan Vaculík
TDI

Za zhotovitele
Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
Ing. Václav Vintř
stavbyvedoucí

Další podpis

REKAPITULACE ČERPÁNÍ POLOŽEK

Stavba: 123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic
Objekt: 21 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Období: 6/2024 - 6/2024

Celkem Smlouva + ZBV

Za objednatele:
Město Luhačovice
p. Jan Vaculík
TDI



Za zhotovitele:
Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
Ing. Václav Vrtík
stavbyvedoucí



0,00

0,00

0,00

0,00

Další podpis

REKAPITULACE ČERPÁNÍ POLOŽEK

Stavba: 123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic
Objekt: 25 - Vedlejší a ostatní náklady - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Období: 6/2024 - 6/2024

P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	Rozpočet	Prostaveno do konce před. období		Prostaveno za období		Do konce sled. období		Zbývá	
1	R-001		Přechodné a provizorní dopravní zařízení	Kč	1,000	JOC 60 000,00	Celkem 60 000,00	Množství 0,350	Celkem 21 000,00	Množství 0,150	Celkem 9 000,00	Množství 0,500	Celkem 30 000,00	Celkem 30 000,00
Celkem za SD VRN9 - Ostatní náklady							60 000,00		21 000,00		9 000,00		30 000,00	30 000,00
Celkem Smlouva + ZBV							60 000,00		21 000,00		9 000,00		30 000,00	30 000,00

Za objednatele
Město Luhačovice
Ing. Jan Vaculík
TČN

Za zhotovitele
Mitranga-stavby spol. s r.o.
Ing. Václav Vít
stavební inženýr



Další podpis

REKAPITULACE ČERPÁNÍ POLOŽEK

Stavba: 123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic
Objekt: 31 - Vedlejší a ostatní náklady - nepřímé náklady
Období: 6/2024 - 6/2024

P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	Rozpočet	Prostaveno do konce před. období		Prostaveno za období		Do konce sled. období		Zbývá	
							Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
7	043002000		Zkoušky a ostatní měření	KČ	1,000	JOC	0,200	25 000,00	0,200	5 000,00	0,400	10 000,00	0,600	15 000,00
8	045002000		Kompletační a koordináční činnost	KČ	1,000	JOC	0,000	10 000,00	0,300	3 000,00	0,300	3 000,00	0,700	7 000,00
Celkem za SD VRM4 - Inženýrská činnost								35 000,00		8 000,00		13 000,00		22 000,00
4	030001000		Zařízení staveniště	MJ	1,000	JOC	0,350	24 000,00	0,150	3 600,00	0,500	12 000,00	0,500	12 000,00
Celkem za SD VRM3 - Zařízení staveniště								24 000,00		3 600,00		12 000,00		12 000,00
Celkem Smlouva + ZBV								59 000,00		11 600,00		25 000,00		34 000,00

Za objednatele
Město Luhačovice
p. Jan Vaculík
TD)



Za zhotovitele
Mitrenga-stavby spol. s r. o.
Ing. Václav Votr
stavbyvedoucí

Další podpis

PROHLÁŠENÍ K FAKTUŘE Č. 2024056

- a) nemáme v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“)
- b) nejsou nám známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostaneme do postavení, kde nemůžeme daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenacházíme,
- c) nezkrátíme daň nebo nevyhlášíme daňovou výhodu,
- d) úplata za plnění dle této faktury není odchýlná od obvyklé ceny,
- e) úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
- f) nebudeme nespolehlivým plátcem,
- g) budeme mít u správce daně registrovaný bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- h) souhlasíme s tím, že pokud bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o nás zveřejněna správcem daně skutečnost, že jsme nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně
- i) souhlasíme s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci našeho bankovního účtu určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

V Brně dne 8.7.2024



----- Doručovací adresa: Mitrenga – stavby, spol. s r.o., Malešovice 144, 664 65 -----

Sídlo:
Křížíkova 1566/19
612 00 Brno

Tel. + Fax. :
E – mail :
WWW : www.mitrenga.net

IČ : 26944022
DIČ : CZ26944022
Bankovní spojení :



Faktura/Daňový doklad - dílčí faktura

Dodavatel: Mitrenga-stavby, spol. s r.o. Křižíkova 1566/19 612 00 Brno, Královo Pole IČO: 26944022 DIČ: CZ26944022 Banka: POZOR ZMĚNA ÚČTU!!! Číslo účtu:  Spisová značka: Krajský obchodní soud v Brně oddíl C, vložka 47237. Konstantní symbol: 308 Forma úhrady: bankovním převodem HS - č. objednávky: SoD ze dne 14.2.2024 Akce/zakázka: Luhačovice -Polichno cyklostezka Středisko: 545 Zpracoval:  tel.: 	Faktura číslo: 2024070 Variabilní symbol: 2024070
	Odběratel: Město Luhačovice nám. 28.října 543 763 26 Luhačovice IČ: 00284165 DIČ: CZ00284165 Bankovní spojení: 1   Datum vystavení: 06.08.2024 Termín splatnosti: 05.09.2024 Dat. usk. zd. plnění: 31.07.2024

Fakturujeme Vám za provedené práce v měsíci červenci na základě Smlouvy o dílo ze dne 14.2.2024 a dodatku č. 1 ze dne 9.6.2024, název akce:
"Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic", částku:

Základ daně	1 203 880,34 Kč
DPH 21%	252 814,87 Kč
Celkem s DPH 21%	1 456 695,21 Kč

Celkem k úhradě: 1 456 695,21 Kč

Přílohy: Rekapitulace čerpání stavby
Soupis provedených prací
Prohlášení DPH

Jsme plátcí DPH


razítko a podpis

fakturu převzal

Tento doklad je hrazen v rámci projektu, registrační číslo: CZ.06.06.01/00/22_035/0002126, z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu".

PROJICCONOM
REKAPITULACE ČERPÁNÍ STAVBY BEZ DPH (ŘSD)

Zhotovitel:
STAVBA

Mitrena-stavby, spol. s r.o.

od: 7/2024

do: 7/2024

123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic

REKAPITULACE

Značka		Název	Cena	Čerpáno do konce předchozího období	Čerpáno za období	Čerpáno celkem	Čerpáno po valorizaci bez DPH	K čerpání zbývá
11		SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu	18 361 897,39 Kč	11 425 504,50 Kč	1 117 068,74 Kč	12 543 573,24 Kč	12 543 573,24 Kč	5 818 324,15 Kč
12		Vedlejší a ostatní náklady - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu	105 000,00 Kč	69 000,00 Kč	9 000,00 Kč	78 000,00 Kč	78 000,00 Kč	27 000,00 Kč
21		SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu	719 447,43 Kč	25 610,00 Kč	64 071,60 Kč	89 681,60 Kč	89 681,60 Kč	629 765,83 Kč
25		Vedlejší a ostatní náklady - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu	60 000,00 Kč	30 000,00 Kč	6 600,00 Kč	36 600,00 Kč	36 600,00 Kč	23 400,00 Kč
31		Vedlejší a ostatní náklady - nepřímé náklady	149 000,00 Kč	35 000,00 Kč	7 140,00 Kč	42 140,00 Kč	42 140,00 Kč	106 860,00 Kč
Celkem			19 395 344,82 Kč	11 586 114,50 Kč	1 203 880,34 Kč	12 789 994,84 Kč	12 789 994,84 Kč	6 605 349,98 Kč

Za objednatele
p. Jan Vaculík
TDI

Za zhotovitele
ing. Václav Vintr
stavbyvedoucí

Další podpis



REKAPITULACE ČERPÁNÍ POLOŽEK

Stavba: 123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic
Objekt: 11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Období: 7/2024 - 7/2024

P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Celkem	Prostaveno za období	Celkem	Do konce sled. období	Celkem	Zbývá	Celkem
227	99822511		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	T	6 167,747	10,00		61 677,47	4 500,000	45 000,00	500,000	5 000,000	5 000,000	50 000,00	1 167,747	11 677,47
Celkem za SO 998 - Přesun hmot																
P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Celkem	Prostaveno za období	Celkem	Do konce sled. období	Celkem	Zbývá	Celkem
217	99722155		Vodorovná doprava sutí ze vytyčených materiálů do 1 km	T	155,555	5,00		777,78	18,060	90,30	55,720	278,60	73,780	368,90	81,775	408,88
218	99722155		Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze vytyčených materiálů	T	4 511,095	5,00		22 555,48	523,740	2 618,70	1 615,880	8 079,40	2 139,620	10 698,10	2 371,475	11 857,38
Celkem za SO 997 - Přesun sutě																
P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Celkem	Prostaveno za období	Celkem	Do konce sled. období	Celkem	Zbývá	Celkem
178	91613121		stojatého s boční opěrou do kůže z betonu prostého	M	381,000	300,00		114 300,00	0,000	0,00	25,000	7 500,00	25,000	7 500,00	356,000	106 800,00
179	59217031		obrubník betonový sliční 1000x150x250mm	M	322,190	150,00		48 328,50	0,000	0,00	322,190	48 328,50	322,190	48 328,50	0,000	0,00
180	59217029		obrubník betonový sliční 1000x150x150mm	M	50,500	150,00		7 575,00	0,000	0,00	50,500	7 575,00	50,500	7 575,00	0,000	0,00
181	59217030		obrubník betonový sliční přechodový 1000x150x150x250mm	M	12,120	150,00		1 818,00	0,000	0,00	12,120	1 818,00	12,120	1 818,00	0,000	0,00
183	59218001		krajník betonový sliční 500x250x80mm	M	62,620	120,00		7 514,40	0,000	0,00	62,620	7 514,40	62,620	7 514,40	0,000	0,00
184	91623121		stojatého s boční opěrou do kůže z betonu prostého	M	273,000	300,00		81 900,00	0,000	0,00	60,000	18 000,00	60,000	18 000,00	213,000	63 900,00
185	59217019		obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	M	273,205	120,00		32 784,60	0,000	0,00	273,205	32 784,60	273,205	32 784,60	0,000	0,00
186	59245017		dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm přírodní	M2	0,253	300,00		75,90	0,000	0,00	0,253	75,90	0,253	75,90	0,000	0,00
187	91699112		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	19,150	1 900,00		36 385,50	0,000	0,00	3,040	5 700,00	3,040	5 700,00	16,110	30 685,50
196	91955111		Zřízení propustky z trub plastových PE ryhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm	M	2,000	250,00		500,00	0,000	0,00	2,000	500,00	2,000	500,00	0,000	0,00
198	91955111		Zřízení propustky z trub plastových PE ryhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm	M	2,000	250,00		500,00	0,000	0,00	2,000	500,00	2,000	500,00	0,000	0,00
200	91955111		Zřízení propustky z trub plastových PE ryhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	M	7,500	750,00		5 700,00	0,000	0,00	7,500	5 700,00	7,500	5 700,00	0,000	0,00
Celkem za SO 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																
P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Celkem	Prostaveno za období	Celkem	Do konce sled. období	Celkem	Zbývá	Celkem
123	87131522		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	M	54,000	1 900,00		10 260,00	0,000	0,00	9,000	1 710,00	9,000	1 710,00	45,000	8 550,00
135	89430215		Síťový lachet tlad 200 mm ze 78 se zvýšenými nároky na prostředí tl. C 20/27	M3	2,978	7 500,00		21 960,00	0,000	0,00	2,978	21 960,00	2,978	21 960,00	0,000	6,00
136	89430215		Připlatek za tloušťku stěn lachet ze 78 do 200	M3	2,978	5,00		14,64	0,000	0,00	2,978	14,64	2,978	14,64	0,000	6,00
137	89441241		Oslazen betonových nebo železobetonových dílců pro lachty skruží přechodových	KUS	1,000	750,00		750,00	0,000	0,00	1,000	750,00	1,000	750,00	0,000	6,00
153	895531 F2		Horska prelabikovaná vpusť obdelnikoveho tvaru o vnjsich rozmerech 1500 x 900 mm, v. 1150 mm, tl. stěn 150 mm - kompletní provedení, dodávka a montáž	KUS	2,000	29 800,00		59 600,00	0,000	0,00	2,000	60 000,00	2,000	60 000,00	0,000	6,00
154	89554111 R		Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců, včetně podkladních konstrukcí	KUS	5,000	3 000,00		15 000,00	0,000	0,00	1,000	3 000,00	1,000	3 000,00	4,000	15 000,00
Celkem za SO 8 - Trubní vedení																
P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Celkem	Prostaveno za období	Celkem	Do konce sled. období	Celkem	Zbývá	Celkem
116	59145243		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm barevná	M2	135,480	100,00		17 316,00	0,000	6,00	138,480	27 129,00	1,35480	27 316,00	0,000	0,00

117	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé	M2	6,695	250,00	1 673,75	0,00	0,00	6,695	1 673,75	0,00	0,00
119	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé	M2	8,755	260,00	2 276,30	0,00	0,00	8,755	2 276,30	0,00	0,00
Celkem za SD 5 - Komunikace pozemní												
P.č.	Značka	Var.	Název	Množství	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období			Prostaveno za období		
69	317321011		Rámsy opěrných zdí a valů ze 28 lit. C 30/37	16,500	7 500,00	123 750,00	0,00	0,00	16,500	123 750,00	0,00	0,00
70	317353111		Bednění línis opěrných zdí a valů plyných,	79,500	250,00	19 875,00	0,00	0,00	79,500	19 875,00	0,00	0,00
71	317353111		zakomponovaných nebo zakřivených žlitení	79,500	150,00	11 925,00	0,00	0,00	79,500	11 925,00	0,00	0,00
88	5922841R		Bednění línis opěrných zdí a valů plyných,	1 220,417	250,00	305 104,25	0,00	0,00	1 220,417	305 104,25	0,00	0,00
Celkem za SD 3 - Svislé a kompletní konstrukce												
P.č.	Značka	Var.	Název	Množství	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období			Prostaveno za období		
50	211561111		Výpín odvodňovací žebry nebo tratičů	72,125	600,00	43 275,00	0,00	0,00	72,125	43 275,00	0,00	0,00
51	21197112		kamenem trubným drceným frakce 4 až 16 mm	35,00	35,00	69 790,00	1 138,000	80,000	2 800,00	42 665,00	775,000	27 125,00
53	21257211		železo nebo zářezu sklonu přes 1,25 do 2,5 m	28,538	400,00	11 415,20	10,965	4 386,00	5,000	2 000,00	6 386,00	5 029,20
56	2127552R		Lože pro tratičový ze šléřoplošku tříděného	225,000	200,00	45 000,00	0,00	0,00	20,000	4 000,00	205,000	41 000,00
57	2127552R		flexibilních DN 250 mm bez řezů	213,000	240,00	51 120,00	0,00	0,00	153,000	36 720,00	60,000	14 400,00
Celkem za SD 2 - Zakládání												
P.č.	Značka	Var.	Název	Množství	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období			Prostaveno za období		
15	12115112		Sednutí omíčky plochy přes 500 m ² II vrstvy do 200	1 837,000	60,00	110 220,00	1 590,000	9 540,00	90,000	5 400,00	249,000	14 940,00
17	12225220R		mm stropné	2 877,000	180,00	517 860,00	2 345,000	431 100,00	39,000	5 400,00	436 500,00	81 360,00
21	13225110		Odškopky a prokopky nezapočetné pro silnice a	52,800	350,00	18 480,00	1,500	525,00	2,000	700,00	1 225,00	49,300
22	13325110		dalnice v horní třídě těžnosti I objem do 5000	24,380	350,00	8 533,00	0,000	0,00	12,000	4 200,00	12,380	4 333,00
23	16245110R		horní třídy těžnosti I skupiny 3 objem do 100	2 128,858	60,00	139 731,48	1 954,000	57 240,00	300,000	18 000,00	1 254,000	64 491,48
28	16715111		m3 stropné	1 599,529	150,00	239 944,35	0,000	0,00	473,000	70 950,00	473,000	70 950,00
29	17115110		Uložení spalin z hornin soudržných do náspů	1 088,000	200,00	217 600,00	336,000	67 200,00	480,000	96 000,00	816,000	163 200,00
30	5898114R		rozklad stropné	2 393,600	150,00	359 040,00	1 751,200	242 580,00	41,000	5 600,00	1 795,200	259 280,00
34	17415110		rozklad stropné frakce 0/90	462,029	200,00	96 405,80	304,000	60 800,00	10,000	2 000,00	314,000	62 800,00
35	58344121		spalinou se zhutněním	8,610	300,00	2 583,00	0,000	0,00	8,610	2 583,00	0,000	0,00
36	17515110		Obtápění potrubí stropné spalinou bez prohození,	27,050	200,00	5 410,00	10,200	2 040,00	5,000	1 000,00	15,200	3 040,00
37	58337331		ložnou do 3 m	53,915	200,00	10 783,00	20,910	4 182,00	10,000	2 000,00	30,910	6 182,00
38	58345920		stěroplošek frakce 0/22	1,538	300,00	461,40	0,000	0,00	1,538	461,40	0,000	0,00
39	18115230		Uprava plátní pro silnice a dalnice v zářezích se	4 546,000	250,00	1 136 500,00	2 511,000	62 775,00	496,000	12 450,00	3 005,000	75 025,00
40	18135111		zhutněním	2 514,000	60,00	150 840,00	0,000	0,00	1 206,000	72 000,00	1 308,000	78 840,00
Celkem za SD 1 - Zemní práce												
Celkem Smlouva + ZBV												
						3 127 499,30	1 150 142,90			1 117 065,74		
										2 167 110,74		



tabulka bodů

REKAPITULACE ČERPÁNÍ POLOŽEK

Stavba: 123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic
Objekt: 12 - Vedlejší a ostatní náklady - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Období: 7/2024 - 7/2024

P.č.	Značka	Vst	Název	MJ	Rozpočet		Prostaveno do konce před. období		Prostaveno za období		Do konce sled. období		Zbývá	
					Množství	JOC	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství
1	01220300		Geodetické práce při provádění staveb	Kč	1,000	90 000,00	90 000,00	0,000	54 000,00	0,100	9 000,00	0,700	63 000,00	0,300
Celkem za SO VRM1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							90 000,00		54 000,00		9 000,00		63 000,00	
Celkem Smlouva + ZBV							90 000,00		54 000,00		9 000,00		63 000,00	
													27 000,00	

Za objednatele
Město Luhačovice
p. Jan Vaculík
TDI

Za zhotovitele
Mirenga-stavby, spol. s
r.o. Václav Votr
stavbyvedoucí

Další podpis

REKAPITULACE ČERPÁNÍ POLOŽEK

Stavba: 123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic
Objekt: 21 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPUSOBILÉ VYDAJE - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Období: 7/2024 - 7/2024

P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Rozpočet		Prostaveno do konce před. období		Prostaveno za období		Do konce sled. období		Zbývá	
					Množství	JOC	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství
33	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypaných materiálů do 1 km	T	83,376	5,00	416,88	0,000	0,00	83,376	416,88	83,376	416,88	0,000
34	997221555		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypaných materiálů	T	2 417,904	5,00	12 089,52	0,000	0,00	2 417,904	12 089,52	2 417,904	12 089,52	0,000
35	997221872		Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamenní zařízení do katalogu odpadů pod kódem 17 05	T	4,060	200,00	812,00	0,000	0,00	4,060	812,00	4,060	812,00	0,000
36	997221872		Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	79,316	200,00	15 863,20	0,000	0,00	79,316	15 863,20	79,316	15 863,20	0,000
Celkem za SO 997 - Přesun sítě							29 181,60		0,00		29 181,60		0,00	
P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Rozpočet		Prostaveno do konce před. období		Prostaveno za období		Do konce sled. období		Zbývá	
					Množství	JOC	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství
32	592001-R1		polymerní betonový odvodňovací žlab š. 0,2 m s krycím litinovým roštem D400	M	13,700	1 500,00	20 550,00	0,000	0,00	13,700	20 550,00	13,700	20 550,00	0,000
Celkem za SO 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							20 550,00		0,00		20 550,00		0,00	
P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Rozpočet		Prostaveno do konce před. období		Prostaveno za období		Do konce sled. období		Zbývá	
					Množství	JOC	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství
1	113107243		Odstranění podkladu žvýčného tl. přes 100 do 150 mm stropné pl. přes 200 m2	M2	25,100	150,00	37 650,00	0,000	0,00	25,100	37 650,00	25,100	37 650,00	0,000
2	113107322		Odstranění podkladu z kamenné dlažby tl. přes 100 do 200 mm stropné pl. do 50 m2	M2	14,000	60,00	840,00	0,000	0,00	14,000	840,00	14,000	840,00	0,000
Celkem za SO 1 - Zemní práce							38 490,00		0,00		38 490,00		0,00	
Celkem Smlouva + ZBV							88 221,60		0,00		88 221,60		0,00	
							24 150,00		0,00		24 150,00		0,00	

Za objednatel:
Město Luhačovice
p. Jan Vaculík
TDI

Za zhotovitele:
Mitrngg-stvoj, spol.
ing. Václav Vít
stavbyvedoucí

Další podpis

REKAPITULACE ČERPÁNÍ POLOŽEK

Stavba: 123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic
Objekt: 25 - Vedlejší a ostatní náklady - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Období: 7/2024 - 7/2024

P.č.	Značka	Var	Název	MJ	Rozpočet		Prostaveno do konce před. období		Prostaveno za období		Do konce sled. období		Zbývá	
					Množství	JOC	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1	R-001		Přechodná a provizorní dopravní zařízení	KC	1,000	60 000,00		60 000,00	0,110	6 600,00	0,610	36 600,00	0,280	23 400,00
Celkem za SO VRH9 - Ostatní náklady								60 000,00		6 600,00		36 600,00		23 400,00
Celkem Smlouva + ZBV								60 000,00		6 600,00		36 600,00		23 400,00

Za objednatele
Město Luhačovice
p. Jan Václavík
TDI

Za zhotovitele
Mitrenga stavby, spol.
s r.o.
Ing. Václav Votr
stavbyvedoucí



Další podpis

REKAPITULACE ČERPÁNÍ POLOŽEK

Stavba: 123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic
Objekt: 31 - Vedlejší a ostatní náklady - nepřímé náklady
Období: 7/2024 - 7/2024

P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Rozpočet		Prostaveno do konce před. období		Prostaveno za období		Do konce sled. období		Zbývá	
					Množství	JDC	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	
7	04300200K		Zkoušky a ostatní měření	KC	1,000	25 000,00		0,400	10 000,00	0,100	2 500,00		0,500	12 500,00
8	04500200K		Kompletační a koordináční činnost	KC	1,000	10 000,00		0,300	3 000,00	0,200	2 000,00		0,500	5 000,00
Celkem za SD VRN4 - inženýrská činnost							35 000,00		13 000,00		4 500,00			17 500,00

PROHLÁŠENÍ K FAKTUŘE Č. 2024070

- a) nemáme v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“)
- b) nejsou nám známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostaneme do postavení, kde nemůžeme daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenacházíme,
- c) nezkrátíme daň nebo nevyhlášíme daňovou výhodu,
- d) úplata za plnění dle této faktury není odchýlná od obvyklé ceny,
- e) úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
- f) nebudeme nespolehlivým plátcem,
- g) budeme mít u správce daně registrovaný bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- h) souhlasíme s tím, že pokud bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o nás zveřejněna správcem daně skutečnost, že jsme nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně
- i) souhlasíme s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci našeho bankovního účtu určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

V Brně dne 6.8.2024









----- Doručovací adresa: Mitrenga – stavby, spol. s r.o., Malešovice 144, 664 65 -----

Sídlo:
Křížíkova 1566/19
612 00 Brno

Tel. + Fax. : 
E – mail : 
WWW : www.mitrenga.net

IČ : 26944022
DIČ : CZ26944022
Bankovní spojení : 

Faktura/Daňový doklad - konečná faktura																							
Dodavatel: Mitrenga-stavby, spol. s r.o. Křižíkova 1566/19 612 00 Brno, Královo Pole IČO: 26944022 DIČ: CZ26944022 Banka: POZOR ZMĚNA ÚČTU!!! Číslo účtu:  Spisová značka: Krajský obchodní soud v Brně oddíl C, vložka 47237. Konstantní symbol: 308 Forma úhrady: bankovním převodem HS - č. objednávky: SoD ze dne 14.2.2024 Akce/zakázka: Luhačovice -Polichno cyklostezka Středisko: 545 Zpracoval:  tel.: 	Faktura číslo: 2024082 Variabilní symbol: 2024082 Odběratel: Město Luhačovice nám. 28.října 543 763 26 Luhačovice IČ: 00284165 DIČ: CZ00284165 Bankovní spojení:   Datum vystavení: 11.09.2024 Termín splatnosti: 11.10.2024 Dat. usk. zd. plnění: 05.09.2024																						
Fakturujeme Vám za provedené práce na základě Smlouvy o dílo ze dne 14.2.2024 a dodatku č. 1 ze dne 9.6.2024, dodatku č. 2 ze dne 4.9.2024 a dodatku č. 3 ze dne 5.9.2024 název akce: "Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic", částku: <table><tbody><tr><td>Základ daně</td><td>3 992 703,47 Kč</td></tr><tr><td>DPH 21%</td><td>838 467,73 Kč</td></tr><tr><td>Celkem s DPH 21%</td><td>4 831 171,20 Kč</td></tr></tbody></table> <table><tbody><tr><td>Celkem k úhradě:</td><td>4 831 171,20 Kč</td></tr></tbody></table> <table><tbody><tr><td>Přílohy:</td><td>Rekapitulace čerpání stavby</td><td rowspan="4">Jsme plátcí DPH</td></tr><tr><td></td><td>Soupis provedených prací</td></tr><tr><td></td><td>Protokol o předání díla</td></tr><tr><td></td><td>Prohlášení DPH</td></tr></tbody></table> <table><tbody><tr><td></td><td>razítko a podpis</td><td></td><td>fakturu převzal</td></tr></tbody></table> Tento doklad je hrazen v rámci projektu, registrační číslo: CZ.06.06.01/00/22_035/0002126, z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu".			Základ daně	3 992 703,47 Kč	DPH 21%	838 467,73 Kč	Celkem s DPH 21%	4 831 171,20 Kč	Celkem k úhradě:	4 831 171,20 Kč	Přílohy:	Rekapitulace čerpání stavby	Jsme plátcí DPH		Soupis provedených prací		Protokol o předání díla		Prohlášení DPH		razítko a podpis		fakturu převzal
Základ daně	3 992 703,47 Kč																						
DPH 21%	838 467,73 Kč																						
Celkem s DPH 21%	4 831 171,20 Kč																						
Celkem k úhradě:	4 831 171,20 Kč																						
Přílohy:	Rekapitulace čerpání stavby	Jsme plátcí DPH																					
	Soupis provedených prací																						
	Protokol o předání díla																						
	Prohlášení DPH																						
	razítko a podpis		fakturu převzal																				

PROLICONOM
REKAPITULACE ČERPÁNÍ STAVBY BEZ DPH (ŘSD)

STAVBA
Zhotovitel: Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic


od: 8/2024 do: 9/2024

REKAPITULACE		Značka					
	Název	Cena	Čerpáno do konce předchozího období	Čerpáno za období	Čerpáno celkem	Čerpáno po valorizaci bez DPH	K čerpání zbývá
11	SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu	19 506 408,67 Kč	12 543 573,24 Kč	3 617 320,75 Kč	16 160 893,99 Kč	16 160 893,99 Kč	3 345 514,68 Kč
12	Vedlejší a ostatní náklady - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu	105 000,00 Kč	78 000,00 Kč	13 350,00 Kč	91 350,00 Kč	91 350,00 Kč	13 650,00 Kč
21	SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu	687 317,27 Kč	89 681,60 Kč	270 692,72 Kč	360 374,32 Kč	360 374,32 Kč	326 942,95 Kč
25	Vedlejší a ostatní náklady - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu	60 000,00 Kč	36 600,00 Kč	15 600,00 Kč	52 200,00 Kč	52 200,00 Kč	7 800,00 Kč
31	Vedlejší a ostatní náklady - nepřímé náklady	149 000,00 Kč	42 140,00 Kč	75 740,00 Kč	117 880,00 Kč	117 880,00 Kč	31 120,00 Kč
	Celkem	20 507 725,94 Kč	12 789 994,84 Kč	3 992 703,47 Kč	16 782 698,31 Kč	16 782 698,31 Kč	3 725 027,63 Kč
		Za objednatele p. Jan Vaculík TDI	Za zhotovitele ing. Václav Vintř stavbyvedoucí		Další podpis		

Za objednatele
p. Jan Vaculík
TDI

Za zhotovitele
ing. Václav Vintr
stavbyvedoucí

Další podpis

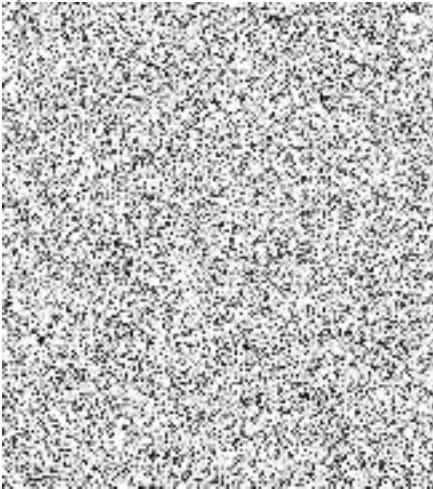

REKAPITULACE ČERPÁNÍ POLOZEK

Stavba: 123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic
Objekt: 11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Období: 8/2024 - 9/2024

P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	Rozpčet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Prostaveno za období	Do konce sled. období	Zbývá	Celkem
227	998225111		Přesun hmoty pro pozemní komunikace s korytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	T	6 255,57500	10,00		62 553,75	5 000,00000	-109,12300	4 890,87700	1 364,69800	13 644,98
Celkem za SO 998 - Přesun hmot								62 553,75	5 000,00000	-109,12300	4 890,87700	1 364,69800	13 644,98
P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	Rozpčet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Prostaveno za období	Do konce sled. období	Zbývá	Celkem
217	997221551		Vodovodná doprava suší ze sypaných materiálů do 1 km	T	155,55500		5,00	777,78	73,78000	-15,78800	57,99200	97,56100	487,82
218	997221559		Příplatek ZKO 1 km u vodovodné dopravy suší ze sypaných materiálů	T	4 511,09500		5,00	22 555,48	2 139,62000	-457,85200	1 681,76800	2 829,32700	14 146,64
219	997221571		Vodovodná doprava vyburaných hmot do 1 km	T	0,79500		5,00	3,68	0,00000	0,03100	0,03100	0,70400	3,52
220	997221579		Příplatek ZKO 1 km u vodovodné dopravy vyburaných hmot	T	21,31500		5,00	106,58	0,00000	0,00000	0,00000	4,50	102,08
221	997221861		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	T	54,22500		200,00	10 845,00	0,00000	4,46600	4,46600	40,75900	9 951,80
222	997221862		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	T	31,94000		200,00	6 388,00	0,00000	1,20000	1,20000	30,74000	6 148,00
223	997221873		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamene zatříbeného do kategorie odpadu pod kódem 17 05	T	5,51000		200,00	1 102,00	0,00000	5,51000	5,51000	0,00000	0,00
224	997221875		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez drážku dehtu zatříbeného do kategorie odpadu pod kódem 17 03 02	T	45,82000		200,00	9 164,00	0,00000	28,75600	28,75600	17,06400	3 412,80
226	997221801		Poplatek za těžbu štěrku - výjezdná pojištění	T	-0,73500		15 000,00	-11 025,00	0,00000	-0,03100	-0,03100	-465,00	-10 560,00
Celkem za SO 997 - Přesun suší								39 917,52	11 067,00	5 157,86	16 224,86	23 692,66	23 692,66
P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	Rozpčet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Prostaveno za období	Do konce sled. období	Zbývá	Celkem
161	911311123		Stodílo ocelové jednotraně sadřeznost N2 se zpevněním sítě 125 mm	M	52,00000	1 500,00		78 000,00	0,00000	52,00000	52,00000	0,00000	0,00
162	911311412		Náhradní ocelové jednotraně sadřeznost N2 se zpevněním sítě 125 mm	M	16,00000	1 500,00		24 000,00	0,00000	16,00000	16,00000	0,00000	0,00
164	914111111		Montáž vysoce dopravní značky do velikosti 1 m2	KUS	28,00000	1 000,00		28 000,00	0,00000	7,00000	7,00000	21,00000	21 000,00
165	40445619		Spinn	KUS	11,00000	2 500,00		27 500,00	0,00000	3,00000	3,00000	8,00000	20 000,00
167	914511111		Montáž sloupků dopravních značek do 3,5 m a betonovým základem	KUS	18,00000	1 000,00		18 000,00	0,00000	5,00000	5,00000	13,00000	13 000,00
168	40445225		Sloupky pro dopravní značku Zn D 60mm x 3,5m	KUS	9,00000	1 000,00		9 000,00	0,00000	2,00000	2,00000	7,00000	7 000,00
171	915111112		Vodovodná doprava znečištěné vody do 125 mm	M	53,50000	150,00		8 025,00	0,00000	10,00000	10,00000	43,50000	6 525,00
172	915111122		Vodovodná doprava znečištěné vody do 125 mm	M	963,00000	120,00		115 560,00	0,00000	689,00000	689,00000	274,00000	32 880,00
173	915131112		Spinn	M2	47,00000	450,00		21 150,00	0,00000	11,67000	11,67000	35,33000	15 898,50
174	915611111		Předznačení vodovodného liniového značení	M	1 016,50000	25,00		25 412,50	0,00000	699,00000	699,00000	317,50000	7 937,50
175	915621111		Předznačení vodovodného plošného značení	M2	47,00000	50,00		2 350,00	0,00000	11,67000	11,67000	35,33000	1 766,50
178	916131213		Oplocení stavebního odpadu	M	381,00000	300,00		114 300,00	7 500,00	2,00000	600,00	374,50000	106 200,00
184	916231213		Oplocení stavebního odpadu	M	273,00000	300,00		81 900,00	18 000,00	2,00000	600,00	211,00000	43 300,00
187	916911211		Oplocení stavebního odpadu	M3	19,00000	1 900,00		36 385,00	5 700,00	-1,08500	1,91500	17,23500	32 746,50
188	916011411		Oplocení stavebního odpadu	KUS	2,00000	750,00		1 500,00	0,00000	1,50000	1,50000	0,00000	0,00
189	916011421		Oplocení stavebního odpadu	KUS	3,00000	750,00		2 250,00	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000	0,00
190	919111111		Oplocení stavebního odpadu	M	572,00000	120,00		68 440,00	45 720,00	191,00000	572,00000	0,00000	0,00
191	919111211		Oplocení stavebního odpadu	M	682,00000	90,00		61 380,00	34 290,00	301,00000	682,00000	0,00000	0,00
192	919123111		Oplocení stavebního odpadu	M	682,00000	120,00		81 840,00	45 720,00	301,00000	682,00000	0,00000	0,00

P.č.	Značka	Var.	Název	Množství	JOC	Rozpočet	Prostředí do konce před. období	Prostředí za období	Do konce sled. období	Celkem	Množství	Celkem	Zbývá
193	919124123		Dlažební spáry vkládané v cementobetonovém kruhu s vyplněním sádru asfaltovou zákluskou	M	682,000000	90,00	61 386,00	381,000000	34 290,00	37 996,00	682,000000	61 386,00	0,00
194	91913111R		Vyzulání dlažedištní spár kluznými trny D 16 mm dle Geotextile pro ochranu, separaci a filtraci nečistot	KUS	1 128,000000	160,00	180 480,00	762,000000	121 920,00	58 560,00	1 128,000000	180 480,00	0,00
202	919261122		Mezní hm. pás 200 do 300 g/m ²	M2	6 873,500000	35,00	240 572,50	6 156,000000	215 460,00	35 112,50	6 873,500000	240 572,50	0,00
203	919272211		Střední spára napložit nového bituménového pásu na stávající za tepla s 15 mm tl. 25 mm s prokázáním	M	89,000000	130,00	13 350,00	0,000000	0,00	2 850,00	19 000,00	2 850,00	10 500,00
207	960005311		Rozbývá a odstraňuje silnicového a jedliho panelu	M	16,000000	150,00	2 400,00	0,000000	0,00	2 400,00	16,000000	2 400,00	0,00
208	960006132		Odstraní zásek dopravních nebo orientačních se slovků z betonových parketu	KUS	16,000000	100,00	1 600,00	0,000000	0,00	600,00	6,000000	600,00	1 000,00
209	960006211		Odstraní zásek dopravních značek ze slovků, slovků nebo konců	KUS	21,000000	100,00	2 100,00	0,000000	0,00	700,00	7,000000	700,00	1 400,00
214	960008311		Benfici jele tubního propisku z betonu	M3	8,000000	1 500,00	12 000,00	0,000000	0,00	750,00	0,000000	750,00	11 250,00
216	99-0001		Schůzka zřízení - odvádě a montáž	KUS	1,000000	350 000,00	350 000,00	0,000000	0,00	350 000,00	1,000000	350 000,00	0,00
Celkem za SO 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 669 075,00	528 600,00		788 071,00		1 316 671,00	352 404,00

P.č.	Značka	Var.	Název	Množství	JOC	Rozpočet	Prostředí do konce před. období	Prostředí za období	Do konce sled. období	Celkem	Množství	Celkem	Zbývá
123	871318221		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednorázové	M	54,000000	190,00	10 260,00	9,000000	1 710,00	-570,00	6,000000	1 140,00	9 120,00
127	877353121		Výjez a montáž tvorek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	KUS	2,000000	750,00	1 500,00	0,000000	0,00	1 500,00	2,000000	1 500,00	0,00
128	877353211		Montáž tvorek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylen-systém KG 2000 jednosměr DN 200	KUS	3,000000	750,00	2 250,00	0,000000	0,00	750,00	1,000000	750,00	1 500,00
130	877363211		Montáž tvorek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylen-systém KG 2000 jednosměr DN 250	KUS	4,000000	750,00	3 000,00	0,000000	0,00	1 500,00	2,000000	1 500,00	1 500,00
132	877373211		Montáž tvorek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylen-systém KG 2000 jednosměr DN 315	KUS	1,000000	750,00	750,00	0,000000	0,00	750,00	1,000000	750,00	0,00
135	86482162		Stěny šachet nad 200 mm ze 28 ze zvýšenými	M3	2,228000	7 500,00	21 960,00	2,228000	21 960,00	-2,928000	0,000000	0,00	23 280,00
136	86482193		Příslušenství na potrubí tl. C 30/37	M3	2,228000	5,00	11,44	2,228000	11,44	-2,928000	0,000000	0,00	14,64
137	894412411		Ostatní betonových nebo železobetonových dílců pro šachty šachet plynových	KUS	1,000000	750,00	750,00	1,000000	750,00	-1,000000	0,000000	0,00	750,00
145	894812221		šachet dle potrubí z PP typ DN 600/250	KUS	2,000000	2 500,00	5 000,00	2,000000	5 000,00	-0,050000	1,950000	4 875,00	12,500
146	894812223		Rezní a čistící šachty z PP typ DN 600/250	KUS	4,000000	2 500,00	10 000,00	4,000000	10 000,00	-0,194000	3,816000	9 540,00	460,00
149	894812331		Kongorování světlé hloubky 1000 mm	KUS	4,000000	2 500,00	10 000,00	4,000000	10 000,00	-0,064800	3,915200	9 788,00	212,00
150	894812332		Rezní a čistící šachty z PP DN 600 šachetové souřadnice	KUS	4,000000	2 500,00	10 000,00	4,000000	10 000,00	-0,064800	3,915200	9 788,00	212,00
151	894812333		Kongorování světlé hloubky 2000 mm	KUS	8,000000	5,00	40,00	0,000000	0,00	3,000000	3,000000	15,00	25,00
152	894812376		600 za výjezd šachetové souřadnice	KUS	8,000000	5 000,00	40 000,00	8,000000	40 000,00	-0,182400	7,817600	39 088,00	912,00
153	89531112		Rezní a čistící šachty z PP DN 600 poklop litový	KUS	2,000000	30 000,00	60 000,00	2,000000	60 000,00	-0,119800	1,882200	56 460,00	3 540,00
160	897722113		pro 1000, zařízení DN 600 z betonovým přístrojem	M	93,000000	20,00	1 900,00	0,000000	0,00	8,000000	16,000000	1 740,00	1 740,00
Celkem za SO 8 - Tlumičové							177 424,64	159 434,64		-24 080,64		135 354,00	42 070,64

P.č.	Značka	Var.	Název	Množství	JOC	Rozpočet	Prostředí do konce před. období	Prostředí za období	Do konce sled. období	Celkem	Množství	Celkem	Zbývá
91	564541111		Zřízení podtlaku nebo podtlaku ze spánní plochy přes 100 m ² tl. 200 mm	M2	5 380,000000	90,00	484 200,00	3 681,000000	331 290,00	132 910,00	5 380,000000	484 200,00	0,00
94	58344231R		Bednění frakce 0/90	T	2 205,800000	300,00	661 740,00	1 509,210000	452 763,00	208 977,00	2 205,800000	661 740,00	0,00
97	584831111		Podklad ze šetrného 50 plochy přes 100 m ² tl. 50 mm	M2	95,700000	140,00	13 398,00	0,000000	0,00	2 688,00	19,200000	2 688,00	10 710,00
99	584831111		Podklad ze šetrného 50 plochy přes 100 m ² tl. 200 mm	M2	1 195,600000	180,00	215 208,00	0,000000	0,00	3 024,00	16,800000	3 024,00	212 184,00
102	585831111		Zbavení krajiny šetrného tl. 130 mm	M2	674,000000	140,00	94 360,00	0,000000	0,00	94 360,00	674,000000	94 360,00	0,00
110	591131312		Krycí cementobetonový vozec slouží CS III tl. 160 mm	M2	2 235,500000	1 190,00	2 640 245,00	1 503,500000	1 798 370,00	871 675,00	2 235,500000	2 640 245,00	0,00
113	591241111		Kožený dlažby z kostek obložených z kamene na MC tl. 50 mm	M2	117,000000	600,00	70 200,00	0,000000	0,00	7 200,00	12,000000	7 200,00	63 000,00
114	593810211		Koška šipová dlažba Jula dlažba 1/70	M2	118,170000	750,00	88 627,50	0,000000	0,00	9 090,00	12,120000	9 090,00	79 537,50
120	5948-R-001		Montáž dlažby na rovnou podlahu šlepek dlažby, šlepek na lepidle, dlažba poplavybové	M2	12,000000	300,00	3 600,00	0,000000	0,00	2 700,00	9,000000	2 700,00	900,00
121	5948-R-002		Byl elatonerový pás napložit - hrušna dlažba	M2	12,000000	700,00	8 400,00	0,000000	0,00	6 300,00	9,000000	6 300,00	2 100,00
Celkem za SO 5 - Komerční a pocieni							4 299 978,50	2 572 623,00		1 358 924,00		3 931 547,00	368 431,50

91	451313111	M2	51,00000	900,00	45 900,00	0,00	0,00	34,00000	30 600,00	34,00000	17,00000	15 300,00
92	451273111	M3	121,1600	400,00	4 846,40	1 118,40	2 796,00	3,23000	1 292,00	6,02600	6,99000	2 430,00
93	452311141	M3	1,06000	3 300,00	3 770,00	0,42000	1 470,00	0,24000	840,00	0,66000	0,40000	1 400,00
94	465513127	M2	51,00000	900,00	45 900,00	0,00	0,00	34,00000	30 600,00	34,00000	17,00000	15 300,00
Celkem za SD 4 - Vodorovné konstrukce												
P.č.	Značka	Var.	Název	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Prostaveno za období	Celkem	Do konce sled. období	Zbytvá	Celkem
							Množství	Množství		Množství		
89	348171111	M	Ozazení mostního ocelového zábradlí	750,00	0,00	90 000,00	0,00	110,00000	82 500,00	110,00000	10,00000	7 500,00
90	553915421	M	ocelové zábradlí V. 1,30 m, včetně povrchové úpravy	1 040,00	0,00	192 000,00	0,00	110,00000	176 000,00	110,00000	10,00000	76 800,00
Celkem za SD 3 - Svislé a kompletní konstrukce												
P.č.	Značka	Var.	Název	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Prostaveno za období	Celkem	Do konce sled. období	Zbytvá	Celkem
							Množství	Množství		Množství		
49	211531111	M3	Výplň odvodňovacích žlabů nebo trávnic	600,00	0,00	231 861,00	220,50000	12,75000	7 650,00	233,30000	153,13500	91 881,00
50	211561111	M3	Kamenným trubním drcením tlakové 16 až 63 mm	600,00	0,00	43 275,00	72,12500	-5,62500	-3 375,00	66,50000	58,50000	3 375,00
51	211971123	M2	Zřízení odpadků ležet nebo trávnic	35,00	0,00	69 790,00	1 219,00000	42 665,00	1 925,00	1 274,00000	720,00000	25 200,00
53	212572111	M3	Říže nebo zábradlí sklon přes 1:2 a 0,25 m	400,00	0,00	11 415,20	15,96500	2,89800	1 598,20	18,86300	9,67500	9 870,00
56	212755281	M	Lože pro trávníky za šikmými trávníky	200,00	0,00	45 000,00	20,00000	25,00000	5 000,00	45,00000	180,00000	36 000,00
57	212755282	M	Travníky z dřevěných trávek plastových	240,00	0,00	51 120,00	153,00000	-15,00000	-3 600,00	138,00000	75,00000	18 000,00
Celkem za SD 2 - Zakládání												
P.č.	Značka	Var.	Název	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Prostaveno za období	Celkem	Do konce sled. období	Zbytvá	Celkem
							Množství	Množství		Množství		
1	111211101	M2	Odstavení kování a stromů průměru kmenů do 100 mm i kůlny stromů terenu do 1,3 m	200,00	0,00	47 000,00	35,00000	200,00000	40 000,00	235,00000	0,00000	0,00
8	113107243	M2	Odstavení podkladů dřevěného štěp 100 do 150 mm stroje přes 200 m2	150,00	0,00	21 750,00	30,00000	61,00000	9 150,00	91,00000	54,00000	8 100,00
9	113107322	M2	Odstavení podkladů z kamenné drceného štěp 100 do 200 mm stroje přes 50 m2	60,00	0,00	1 140,00	0,00000	19,00000	1 140,00	19,00000	0,00000	0,00
15	121151123	M2	Sejmout omítku plochy přes 500 m2 tl. vrstvy do 200 mm stroje	60,00	0,00	110 220,00	249,00000	50,25000	3 015,00	299,25000	1 537,75000	92 265,00
16	121151125	M2	Sejmout omítku plochy přes 500 m2 tl. vrstvy přes 250 do 300 mm stroje	75,00	0,00	240 525,00	3 127,00000	80,00000	6 000,00	3 207,00000	0,00000	0,00
17	122252206	M3	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice a dálnice v hornině třídy těžnosti I objem do 5000 m3 stroje	180,00	0,00	524 340,00	2 425,00000	21,30000	3 834,00	2 446,30000	466,70000	84 006,00
19	129001101	M3	Přípravek za střílení odkopávkou nebo prokopávkou v blízkosti uživatelských sítí	250,00	0,00	36 412,50	0,00000	122,31500	30 578,75	122,31500	23,33500	5 833,75
20	131251102	M3	Houbení jam nezapažených v hornině třídy těžnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 stroje	350,00	0,00	13 464,50	8,94000	9,12000	3 192,00	18,07000	20,40000	7 140,00
21	132251103	M3	Houbení jam nezapažených v hornině třídy těžnosti I skupiny 3 objem do 800 m3 v hornině třídy těžnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	350,00	0,00	18 655,00	3,50000	0,30000	105,00	3,80000	49,80000	17 325,00
22	133251102	M3	Houbení jam nezapažených v hornině třídy těžnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	350,00	0,00	8 533,00	12,00000	1,50000	525,00	13,50000	10,80000	3 808,00
23	162451106	M3	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžnosti I skupiny 1 až 3	60,00	0,00	141 171,48	1 254,00000	622,23300	37 333,98	1 876,23300	476,02500	28 597,50
24	162651112	M3	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžnosti I skupiny 1 až 3	120,00	0,00	107 328,00	0,00000	779,42500	93 531,00	779,42500	114,97500	13 797,00
25	162751117	M3	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžnosti I skupiny 1 až 3	180,00	0,00	459 237,78	2 189,00000	-43,13400	-7 764,12	2 145,86600	405,45500	72 981,90
26	162751119	M3	Přípravek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžnosti I skupiny 1 až 3 ZKO 1000 m přes 10000 m	8,50	0,00	433 724,57	-43 780,00000	-862,68000	-7 332,78	42 917,32000	8 109,10000	68 927,35
28	167151111	M3	Nakládání výkopku z horniny třídy těžnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	150,00	0,00	243 544,35	473,00000	208,99500	31 349,85	661,99500	941,63000	141 244,50
29	171151103	M3	Uložení sypání z hornin soudržných do nasypů zhuštěných stroje	200,00	0,00	217 400,00	816,00000	11,75000	2 375,00	827,75000	260,12500	52 025,00
30	589811148	T	Poplatek za uložení zeminy a kamene na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	160,00	0,00	359 040,00	1 795,20000	26,12500	3 918,75	1 821,32500	572,27500	85 841,25
31	171201231	T	Poplatek za uložení zeminy a kamene na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	150,00	0,00	272 136,50	4 158,50000	-81,35500	-12 203,25	4 077,14500	770,38500	115 554,75
33	10371500	M3	Zásep jam, řezů nebo kolek objemů	700,00	0,00	16 100,00	0,00000	21,37500	14 962,50	21,37500	1,62500	1 197,00
34	174151101	M3	Sypání na zhuštění	200,00	0,00	96 405,80	314,00000	22,50400	4 500,80	336,50400	145,52500	29 105,00

35	59344131	Stěrkodř frakce 0/8	T	8,61000	2 583,00	2 583,00	-71 750,00	-2 152,50	1 435,00	435,50	71 750,00	2 152,50
36	17516101	Odstavání potrubí atypické sypánínou bez prohození,	M3	31,05000	6 210,00	15,20000	-8 800,00	-1 760,00	6 400,00	1 280,00	24 500,00	4 930,00
37	58337231	úložnou do 3 m	T	53 915 000	200,00	30 710,00	-27 527,00	-5 505,40	3 383,00	676,60	50 532,00	10 106,40
38	58343920	Kamenný dílně frakce 16/22	T	9 73800	300,00	1,38600	8,20000	2 460,00	9 73800	2 921,40	0,00000	0,00
39	18113202	Úprava plátně pro síťnice a síťnice v zářezích se	M2	4 641,50000	25,00	3 001,00000	262,40000	6 560,00	3 263,40000	81 585,00	1 378,10000	34 452,50
40	18135113	zhutněním	M2	2 514,00000	60,00	1 200,00000	926,00000	55 560,00	2 126,00000	127 960,00	388,00000	23 380,00
41	18135115	Rozprostření omítky tl. vrstvy přes 250 do 300 mm pl	M2	2 981,33300	60,00	178 879,98	2 598,08300	155 884,98	2 598,08300	155 884,98	383,25000	22 995,00
42	18145131	Založení parkového trávníku výševem pl přes 1000	M2	2 514,00000	25,00	62 850,00	2 126,00000	53 150,00	2 126,00000	53 150,00	388,00000	9 700,00
43	00572410	m2 v rovině a ve svahu do 1:5	KG	62,85000	350,00	21 997,50	53,15000	18 602,50	53,15000	18 602,50	9,70000	3 395,00
		osivo směs travní parková										
		Stromy - dodávka a výsadba, včetně Nosičů jímky,										
		výměry půdy, odvozu přibližné zeminy, poplasku,										
		hnojení, mulčování, závlaky (dle klimatických										
		podmínek), kování ke kůlům, řez pro výsadbu, ští										
44	181-R-001	led n	KUS	10,00000	2 000,00	0,00000	10,00000	20 000,00	10,00000	20 000,00	0,00000	0,00
45	181-R-002	Kere - dodávka a výsadba, včetně Nosičů jímky,	KUS	220,00000	250,00	0,00000	220,00000	55 000,00	220,00000	55 000,00	0,00000	0,00
46	185804312	hnojení, závlaky, páskování péče	M3	25,14000	100,00	0,00000	21,26000	2 126,00	21,26000	2 126,00	3,86000	388,00
		Zalati rostlin vodou plocha přes 20 m2										
		Celkem za SO 1 - Zemní práce				4 453 934,86	2 896 708,90	618 137,06		3 514 845,96		939 088,90

P.č.	Značka	Var.	Název	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Prostaveno za období	Do konce sled. období	Celkem	Množství	Zbývá
239	567122111		podklad za směsí stříelné cementem SC c 8/10 (									
			KSOJ) tl. 120 mm	364,00		778 960,00	2 100,00000	40,00000	2 140,00000	14 560,00	0,00000	0,00
			Celkem za SO ZL 3.1 - V - Dodatečná sanace km 0,525 - 1,060			778 960,00				14 560,00		0,00
P.č.	Značka	Var.	Název	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Prostaveno za období	Do konce sled. období	Celkem	Množství	Zbývá
244	564821111,1		podklad SO tl. 80 mm	106,00		8 480,00	0,00000	80,00000	80,00000	8 480,00	0,00000	0,00
245	567122111,1		podklad za směsí stříelné cementem SC 8/10 tl.	367,00		27 525,00	0,00000	75,00000	75,00000	27 525,00	0,00000	0,00
246	912211111		120 mm	330,00		660,00	0,00000	2,00000	2,00000	660,00	0,00000	0,00
247	40445188		montáž tmářového šlábku šlábku plastového	254,00		508,00	0,00000	2,00000	2,00000	508,00	0,00000	0,00
248	91951112		sloupky směrny šlábku plastový	196,00		1 960,00	0,00000	10,00000	10,00000	1 960,00	0,00000	0,00
249	28614386		zřízení propustku z trub plastových PE rýhovanych	1 050,00		10 500,00	0,00000	10,00000	10,00000	10 500,00	0,00000	0,00
			DN 400			49 633,00				49 633,00		0,00
			trubka kanalizační PP kruhová DN 400x6000									
			Celkem za SO ZL 3.3 - Nový hospodářský areál v km 0,840 vlevo									

P.č.	Značka	Var.	Název	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Prostaveno za období	Do konce sled. období	Celkem	Množství	Zbývá
250	32721123		zdivo opěrných zdí z pravidelných kamennů na mrahu	20 800,00		10 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	10 400,00	0,00000	0,00
251	32721191		příplatek k cenám zdí opěrných sd z kamene	1 250,00		625,00	0,00000	0,00000	0,00000	625,00	0,00000	0,00
252	91112111		montáž zábradlí ocelového, střípného	940,00		12 032,00	0,00000	12,80000	12,80000	12 032,00	0,00000	0,00
253	91111-R		atypická ocelová zábradlí, výška 1,3 m, počet vod.	7 650,00		97 280,00	0,00000	12,80000	12,80000	97 280,00	0,00000	0,00
			trubak 3 profi trubky 60/3			120 337,00				120 337,00		0,00
			Celkem za SO ZL 3.4 - Bezpečnostní opatření u vyvážení v km 0,887 vlevo									
P.č.	Značka	Var.	Název	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Prostaveno za období	Do konce sled. období	Celkem	Množství	Zbývá
238	564821111		podklad za šlábky tl. 80 mm	104,00		70 720,00	0,00000	680,00000	680,00000	70 720,00	0,00000	0,00
239	567122111		kamenný stříelné cementem SC c 120 mm	364,00		235 144,00	0,00000	646,00000	646,00000	235 144,00	0,00000	0,00
243	NP1012		křt cementobetonový v pram. tl. 220 mm včetně	2 300,00		28 750,00	0,00000	12,50000	12,50000	28 750,00	0,00000	0,00
			řezání a bolení savačích asfaltbetonu a výškové			334 614,00				334 614,00		0,00
			úpravy přítluků železnic									
			Celkem za SO ZL 3.1 - Změna konstrukce vozovky v km 0,335 - 0,525									
			Celkem Směrová - ZBV			12 843 713,37	7 250 797,34	3 617 322,75	10 868 118,69			1 975 594,68

Za objednatel
Město Luhačovice
p. Jan Vavřík
TOI

Další podpis





REKAPITULACE ČERPÁNÍ POLOŽEK

Stavba: 123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic
Objekt: 12 - Vedlejší a ostatní náklady - ZPŮSOBITÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Období: 8/2024 - 9/2024

P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	Rozpočet	Prostaveno do konce před. období		Prostaveno za období		Do konce sled. období		Zbývá	
							Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1	01220300C		Geodetické práce při provádění stavby	KČ	1,00000	90 000,00	0,70000	63 000,00	0,17000	15 300,00	0,87000	78 300,00	0,13000	11 700,00
2	01210300C		Geodetické práce před výstavbou	KČ	1,00000	15 000,00	1,00000	15 000,00	-0,13000	-1 950,00	0,87000	13 050,00	0,13000	1 950,00
Celkem za SD VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce						105 000,00		78 000,00		13 350,00		91 350,00		13 650,00
Celkem Smlouva + ZBV						105 000,00		78 000,00		13 350,00		91 350,00		13 650,00

Za objednatele
Město Luhačovice
p. Jan Vaculík
TD)

Za zhotovitele
Mlénska státní spol. s r.o.



Další podpis

Stavba: 123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic
Objekt: 21 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPUSOBILÉ VYDAJE - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu.
Období: 8/2024 - 9/2024


P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Celkem	Množství	Do konce sled. období	Celkem	Zbývá
37	99825111		Přesun hmot pro pozemní komunikace a krytém z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	T	182,66700	10,00		1 826,67	0,00	1 826,67	130,84300	1 308,43	1 308,43	51824
Celkem za SD 998 - Přesun hmot														
P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Celkem	Množství	Do konce sled. období	Celkem	Zbývá
33	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypaných materiálů do 1 km	T	83,37600	5,00		416,88	83,37600	416,88	77,43000	5,95600	25,78	387,10
34	997221559		Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypaných materiálů.	T	2 417,90400	5,00		12 089,52	2 417,90400	12 089,52	-3 245,18000	-11 225,90	863,62	11 225,90
36	997221875		Připlatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (ekologické) asfaltového bez obsahu dlemtu zatrdného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	79,31600	200,00		15 863,20	79,31600	15 863,20	-77,42000	1,89600	379,20	15 484,00
Celkem za SD 997 - Přesun sutě														
P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Celkem	Množství	Do konce sled. období	Celkem	Zbývá
30	919726122		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měná km přes 200 do 300 g/m2	M2	177,25000	35,00		6 203,75	211,00000	7 395,00	-36,79325	174,23675	6 098,29	105,46
31	935113111		Osazení odvodňovacího polyimetrového žlabu s krytím roštem šířky do 200 mm	M	13,70000	300,00		4 110,00	0,00000	0,00	7 000,00	7,00000	2 100,00	2 010,00
Celkem za SD 9 - Ostatní konstrukce a práce bourání														
P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Celkem	Množství	Do konce sled. období	Celkem	Zbývá
18	564561111		Zřízení podvojevu nebo podklatu ze sranpy	M2	422,00000	90,00		37 980,00	0,00000	0,00	314,00000	28 260,00	28 260,00	9 720,00
19	583442256		Slékolní řezce 0/90	T	173,02000	300,00		51 905,00	0,00000	0,00	128,74000	38 622,00	38 622,00	13 284,00
21	564811111		Podklad ze šlanořtí SD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	M2	133,65000	180,00		24 057,00	0,00000	0,00	18,00000	3 240,00	3 240,00	29 817,00
22	564930412		Podklad z asfaltového recyklatu plochy do 100 m2 tl 100 mm	M2	31,00000	90,00		2 790,00	0,00000	0,00	18,00000	1 620,00	1 620,00	1 170,00
Celkem za SD 5 - Komunikace p uzemí														
P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Celkem	Množství	Do konce sled. období	Celkem	Zbývá
12	348001-R1		Dřevěná oplocení smíkově křídý průměr 20 cm, zaražený do hl. 0,5 m, roček k 0,4-5 m, váha 160-170 cm - kompletní provedení, izolace, montáž, demontáž	KUS	35,00000	150,00		5 250,00	17,50000	2 625,00	17,50000	35,00000	5 250,00	0,00
13	348001-R2		Dřevěná oplocení smíkově křídý celina opřemě 5-15 cm umístěn v 23-rtváci - kompletní provedení, izolace, montáž, demontáž	M	390,00000	80,00		31 200,00	195,00000	15 600,00	390,00000	31 200,00	0,00000	0,00
14	348001-R3		Trvalé oplocení dřboví křídý celina 20 cm, zaražený do hl. 0,5 m, roček k 0,4-5 m, váha 160-170 cm - kompletní provedení, izolace a montáž	KUS	65,00000	200,00		13 000,00	0,00000	0,00	65,00000	13 000,00	0,00000	0,00
15	348001-R4		Trvalé oplocení smíkově křídý celina opřemě 5-15 cm, umístěn v 23-rtváci - kompletní provedení, izolace a montáž	M	747,00000	150,00		112 050,00	0,00000	0,00	747,00000	112 050,00	0,00000	0,00
16	348001-R5		Ekologická izolace 6,0 m - kompletní provedení, izolace a montáž	KUS	1,00000	7 000,00		7 000,00	0,00000	0,00	1,00000	7 000,00	0,00000	0,00
Celkem za SD 3 - Bytové a komerční konstrukce														
P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	Rozpočet	JOC	Celkem	Prostaveno do konce před. období	Celkem	Množství	Do konce sled. období	Celkem	Zbývá
1	113107348		Osten a dřevěná konstrukce dřevěná pře 10m do 150 mm vysoká přes 20 m	M2	251,00000	150,00		37 650,00	60,00000	13 500,00	-84,00000	6,00000	900,00	36 750,00

3	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojné	M3	144,00000	180,00	25 920,00	0,00000	0,00	100,90000	18 162,00	100,90000	18 162,00	431,0000	77 58,00
4	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	M3	7,20000	250,00	1 800,00	0,00000	0,00	5,04500	1 261,25	5,04500	1 261,25	21 5500	538,75
6	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m, výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	145,00000	180,00	26 100,00	0,00000	0,00	100,90000	18 162,00	100,90000	18 162,00	441,0000	7 938,00
7	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	2 900,00000	8,50	24 650,00	0,00000	0,00	2 018,00000	17 153,00	2 018,00000	17 153,00	882,00000	7 497,00
8	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kódu odpadu 17 05 04	T	275,50000	150,00	41 325,00	0,00000	0,00	191,71000	28 756,50	191,71000	28 756,50	83,79900	12 568,50
11	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	M2	177,25000	25,00	4 431,25	0,00000	0,00	110,25000	2 756,25	110,25000	2 756,25	47,00000	1 475,00
Celkem za SD 1 - Zemní práce						161 876,25		13 500,00		73 651,00		87 151,00		74 723,25
Celkem Smlouva + ZBV						487 619,27		67 479,60		270 692,72		338 172,22		149 446,95

Za objednatelé
Město Louny
p. Ján Vaculík
TDI

Za zhotovitele
Mitrnga-stavby, spol. s r.o.
Ing. Václav Vint
stavbyvedoucí

Další podpis



REKAPITULACE ČERPÁNÍ POLOŽEK


Stavba: 123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic
Objekt: 25 - Vedlejší a ostatní náklady - ZPŮSOBILÉ VYDAJE - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
Období: 8/2024 - 9/2024

P.č.	Značka	Var.	Název	M.J.	Množství	Rozpočet	Prostaveno do konce před. období	Prostaveno za období	Do konce sled. období	Zbývá	Celkem
1	R-001		Přechodné a provizorní dopravní zařízení	KC	1,00000	JOC 60 000,00	Množství 0,61000 Celkem 36 600,00	Množství 0,25000 Celkem 15 600,00	Množství 0,87000 Celkem 52 200,00	Množství 0,13000 Celkem 7 800,00	Celkem 7 800,00
Celkem za SD VRN9 - Ostatní náklady											7 800,00
Celkem Směšková + ZBV											7 800,00

Za objednatele
Město Luhačovice
p. Jan Vaculík
TbJ

Za zhotovitele
Mitrenga staveby, spol. s r.o.
Ing. Václav Vnitr
stavbyvedoucí

Další podpis



REKAPITULACE ČERPÁNÍ POLOŽEK


Stavba: 123 - Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic
Objekt: 31 - Vedlejší a ostatní náklady - nepřímé náklady
Období: 8/2024 - 9/2024

P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	JOC	Prostaveno do konce před. období		Prostaveno za období		Do konce sled. období		Zbývá	
							Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
7	04300200C		Zkoušky a ostatní měření	KČ	1,00000	25 000,00		25 000,00		9 250,00	0,87000	21 750,00		
8	04500200C		Kompletace a koordinací činnost	KČ	1,00000	10 000,00		10 000,00		3 700,00	0,87000	8 700,00		
Celkem za SD VRN4 - Inženýrská činnost								35 000,00		12 950,00		30 450,00		
P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	JOC	Prostaveno do konce před. období		Prostaveno za období		Do konce sled. období		Zbývá	
4	03000100C		Zařízení staveniště	KČ	1,00000	24 000,00		24 000,00		6 240,00	0,87000	20 880,00		
Celkem za SD VRN3 - Zařízení staveniště								24 000,00		6 240,00		20 880,00		
P.č.	Značka	Var.	Název	MJ	Množství	JOC	Prostaveno do konce před. období		Prostaveno za období		Do konce sled. období		Zbývá	
1	01230300C		Geodetické práce po výstavbě	KČ	1,00000	10 000,00		10 000,00		8 700,00	0,87000	8 700,00		
2	01325400C		Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,00000	40 000,00		40 000,00		34 800,00	0,87000	34 800,00		
3	01327400F		Fotodokumentace a pasportizace stavby	KČ	1,00000	15 000,00		15 000,00		13 050,00	0,87000	13 050,00		
Celkem za SD VRN1 - Průběžné geodetické a projektové práce								65 000,00		56 550,00		56 550,00		
Celkem celková + ZBV								124 000,00		75 740,00		107 880,00		
												16 120,00		

Za objednatel
Město Luhačovice
B. Jan Václavík
TDI

Za zhotovitele

Další podpis





Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY

Přebírající, Objednatel Město Luhačovice Nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice Jednající: Ing. Marian Ležák, starosta zastoupen ve věcech technických: kontakt: [redacted]		Předávající, Zhotovitel Mitrenga-stavby, spol. s r.o. Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno Jednající: Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel zastoupen ve věcech technických: Ing. Václav Vintr – zástupce stavbyvedoucího kontakt: [redacted]	
Datum zahájení přejímáčního řízení: 5.9.2024		Název stavby: Luhačovice – cyklostezka Polichno – Újezdec u Luhačovic	
Datum ukončení přejímáčního řízení: 6.9.2024		SOD ze dne 14.2.2024	
Popis předávaného díla - dílčí části Výstavba stezky pro pěši a cyklisty v koridoru podél silnice II/490 v extravilánu obce Polichno a s vazbou na Uherský Brod a jeho cyklotrasy. Staničení předávaného úseku podle PD 0,355 km – 1,060 km. SO 101 – Stezka pro chodce a cyklisty - stezka s cementobetonovým krytem - stabilita svahu - sjezdy - opěrná zeď - odvodnění vč. propustků - dopravní značení - sčítač dopravy - vegetační úpravy - dřevěné hrzení podél pastviny			
Změny proti PD: Viz dokumentace skutečného provedení			
Zhotovitel: Mitrenga-stavby, spol. s r.o. Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno Ing. Václav Vintr, zástupce stavbyvedoucího kontakt: [redacted]		Technický dozor stavebníka: [redacted] Kontakt: [redacted]	
Projektant: Ing. Linda Smítalová – Atelis se sídlem: Rokycanova 781/13, 779 00 Olomouc IČ: 74276361 ČKAIT 1201908 – obor dopravní stavby ID00			
Cena díla bez DPH: 16 128 404,90 Kč	DPH 21%: 3 386 965,03 Kč	Cena díla včetně DPH: 19 515 369,93 Kč	
Datum zahájení prací předáním a převzetím staveniště: 11.4.2024	Datum dokončení prací dle Dodatku SoD č. 3: 6.9.2024	Skutečné dokončení prací: 6.9.2024	



Soupis předávaných dokladů a zkoušek:

Viz samostatný protokol

Soupis drobných vad a nedodělků včetně termínu jejich odstranění:

Bez vad a nedodělků

Termín vyklizení staveniště:

Staveniště je vyklizeno

Záruční doba **60 měsíců** končí (datum): **5.9.2029**

Zástupci zhotovitele **odevzdávají** a zástupci objednatele **přijímají** stavební dílo zhotovené v souladu s požadavky objednatele.

Podepsáno dne: 6.9.2024 ve 12:00 hodin

Zástupci	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Zhotovitele			
Objednatele			
Ostatní			

PROHLÁŠENÍ K FAKTUŘE Č. 2024082

- a) nemáme v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“)
- b) nejsou nám známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostaneme do postavení, kde nemůžeme daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenacházíme,
- c) nezkrátíme daň nebo nevylákáme daňovou výhodu,
- d) úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny,
- e) úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
- f) nebudeme nespolehlivým plátcem,
- g) budeme mít u správce daně registrovaný bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- h) souhlasíme s tím, že pokud bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o nás zveřejněna správcem daně skutečnost, že jsme nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně
- i) souhlasíme s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci našeho bankovního účtu určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

V Brně dne 11.9.2024



----- Doručovací adresa: Mitrenga – stavby, spol. s r.o., Malešovice 144, 664 65 -----

Sídlo:
Křížíkova 1566/19
612 00 Brno

Tel. + Fax. : 
E – mail : 
WWW : www.mitrenga.net

IČ : 26944022
DIČ : CZ26944022
Bankovní spojení : 
