

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 431 Přeložka v.o. - KSÚS Středočeského kraje

Číslo SO/PS

/ pořadí Změny SO/PS:

431 / 01

Číslo ZBV:

02

Objednatel 1:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11,, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Objednatel 2 :

Město Sedlčany

Náměstí T.G. Masaryka 32, 264 80, Sedlčany

IČ: 00243272

Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.

Husova 1697, 53003 Pardubice

IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 02 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.5	0,00	101 936,68	101 936,68

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02	0,00	101 936,68	101 936,68

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název stavby dle SoD

III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS):

SO 431 Přeložka v.o. - KSÚS Středočeského kraje

Číslo SO/PS

/ pořadí Změny SO/PS:

431 / 01

Číslo ZBV /

Skupina změny:

02.5

Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0628/00066001/2024 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.06.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Objednatel 2: Město Sedlčany se sídlem Náměstí T.G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice

Přílohy změnového listu:

1. Krycí list

1

počet listů

2. Změnový list

2

počet listů

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací

1

počet listů

4. Rozpis ocenění Změn položek

1

počet listů

5. Přehled zařazení změn do skupin

1

počet listů

6. Přehled dalších dokladů

1

počet listů

7. Soupis prací SO po všech změnách

1

počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů

18

počet listů

Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

Projektant (AD)

Stavební dozor

Supervize

Initiátor změny: Objednatel

Předmět Změny: Provizorní veřejné osvětlení

Popis a zdůvodnění Změny:

Dle projektové dokumentace bylo uvažováno, že vedení veřejného osvětlení bude pouze uloženo a zapojeno do nově vybudované konstrukce chodníků a říms. Nicméně Zhotovitel zjistil, že stávající vedení veřejného osvětlení umístěné na původní konstrukci mostu ev. č. 10522-1 bude nutné po dobu výstavby Díla, na základě požadavku města, zachovat, jelikož zajišťuje propojení dvou částí města Sedlčany a není proto možné jej přepojit. V návaznosti na aktuálně vyhodnocené potřeby zajištění kontinuálního provozu VO, neboli zachování živého vedení VO, kvůli propojení dvou částí města právě vedením přes most, bylo zřízeno provizorní nadzemní vedení VO. Zhotovitel tedy navrhnul zajistit vyvěšení provizorního vedení veřejného osvětlení na stávající sloupky veřejného osvětlení tak, aby nedošlo k přerušení vedení mezi dotčenými částmi obce. Z důvodu zanechání původního kabelu a z důvodu potřeby vyvěšení provizorního nadzemního vedení, došlo k instalaci kabelu nového v celkové délce 255 m.

Tuto skutečnost oznámil Zhotovitel Objednateli dne 26.8.2024 dopisem č.j. S25/04/24/ENG (příloha č.8)

Následně vydal Objednatel na základě Vyjádření k Oznámení o nové skutečnosti Objednatelům č. 2 (Město Sedlčany) ze dne 2.9.2024, č.j. MÚ-S/OI/18987/2024 (příloha č.9), stanoviska AD ze dne 27.8.2024 č.j. PX 5222.02/2024/MVa příloha č.10) a stanoviska TDI č.j.16.2/08.Sedl/2024/Ba ze dne 28.8.2024 (příloha č.11) Pokyn pověřené osoby Objednatele dopisem č.j. 16.1/08/Sedl/2024/Ba dne 5.9.2024.(příloha č.12)

Změna je klasifikována jako změna de minimis, jelikož vzešla z dodatečného požadavku Objednatele pro zajištění propojení dvou částí měst. Tato změna nemění celkový charakter zakázky a svou hodnotou nepřesahuje stanovený limit pro změny malého rozsahu dle zákona o zadávání veřejných zakázek a je plně v souladu se Směrnicí R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

Jedná se o Změnu, která je podle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5 - de minimis, podle Čl. 12. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a se jedná o změnu de minimis podle § 222 odst. (4) ZZVZ

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných
0,00	101 936,68	101 936,68	101 936,68

Technická pomoc Objednatele

jméno

Bc. Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Štefan Strelec	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Gajzler	podpis
Stavební dozor	jméno	Petr Havránek DiS.	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
Zástupce Objednatele	jméno	Lucie Jandíková	podpis
Zástupce Objednatele	jméno	Ing. Ivan Janeček	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel	jméno	Mgr. Irena Bubeníková Ing. Zdeněk Babka	podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 02

Název stavby:

III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

431 / 01

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

SO 431 Přeložka v.o. - KSÚS Středočeského kraje

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
105 538,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	105 538,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	101 936,68	101 936,68	96,59

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	207 474,68	101 936,68	96,59

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 431 - Sedlčany - most přes potok Mastník (KSÚS)								SO -					
Číslo a název rozpočtu: SO 431 - Přeložka v.o. - - KSÚS Středočeského kraje								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	200,000	254,180	54,180	76,00	15 200,00	0,00	4 117,68	19 317,68	4 117,68	27,090
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						15 200,00	0,00	4 117,68	19 317,68	4 117,68	27,09%
Nové položky													
92	70003.N	PŘELOŽKA KABELU VO	KPL	0,000	1,000	1,000	97 819,00	0,00	0,00	97 819,00	97 819,00	97 819,00	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	97 819,00	97 819,00	97 819,00	100,00%
		Celkem za všechny změnéné položky						15 200,00	0,00	101 936,68	117 136,68	101 936,68	670,64%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Štefan Strelec, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Petr Havránek DiS., (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby:

III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedčanech

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	24 299 000,05 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	24 763 369,76 Kč
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	29 963 677,41 Kč
3=12/1*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,01%
4=25/1*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=28/1*100	Sledování záměrných položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	362 433,03 Kč
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,49%
8=1*0,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 289 700,02 Kč

12=(11/0,15	Limit	3 644 850,01 Kč
13=(39/11)	Sledování limitu v %	0,42%
14=ABS(37)+38	Hodnota skupiny 5	101 936,68 Kč

		Skupiny Změn																		
		- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -						
		Vyhrazená změna (Domény) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměrná položka (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředkládané (dle §222 odst. (8) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny do minima Změny neměnnosti celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)						
SO	ZBV č.	Název SO/PS / Předmět Změny	Změny záporné (zadává se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadává se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadává se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadává se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadává se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadává se znaménkem mínus)	Změny kladné	Limit 15%
16	17	18	19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=(37)+38
			-500 000,00 Kč	964 369,71 Kč	464 369,71 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-500 000,00 Kč	862 433,03 Kč	362 433,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	101 936,68 Kč	101 936,68 Kč
SO 481	01	Předmět vedení CETN - KSUS Sbědovský kraj / Výměrné přeložky vedení CETN	-500 000,00 Kč	862 433,03 Kč	362 433,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-500 000,00 Kč	862 433,03 Kč	362 433,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	101 936,68 Kč	101 936,68 Kč
SO 431	02	Předmět v.o. - KSUS Sbědovského kraje / Provizorní veřejná osvětlení	0,00 Kč	101 936,68 Kč	101 936,68 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	101 936,68 Kč	101 936,68 Kč

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Změnového listu ke schválení.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	02
Název stavby:	III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 431 Přeložka v.o. - KSÚS Středočeského kraje
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	431 / 01

Doklad	počet listů
7. Soupis prací	1
8. Oznámení o nové skutečnosti 3 - VO	2
9. Vyjádření objednavatele 2 na oznámení č. 3	1
10. Stanovisko AD-VO	1
11. Stanovisko TDI	1
12. Pokyn Objednatele Provizorní osvětlení	2
13. Výkres_přeložka VO-rev1-BK230312	3
14. Fotodokumentace	3
15. Cenové nabídky	4
16- Zápis SD	1
Počet listů celkem	19

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech Číslo a název SO/PS:431 - Sedlčany - most přes potok Mastník (KSÚS) Číslo a název rozpočtu: SO 431 - Přeložka v.o. - - KSÚS Středočeského kraje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 01					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	230,000	230,000	0,000	290,00	66 700,00	0,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 200+6*5 = 230,000 => A											
2	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČÍ NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	10,000	10,000	0,000	495,00	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 4*2+1+1 = 10,000 => A											
3	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	200,000	254,180	54,180	76,00	15 200,00	0,00	4 117,68	19 317,68	4 117,68	27,09%
		Původní množství: 200,000 ZBV č.02: 54,18 = 54,180 => A (výpočet viz příloha Výkres_přeložka VO)											
4	747212	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. Kč	KUS	1,000	1,000	0,000	18 688,00	18 688,00	0,00	0,00	18 688,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 1,000											
		Nové položky											
92	70003.N	PŘELOŽKA KABELU VO	KPL	0,000	1,000	1,000	97 819,00	0,00	0,00	97 819,00	97 819,00	97 819,00	100,00%
	Nabídky	Původní množství: 0,000 ZBV č.02: 1 = 1,000 => A 255m délky nového kabelu AES 2*16											
		Celkem						105 538,00	0,00	101 936,68	207 474,68	101 936,68	96,59%

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21
Praha 5 - Smíchov
k rukám ředitele Ing. Aleše Čermáka, Ph.D., MBA

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/tel.

V Praze dne

S25/04/24/ENG

Bc. Orvanová Markéta/.

26. 08. 2024

Dílo „III/10522, most ev. č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech“ (dále jen „**Dílo**“), smlouva o dílo uzavřená mezi KSÚS Středočeského kraje, p.o., č. smlouvy objednatele SMLD-0628/00066001/2024 (dále jen „**Objednatel 1**“), Město Sedlčany (dále jen „**Objednatel 2**“) a M – SILNICE a.s., č. smlouvy zhotovitele 25-SOD-2024-024 (dále jen „**Zhotovitel**“), ze dne 24.6.2024 (dále jen „**Smlouva**“).

Oznámení o nové skutečnosti č. 3 – provizorní veřejné osvětlení

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás s oznámením o nových skutečnostech zjištěných při realizaci Díla a žádostí o vydání pokynu představující změnu Díla ve smyslu čl. 6.7 Smlouvy.

Dle stávající projektové dokumentaci Díla (dále jen „**PD**“) bylo uvažováno, že vedení veřejného osvětlení bude pouze uloženo a zapojeno do nově vybudované konstrukce chodníků a říms. Nicméně Zhotovitel zjistil, že stávající vedení veřejného osvětlení umístěné na původní konstrukci mostu ev. č. 10522-1 bude nutné po dobu výstavby Díla zachovat, jelikož zajišťuje propojení dvou částí města Sedlčany a není proto možné jej přepojit.

Zhotovitel tedy navrhuje zajistit vyvěšení provizorního vedení veřejného osvětlení na stávající sloupy veřejného osvětlení tak, aby nedošlo k přerušení vedení mezi dotčenými částmi obce. (dále jen „**Vícepráce**“)

V návaznosti na výše uvedené tímto Zhotovitel v souladu s čl. 6.7 Smlouvy navrhuje Objednateli změnu Díla odpovídající výše uvedeným Vícepracím (dále jen „**Změna**“). Tato Změna představuje Nezbytnou změnu, jak je definována ve Směrnici ředitele Objednatele 1 ke změnám staveb.

Změna bude mít předpokládaný dopad do smluvní ceny ve výši 112.160 Kč, a to dle přiloženého rozpočtu, ale konečný dopad do smluvní ceny může být až 200.000 Kč. Změna nemá dopad do harmonogramu Díla.

Zhotovitel Vám tímto tedy v souladu s čl. 6.7 Smlouvy žádá o schválení Změny Díla ve výše uvedeném rozsahu, tedy o schválení Změny a vydání pokynu k provedení prací souvisejících se Změnou, a to nejpozději do 30.8. 2024, aby se minimalizovalo časové zpoždění a předešlo vzniku dodatečných nákladů.

Pokud nesouhlasíte s výše popsaným postupem, tak tímto Zhotovitel žádá Objednatele, aby ve stejném termínu určil jiné řešení, podle kterého má Zhotovitel postupovat tak, aby bylo zajištěno dodržení plynulého postupu prací.

M - SILNICE a.s.

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
oblastní závod JIH: Trabantská 290/31,
190 15 Praha 9
provoz Strakonice: Heydukova 321
386 01 Strakonice

Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddílu B,
vložka č. 430

IČ: 421 96 868, **DIČ:** CZ42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 1080015329/0800

telefon: +420 495 846 808
e-mail: jih@msilnice.cz
web: www.msilnice.cz

S pozdravem

Přílohy:

1. Položkový rozpočet



MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
Odbor investic
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

Č.j. MÚ-S/OI/18987/2024

Vyřizuje: Ing. Aneta Šnellerová

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
K rukám paní Lucie Jandíkové

V Sedlčanech 2. září 2024

VYJÁDRĚNÍ K OZNÁMENÍ O NOVÉ SKUTEČNOSTI č. 3

Město Sedlčany (objednatel 2) souhlasí s navrženým postupem zajištění provizorního veřejného osvětlení a z toho vyplývajícími nezbytnými vícepracemi uvedenými v Oznámení o nové skutečnosti č. 3 – provizorní veřejné osvětlení.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic Stř. Kr. p.o.
Lucie Jandíková
Provozní manažer úseku mosty – oblast Benešov
Křižíkova 1351
272 01 Benešov

Čj : PX 5222.02/2024/MVa
V Praze : 27. srpna 2024
Vyřizuje: Ing. Martin Vavřena

Věc: **III/10522, most ev. č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech**
číslo zakázky: 23 225 01
Oznámení o nové skutečnosti č. 3 – provizorní veřejné osvětlení

Sdělení č. 2
Vyjádření AD - provizorní veřejné osvětlení

Autorský dozor obdržel od Zhotovitele dne 23.8.2024 č.j. S25/04/24/ENG žádost o stanovisko k zachování stávajícího vedení veřejného osvětlení po dobu výstavby Díla.

V projektu PDPS projektant vycházel z podkladů o IS předaných jejich vlastníky/Správci. V tomto případě Města Sedlčany. Při realizaci zadávací dokumentace nebylo správcem VO požadováno, aby bylo stávající vedení VO zachováno, jelikož zajišťuje propojení dvou částí města Sedlčany a není proto možné jej přepojit.

AD nemá připomínek proti provedení vyvěšení provizorního vedení veřejného osvětlení na stávající sloupy veřejného osvětlení tak, aby nedošlo k přerušení vedení mezi dotčenými částmi obce a souhlasí se změnami řešenými v Oznámení č.3. AD současně souhlasí se související úpravou výměr dotčených položek v soupisu prací resp. s doplněním potřebných nových položek a tím se změnou ceny díla.

S pozdravem za Pontex Praha
Ing. Martin Vavřena
Autorský dozor

Naše značka: 16.2/08/Sedl/2024/Ba
Vaše značka:
Vyřizuje: Daniel Balla DiS
Datum: 28.08.2024

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5
K rukám: Ing. Lucie Jandíková

Stavba: III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech

Věc: Vyjádření TDI k Oznámení o nové skutečnosti č. 3 – provizorní veřejné osvětlení

Dne 23.8.2024 zaslal Zhotovitel Oznámení č. 3 – spočívající v realizaci provizorní přeložky VO a DIO, ve kterém Zhotovitel uvádí,

že dle stávající projektové dokumentace Díla (dále jen „PD“) bylo uvažováno, že vedení veřejného osvětlení bude pouze uloženo a zapojeno do nově vybudované konstrukce chodníků a říms. Nicméně Zhotovitel zjistil, že stávající vedení veřejného osvětlení umístěné na původní konstrukci mostu ev. č. 10522-1 bude nutné po dobu výstavby Díla zachovat, jelikož zajišťuje propojení dvou částí města Sedlčany a není proto možné jej přepojit.

Zhotovitel tedy navrhuje zajistit vyvěšení provizorního vedení veřejného osvětlení na stávající sloupy veřejného osvětlení tak, aby nedošlo k přerušení vedení mezi dotčenými částmi obce.

V návaznosti na výše uvedené tímto Zhotovitel v souladu s čl. 6.7 Smlouvy navrhnul Objednateli změnu Díla pro realizaci provizorní přeložky. Tato změna představuje Nepředvídanou změnu, jak je definována ve Směrnici ředitele Objednatele ke změnám staveb.

Zhotovitel v souladu s čl. 6.7 Smlouvy žádá o schválení změny Díla.

Předpokládaný cenový dopad změny je

Změny záporné : - Kč bez DPH

Změny kladné: + 120 000 až 200 000 Kč bez DPH

V projektu PDPS projektant vycházel z podkladů o IS předaných jejich vlastníky/Správcí. V tomto případě Města Sedlčany. Při realizaci zadávací dokumentace nebylo správcem VO požadováno, aby bylo stávající vedení VO zachováno, jelikož zajišťuje propojení dvou částí města Sedlčany a není proto možné jej přepojit. TDS považuje změnu za účelnou a doporučuje Objednateli vydat pokyn k Variaci.

Odpovědný TDI doporučuje zařadit Změnu do Skupiny 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů. Jedná se o Změnu nepodstatnou splňující podmínky stanovené v § 222 odst.6 ZZVZ.

S pozdravem

Naše značka: 16.1/08/Sedl/2024/Ba

Vaše značka: S25/04/24/ENG

Vyřizuje: Daniel Balla DiS

Datum: 5.9.2024

M-SILNICE a.s.
Ing. Filip Slaba
Husova 1697
530 03 Pardubice

Stavba: „III/10522, most ev. č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech“

Věc: Pokyn pověřené osoby Objednatele

Vážený pane,

Objednateli stavby „III/10522, most ev. č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech“ (dále jen „Stavba“) byl dne 23.08.2024, v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo ze dne 31.7.2024, č. smlouvy SMLD-0628/00066001/2024, mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace - Objednatel a M-SILNICE a.s. - Zhotovitel, (dále jen „Smlouva“), doručen elektronicky dopis č.j S25/04/24/ENG datovaný dne 23.8.2024 a označený jako

Oznámení o nové skutečnosti č. 3 – provizorní veřejné osvětlení

ve kterém Zhotovitel oznamuje o nových skutečnostech zjištěných při realizaci Díla a žádá o vydání pokynu představující změnu Díla ve smyslu čl. 6.7 Smlouvy.

Zhotovitel uvádí, že dle stávající projektové dokumentace Díla (dále jen „PD“) bylo uvažováno, že vedení veřejného osvětlení bude pouze uloženo a zapojeno do nově vybudované konstrukce chodníků a říms. Nicméně Zhotovitel zjistil, že stávající vedení veřejného osvětlení umístěné na původní konstrukci mostu ev. č. 10522-1 bude nutné po dobu výstavby Díla zachovat, jelikož zajišťuje propojení dvou částí města Sedlčany a není proto možné jej přepojit. Zhotovitel tedy navrhuje zajistit vyvěšení provizorního vedení veřejného osvětlení na stávající sloupky veřejného osvětlení tak, aby nedošlo k přerušení vedení mezi dotčenými částmi obce. (dále jen „Vícepráce“)

Změna bude mít předpokládaný dopad do smluvní ceny ve výši 112.160 Kč, a to dle přiloženého rozpočtu, ale konečný dopad do smluvní ceny může být až 200.000 Kč. Změna nemá dopad do harmonogramu Díla.

Zhotovitel tímto tedy v souladu s čl. 6.7 Smlouvy žádá o schválení Změny Díla ve výše uvedeném rozsahu, tedy o schválení Změny a vydání pokynu k provedení prací souvisejících se Změnou, a to nejpozději do 30.8. 2024, aby se minimalizovalo časové zpoždění a předešlo vzniku dodatečných nákladů.

Zástupce Objednatele k výše uvedenému dodává, že předané Oznámení bere na vědomí, potvrzuje uvedenou skutečnost a na základě požadavku Města Sedlčany a vyjádření AD a TDS souhlasí s uvedenou Změnou rozsahu díla dle návrhu Zhotovitele.

Zástupce Objednatele tímto vydává Pokyn ke změně rozsahu díla v rozsahu uvedeném Zhotovitelem a v souladu s Pod-čl. 5.1 Smlouvy vyzívá Zhotovitele o předložení Změny rozsahu Díla dle Pod-čl. 6.7 Smlouvy

Zástupce objednatele ale uvádí, že neodsouhlasuje cenový dopad změny.
Pro ocenění Změny bude postupováno dle Pod-čl. 6.7 Smlouvy o dílo a bude účtováno na základě skutečně provedeného množství.

Zástupce Objednatele předběžně zařazuje Změnu do Skupiny 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů. Jedná se o Změnu nepodstatnou splňující podmínky stanovené v § 222 odst.6 ZZVZ.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Zástupce Objednatele uvádí, že tento Požadavek k předložení změny sám o sobě, není uznáním nároku a nezakládá právo na jakoukoliv platbu či prodloužení lhůty, které již bylo Zhotovitelem uplatněno nebo teprve uplatněno bude.

Nedílnou součástí tohoto Pokynu je Vyjádření města Sedlčan.

S pozdravem


Přílohy:

Vyjádření Města Sedlčany

Vyjádření AD - provizorní veřejné osvětlení, ze dne 27.8.2024, č.j.: PX 5222.02/2024/MVa

Vyjádření TDI

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1:300

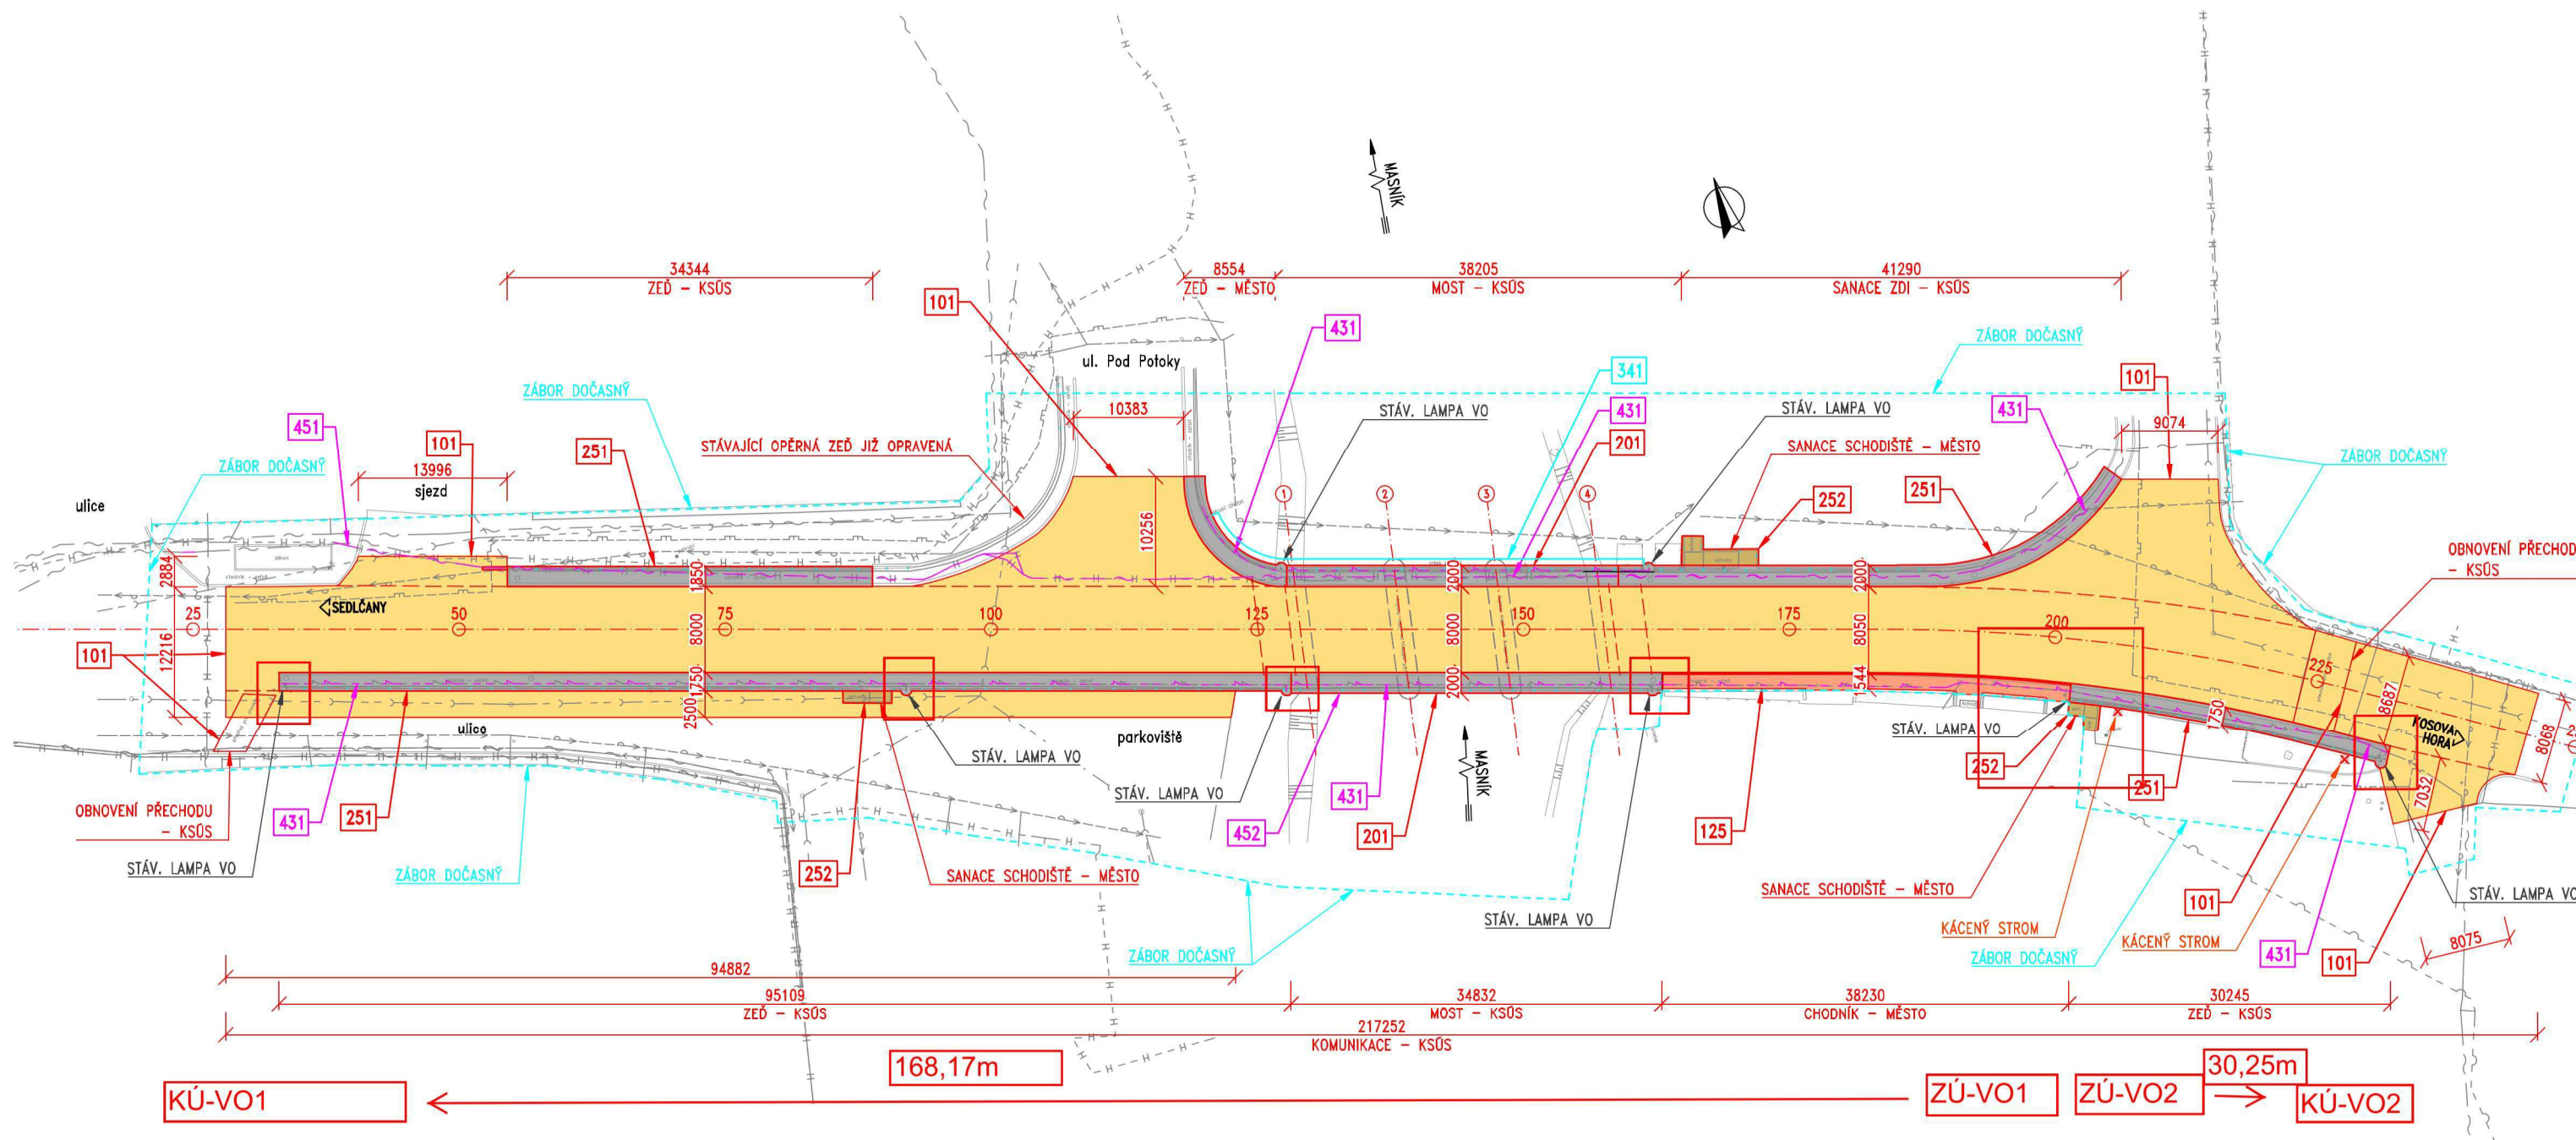

- POZNÁMKY:**
1. DÉLKOVÉ KÓTY JSOU V OSE KOMUNIKACE.
 2. SO 341 VYVĚŠENÍ VODOVODU BUDE REALIZOVÁNO POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE MĚSTO NESTIHNE PŘELOŽIT VODOVOD MIMO MOST PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY.
 3. LAMPY VO ZŮSTÁVAJÍ STÁVAJÍCÍ.
 4. VZDUŠNÉ VEDENÍ NA LAMPÁCH VO A KAMEROVÝ SYSTÉM NEBUDOU STAVBOU DOTČENY.

- LEGENDA:**
- CHODNÍK, ŘÍMSA MOST – KSÚS
 - VOZOVKA – KSÚS
 - CHODNÍK – MĚSTO
 - SCHODIŠTĚ SANACE – MĚSTO
 - 1SCV KANÁL
 - 1SCV VODOVOD
 - CETIN METALIKA
 - CETIN NADZEMNÍ
 - CEZ–D NN KABEL
 - CETIN NN PODZEMNÍ
 - CETIN OPTIKA
 - GASNET STL
 - TS VO PODZEMNÍ
 - ZÁBOR DOČASNÝ
 - STROM ZAMĚŘENÝ, NEZAMĚŘENÝ
 - STROM KÁCENÝ

- SEZNAM OBJEKTŮ:**
- SO 101 KOMUNIKACE
 - SO 125 CHODNÍKY
 - SO 181 DIO
 - SO 201 MOST EV.Č. 10522–1
 - SO 251 OPĚRNÉ ZDI
 - SO 252 SCHODIŠTĚ
 - SO 341 VYVĚŠENÍ VODOVODU
 - SO 431 PŘELOŽKA VO
 - SO 451 PŘELOŽKA VEDENÍ CETIN
 - SO 452 PŘELOŽKA ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ VODNÍ HLADINY

- FINANCUJE:**
- KSÚS
 - MĚSTO
 - KSÚS
 - KSÚS
 - MĚSTO
 - KSÚS
 - KSÚS
 - KSÚS
 - KSÚS

SO 431- Přeložka VO
 ZBV 2
 Realizace propojení vedení v zemi a vzdušné vedení pomocí 4 lamp VO-viz zákres.
 Výška lampy 6,5m
 Půdorysná délka
 $L=L1+L2=95,11+34,83+38,23+30,25=168,17+30,25=198,42m$
 Skutečná délka použitého kabelu:
 $Půdorys \times 1,15 \text{ (prověšení)} + 4 \times 6,5 = 198,42 \times 1,15 + 26 = 254,18m.$

ZMENŠENO NA 50 %

Akce:
 III/10522, most ev.č. 10522–1 přes potok
 Masník v Sedlčanech

Objednatel:
 KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
 STŘEDOČESKÉHO KRAJE
 ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5



Souřadnicový systém: S–JTSK
 Výškový systém: Bpv

ČÁST C



Objednatel: KSÚS Středočeského kraje		Obec: Sedlčany	Kraj: Středočeský
Akce:	III/10522, most ev.č. 10522–1 přes potok Masník v Sedlčanech		Datum
Objekt:			11/2023
Část:			DÚSP
Příloha:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		Č. přílohy
			C3

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1:300



- LEGENDA:

SEZNAM OBJEKTŮ:

FINANCUJE:

ZMENŠENO NA 50 %

KSÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
Stredoľeského kraja

ČÁST C


PONTEx S.A.O.
Praha 4, Bazová 1858, 147

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

DUSP

8. *affinity*

C3

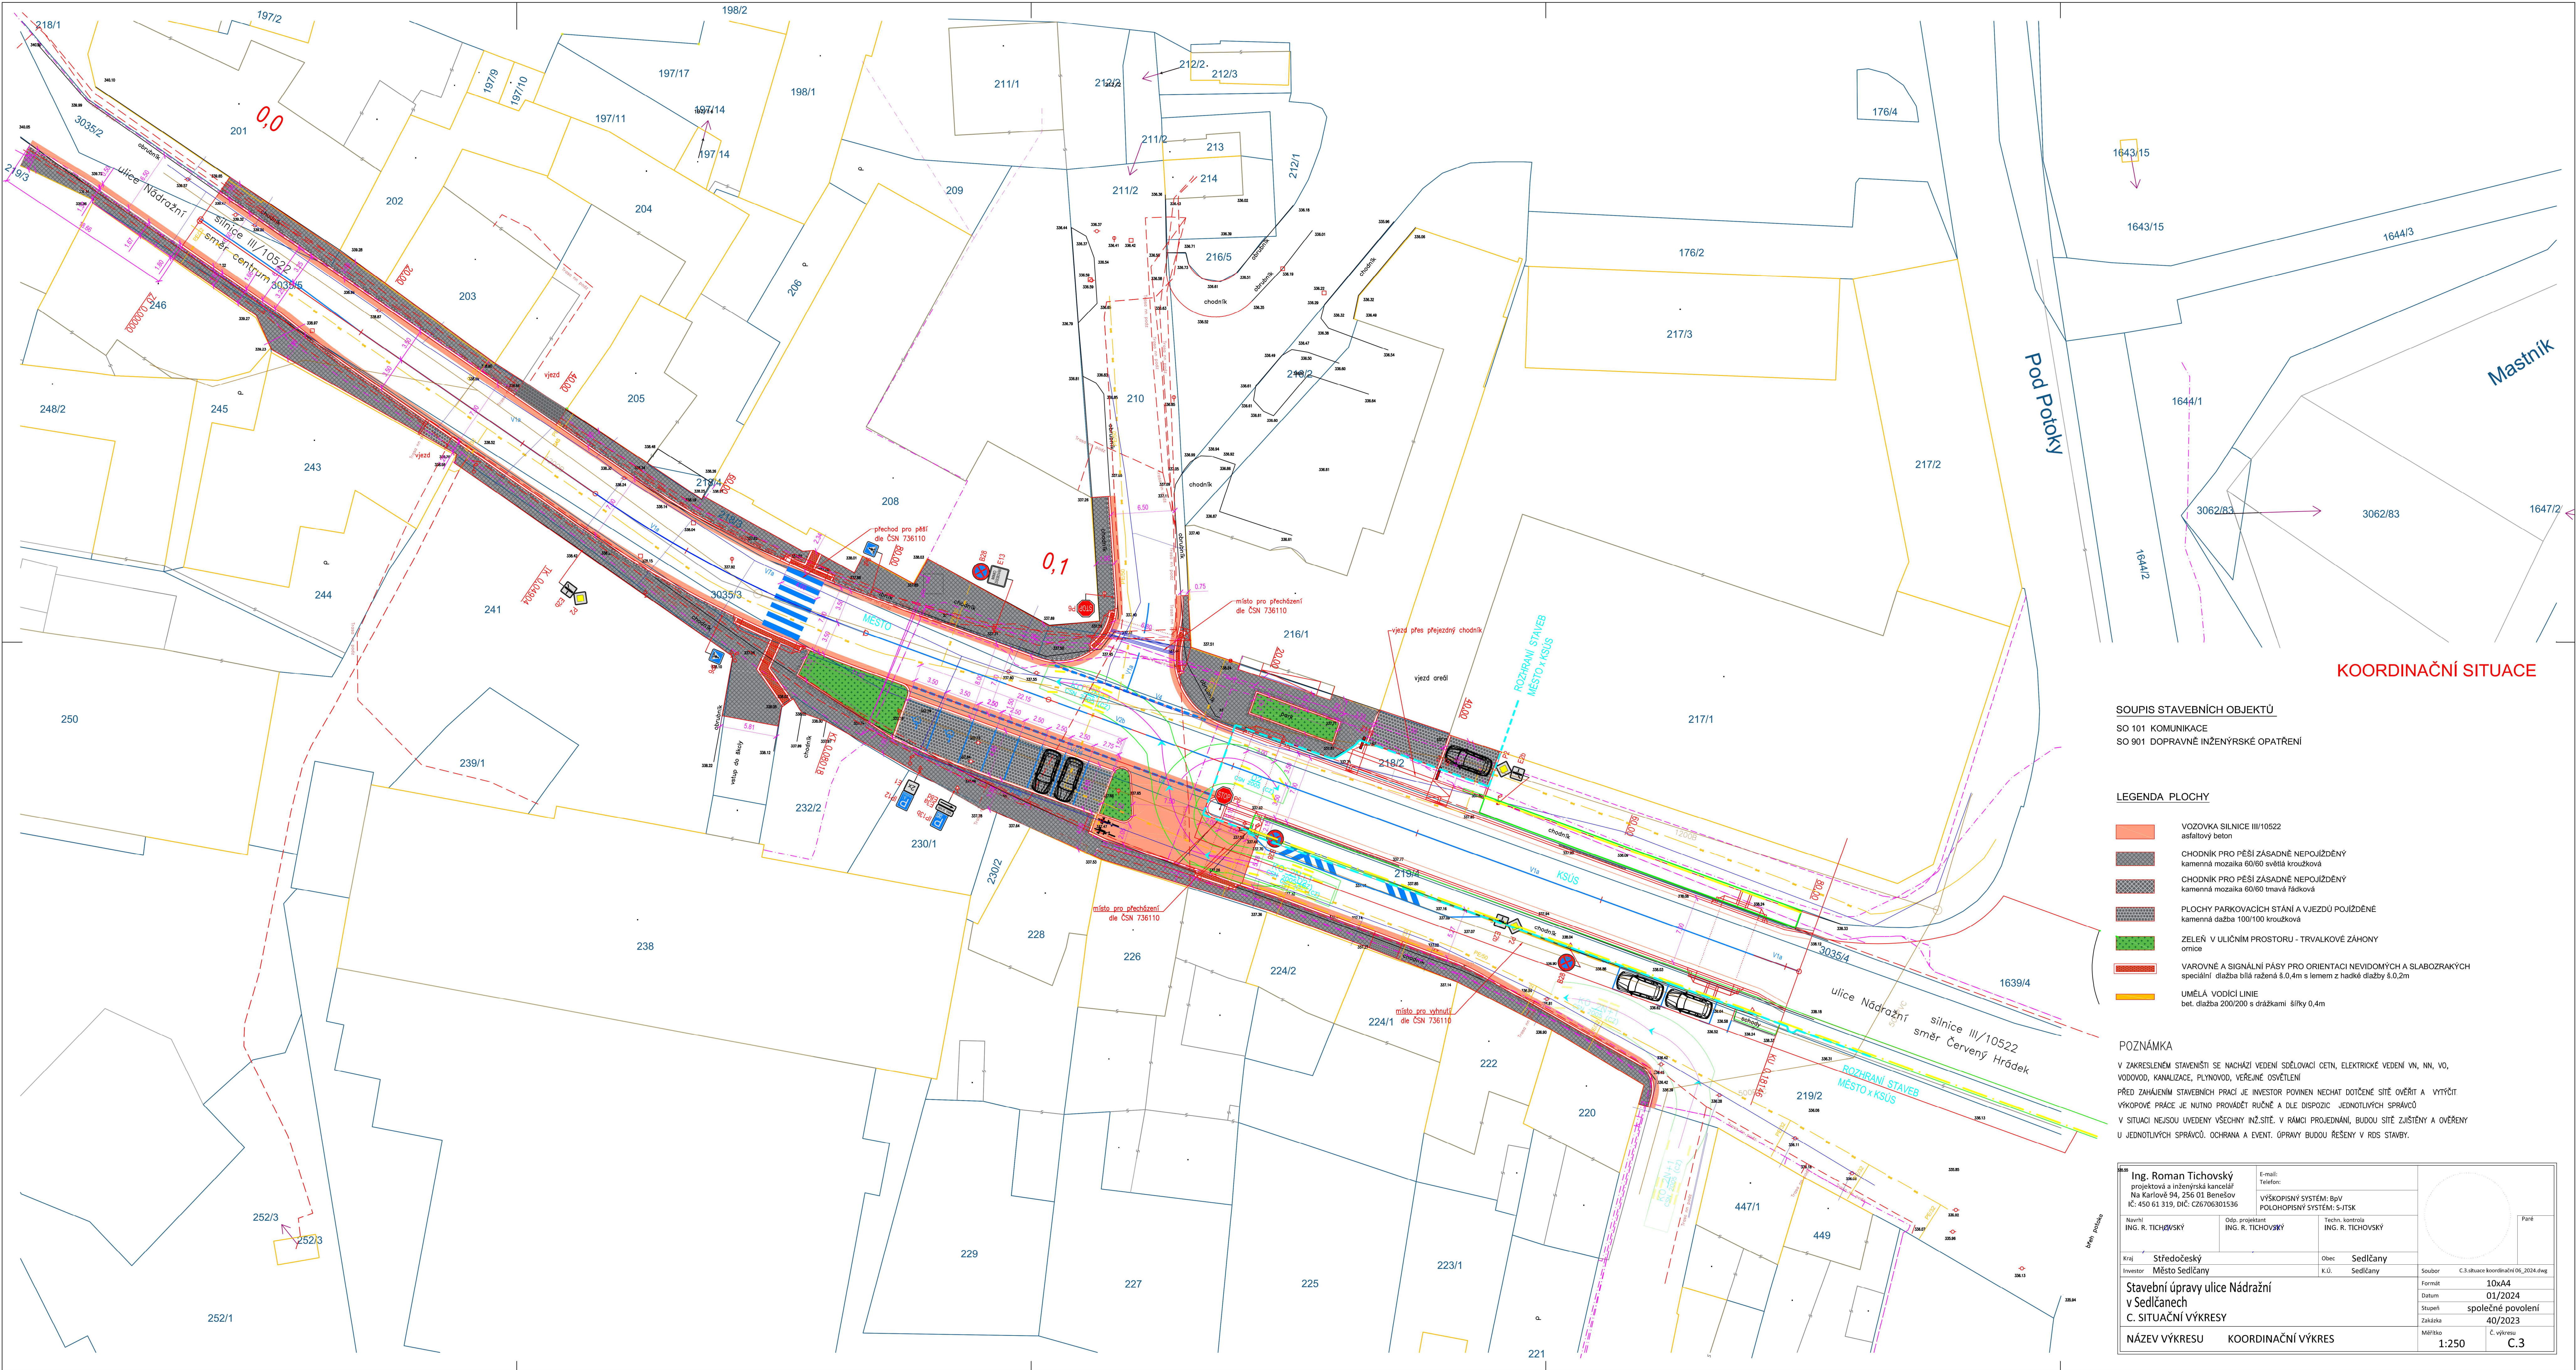

KOORDINAČNÍ SITUACE

SOUPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
SO 101 KOMUNIKACE
SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

LEGENDA PLOCHY

- VOZOVKA SILNICE III/10522
asfaltový beton
- CHODNÍK PRO PĚŠÍ ZASADNĚ NEPOUŽÍZĚNÝ
kamenná mozaika 60/60 světlá kružková
- CHODNÍK PRO PĚŠÍ ZASADNĚ NEPOUŽÍZĚNÝ
kamenná mozaika 60/60 tmavá řádková
- PLOCHY PARKOVACÍCH STÁNÍ A VJEZDŮ POUŽÍZĚNÉ
kamenná dlažba 100/100 kružková
- ZELEŇ V ULIČNÍM PROSTORU - TRÁVKOVÉ ZÁHKONY
ornice
- VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PASY PRO ORIENTACI NEVĚDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH
speciální dlažba bílá ražená 8,0/4m s lemem z hadké dlažby 8,0/2m
- UMĚLÁ VODICÍ LINIE
bet. dlažba 200/200 s drážkami šířky 0,4m

POZNÁMKA

V ZÁKRESNĚNÉM STAVĚNÍ SE NACHÁZÍ VEDENÍ SPOLEČNÝCH CEN, ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN, NN, VO, VODOVOD, KANALIZACE, PLYNOVOD, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
PŘED ZAHLAŠENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE INVESTOR POVINN NECHAT DOTYČNÉ SÍTĚ OVĚŘIT A VÝVOJ
VÝKOPOVÉ PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT RUČNĚ A DLE DISPOZIC JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ
V SITUACI NEJSOU UVEDENY VŠECHNY INŽ. SÍTĚ. V RÁMCI PROJEKTOVÁNÍ, BUDOU SÍTĚ ZJIŠŤOVAT A OVĚŘOVAT
U JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ. OCHRANA A EVENT. OPRAVY BUDOU ŘEŠENY V ROS STAVBY.

Ing. Roman Tichovský projektová a inženýrská kancelář Na Karlově 94, 256 03 Benešov IČ: 450 61 319, DIČ: CZ6706301536		E-mail: Tichovsk@seznam.cz VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: RPV POLOHOPISNÝ SYSTÉM: S-JTSK		Fotie
Náčelní ING. R. TICHOVSKÝ	Oldř. projektant ING. R. TICHOVSKÝ	Techn. kontrola ING. R. TICHOVSKÝ		
Kraj: Středočeský	Obec: Sedlčany	Soubor: C:\staveb\koordinaci\01_2024.dwg		
Investor: Město Sedlčany	K.Ú. Sedlčany	Formát: 10x44		
Stavební úpravy ulice Nádražní v Sedlčanech				Datum: 01/2024
C. SITUAČNÍ VÝKRESY				Stupeň: společné povolení
NÁZEV VÝKRESU KOORDINAČNÍ VÝKRES				Zakázka: 40/2023
				Měřítko: 1:250 C. výkres
				C.3





Obecní úřad
Město
Obecní úřad
Obecní úřad
Obecní úřad

BRATŘI
BUZKOVCI

M-SILNICE
M-SILNICE a.s., oblasť závod JIH
Trabantka 23031 190 15, Praha - Satalice
STOP
30
Návěšný klasic
u stavebyvedoucího



Přehled cenových nabídek							
Poř. Č. pol.	kód položky	Název položky	Jednotková cena	Cena celkem	Cena vč. DPH	str/počet str.	Firma
92	70003.N	PŘELOŽKA KABELU VO		85 060,00 Kč	102 922,60 Kč	1	Kavas elektro s.r.o.
				90 887,00 Kč	109 973,27 Kč	1	ETM stavební s.r.o.
				96 350,00 Kč	116 583,50 Kč	1	Elmont Tábor s.r.o.

Výsledná cena byla navýšena o 15%. Toto navýšení se skládá z:

- 5% výrobní režie
- 5% správní režie
- 5% zisk

Celková cena vč. navýšení : 97 819 Kč

ROZPOČET

Stavba: III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech

Objekt: SO 451

Termín výstavby:

Objednatel: M-SILNICE s.r.o.

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 11.07.2024

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Přeložka veřejného osvětlení

1			kabel AES 2*16	m	255,00	112,00 Kč	28 560,00 Kč
2			závěsy	ks	7,00	522,00 Kč	3 654,00 Kč
3			kotvení	ks	6,00	305,00 Kč	1 830,00 Kč
4			svorka spojovací	ks	2,000	508,00 Kč	1 016,00 Kč
5			montáže a elektrikářské práce	kpl.	1,00	29 000,00 Kč	29 000,00 Kč
6			pronájem montážní plošiny	kpl.	1,00	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
7			ostatní drobný materiál	kpl.	1,00	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
8			doprava	kpl.	1,00	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč

Celkem bez DPH

85 060,00 Kč

DPH 21%

17 862,60 Kč

Celkem vč. DPH

102 922,60 Kč

CENOVÁ NABÍDKA - 2024_M_SILNICE_III/10522, most přes potok Mastník v Sedlčanech

Zpracovatel:

[illegible]

Nabídka na akci: Sedlčany – most přes potok Mastník

Na základě naší tel. dohody Vám zasílám naši cenovou nabídku na výše uvedenou akci.

Nabídnutá cena

Přeložka veřejného osvětlení v celkové délce 255m včetně materiálu, montáže, elektrikářských prací, pronájmu plošiny a dopravy.

Cena celkem bez DPH 96 350 Kč bez DPH

Cena je bez DPH, které bude fakturováno v době realizace díla dle platných daňových předpisů

Děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci.

V Táboře, dne 12.7.2024

Pocasi: 27-31°C, Polojasno

11.7.24

Pracovníci: THP (Pípal)

Četa zemních prací

Stroje: Bagr, Načes, 8x4

Pracovní doba: 7⁰⁰-12⁰⁰; 13⁰⁰-17⁰⁰Provaldění práce: odstranění osrus, zabradli/
a žirice z chodníků

dle ZÁKLADNÍ ZÁMĚRY A DOBŮ PROVEDENÍ STAVBY
OBJEDNATEL V SOULADU S ČLÁNKEM 6.4 PŘÍM. 6)
SMLUVY O DÍLO C. VÝDAVA POKYU KE
EMENÉ ROZSAHU DÍLA A TO:

- VODNÍK, ZABRADLI, A JAKOŽE BY JIŽ OBEZRA K AUTORIZOVANÉ
KAPACITĚ (OBEZRA ZED VLEVO PŘED MOSTEM). ZKOTOVITEL
PROVEDE PRODLUŽENÍ ROZSAHU PRACÍ O CCA 10 m,
AŽ ZA KONEC STAVBYČHO ZABRADLI A OPEŘE
BÍDKY. K ZASTIŽENÍ JE TO, EMENY DOŠLO PO ODJEZDU
STAVBYČHO STAVU OPEŘE BÍDKY A ŘÍMY, KTERA
JE V HORU N STAVU, NEŽ BYLO ZANĚVĚNO V
PROJEKTU.

TATO EMENÁ BUDE ZKOTOVITELEM ADMINISTROVÁNA
POSTUPEM, STANOVENÝM VE SMLUVĚ. ,
AUTORSKÝ DOZOR, S TÍMTO VÝDAJEM POKYU
SOULASÍ A KDA OFICIÁLNÍ STANOVISEK,
ZE STRANY ZKOTOVITELE BUDE ZARUČENA
PŘEDNÁ DEFICITE ROZSAHU A LADČNOSTI PRACÍ.

Lucie Janáková
OBJEDNATEL

Jan Pípal
HSI

Zápis investora:

Potřeba odstranění NH VO v
mostovce. Souhlasíme s provedením
k dnešnímu dni. A opětovně
zapojení v pondělí
