



S00AP00S159K

DVNU 104/05/2017

S 10

60

DODATEK č. 1



ke



SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 032/NCTC
Číslo smlouvy objednatele: 04/01/ORI-OVZ/2017
Číslo Dodatku č. 1: 30/08/18/2017

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: Statutární město Prostějov
Sídlo: Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: primátorkou města Prostějova, RNDr. Alencou Raškovou
Ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Fišerem, 1. náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015
Ve věcech technických: Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova
Ing. Petr Brückner, pracovníkem Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova
IČ: 00288659
DIČ: CZ00288659
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: STRABAG a.s.
Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsán ve veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupený: Ing. Ladislavem Jančíkem, ředitelem oblasti Střed, OZ Morava, Dopravní stavitelství – jednajícím na základě plné moci
a
Zdeňkem Ptačovským, vedoucím OTÚ oblasti Střed, OZ Morava, Dopravní stavitelství – jednajícím na základě plné moci
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Tomáš Chromčík, vedoucí PJ Prostějov
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 04/01/ORI-OVZ/2017 ze dne 25. 4. 2017, jejímž předmětem je stavba „Náměstí spojenců, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, úprava hracích ploch, Prostějov“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění se mění takto:

Původní text odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.2.2. Termín dokončení III. a IV. etapy: nejpozději do: 20. 8. 2017

Termín dokončení I. a II. etapy: nejpozději do : 20. 5. 2018

K posunutí termínu došlo z důvodu navýšení prací a klimatických podmínek.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 04/01/ORI-OVZ/2017 ze dne 25. 4. 2017, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdržel Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha a nedílná součást dodatku č. 1 :

1. Harmonogram postupu prací

Smlouvu přezkoumal:

V Prostějově


V Olomouci dne 9. 8. 2017

Ing. Ladislav Jančík
ředitel oblasti Střed
OZ Morava
Dopravní stavitelství
STRABAG a.s.

Zdeněk Ptačovský
Vedoucí OTÚ oblasti Střed
OZ Morava
Dopravní stavitelství
STRABAG a.s.



HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
„Náměstí Spojenců, Prostějov - úpravy komunikací, chodníků, hracích ploch a veřejného osvětlení“

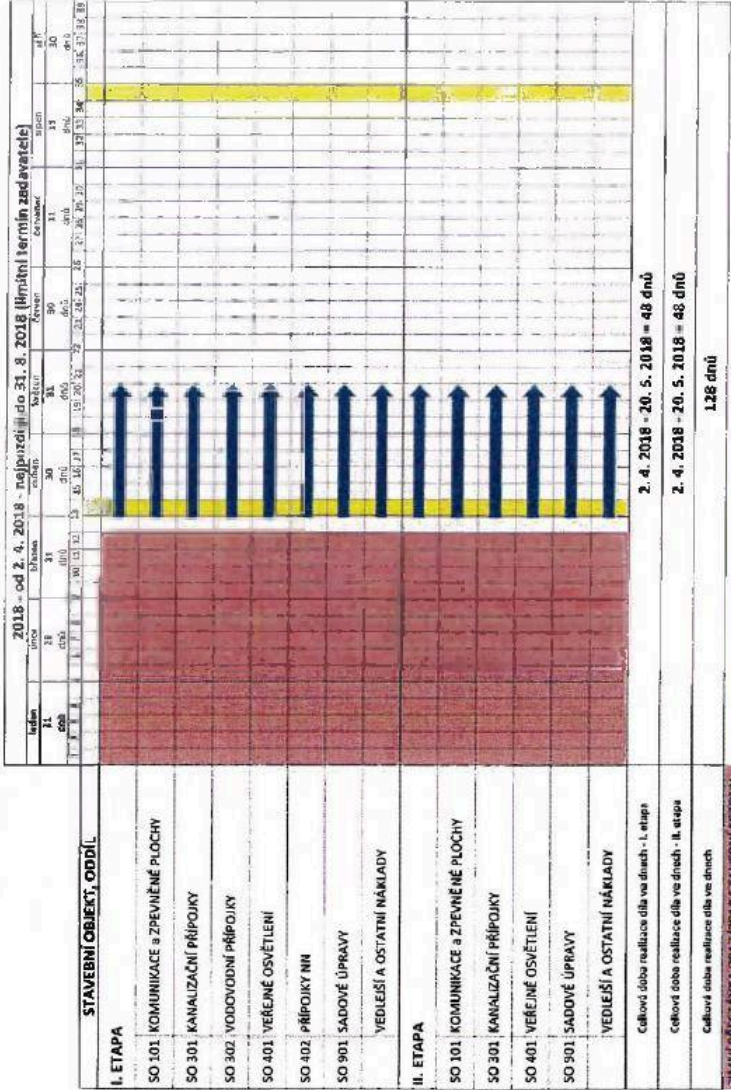

ZÁKLADNÍ PŘEDMĚT PRÁCE: ÚPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
 STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744
 V Olomouci dne: 9. 8. 2017

