



Změna během výstavby č. 5

ze dne 13.6.2025

Název stavby:	TTV Výstupní Ústí n.L. DPmUL PDPS		
Číslo smluvního vztahu:	MIROS24200361		
Název části stavby (PS, SO):	SO 651, SO 661		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dle projektové dokumentace vypracované Trakční trolejové vedení Výstupní, Ústí nad Labem“, zpracované v 03/2024 společností STOSMOL, s.r.o. (dále jen „DPS“), včetně všech příloh a součástí této DPS; a společného povolení Drážního úřadu ze dne 29. 12. 2023, č. j. DUCR-78650/23/Ce, které nabylo právní moci dne 24. 1. 2024 v rozsahu určitých částí zde zmíněných objektů: SO 651 Trakční trolejové vedení Výstupní a SO 661 Trakční kabelové vedení Výstupní.			
Nové řešení: - viz. jednotlivé ZL č. 10			
Zdůvodnění změny: - viz. jednotlivé ZL č. 10			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		ano/ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:		Karel Lank	
Vliv změny na smluvní cenu:		ano/ne	

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099



Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	+ 0 Kč
Nová cena díla bez. DPH:	Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.6.2025
Nový termín dokončení díla:	30.11.2025 (dokladová část stavby bude předána do 31.12.2025)

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Adam Hořejší

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Stanislav Jokiel

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Lukáš Spal

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha: Změnové listy ZL č. 10.

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099



MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099

Číslo zakázky : 24038

Název zakázky : Výstupní-TTV

ZL č.10

Požadavek zadal :

Adam Hořejší

Datum zadání :

11.06.2025

Zpracovává :

Stanislav Jokiel

Termín zpracování :

13.06.2025


NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : **Žádost o prodloužení termínu dokončení díla do 30.11.2025**

PŘÍČINA / DŮVOD : Z důvodů kolize nových základů TTV č. 61, 62, 63, 64 a 65 s inž.sítěmi ČEZ Distribuce došlo k jejich posunu do nových konstrukcí stavby-gabionu., které jsou součástí rekonstrukce ulice Výstupní-investiční akce Statutárního města Ústí n.L.. Rekonstrukce ulice Výstupní je také v kolizi s IS ČEZ Distribuce a tato stavba si vyžádala přeložku této IS, kterou investuje a realizuje Statutární město Ústí n.L.. Jelikož jsou základy TTV Výstupní (DPMÚL) zabudovány do nových konstrukcí rekonstrukce ulice Výstupní (SM Ústí n.L.), tak je nelze bez realizace přeložky ČEZ Distribuce zrealizovat a dílo dokončit. Výstavba základů TTV č. 61-65 bude tedy pokračovat až po dokončení přeložky IS ČEZ Distribuce, která je dle informací od investora přeložky a zhotovitele přeložky ČEZ plánována na srpen-září 2025. Na základě těchto výše uvedených důvodů a skutečností žádá zhotovitel základů TTV Výstupní a prodloužení termínu dokončení díla do 30.11.2025, s tím že kompletní dokladová část bude dodána do 31.12.2025.

Tyto práce mají vliv na termín dokončení díla.

POPIS / SCHEMA :

Příloha :

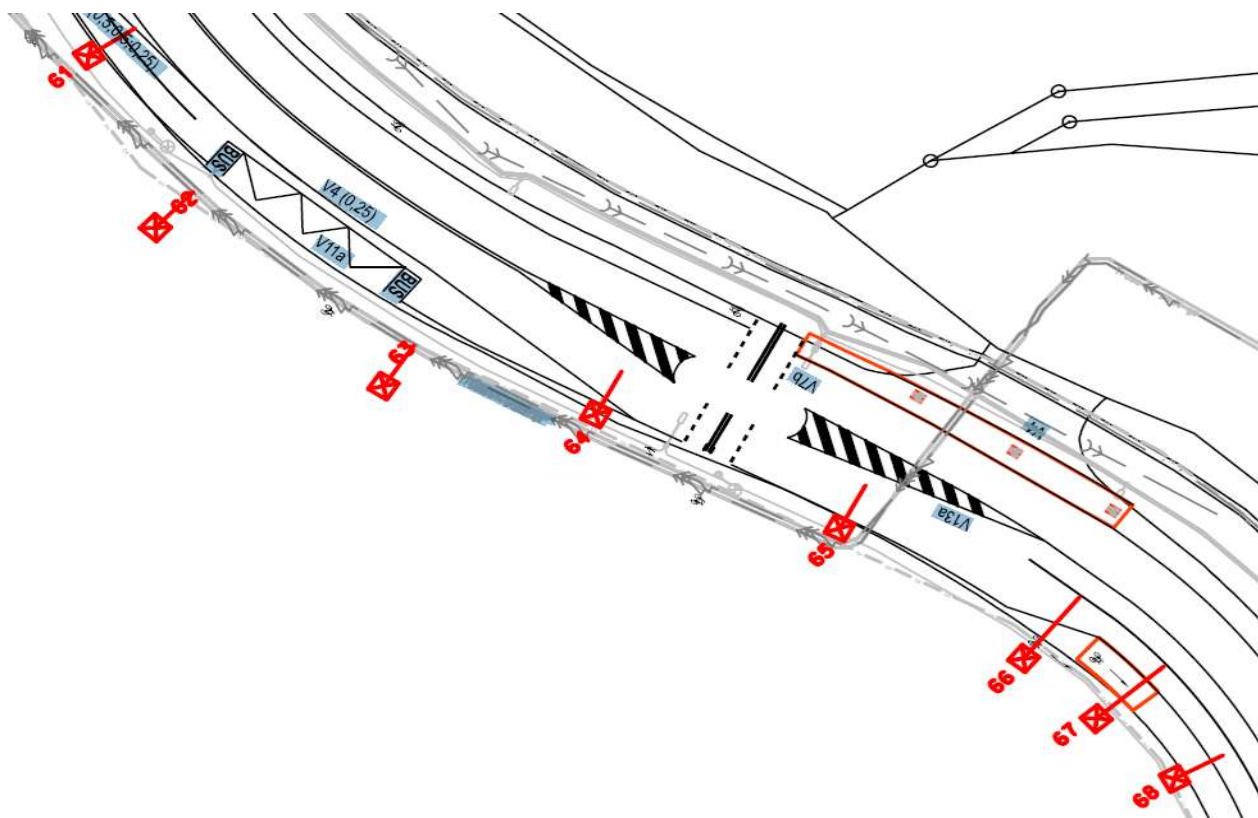

Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a budou mít vliv na termín dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :

Adam Hořejší
Stavbyvedoucí

Odsouhlasil :

Karel Lank
Technický dozor investora
