

Projekt „Simulační centrum intenzivní medicíny“ je financován Evropskou unií z nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR

## **Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2203200857**

**na provedení projektových činností, inženýrských činností  
a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek  
vybavení v rámci projektu**

**„Simulační centrum intenzivní medicíny“**

**uzavřené mezi**

**Fakultní nemocnicí v Motole**

**a**

**PORR a.s.**

## PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) v průběhu realizace Díla dle Smlouvy č. 2203200857 na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu „Simulační centrum intenzivní medicíny“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 22. 12. 2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.7.2024 a Dodatku č. 2 ze dne 25.9.2024 (dále jen „**Smlouva**“) bylo nutné některé dílčí části realizovat mírně odlišným způsobem od původního záměru Objednatele, neboť vyvstaly okolnosti, které Objednatel postupující s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto okolnosti nebyly zahrnuty ve znění Smlouvy, nicméně provedení dalších prací, dodávek a služeb je nezbytné pro splnění původního závazku ze Smlouvy, přičemž méněpráce a vícepráce, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 3, a jejich podrobný popis, odůvodnění a ocenění jsou uvedeny v přehledu změn v příloze č. 1 tohoto dodatku;
- (B) V průběhu realizace Díla došlo jmenováním ke změně osoby zastupující Objednatele, kterého nyní zastupuje MUDr. Petr Polouček, MBA;
- (C) V průběhu realizace Díla došlo ke změně kontaktní osoby objednatele; Smluvní strany shodně konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o změnu, (i) která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, neboť nemění předmět veřejné zakázky, (ii) zároveň výše uvedená změna smlouvy není změnou závazku, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, neboť nedochází k žádné změně ekonomické rovnováhy a (iii) zároveň výše uvedená změna smlouvy nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky;
- (D) pro odstranění jakýchkoliv pochybností a případných budoucích sporů mají Smluvní strany zájem shrnout a odůvodnit vzniklé skutečnosti, a tudíž upravit některá práva a povinnosti podle Smlouvy tak, aby tyto odpovídaly nově vzniklému stavu, a toto vše provést v souladu s čl. 5. odst. 5.4. a čl. 33. odst. 33.6. Smlouvy, tj. formou dodatku č. 3 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 3**“), a dále v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TENTO DODATEK Č. 3:

### 1 SMLUVNÍ STRANY

#### **Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace**

se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

IČO: 00064203

DIČ: CZ00064203

zastoupená: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **PORR a.s.**

se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

číslo bankovního účtu: Raiffeisenbank a.s. - 1091107720/5500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

zastoupená: Ing. Dušanem Čížkem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Řípou, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jen „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jen „Smluvní strana“)

## 2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 V důsledku skutečností a zjištění, uvedených v Preambuli tohoto Dodatku č. 3 došlo k méněpracím a vícepracím, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 3 a jejichž podrobný popis, odůvodnění a ocenění je uvedeno v přehledu změn v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (jedná se o změny v celkové hodnotě 5 411 639,73 Kč bez DPH).
- 2.2 Obsah ustanovení čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*Celková cena Díla, kterou se Objednatel zavazuje Zhotoviteli uhradit za provedení celého Díla podle této Smlouvy, činí:*

|                                      |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Celková cena Díla bez DPH:</i>    | <i>467.027.760,64 Kč (slovy: čtyři sta šedesát sedm milionů dvacet sedm tisíc sedm set šedesátkorun českých šedesát čtyři haléřů)</i> |
| <i>DPH:</i>                          | <i>98.075.829,73 Kč (slovy: devadesát osm milionů sedmdesát pět tisíc osm set dvacet devět korun českých sedmdesát tři haléřů)</i>    |
| <i>Celková cena Díla včetně DPH:</i> | <i>565.103.590,37 Kč (slovy: pět set šedesát pět milionů sto tři tisíc pět set devadesát korun českých třicet sedm haléřů)</i>        |

- 2.3 Změnové listy ZL 01 až ZL 10 jsou v souladu s ustanovením čl. 11. odst. 11.7. Smlouvy přílohou tohoto Dodatku č. 3 a stávají se neoddělitelnou součástí Smlouvy.
- 2.4 Obsah čl. 26. odst. 26.3. písm. a) Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:  
„Všeobecně pověřeným zaměstnancem Objednatele je:  
[redacted] rovozně technický náměstek, [redacted]“
- 2.5 Obsah čl. 26. odst. 26.6. písm. a) Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:  
„V provozních záležitostech souvisejících s prováděním Díla jsou za Objednatele oprávněni jednat níže uvedené osoby:  
[redacted] rovozně technický náměstek [redacted]“
- 2.6 Obsah čl. 26. odst. 26.12. písm. a) Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:  
„V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol  
Datová schránka: nk8bxj3  
E-mai [redacted]“

## 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů, nabývá Dodatek č. 3 účinnosti uveřejněním v registru smluv. Zhotovitel s uveřejněním Dodatku č. 3 v registru smluv souhlasí.

- 3.3 Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě je vyhotoven v 1 elektronickém originálu, jedná se o jedno vyhotovení s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1: Seznam změnových listů s oceněním


Příloha č. 2: Změnové listy ZL 01, ZL 02, ZL 03, ZL 04, ZL 05, ZL 06, ZL 07, ZL 08, ZL 09, ZL 10.

V Praze dne viz elektronický podpis



Fakultní nemocnice v Motole,  
státní příspěvková organizace  
MUDr. Petr Polouček, MBA  
ředitel

V Praze dne viz elektronický podpis



PORR a.s.  
Ing. Dušan Čížek, MBA  
předseda představenstva

V Praze dne viz elektronický podpis



PORR a.s.  
Ing. Peter Suchý  
člen představenstva

## Celková rekapitulace

V Praze dne 16.07.2025

Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole  
Zhotovitel: PORR a.s.

IČO: 00064203  
IČO: 43005560

|          |                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba : | FN Motol - Simulační centrum intenzivní medicíny                                                                                                                                                          |
| Smlouva  | Smlouva č. 2203200857 na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících<br>dodávek vybavení v rámci projektu - Simulační centrum intenzivní medicíny |
| Objekt : | <b>Změnové listy č. 04 až10</b>                                                                                                                                                                           |

## Cena ze smlouvy

461 616 120,91

|  | Popis                    | MJ | Množství | Cena celkem [CZK]<br>základní smlouvy | Celková cena dodatku č.3 | Cena smlouvy vč.<br>dodatku č. 3 |
|--|--------------------------|----|----------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|  |                          |    |          |                                       |                          |                                  |
|  | Cena v Kč bez DPH        |    |          | 461 616 120,91                        | 5 411 639,73             | 467 027 760,64                   |
|  | Výše DPH 21%             |    |          | 96 939 385,39                         | 1 136 444,34             | 98 075 829,73                    |
|  |                          |    |          |                                       |                          |                                  |
|  |                          |    |          |                                       |                          |                                  |
|  | Cena celkem v Kč vč. DPH |    |          | 558 555 506,30                        | 6 548 084,07             | 565 103 590,37                   |

Rekapitulace včetně posouzení přípustnosti změn závazku ze smlouvy

V Praze dne 19.05.2025

Objednatel Fakultní nemocnice v Motole IČO: 00064203  
Zhotovitel: PORR a.s. IČO: 43005560

|          |                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba : | Simulační centrum intenzivní medicíny                                                                                                                                              |
| Smlouva  | Smlouva č. 2203200857 na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu - Simulační centrum |
| Objekt : | Změnové listy č. 04 až 10                                                                                                                                                          |

| Cena ze smlouvy                    |                                                     |       |          | 461 616 120,91                |                              |                        | 461 616 120,91 |                                                              |             |                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| PČ ZL                              | Popis                                               | MJ    | Množství | Cena celkem [CZK]<br>přípočet | Cena celkem [CZK]<br>odpočet | Celkem cena bez<br>DPH | procenta ke SM | Celkem pro účely<br>posouzení dle § 222<br>ZZVZ v Kč bez DPH | § 222 odst. | procenta k<br>absolutní hodnotě<br>ZL ke SM |
| 04                                 | Změna - publicita - dodatečný požadavek objednatele | celek | 1,000    | 35 474,63                     | -150 000,00                  | -114 525,37            | -0,02%         | 185 474,63                                                   | 4           | 0,04%                                       |
| 05                                 | Změna - trasy připojovacího bodu elektro pro ZS     | celek | 1,000    | 300 578,09                    | -54 080,00                   | 246 498,09             | 0,05%          | 246 498,09                                                   | 6           | 0,05%                                       |
| 06                                 | Změna - náhradní výsadba vč. splnění požadavků DOSS | celek | 1,000    | 161 842,68                    | 0,00                         | 161 842,68             | 0,04%          | 161 842,68                                                   | 6           | 0,04%                                       |
| 07                                 | Změna - stavební suť - výkopy stavební jámy         | celek | 1,000    | 5 712 110,59                  | -2 321 961,14                | 3 390 149,45           | 0,73%          | 3 390 149,45                                                 | 6           | 0,73%                                       |
| 08                                 | Změna - podepření technologického kanálu            | celek | 1,000    | 1 154 806,70                  | 0,00                         | 1 154 806,70           | 0,25%          | 1 154 806,70                                                 | 6           | 0,25%                                       |
| 09                                 | Změna - analýza klimatického dopadu                 | celek | 1,000    | 173 132,18                    | 0,00                         | 173 132,18             | 0,04%          | 173 132,18                                                   | 6           | 0,04%                                       |
| 10                                 | Změna - pilotová stěna                              | celek | 1,000    | 439 026,36                    | -39 290,36                   | 399 736,00             | 0,09%          | 399 736,00                                                   | 6           | 0,09%                                       |
|                                    |                                                     |       |          |                               |                              |                        |                |                                                              |             |                                             |
|                                    |                                                     |       |          |                               |                              |                        |                |                                                              |             |                                             |
|                                    |                                                     |       |          |                               |                              |                        |                |                                                              |             |                                             |
| Celkem ZL č. 04 až 10 v Kč bez DPH |                                                     |       |          | 7 976 971,23                  | -2 565 331,50                | 5 411 639,73           | 1,17%          | 5 711 639,73                                                 |             | 1,24%                                       |

|                                           |                            |                           |              |                       |                    |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| Změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 3 | Součet změn dle § 222 ZZVZ | Zkrácená charakteristika  | Součet       | Poměr ke smluvní ceně | Zákonný limit      |
|                                           | § 222 odst. 4              | ostatní činnosti          | 185 474,63   | 0,04%                 | 14,99%             |
|                                           | § 222 odst. 5              | nezbytné dodatečné práce  | 0,00         | 0,00%                 | vícepráce max. 30% |
|                                           | § 222 odst. 6              | nepředvídatelné okolnosti | 5 526 165,10 | 1,20%                 |                    |
|                                           | Kontrolní součet           |                           | 5 711 639,73 | 1,24%                 |                    |

|              |              |  |  |
|--------------|--------------|--|--|
| ZMĚNOVÝ LIST | číslo: ZL 04 |  |  |
|--------------|--------------|--|--|

# Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny - Vyjmutí publicity objektu

V Praze dne 05.02.2025

**Zhotovitel:** PORR, a.s.  
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

**Objednatel:** Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace  
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem<br>přípočet | Cena celkem odpočet | Cena celkem | cenová úroveň |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------|

|                              |  |  |  |  |  |  |                  |                    |                    |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>Celkem stavební práce</b> |  |  |  |  |  |  | <b>35 474,63</b> | <b>-150 000,00</b> | <b>-114 525,37</b> |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|--------------------|--------------------|--|

|   |   |         |                                                                                              |     |        |            |           |             |             |                                          |
|---|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-----------|-------------|-------------|------------------------------------------|
| 1 | K | SOD     | Zajištění publicity projektu                                                                 | kpl | -1,000 | 150 000,00 |           | -150 000,00 | -150 000,00 | cena z kontrolního rozpočtu rekapitulace |
| 2 | K | IND     | Základní kámen                                                                               | kpl | 1,000  | 14 727,01  | 14 727,01 | 0,00        | 14 727,01   | individuální cena - doklad č.1           |
| 3 | K | IND     | Poklepová kladívka                                                                           | kus | 8,000  | 1 494,25   | 11 954,00 | 0,00        | 11 954,00   | individuální cena - doklad č.2           |
| 4 | K | IND     | Gravírovaná mosazná cedule                                                                   | kus | 1,000  | 6 599,62   | 6 599,62  | 0,00        | 6 599,62    | individuální cena - doklad č.3           |
| 5 | K | HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník - doprava kladívek a cedule                 | hod | 2,000  | 331,00     | 662,00    | 0,00        | 662,00      | KROS CÚ 2022/II.                         |
| 6 | K | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - montáž informační tabule SCIM dodané objednatelem | hod | 4,000  | 383,00     | 1 532,00  | 0,00        | 1 532,00    | KROS CÚ 2022/II.                         |

## ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL 05

## Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny - Trasy připojovacího bodu elektro pro ZS

V Praze dne 05.02.2025

**Zhotovitel:** PORR, a.s.  
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

**Objednatel:** Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace  
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

| PČ                           | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem připočet | Cena celkem odpočet | Cena celkem       | cenová úroveň                                  |
|------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Celkem stavební práce</b> |     |           |                                                                                                                           |    |          |              | <b>300 578,09</b>    | <b>-54 080,00</b>   | <b>246 498,09</b> |                                                |
|                              | D   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                       |    |          |              | 3 297,12             | 0,00                | 3 297,12          |                                                |
|                              | D   | 1         | Zemní práce                                                                                                               |    |          |              | 3 170,32             | 0,00                | 3 170,32          |                                                |
| 1                            | K   | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých                                                                                        | m  | 2,000    | 146,000      | 292,00               |                     | 292,00            | KROS CÚ 2022/II.                               |
| 2                            | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                 | m3 | 2,400    | 328,00       | 787,20               |                     | 787,20            | cena z kontrol.rozpočtu D.1.1.1 poř.č.19       |
|                              |     |           | "zemina" 0,8*5*0,6                                                                                                        |    | 2,400    |              |                      |                     |                   |                                                |
| 3                            | K   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 16,800   | 25,30        | 425,04               |                     | 425,04            | cena z kontrol.rozp. D.1.1.1 poř.č.20          |
|                              |     |           | "zemina" 2,4*7                                                                                                            |    | 16,800   |              |                      |                     |                   |                                                |
|                              |     |           | Součet                                                                                                                    |    | 16,800   |              |                      |                     |                   |                                                |
| 4                            | K   | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                | t  | 4,320    | 291,00       | 1 257,12             |                     | 1 257,12          | cena z kontrol.rozp. D.1.1.1 poř.č.22          |
|                              |     |           | "zemina" 2,4*1,8                                                                                                          |    | 4,320    |              |                      |                     |                   |                                                |
|                              |     |           | Součet                                                                                                                    |    | 4,320    |              |                      |                     |                   |                                                |
| 5                            | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                              | m3 | 2,400    | 22,40        | 53,76                |                     | 53,76             | cena z kontrol.rozp. D.1.1.1 poř.č.23          |
|                              |     |           | "zemina" 2,4                                                                                                              |    | 2,400    |              |                      |                     |                   |                                                |
|                              |     |           | Součet                                                                                                                    |    | 2,400    |              |                      |                     |                   |                                                |
| 6                            | K   | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním                                                           | m3 | 2,400    | 148,00       | 355,20               |                     | 355,20            | cena z kontrol.rozp. D.1.1.1 poř.č.24          |
|                              | D   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                       |    |          |              | 126,80               | 0,00                | 126,80            |                                                |
| 7                            |     | 979021113 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí                                      | m  | 2,000    | 63,40        | 126,80               |                     | 126,80            | KROS CÚ 2022/II.                               |
|                              | D   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                       |    |          |              | 264 070,00           | -54 080,00          | 209 990,00        |                                                |
|                              | D   | 741       | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                             |    |          |              | 264 070,00           | -54 080,00          | 209 990,00        |                                                |
| 8                            | K   | 741110003 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně                                                                    | m  | 280,000  | 44,20        | 12 376,00            |                     | 12 376,00         | KROS CÚ 2022/II.                               |
| 9                            | M   | 34571355  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm HDPE+LDPE 280° 1,05                        | m  | 294,000  | 106,00       | 31 164,00            |                     | 31 164,00         | KROS CÚ 2022/II.                               |
|                              |     |           |                                                                                                                           |    | 320,250  |              |                      |                     |                   |                                                |
| 10                           | K   | 741110003 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně                                                                    | m  | -80,000  | 44,20        |                      | -3 536,00           | -3 536,00         | KROS CÚ 2022/II. odpočet z kontrol.rozp.kpl ZS |
| 11                           | M   | 34571355  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE                                 | m  | -84,000  | 106,00       |                      | -8 904,00           | -8 904,00         | KROS CÚ 2022/II. odpočet z kontrol.rozp.kpl ZS |
|                              |     |           | -84                                                                                                                       |    | -84,000  |              |                      |                     |                   |                                                |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem připočet | Cena celkem odpočet | Cena celkem | cenová úroveň                                         |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 12 | K   | 741123233 | Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený volně (např. AYKY)      | m   | -80,000  | 53,60        |                      | -4 288,00           | -4 288,00   | KROS CÚ 2022/II.<br>odpočet z<br>kontrol.roz. kpl. 7S |
| 13 | M   | 34113229  | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x150+70mm2                             | m   | -92,000  | 406,00       |                      | -37 352,00          | -37 352,00  | KROS CÚ 2022/II.<br>odpočet z<br>kontrol.roz. kpl. 7S |
|    |     |           | -92                                                                                                  |     | -92,000  |              |                      |                     |             |                                                       |
| 14 | K   | 741123318 | Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený pevně (např. AYKY)      | m   | 280,000  | 96,00        | 26 880,00            |                     | 26 880,00   | KROS CÚ 2022/II.                                      |
| 15 | M   | 34113241  | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2                            | m   | 322,000  | 555,00       | 178 710,00           |                     | 178 710,00  | KROS CÚ 2022/II.                                      |
|    |     |           | 280 * 1,15                                                                                           |     | 350,750  |              |                      |                     |             |                                                       |
| 16 | K   | 741136005 | Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 3x185+95-240+120 mm2                | kus | 2,000    | 3940,00      | 7 880,00             |                     | 7 880,00    | KROS CÚ 2022/II.                                      |
| 17 | M   | 35436032  | spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-185 3-47 x120-185mm                                   | kus | 2,000    | 3530,00      | 7 060,00             |                     | 7 060,00    | KROS CÚ 2022/II.                                      |
|    | D   | M         | Práce a dodávky M                                                                                    |     |          |              | 33 210,97            | 0,00                | 33 210,97   |                                                       |
|    | D   | 46-M      | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                    |     |          |              | 33 210,97            | 0,00                | 33 210,97   |                                                       |
| 18 | K   | 460010024 | Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru                                    | km  | 0,300    | 1620,00      | 486,00               |                     | 486,00      | KROS CÚ 2022/II.                                      |
| 19 | K   | 460161312 | Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3                             | m   | 5,000    | 870,00       | 4 350,00             |                     | 4 350,00    | KROS CÚ 2022/II.                                      |
| 20 | K   | 460171272 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3               | m   | 5,000    | 173,00       | 865,00               |                     | 865,00      | KROS CÚ 2022/II.                                      |
| 21 | K   | 460431292 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3                    | m   | 5,000    | 147,00       | 735,00               |                     | 735,00      | KROS CÚ 2022/II.                                      |
| 22 | K   | 460431662 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 80 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3                    | m   | 5,000    | 209,00       | 1 045,00             |                     | 1 045,00    | KROS CÚ 2022/II.                                      |
| 23 | K   | 460661313 | Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté betonovou deskou š lože přes 40 do 50 cm                   | m   | 5,000    | 187,00       | 935,00               |                     | 935,00      | KROS CÚ 2022/II.                                      |
| 24 | K   | 460881114 | Kryt vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm                   | m2  | 5,000    | 828,00       | 4 140,00             |                     | 4 140,00    | KROS CÚ 2022/II.                                      |
| 25 | K   | 460881223 | Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva obrusná tl 5 cm             | m2  | 5,000    | 403,00       | 2 015,00             |                     | 2 015,00    | KROS CÚ 2022/II.                                      |
| 26 | K   | 460891121 | Osazení betonového obrubníku silničního ležatého do betonu při elektromontážích                      | m   | 2,000    | 302,00       | 604,00               |                     | 604,00      | KROS CÚ 2022/II.                                      |
| 27 | K   | 468011131 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl do 15 cm         | m2  | 3,000    | 728,00       | 2 184,00             |                     | 2 184,00    | KROS CÚ 2022/II.                                      |
|    |     |           | "hloubka 15cm" 0,6*5                                                                                 |     | 3,000    |              |                      |                     |             |                                                       |
|    |     |           | Součet                                                                                               |     | 3,000    |              |                      |                     |             |                                                       |
| 28 | K   | 468011132 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl přes 15 do 30 cm | m2  | 4,000    | 1230,00      | 4 920,00             |                     | 4 920,00    | KROS CÚ 2022/II.                                      |
| 29 | K   | 468011142 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm          | m2  | 4,000    | 222,00       | 888,00               |                     | 888,00      | KROS CÚ 2022/II.                                      |
| 30 | K   | 468041123 | Řezání živичného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm                        | m   | 10,000   | 186,00       | 1 860,00             |                     | 1 860,00    | KROS CÚ 2022/II.                                      |
| 31 | K   | 468051131 | Bourání základu železobetonového při elektromontážích                                                | m3  | 0,875    | 6440,00      | 5 635,00             |                     | 5 635,00    | KROS CÚ 2022/II.                                      |
|    |     |           | "žb panel pod komunikaci" 5*0,5*0,350                                                                |     | 0,875    |              |                      |                     |             |                                                       |
| 32 | K   | 469972111 | Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km                                           | t   | 2,075    | 547,00       | 1 135,03             |                     | 1 135,03    | KROS CÚ 2022/II.                                      |
|    |     |           | 0,5*2,4                                                                                              |     | 1,200    |              |                      |                     |             |                                                       |
|    |     |           | 0,875 "žb vrstvy pod komunikaci"                                                                     |     | 0,875    |              |                      |                     |             |                                                       |
|    |     |           | Součet                                                                                               |     | 2,075    |              |                      |                     |             |                                                       |
| 33 | K   | 469972121 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km                  | t   | 30,125   | 18,90        | 569,36               |                     | 569,36      | KROS CÚ 2022/II.                                      |
|    |     |           | 0,5*2,4*20                                                                                           |     | 24,000   |              |                      |                     |             |                                                       |
|    |     |           | 0,875*7                                                                                              |     | 6,125    |              |                      |                     |             |                                                       |
|    |     |           | Součet                                                                                               |     | 30,125   |              |                      |                     |             |                                                       |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem připočet | Cena celkem odpočet | Cena celkem | cenová úroveň    |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|
| 34 | K   | 469973125 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t  | 1,200    | 557,00       | 668,40               |                     | 668,40      | KROS CÚ 2022/II. |
|    |     |           | "přepočet na m3"0,5*2,4                                                                                                                                 |    | 1,200    |              |                      |                     |             |                  |
| 35 | K   | 469981111 | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotářích                                                                                              | t  | 0,675    | 261,00       | 176,18               |                     | 176,18      | KROS CÚ 2022/II. |

## Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny - Náhradní výsadba vč. splnění požadavků DOSS

V Praze dne 05.02.2025

**Zhotovitel:** PORR, a.s.  
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

**Objednatel:** Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace  
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

| PČ                           | Typ | Kód       | Popis                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem připočet | Cena celkem odpočet | Cena celkem       | cenová úroveň                         |
|------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|
| <b>Celkem stavební práce</b> |     |           |                                                                                                          |     |          |              | <b>161 842,68</b>    | <b>0,00</b>         | <b>161 842,68</b> |                                       |
|                              | D   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                      |     |          |              | 161 842,68           | 0,00                | 161 842,68        |                                       |
|                              | D   | 1.02      | Výsadba soliterních stromů vel. 16-18                                                                    |     |          |              | 142 192,64           | 0,00                | 142 192,64        |                                       |
| 1                            | K   | 183101221 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 11,000   | 1 570,00     | 17 270,00            |                     | 17 270,00         | cena z kontrol.rozpčtu D.502 poř.č. 2 |
| 2                            | M   | 10321100  | zahradní substrát pro výsadbu VL                                                                         | m3  | 2,750    | 1 370,00     | 3 767,50             |                     | 3 767,50          | cena z kontrol.rozp.D.502 poř.č. 3    |
| 3                            | K   | 184102114 | Výsadba dřevin s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5                   | kus | 16,000   | 346,00       | 5 536,00             |                     | 5 536,00          | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 4   |
| 4                            | M   | 026X.001  | dodání stromů (školkařské výpěstky s balem vel. 16-18)                                                   | kus | 11,000   | 7 800,00     | 85 800,00            |                     | 85 800,00         | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 5   |
| 5                            | K   | 184215133 | Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m               | kus | 11,000   | 323,00       | 3 553,00             |                     | 3 553,00          | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 6   |
| 6                            | M   | 60591257  | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m                                                          | kus | 33,000   | 179,00       | 5 907,00             |                     | 5 907,00          | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 7   |
|                              | VV  |           | 11*3 'Přepočtené koeficientem množství                                                                   |     | 48,000   |              |                      |                     |                   |                                       |
| 7                            | K   | 184215413 | Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5                               | kus | 11,000   | 109,00       | 1 199,00             |                     | 1 199,00          | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 8   |
| 8                            | M   | 10364100  | zemina pro terénní úpravy - tříděná                                                                      | t   | 0,055    | 273,00       | 15,02                |                     | 15,02             | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 9   |
|                              | VV  |           | 11*0,005 'Přepočtené koeficientem množství                                                               |     | 0,080    |              |                      |                     |                   |                                       |
| 9                            | K   | 184215X01 | Dodání a zhotovení ochranného nátěru kmene                                                               | kus | 15,840   | 185,00       | 2 930,40             |                     | 2 930,40          | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 10  |
|                              | VV  |           | 0,48*3*11                                                                                                |     | 15,840   |              |                      |                     |                   |                                       |
| 10                           | K   | 184801121 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5                                         | kus | 11,000   | 88,70        | 975,70               |                     | 975,70            | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 11  |
| 11                           | K   | 184911421 | Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5                                              | m2  | 22,000   | 44,10        | 970,20               |                     | 970,20            | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 12  |
|                              | VV  |           | 11,000*2                                                                                                 |     | 32,000   |              |                      |                     |                   |                                       |
| 12                           | M   | 10391100  | kůra mulčovací VL                                                                                        | m3  | 3,296    | 1 520,00     | 5 009,92             |                     | 5 009,92          | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 13  |
|                              | VV  |           | 22*0,103 'Přepočtené koeficientem množství                                                               |     | 2,266    |              |                      |                     |                   |                                       |
| 13                           | K   | 185802114 | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5                             | t   | 0,001    | 33 500,00    | 16,75                |                     | 16,75             | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 14  |
|                              | VV  |           | 0,00005*11                                                                                               |     | 0,001    |              |                      |                     |                   |                                       |
| 14                           | M   | 25191155  | hnojivo průmyslové                                                                                       | kg  | 8,000    | 31,20        | 249,60               |                     | 249,60            | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 15  |
| 15                           | K   | 185802114 | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5                             | t   | 0,128    | 33 500,00    | 4 288,00             |                     | 4 288,00          | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 16  |
|                              | VV  |           | 0,008*11                                                                                                 |     | 0,880    |              |                      |                     |                   |                                       |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem přípočet | Cena celkem odpočet | Cena celkem | cenová úroveň                        |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|
| 16 | M   | 2519X.01  | hnojivo dlouhodobě působícího hnojiva                                                                    | kg  | 8,000    | 555,00       | 4 440,00             |                     | 4 440,00    | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 17 |
| 17 | K   | 185804311 | Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2                                                                     | m3  | 0,550    | 481,00       | 264,55               |                     | 264,55      | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 18 |
|    | VV  |           | 0,05*11                                                                                                  |     | 0,550    |              |                      |                     |             |                                      |
|    | D   | 1.04      | Výsadba soliterních stromů vel. 20 - 25                                                                  |     |          |              | 19 650,04            |                     | 19 650,04   |                                      |
| 18 | K   | 183101221 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 1,000    | 1 570,00     | 1 570,00             |                     | 1 570,00    | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 2  |
| 19 | M   | 10321100  | zahradní substrát pro výsadbu VL                                                                         | m3  | 4,000    | 1 370,00     | 5 480,00             |                     | 5 480,00    | cena z kontrol.rozp D.502 poř.č. 2   |
| 20 | K   | 184102115 | Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5                  | kus | 1,000    | 558,00       | 558,00               |                     | 558,00      | KROS CÚ 2022/II.                     |
| 21 | M   | 026X.002  | dodání stromů (školkařské výpěstky s balem vel. 20-25)                                                   | kus | 1,000    | 9 850,00     | 9 850,00             |                     | 9 850,00    | individuální cena - doklad č.4       |
| 22 | K   | 185802114 | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5                             | t   | 0,001    | 33 500,00    | 33,50                |                     | 33,50       | cena z kontrol.rozp D.502 poř.č. 14  |
| 23 | M   | 25191155  | hnojivo průmyslové                                                                                       | kg  | 0,001    | 31,20        | 0,03                 |                     | 0,03        | cena z kontrol.rozp D.502 poř.č. 15  |
| 24 | K   | 185802114 | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5                             | t   | 0,001    | 33 500,00    | 33,50                |                     | 33,50       | cena z kontrol.rozp D.502 poř.č. 16  |
| 25 | M   | 2519X.01  | hnojivo dlouhodobě působícího hnojiva                                                                    | kg  | 1,000    | 555,00       | 555,00               |                     | 555,00      | cena z kontrol.rozp D.502 poř.č. 17  |
| 26 | K   | 184215133 | Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m               | kus | 1,000    | 310,00       | 310,00               |                     | 310,00      | KROS CÚ 2022/II.                     |
| 27 | M   | 60591257  | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m                                                          | kus | 3,000    | 185,00       | 555,00               |                     | 555,00      | KROS CÚ 2022/II.                     |
|    | VV  |           | 1*3 'Přepočtené koeficientem množství                                                                    |     | 3,000    |              |                      |                     |             |                                      |
| 30 | K   | 184215413 | Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5                               | kus | 1,000    | 109,00       | 109,00               |                     | 109,00      | cena z kontrol.rozp D.502 poř.č. 8   |
| 31 | M   | 10364100  | zemina pro terénní úpravy - tříděná                                                                      | t   | 0,005    | 273,00       | 1,37                 |                     | 1,37        | cena z kontrol.rozp D.502 poř.č. 9   |
|    | VV  |           | 1*0,005 'Přepočtené koeficientem množství                                                                |     | 0,005    |              |                      |                     |             |                                      |
| 32 | K   | 184501141 | Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5                                  | m2  | 0,450    | 106,00       | 47,70                |                     | 47,70       | KROS CÚ 2022/II.                     |
| 33 | M   | 61894003  | rákos ohradový neloupaný 60x200cm                                                                        | m2  | 0,495    | 66,40        | 32,87                |                     | 32,87       | KROS CÚ 2022/II.                     |
|    | VV  |           | 0,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                               |     | 0,495    |              |                      |                     |             |                                      |
| 34 | K   | 184801121 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5                                         | kus | 1,000    | 88,70        | 88,70                |                     | 88,70       | cena z kontrol.rozp D.502 poř.č. 11  |
| 35 | K   | 184911421 | Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5                                              | m2  | 2,000    | 44,10        | 88,20                |                     | 88,20       | cena z kontrol.rozp D.502 poř.č. 27  |
| 36 | M   | 10391100  | kůra mulčovací VL                                                                                        | m3  | 0,206    | 1 520,00     | 313,12               |                     | 313,12      | cena z kontrol.rozp D.502 poř.č. 28  |
|    | VV  |           | 2*0,103 'Přepočtené koeficientem množství                                                                |     | 0,206    |              |                      |                     |             |                                      |
| 37 | K   | 185804311 | Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2                                                                     | m3  | 0,050    | 481,00       | 24,05                |                     | 24,05       | cena z kontrol.rozp D.502 poř.č. 29  |

Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny - Rekapitulace - odpad ve stavební jámě (7a,b,c)

V Praze dne 05.02.2025

**Zhotovitel:** PORR, a.s.  
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

**Objednatel:** Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace  
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

| PČ                           | Typ | Kód | Popis                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem<br>nřpočet | Cena celkem<br>odpočet | Cena celkem         | cenová úroveň |
|------------------------------|-----|-----|------------------------------------------|-----|----------|--------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| <b>Celkem stavební práce</b> |     |     |                                          |     |          |              | <b>5 712 110,59</b>    | <b>-2 321 961,14</b>   | <b>3 390 149,45</b> |               |
| 1                            | K   |     | <a href="#">Celkem stavební práce 7a</a> | kpl |          |              | 3 374 235,86           | -1 323 348,16          | 2 050 887,71        |               |
| 2                            | K   |     | <a href="#">Celkem stavební práce 7b</a> | kpl |          |              | 1 772 475,43           | -893 269,97            | 879 205,45          |               |
| 3                            | K   |     | <a href="#">Celkem stavební práce 7c</a> | kpl |          |              | 565 399,31             | -105 343,01            | 460 056,29          |               |
|                              |     |     |                                          |     |          |              |                        |                        |                     |               |

## ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL 07\_a

## Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny - Odpad ve stavební jámě (7a,b,c)

V Praze dne 05.02.2025

Zhotovitel: PORR, a.s.  
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace  
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

| PČ                           | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                               | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem<br>nřinočet | Cena celkem<br>odnočet | Cena celkem         | cenová úroveň                          |
|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| <b>Celkem stavební práce</b> |     |             |                                                                                                                                                     |    |            |              | <b>3 374 235,86</b>     | <b>-1 323 348,16</b>   | <b>2 050 887,71</b> |                                        |
|                              | D   | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                 |    |            |              | 3 374 235,86            | -1 323 348,16          | 2 050 887,71        |                                        |
|                              | D   | 1           | Zemní práce                                                                                                                                         |    |            |              | 1 057 502,11            | -1 323 348,16          | -265 846,05         |                                        |
| 1                            | K   | 131251106   | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně                                                         | m3 | -1 075,900 | 147,00       |                         | -158 157,30            | -158 157,30         | cena z kontrol.rozp. D.1.1.1 poř.č. 12 |
|                              |     |             | "půdorysná oplocha hl výkopu"-1075,9*1                                                                                                              |    | -1 075,900 |              |                         |                        |                     |                                        |
| 2                            | R   | 131251106-R | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně - směs stavebního odpadu (suf, beton, komunální odpad) | m3 | 1 075,900  | 181,33       | 195 092,95              |                        | 195 092,95          | individuální cena - doklad č.5         |
|                              |     |             | "půdorysná oplocha hl výkopu"-1075,9*1                                                                                                              |    |            |              |                         |                        |                     |                                        |
| 3                            | K   | 131251207   | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně                                                         | m3 | -3 227,700 | 224,00       |                         | -723 004,80            | -723 004,80         | cena z kontrol.rozp. D.1.1.1 poř.č. 14 |
|                              |     |             | "hlavní stavební jáma"-1075,9*3                                                                                                                     |    | -3 227,700 |              |                         |                        |                     |                                        |
| 4                            | R   | 131251207-R | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně - směs stavebního odpadu (suf, beton, komunální odpad)    | m3 | 3 227,70   | 267,19       | 862 409,16              |                        | 862 409,16          | individuální cena - doklad č.6         |
|                              |     |             | "hlavní stavební jáma"-1075,9*3                                                                                                                     |    | 3 227,700  |              |                         |                        |                     |                                        |
| 5                            | K   | 162351103   | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tříd těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                 | m3 | -348,164   | 87,80        |                         | -30 568,80             | -30 568,80          | cena z kontrol.rozp. D.1.1.1 poř.č. 18 |
|                              |     |             | -783,37/2,25                                                                                                                                        |    | -348,164   |              |                         |                        |                     |                                        |
| 6                            | K   | 162751117   | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tříd těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                            | m3 | -348,164   | 328,00       |                         | -114 197,79            | -114 197,79         | cena z kontrol.rozp. D.1.1.1 poř.č. 19 |
|                              |     |             | -783,37/2,25                                                                                                                                        |    | -348,164   |              |                         |                        |                     |                                        |
| 7                            | K   | 162751119   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                           | m3 | -2 437,15  | 25,30        |                         | -61 659,92             | -61 659,92          | cena z kontrol.rozp. D.1.1.1 poř.č. 20 |
|                              |     |             | (-783,37/2,25)*7                                                                                                                                    |    | -2 437,151 |              |                         |                        |                     |                                        |
| 8                            | K   | 171201231   | Poplatek za uložení (skládkovné)                                                                                                                    | t  | -783,37    | 291,00       |                         | -227 960,67            | -227 960,67         | cena z kontrol.rozp. D.1.1.1 poř.č. 22 |
|                              |     |             | (-783,37)                                                                                                                                           |    | -783,370   |              |                         |                        |                     |                                        |
| 9                            | K   | 171251201   | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                                                        | m3 | -348,16    | 22,40        |                         | -7 798,87              | -7 798,87           | cena z kontrol.rozp. D.1.1.1 poř.č. 23 |
|                              |     |             | (-783,37/2,25)                                                                                                                                      |    | -348,164   |              |                         |                        |                     |                                        |
|                              |     | 997         | Přesun sutě                                                                                                                                         |    |            |              | 2 316 733,75            | 0,00                   | 2 316 733,75        |                                        |
| 10                           | K   | 997006002   | Hrubé třídění stavebního odpadu                                                                                                                     | t  | 783,37     | 165,00       | 129 256,05              |                        | 129 256,05          | KROS CÚ 2022/II.                       |
|                              |     |             | 783,37                                                                                                                                              |    | 783,370    |              |                         |                        |                     |                                        |
| 11                           | K   | 997002611   | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                                                                                   | t  | 783,37     | 130,00       | 101 838,10              |                        | 101 838,10          | KROS CÚ 2022/II.                       |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                  | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem<br>přínocet | Cena celkem<br>odnocet | Cena celkem  | cenová úroveň                  |
|----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------|
|    |     |              | 783,37                                                                                                                                 |     | 783,370    |              |                         |                        |              |                                |
|    |     |              | Součet                                                                                                                                 |     | 783,370    |              |                         |                        |              |                                |
| 12 | K   | 997006511    | Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m                                                                      | t   | 783,37     | 56,40        | 44 182,07               |                        | 44 182,07    | KROS CÚ 2022/II.               |
|    |     |              | "07/2023"21,2+97,38+56,88                                                                                                              |     | 175,460    |              |                         |                        |              |                                |
|    |     |              | "08/2023"91,5                                                                                                                          |     | 91,500     |              |                         |                        |              |                                |
|    |     |              | Mezisoučet                                                                                                                             |     | 266,960    |              |                         |                        |              |                                |
|    |     |              | "08/2023"329,25+187,16                                                                                                                 |     | 516,410    |              |                         |                        |              |                                |
|    |     |              | Součet                                                                                                                                 |     | 783,370    |              |                         |                        |              |                                |
| 13 | K   | 997006512    | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km                                                            | t   | 783,37     | 176,00       | 137 873,12              |                        | 137 873,12   | KROS CÚ 2022/II.               |
|    |     |              | "07/2023"21,2+97,38+56,88                                                                                                              |     | 175,460    |              |                         |                        |              |                                |
|    |     |              | "08/2023"91,5                                                                                                                          |     | 91,500     |              |                         |                        |              |                                |
|    |     |              | Mezisoučet                                                                                                                             |     | 266,960    |              |                         |                        |              |                                |
|    |     |              | "08/2023"329,25+187,16                                                                                                                 |     | 516,410    |              |                         |                        |              |                                |
|    |     |              | Součet                                                                                                                                 |     | 783,370    |              |                         |                        |              |                                |
| 14 | K   | 997006519    | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                  | t   | 23 024,02  | 17,00        | 391 408,34              |                        | 391 408,34   | KROS CÚ 2022/II.               |
|    |     |              | "odpad 17 01 01"266,96*5                                                                                                               |     | 1 334,800  |              |                         |                        |              |                                |
|    |     |              | "odpad 17 01 07"516,41*42                                                                                                              |     | 21 689,220 |              |                         |                        |              |                                |
|    |     |              | Součet                                                                                                                                 |     | 23 024,020 |              |                         |                        |              |                                |
| 15 | K   | 997013601    | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01                                           | t   | 80,088     | 1 460,00     | 116 928,48              |                        | 116 928,48   | KROS CÚ 2022/II.               |
|    |     |              | "prostý beton"266,96*0,3                                                                                                               |     | 80,088     |              |                         |                        |              |                                |
| 16 | K   | 997013602    | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01                                     | t   | 160,176    | 1 560,00     | 249 874,56              |                        | 249 874,56   | KROS CÚ 2022/II.               |
|    |     |              | "ŽB"266,96*0,6                                                                                                                         |     | 160,176    |              |                         |                        |              |                                |
| 17 | IND | 997013869_R1 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí zeminy, betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t   | 516,410    | 2 111,30     | 1 090 296,43            |                        | 1 090 296,43 | individuální cena - doklad č.7 |
|    |     |              | 516,41                                                                                                                                 |     | 516,410    |              |                         |                        |              |                                |
| 18 | IND | R2           | výluhové zkoušky                                                                                                                       | kpl | 2          | 27 538,30    | 55 076,60               |                        | 55 076,60    | individuální cena - doklad č.8 |
|    |     |              | 2                                                                                                                                      |     | 2,000      |              |                         |                        |              |                                |

## ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL 07\_b

## Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny - Odpad ve stavební jámě (7a,b,c)

V Praze dne 05.02.2025

Zhotovitel: PORR, a.s.  
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace  
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem<br>nářpočet | Cena celkem<br>odpočet | Cena celkem | cenová úroveň |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------|---------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------|---------------|

**Celkem stavební práce** **1 772 475,43** **-893 269,97** **879 205,45**

|    |   |             |                                                                                                                           |    |            |        |              |             |             |                                        |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|-------------|-------------|----------------------------------------|
|    | D | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                                       |    |            |        | 1 772 475,43 | -893 269,97 | 879 205,45  |                                        |
|    | D | 1           | Zemní práce                                                                                                               |    |            |        | 862 409,16   | -893 269,97 | -30 860,81  |                                        |
| 1  | K | 131251207   | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně                               | m3 | -3 227,700 | 224,00 |              | -723 004,80 | -723 004,80 | cena z kontrol.rozp. D 1 1 1 poř.č. 14 |
|    |   |             | "hlavní stavební jáma"-1075,9*3                                                                                           |    | -3 227,700 |        |              |             |             |                                        |
| 2  | R | 131251207-R | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně - směr stavebního odpadu (sut', | m3 | 3 227,70   | 267,19 | 862 409,16   |             | 862 409,16  | individuální cena - doklad č.5         |
|    |   |             | "hlavní stavební jáma"-1075,9*3                                                                                           |    | 3 227,700  |        |              |             |             |                                        |
| 3  | K | 162351103   | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                      | m3 | -134,218   | 87,80  |              | -11 784,32  | -11 784,32  | cena z kontrol.rozp. D 1 1 1 poř.č. 18 |
|    |   |             | (-301,99/2,25)                                                                                                            |    | -134,218   |        |              |             |             |                                        |
| 4  | K | 162751117   | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                 | m3 | -134,218   | 328,00 |              | -44 023,43  | -44 023,43  | cena z kontrol.rozp. D 1 1 1 poř.č. 19 |
|    |   |             | (-301,99/2,25)                                                                                                            |    | -134,218   |        |              |             |             |                                        |
| 5  | K | 162751119   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | -939,52    | 25,30  |              | -23 769,97  | -23 769,97  | cena z kontrol.rozp. D.1.1.1 poř.č. 20 |
|    |   |             | (-301,99/2,25)*7                                                                                                          |    | -939,524   |        |              |             |             |                                        |
| 6  | K | 171201231   | Poplatek za uložení (skládkovné)                                                                                          | t  | -301,99    | 291,00 |              | -87 879,09  | -87 879,09  | cena z kontrol.rozp. D 1 1 1 poř.č. 22 |
|    |   |             | (-301,99)                                                                                                                 |    | -301,990   |        |              |             |             |                                        |
| 7  | K | 171251201   | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                              | m3 | -125,37    | 22,40  |              | -2 808,36   | -2 808,36   | cena z kontrol.rozp. D 1 1 1 poř.č. 23 |
|    |   |             | (-301,99/2,25)                                                                                                            |    | -125,373   |        |              |             |             |                                        |
|    |   | 997         | Přesun sutě                                                                                                               |    |            |        | 910 066,26   | 0,00        | 910 066,26  |                                        |
| 8  | K | 997006002   | Hrubé třídění stavebního odpadu                                                                                           | t  | 301,99     | 165,00 | 49 828,35    |             | 49 828,35   | KROS CÚ 2022/III.                      |
|    |   |             | 301,99                                                                                                                    |    | 301,990    |        |              |             |             |                                        |
| 9  | K | 997006511   | Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 100 m                                                         | t  | 301,990    | 56,40  | 17 032,24    |             | 17 032,24   | KROS CÚ 2022/III.                      |
|    |   |             | "09/2023"27,54+19,9                                                                                                       |    | 47,440     |        |              |             |             |                                        |
|    |   |             | Mezisoučet                                                                                                                |    | 47,440     |        |              |             |             |                                        |
|    |   |             | "09/2023"249,29                                                                                                           |    | 249,290    |        |              |             |             |                                        |
|    |   |             | Mezisoučet                                                                                                                |    | 249,290    |        |              |             |             |                                        |
|    |   |             | "09/2023"5,26                                                                                                             |    | 5,260      |        |              |             |             |                                        |
|    |   |             | Součet                                                                                                                    |    | 301,990    |        |              |             |             |                                        |
| 10 | K | 997006512   | Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km                                               | t  | 301,990    | 176,00 | 53 150,24    |             | 53 150,24   | KROS CÚ 2022/III.                      |



| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                  | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem<br>připočet | Cena celkem<br>odpočet | Cena celkem | cenová úroveň                  |
|----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------|
|    |     |              | "09/2023"27,54+19,9                                                                                                                    |    | 47,440     |              |                         |                        |             |                                |
|    |     |              | Mezisoučet                                                                                                                             |    | 47,440     |              |                         |                        |             |                                |
|    |     |              | "09/2023"249,29                                                                                                                        |    | 249,290    |              |                         |                        |             |                                |
|    |     |              | Mezisoučet                                                                                                                             |    | 249,290    |              |                         |                        |             |                                |
|    |     |              | "09/2023"5,26                                                                                                                          |    | 5,260      |              |                         |                        |             |                                |
|    |     |              | Součet                                                                                                                                 |    | 301,990    |              |                         |                        |             |                                |
| 11 | K   | 997006519    | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                  | t  | 10 634,18  | 17,00        | 180 781,06              |                        | 180 781,06  | KROS CÚ 2022/II.               |
|    |     |              | "odpad 17 01 01"27,54*5                                                                                                                |    | 137,700    |              |                         |                        |             |                                |
|    |     |              | "odpad 17 01 07"249,29*42                                                                                                              |    | 10 470,180 |              |                         |                        |             |                                |
|    |     |              | "odpad 17 09 04"5,26*5                                                                                                                 |    | 26,300     |              |                         |                        |             |                                |
|    |     |              | Součet                                                                                                                                 |    | 10 634,180 |              |                         |                        |             |                                |
| 12 | K   | 997013602    | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01                                     | t  | 47,440     | 1 560,00     | 74 006,40               |                        | 74 006,40   | KROS CÚ 2022/II.               |
|    |     |              | "ŽB"27,54+19,9                                                                                                                         |    | 47,440     |              |                         |                        |             |                                |
| 13 | IND | 997013869_R1 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí zeminy, betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t  | 249,29     | 2 111,30     | 526 325,98              |                        | 526 325,98  | individuální cena - doklad č.7 |
|    |     |              | 249,29                                                                                                                                 |    | 249,290    |              |                         |                        |             |                                |
| 14 | K   | 997013631    | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                             | t  | 5,26       | 1 700,00     | 8 942,00                |                        | 8 942,00    | KROS CÚ 2022/II.               |
|    |     |              | 5,26                                                                                                                                   |    | 5,260      |              |                         |                        |             |                                |

## Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny - Odpad ve stavební jámě (7a,b,c)

V Praze dne 05.02.2025

Zhotovitel: PORR, a.s.  
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace  
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

| PČ                           | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                            | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem<br>nřpočet | Cena celkem<br>odpočet | Cena celkem       | cenová úroveň                             |
|------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| <b>Celkem stavební práce</b> |     |              |                                                                                                                                                  |    |           |              | <b>565 399,31</b>      | <b>-105 343,01</b>     | <b>460 056,29</b> |                                           |
|                              | D   | HSV          | Práce a dodávky HSV                                                                                                                              |    |           |              | 565 399,31             | -105 343,01            | 460 056,29        |                                           |
|                              | D   | 1            | Zemní práce                                                                                                                                      |    |           |              | 0,00                   | -105 343,01            | -105 343,01       |                                           |
| 1                            | K   | 162351103    | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3<br>(-184,91/2,25)                           | m3 | -82,182   | 87,80        |                        | -7 215,60              | -7 215,60         | cena z kontrol.rozp.<br>D.1.1.1 poř.č. 18 |
| 2                            | K   | 162751117    | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3<br>(-184,91/2,25)                      | m3 | -82,182   | 328,00       |                        | -26 955,77             | -26 955,77        | cena z kontrol.rozp.<br>D.1.1.1 poř.č. 19 |
| 3                            | K   | 162751119    | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m<br>(-184,91/2,25)*7    | m3 | -575,28   | 25,30        |                        | -14 554,47             | -14 554,47        | cena z kontrol.rozp.<br>D.1.1.1 poř.č. 20 |
| 4                            | K   | 162751119    | Poplatek za uložení (skládkovné)<br>(-184,91)                                                                                                    | t  | -184,91   | 291,00       |                        | -53 808,81             | -53 808,81        | cena z kontrol.rozp.<br>D.1.1.1 poř.č. 22 |
| 5                            | K   | 162751119    | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky<br>(-184,91/2,25)                                                                                   | m3 | -125,37   | 22,40        |                        | -2 808,36              | -2 808,36         | cena z kontrol.rozp.<br>D.1.1.1 poř.č. 23 |
|                              |     | 997          | Přesun sutě                                                                                                                                      |    |           |              | 565 399,31             | 0,00                   | 565 399,30        |                                           |
| 6                            | K   | 997006511    | Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m<br>"01/2024"184,91                                                             | t  | 184,910   | 56,40        | 10 428,92              |                        | 10 428,92         | KROS CÚ 2022/II.                          |
|                              |     |              | Součet                                                                                                                                           |    | 184,910   |              |                        |                        |                   |                                           |
| 7                            | K   | 997006512    | Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km<br>"01/2024"184,91                                                   | t  | 184,910   | 176,00       | 32 544,16              |                        | 32 544,16         | KROS CÚ 2022/II.                          |
|                              |     |              | Součet                                                                                                                                           |    | 184,910   |              |                        |                        |                   |                                           |
| 8                            | K   | 997006519    | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km<br>"odpad 17 01 07"184,91*42                                               | t  | 7 766,22  | 17,00        | 132 025,74             |                        | 132 025,74        | KROS CÚ 2022/II.                          |
|                              |     |              | Součet                                                                                                                                           |    | 7 766,220 |              |                        |                        |                   |                                           |
| 9                            | IND | 997013869_R1 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí zeminy, betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07<br>184,91 | t  | 184,91    | 2 111,30     | 390 400,48             |                        | 390 400,48        | individuální cena -<br>doklad č.7         |
|                              |     |              |                                                                                                                                                  |    | 184,910   |              |                        |                        |                   |                                           |

Název akceSimulační centrum intenzivní medicíny - Podepření kolektoru

V Praze dne 05.02.2025

Zhotovitel:

PORR, a.s.  
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

Objednatel:

Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace  
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

| PČ                    | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                            | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem přípočet | Cena celkem odpočet | Cena celkem  | cenová úroveň                   |
|-----------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|
| Celkem stavební práce |     |             |                                                                                                                                                  |     |            |              | 1 154 806,70         | 0,00                | 1 154 806,70 |                                 |
|                       | D   | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                                                              |     |            |              | 1 154 806,70         | 0,00                | 1 154 806,70 |                                 |
|                       | D   | 9           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                              |     |            |              | 1 154 806,70         | 0,00                | 1 154 806,70 |                                 |
| 1                     | IND | 101         | doprava podpěrných konstrukcí pro podepření kolektoru                                                                                            | kpl | 1,000      | 31 114,70    | 31 114,70            |                     | 31 114,70    | individuální cena - doklad č.9  |
|                       |     |             | 1                                                                                                                                                |     | 1,000      |              |                      |                     |              |                                 |
| 2                     | K   | HZS2111     | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesář                                                                       | hod | 130,0      | 429,00       | 55 770,00            |                     | 55 770,00    | KROS CÚ 2022/II.                |
|                       |     |             | montáž, demontáž                                                                                                                                 |     |            |              |                      |                     |              |                                 |
| 3                     | K   | HZS2112     | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesář odborný                                                               | hod | 80,0       | 474,00       | 37 920,00            |                     | 37 920,00    | KROS CÚ 2022/II.                |
|                       |     |             | montáž, demontáž                                                                                                                                 |     |            |              |                      |                     |              |                                 |
| 4                     | IND | 975121332-R | Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky do v 4 m zatížení přes 1000 do 1500 kg/m za první a ZKD den použití | m   | 88 000,000 | 11,70        | 1 030 002,00         |                     | 1 030 002,00 | individuální cena - doklad č.11 |
|                       |     |             | "880 dní * 100mb" 880*100                                                                                                                        |     | 88 000,000 |              |                      |                     |              |                                 |
|                       |     |             | Rozpis materiálu:<br>Nosník Doka H20 top P 2,45 m - 64 Ks<br>Stropní podpěra Doka Eurex 20 top 250 - 127 Ks<br>Chyťovací klavíry H20 254 Ks      |     |            |              |                      |                     |              |                                 |

**Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny - Vypracování podrobného stanovení analýzy klimatického dopadu**

V Praze dne 05.02.2025

**Zhotovitel:** PORR, a.s.  
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

**Objednatel:** Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace  
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

| PČ                           | Typ | Kód         | Popis                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK]      | Cena celkem připočet | Cena celkem odpočet | Cena celkem | cenová úroveň                   |
|------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>Celkem stavební práce</b> |     |             |                                                                                    |     |          | <b>173 132,18</b> | <b>0,00</b>          | <b>173 132,18</b>   |             |                                 |
| 1                            | IND |             | Prověřování projektu:                                                              | kpl | 1,000    | 135 775,86        | 135 775,86           |                     | 135 775,86  | individuální cena - doklad č.13 |
|                              |     |             | a) Odůvodnění potřeby výpočtu posouzení uhlíkové stopy provozu a následného        |     |          |                   |                      |                     |             |                                 |
|                              |     |             | šetření celého životního cyklu pro:                                                |     |          |                   |                      |                     |             |                                 |
|                              |     |             | b) Analýza citlivosti, expozice, zranitelnost                                      |     |          |                   |                      |                     |             |                                 |
|                              |     |             | 2. Podrobná analýza projektu a provozu infrastruktury                              |     |          |                   |                      |                     |             |                                 |
|                              |     |             | a) Výpočet uhlíkové stopy projektu                                                 |     |          |                   |                      |                     |             |                                 |
|                              |     |             | b) Výpočet uhlíkové stopy provozu zařízení                                         |     |          |                   |                      |                     |             |                                 |
|                              |     |             | c) Peněžní vyjádření stínové ceny uhlíku pro provoz zařízení (na každý rok provozu |     |          |                   |                      |                     |             |                                 |
|                              |     |             | zařízení)                                                                          |     |          |                   |                      |                     |             |                                 |
|                              |     |             | d) Ověření kompatibility s vývojem k celkovým cílům snížení emisí skleníkových     |     |          |                   |                      |                     |             |                                 |
|                              |     |             | plynů do roku 2030 a                                                               |     |          |                   |                      |                     |             |                                 |
|                              |     |             | e) Podrobná analýza klimatických rizik (kde bude potřeba)                          |     |          |                   |                      |                     |             |                                 |
|                              |     |             | f) Vytvoření doporučení/opatření pro investici                                     |     |          |                   |                      |                     |             |                                 |
| 2                            | IND | 975121332-R | Příprava dat k vypracování Podrobné analýzy                                        | kpl | 1,000    | 37 356,32         | 37 356,32            |                     | 37 356,32   | individuální cena - doklad č.14 |
|                              |     |             | Příprava a poskytování dat pro zpracovatele analýzy                                |     |          |                   |                      |                     |             |                                 |

## Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny - Přítomnost pilotové stěny

V Praze dne 05.02.2025


Zhotovitel: PORR, a.s.  
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace  
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

| PČ                           | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem<br>náročet | Cena celkem<br>odnočet | Cena celkem       | cenová úroveň |
|------------------------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Celkem stavební práce</b> |     |     |       |    |          |              | <b>439 026,36</b>      | <b>-39 290,36</b>      | <b>399 736,00</b> |               |

|   |   |           |                                                                                                                           |    |          |          |            |            |            |                                                                                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|   |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                       |    |          |          | 18 454,05  | 0,00       | 18 454,05  |                                                                                |
| 1 | D | 1         | Úprava dokumentace DPS                                                                                                    | %  | 4,840    | 3 812,82 | 18 454,05  |            | 18 454,05  | procentuelní podíl dokumentace DPS/stavebních prací z SOD<br>3. Nabídková cena |
|   |   | 1         | Zemní práce                                                                                                               |    |          |          | 27 121,00  | 0,00       | 27 121,00  |                                                                                |
| 2 | K | 132154203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3                         | m3 | 53,100   | 440,00   | 23 364,00  |            | 23 364,00  | KROS CÚ 2022/II.                                                               |
| 3 | K | 139711111 | Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně                                     | m3 | 1,700    | 2 210,00 | 3 757,00   |            | 3 757,00   | KROS CÚ 2022/II.                                                               |
|   |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                       |    |          |          | 237 984,50 | -39 290,36 | 198 694,14 |                                                                                |
| 4 | K | 981511114 | Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním                                                     | m3 | 30,550   | 7 790,00 | 237 984,50 |            | 237 984,50 | KROS CÚ 2022/II.                                                               |
|   |   |           | "mazanina hlav pilot" 1,3*5*0,17                                                                                          |    | 1,105    |          |            |            |            |                                                                                |
|   |   |           | "pilotová stěna" (3,14*0,65*0,65)*6,5*3                                                                                   |    | 25,870   |          |            |            |            |                                                                                |
|   |   |           | "torkret stěna" 6,5*0,1*5,5                                                                                               |    | 3,575    |          |            |            |            |                                                                                |
|   |   |           | Součet                                                                                                                    |    | 30,550   |          |            |            |            |                                                                                |
| 5 | K | 131251106 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně                               | m3 | -30,550  | 147,00   | 0,00       | -4 490,85  | -4 490,85  | cena z kontrol.rozp. D.1.1.1 poř.č. 12                                         |
|   |   |           | -30,55                                                                                                                    |    | -30,550  |          |            |            |            |                                                                                |
| 6 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                      | m3 | -30,550  | 87,80    | 0,00       | -2 682,29  | -2 682,29  | cena z kontrol.rozp. D.1.1.1 poř.č. 18                                         |
|   |   |           | "-30,55"                                                                                                                  |    | -30,550  |          |            |            |            |                                                                                |
| 7 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                 | m3 | -30,550  | 328,00   | 0,00       | -10 020,40 | -10 020,40 | cena z kontrol.rozp. D.1.1.1 poř.č. 18                                         |
|   |   |           | "-30,55"                                                                                                                  |    | -30,550  |          |            |            |            |                                                                                |
| 8 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | -213,85  | 25,30    | 0,00       | -5 410,41  | -5 410,41  | cena z kontrol.rozp. D.1.1.1 poř.č. 19                                         |
|   |   |           | (-30,55*7)                                                                                                                |    | -213,850 |          |            |            |            |                                                                                |
| 9 | K | 162751119 | Poplatek za uložení (skládkovné)                                                                                          | t  | -54,99   | 291,00   | 0,00       | -16 002,09 | -16 002,09 | cena z kontrol.rozp. D.1.1.1 poř.č. 22                                         |
|   |   |           | "-30,55*1,8"                                                                                                              |    | -54,990  |          |            |            |            |                                                                                |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                              | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem<br>přínocet | Cena celkem<br>odnocet | Cena celkem | cenová úroveň                             |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| 10 | K   | 162751119 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                       | m3     | -30,55   | 22,40        | 0,00                    | -684,32                | -684,32     | cena z kontrol.rozp.<br>D.1.1.1.por.č. 23 |
|    |     | 997       | Přesun sutě                                                                                        |        |          |              | 138 225,45              | 0,00                   | 138 225,46  |                                           |
| 11 | K   | 997006511 | Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m                                  | t      | 73,626   | 56,40        | 4 152,51                |                        | 4 152,51    | KROS CÚ 2022/II.                          |
|    |     |           | 73,626                                                                                             |        | 73,626   |              |                         |                        |             |                                           |
| 12 | K   | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km                        | t      | 73,626   | 176,00       | 12 958,18               |                        | 12 958,18   | KROS CÚ 2022/II.                          |
| 13 | K   | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km                              | t      | 368,13   | 17,00        | 6 258,21                |                        | 6 258,21    | KROS CÚ 2022/II.                          |
|    |     |           | "odpad 17 01 01"73,626*5                                                                           |        | 368,130  |              |                         |                        |             |                                           |
|    |     |           | Součet                                                                                             |        | 368,130  |              |                         |                        |             |                                           |
| 14 | K   | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t      | 73,626   | 1 560,00     | 114 856,56              |                        | 114 856,56  | KROS CÚ 2022/II.                          |
|    |     |           | "ŽB"73,626                                                                                         |        | 73,626   |              |                         |                        |             |                                           |
|    |     | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                        |        |          |              | 17 241,36               | 0,00                   | 17 241,36   |                                           |
|    |     | VRN1      | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                           |        |          |              |                         |                        |             |                                           |
| 15 | IND | 12002000  | Geodetické práce                                                                                   | výjezd | 6,000    | 2 873,56     | 17 241,36               |                        | 17 241,36   | individuální cena -<br>doklad č.15        |
|    |     |           | "zaměření piltové stěny"2                                                                          |        | 2,000    |              |                         |                        |             |                                           |
|    |     |           | "vytyčení vrtů kotev"4                                                                             |        | 4,000    |              |                         |                        |             |                                           |
|    |     |           | Součet                                                                                             |        | 6,000    |              |                         |                        |             |                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | <b>číslo: ZL 01</b>                                                                                                            |                                            |
| <b>Zhotovitel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PORR, a.s.</b><br>se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560                               |                                                                                                                                |                                            |
| <b>Objednatel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Fakultní nemocnice v Motole</b> , státní příspěvková organizace<br>se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203 | <b>Datum:</b> 22.03.2023.                                                                                                      |                                            |
| <b>Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny</b><br>Smlouva č. 2203200857 na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu - <b>Simulační centrum intenzivní medicíny</b><br>Datum uzavření: 22. 12. 2022 /dále jen Smlouva/<br>Datum a čas zveřejnění Smlouvy v registru smluv: 28.12. 2022 13:30:07<br>ID Smlouvy: 21343257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                            |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | poštou <input type="checkbox"/>                                                                                                | e-mailem <input type="checkbox"/>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | faxem <input type="checkbox"/>                                                                                                 | osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | specifikaci:                                                                                                             | -                                                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | na výkresy:                                                                                                              | -                                                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | na rozpočtové podklady:                                                                                                  | -                                                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | na jinou část smlouvy:                                                                                                   | - Odst. 4.2 Smlouvy – MILNÍK - Předání a převzetí Staveniště (MILNÍK č. 2)<br>Příloha č. 3 Smlouvy – Stručný harmonogram prací |                                            |
| <b>Předmět změny:</b><br>– <b>ZMĚNA TERMÍNU PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                            |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>– Předpokládané termíny plnění – MILNÍKY – dle platné SOD<br><b>MILNÍKY</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>MILNÍK č. 1</b> - Zahájení díla - PORR, a.s. <b>28.12.2023.</b></li> <li><b>MILNÍK č. 2</b> - Předání a převzetí Staveniště - PORR, a.s. (Den „D“) <b>28.12.2023.</b><br/> <b>Poznámka</b> - Den „D“ znamená den protokolárního předání Staveniště Zhotoviteli – viz. Zadávací dokumentace.</li> <li><b>MILNÍK č. 9</b> - Protokolární předání dokončeného Díla Objednateli <b>10.12.2025.</b></li> </ul> – Vzhledem ke skutečnosti, kdy stran Objednatele v souvislosti s koordinací staveb nacházející se v daném území, došlo ke <b>skutečnému termínu protokolárního předání a převzetí staveniště (I. etapa)</b> Zhotovitelem stavby dne <b>22. 03. 2023</b> , lze konstatovat, že <b>termín MILNÍKU č. 2 bude upraven následovně:</b><br><b>ZMĚNA DOTČENÉHO MILNÍKU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>MILNÍK č. 2</b> - Předání a převzetí Staveniště - PORR, a.s. (Den „D“) – I. etapa 22.03.2023.<br/> <b>Poznámka</b> - Den „D“ znamená den protokolárního předání Staveniště Zhotoviteli – viz. Zadávací dokumentace.</li> </ul> <b>MILNÍK, KTERÝ NENÍ DOTČEN ZMĚNOU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>MILNÍK č. 9</b> - Protokolární předání dokončeného Díla Objednateli <b>10.12.2025.</b></li> </ul> |                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                            |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b><br>-  – <b>SOUHLASÍM.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                             |                                            |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | 0                                                                                                                              |                                            |
| <b>Změna podle příslušného odstavce § 222 ZZVZ</b><br><b>Stanovisko Odboru veřejných zakázek FN Motol:</b><br>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.<br>Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                            |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                            |

**Příloha:**

- Stručný harmonogram prací
- Protokol o předání a převzetí staveniště (pracoviště) – I. etapa ze dne 22.03.2023.

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                            | <b>PORR, a.s.</b><br>se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560                                               |  |  |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                 |                                                         |  |  |
| Datum:                                                                                                                                                                                                 | 22.03.2023.                                                                                                                              |  |  |
| Cena méněprací bez DPH:<br><b>0,- Kč</b>                                                                                                                                                               | Cena víceprací bez DPH:<br><b>0,- Kč</b>                                                                                                 |  |  |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><b>0,- Kč</b>                                                                                                                                                          | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br><b>BEZE ZMĚNY</b><br>(PLATNÝ TERMÍN DOKONČENÍ DLE SOD)<br><b>10.12.2025.</b><br>(MILNÍK č. 9) |  |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |                                                                                                                                          |  |  |
| Podpis za Objednatele:                                                                                                                                                                                 | Podpis za Zhotovitele:                                                                                                                   |  |  |
| <b>Fakultní nemocnice v Motole</b><br>státní příspěvková organizace                                                                                                                                    | <b>PORR,a.s.</b><br>Ing. Peter Suchý, předseda představenstva<br>Ing. Dušan Čížek, MBA, člen představenstva                              |  |  |
| Datum:                                                                                                                                                                                                 | Datum:                                                                                                                                   |  |  |





**ZMĚNOVÝ LIST**číslo: **ZL 02****Zhotovitel:****PORR, a.s.**

se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

**Objednatel:****Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace**

Datum: 22.03.2023.

se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

**Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny**Smlouva č. 2203200857 na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu - **Simulační centrum intenzivní medicíny**

Datum uzavření: 22. 12. 2022 /dále jen Smlouva/

Datum a čas zveřejnění Smlouvy v registru smluv: 28.12. 2022 13:30:07

ID Smlouvy: 21343257

Způsob odeslání / předání  
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒**Odkazy na**

specifikaci: -

na výkresy: -

na rozpočtové podklady: -

na jinou část smlouvy: -

- Odst. 4.2 Smlouvy – MILNÍK – Předložení dokončené DPS a Koordinační projektové dokumentace ke schválení Objednateli (MILNÍK č. 4) Příloha č. 3 Smlouvy – Stručný harmonogram prací

**Předmět změny:**

- ZMĚNA TERMÍNU PŘEDLOŽENÍ DOKONČENÉ DPS A KOORDINAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE SCHVÁLENÍ OBJEDNATELI (MILNÍK Č. 4)**

**Popis a zdůvodnění změny:**

- Předpokládaný termín plnění – MILNÍK – dle platné SOD MILNÍK
  - MILNÍK č. 4** **15.06.2023.**  
PŘEDLOŽENÍ DOKONČENÉ DPS A KOORDINAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE SCHVÁLENÍ OBJEDNATELI
- Vzhledem ke skutečnosti, kdy stran Objednatele, v souvislosti s koordinací připravované samostatné projektové dokumentace, týkající se interiéru a vnitřního vybavení SCIM, lze konstatovat, že interiéru a vnitřní vybavení objektu SCIM, které **nebylo** součástí zadaného rozsahu plnění předmětné výstavby SCIM, má zcela zásadní vliv na dokončení DPS a koordinační projektovou dokumentaci a **je tedy nezbytné** provést vzájemnou koordinaci a vzájemný soulad jednotlivých projektových dokumentací.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že termín MILNÍKU č. 4 bude upraven následovně:  
**ZMĚNA DOTČENÉHO MILNÍKU**

- MILNÍK č. 4** **25.07.2023.**  
PŘEDLOŽENÍ DOKONČENÉ DPS A KOORDINAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE SCHVÁLENÍ OBJEDNATELI

**MILNÍK, KTERÝ NENÍ DOTČEN ZMĚNOU**

- MILNÍK č. 9** - Protokolární předání dokončeného Díla Objednateli **10.12.2025.**

**Stanovisko technického dozoru stavby:**-  - **SOUHLASÍM.**

Počet připojených listů specifikací:

0

**Změna podle příslušného odstavce § 222 ZZVZ****Stanovisko Odboru veřejných zakázek FN Motol:**


Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐odstavec 5, § 222 ☐odstavec 6, § 222 ☐odstavec 7, § 222 ☐

**Příloha:**

- Stručný harmonogram prací
- PORR – POTVRZENÍ SPLNĚNÍ MILNÍKU VÝSTAVBY (ze dne 25.07.2023.)

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                            | <b>PORR, a.s.</b><br>se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560                                               |                                                                                                                                                                                     |  |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                     |  |
| Datum:                                                                                                                                                                                                 | 22.03.2023.                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |  |
| Cena méněprací bez DPH:<br><b>0,- Kč</b>                                                                                                                                                               | Cena víceprací bez DPH:<br><b>0,- Kč</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |  |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><b>0,- Kč</b>                                                                                                                                                          | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br><b>BEZE ZMĚNY</b><br>(PLATNÝ TERMÍN DOKONČENÍ DLE SOD)<br><b>10.12.2025.</b><br>(MILNÍK č. 9) |                                                                                                                                                                                     |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |  |
| Podpis za Objednatele:                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | Podpis za Zhotovitele:                                                                                                                                                              |  |
| <b>Fakultní nemocnice v Motole</b><br>státní příspěvková organizace                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | <b>PORR,a.s.</b><br>Ing. Peter Suchý, předseda představenstva<br>Ing. Dušan Čížek,              |  |
| <br>Datum:                       |                                                                                                                                          | <br>Datum:  |  |





zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 43567

**Věc:** **VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO A TECHNICKÉHO DOZORU**

**Předmět vyjádření:** **ZL č. 03 – ZMĚNA TERMÍNU PŘEDLOŽENÍ KONTROLNÍHO ROZPOČTU PRO REALIZACI DÍLA KE SCHVÁLENÍ OBJEDNATELI**

**Název stavby:** **SIMULAČNÍ CENTRUM INTENZIVNÍ MEDICÍNY**

Provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu „Simulační centrum intenzivní medicíny“  
číslo smlouvy objednatele 2203200857 ze dne 22. 12. 2022.

**Zhotovitel:** **PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice  
IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

zastoupená:

**Ev. č. vyjádření:** **137.**

**Datum vyjádření:** 08.07.2024.

**Popis skutečnosti:** V návaznosti na podklady, zaslané Zhotovitelem – PORR, a.s., tímto AD a TDO stanovuje vyjádření k zaslaným podkladům.

**Objednatel:** **Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace**

se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol

**Zastoupená:**

IČ: 00064203 DIČ: CZ00064203

Tel.:

**Autorský dozor - AD:** **PIKMA, s.r.o.**

**Tech. dozor – TDO:** Novodvorská 1074/26, 674 01 Třebíč

IČ: 268 88 181, DIČ: CZ 268 88 181. Je plátcem DPH

jednatel společnosti

Autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby - č. 1004113

Znalec v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské.

**Vyjádření AD, TDO: VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO A TECHNICKÉHO DOZORU**

**ZL č. 03 – ZMĚNA TERMÍNU PŘEDLOŽENÍ KONTROLNÍHO ROZPOČTU PRO REALIZACI DÍLA KE SCHVÁLENÍ OBJEDNATELI**

Poznámka – E-mail – PORR, a.s. [redacted] ze dne 24.08.2023. (359).

**POKYN TDO**

**VYJÁDŘENÍ AD a TDO**

- Vyjádření AD a TDO ev. č. 27, ze dne 20.08.2023 - **pozbývá platnosti**.  
Poznámka - Vyjádření AD a TDO ev. č. 27, ze dne 20.08.2023 se tímto ruší.
- Vyjádření AD a TDO ev. č. 85, ze dne 24.01.2024 - **pozbývá platnosti**.  
Poznámka - Vyjádření AD a TDO ev. č. 85, ze dne 24.01.2024 se tímto ruší.
- AD a TDO tímto **SOUHLASÍ** s předloženým ZMĚNOVÝM LISTEM - ZL č. 03 – ZMĚNA TERMÍNU PŘEDLOŽENÍ KONTROLNÍHO ROZPOČTU PRO REALIZACI DÍLA KE SCHVÁLENÍ OBJEDNATELI.

**ZÁVĚR:**

AD a TDO tímto **SOUHLASÍ** s předloženým ZMĚNOVÝM LISTEM - ZL č. 03 – ZMĚNA TERMÍNU PŘEDLOŽENÍ KONTROLNÍHO ROZPOČTU PRO REALIZACI DÍLA KE SCHVÁLENÍ OBJEDNATELI.


Vypracoval:



Příloha:


- ZL č. 03 – ZMĚNA TERMÍNU PŘEDLOŽENÍ KONTROLNÍHO ROZPOČTU PRO REALIZACI DÍLA KE SCHVÁLENÍ OBJEDNATELI

V Třebíči dne 08.07.2024.



Autorský dozor objednatele  
Technický dozor objednatele

PIKMA, s.r.o. • Novodvorská 1074/26, 674 01 Třebíč • IČ: 26 88 81 81 • Te [redacted]





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | číslo: <b>ZL 03</b>                                                                                                                                                          |                                            |
| <b>Zhotovitel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PORR, a.s.</b><br>se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560                               |                                                                                                                                                                              |                                            |
| <b>Objednatel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fakultní nemocnice v Motole</b> , státní příspěvková organizace<br>se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203 | Datum: 22.03.2023.                                                                                                                                                           |                                            |
| <b>Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny</b><br>Smlouva č. 2203200857 na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu - <b>Simulační centrum intenzivní medicíny</b><br>Datum uzavření: 22. 12. 2022 /dále jen Smlouva/<br>Datum a čas zveřejnění Smlouvy v registru smluv: 28.12. 2022 13:30:07<br>ID Smlouvy: 21343257                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                            |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          | poštou <input type="checkbox"/>                                                                                                                                              | e-mailem <input type="checkbox"/>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | faxem <input type="checkbox"/>                                                                                                                                               | osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | specifikaci:                                                                                                             | -                                                                                                                                                                            |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | na výkresy:                                                                                                              | -                                                                                                                                                                            |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | na rozpočtové podklady:                                                                                                  | -                                                                                                                                                                            |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | na jinou část smlouvy:                                                                                                   | - Odst. 4.2 Smlouvy – MILNÍK – Předložení Kontrolního rozpočtu pro realizaci Díla ke schválení Objednateli (MILNÍK č. 7)<br>Příloha č. 3 Smlouvy – Stručný harmonogram prací |                                            |
| <b>Předmět změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                            |
| - <b>ZMĚNA TERMÍNU PŘEDLOŽENÍ KONTROLNÍHO ROZPOČTU PRO REALIZACI DÍLA KE SCHVÁLENÍ OBJEDNATELI (MILNÍK Č. 7)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                            |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                            |
| – Předpokládané termíny plnění – MILNÍK – dle platné SOD<br><b>MILNÍK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                            |
| • <b>MILNÍK č. 7</b> <span style="float: right;"><b>30.06.2023.</b></span><br><i>PŘEDLOŽENÍ KONTROLNÍHO ROZPOČTU PRO REALIZACI DÍLA KE SCHVÁLENÍ OBJEDNATELI</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                            |
| - Vzhledem ke skutečnosti, kdy stran Objednatele, v souvislosti s koordinací připravované samostatné projektové dokumentace, týkající se interiéru a vnitřního vybavení SCIM, lze konstatovat, že interiéru a vnitřní vybavení objektu SCIM, které <b>nebylo</b> součástí zadaného rozsahu plnění předmětné výstavby SCIM, má zcela zásadní vliv na dokončení DPS a koordinační projektovou dokumentaci a má rovněž zcela zásadní vliv i na <b>vypracování kontrolního rozpočtu</b> předmětné výstavby. |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                            |
| - Vliv změny doby, týkající se změny interiéru a vnitřního vybavení objektu SCIM, které <b>nebylo</b> součástí zadaného rozsahu plnění předmětné výstavby SCIM je <b>40 kalendářních dnů</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                            |
| Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že termín MILNÍKU č. 7 bude upraven následovně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                            |
| <b>ZMĚNA DOTČENÉHO MILNÍKU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                            |
| • <b>MILNÍK č. 7</b> <span style="float: right;"><b>09.08.2023.</b></span><br><i>PŘEDLOŽENÍ KONTROLNÍHO ROZPOČTU PRO REALIZACI DÍLA KE SCHVÁLENÍ OBJEDNATELI (VLIV 40 KALENĎÁŘNÍCH DNŮ)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                            |
| <b>MILNÍK, KTERÝ NENÍ DOTČEN ZMĚNOU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                            |
| • <b>MILNÍK č. 9</b> - Protokolární předání dokončeného Díla Objednateli <span style="float: right;"><b>10.12.2025.</b></span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                            |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                            |
| - PIKMA, s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | - <b>SOUHLASÍM.</b>                                                                                                                                                          |                                            |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |  0                                                                                       |                                            |
| <b>Změna podle příslušného odstavce § 222 ZZVZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                            |
| <b>Stanovisko Odboru veřejných zakázek FN Motol:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                            |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                            |
| Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                            |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                            |

**Prohlášení Zhotovitele:**

- Potřeba provedení změn (dodatečných víceprací) na základě tohoto změnového listu, původně neobsažených v zadávacích podmínkách, vyvstala až v průběhu provádění díla a to v důsledku vzniku nepředvídatelných okolností, které žádná ze stran nemohla s náležitou péčí předvídat.
- Současně platí, že provedení těchto změn je nezbytné pro řádné a funkční dokončení této veřejné zakázky v souladu s jejím zamýšleným účelem.
- Změny obsažené v tomto změnovém listu nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou realizovány v souladu se smlouvou o dílo (zejména čl. 11) a dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Strany v rámci jednání o změnách postupují taktéž v souladu se zásadami 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) zahrnující zejména projednání vícero v úvahu přicházejících variant technických řešení a výběr nejvhodnějšího řešení (vč. jejich zaznamenání v rámci kontrolních dnů, zápisů do stavebního deníku, průběžné písemné komunikace, změnových listech či dodatcích).

**Příloha:**

- PORR – Stručný harmonogram prací
- PORR – POTVRZENÍ SPLNĚNÍ MILNÍKU VÝSTAVBY ( ze dne 09.08.2023)

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                            | PORR, a.s.<br>se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560                                                      |  |  |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |  |  |
| Datum:                                                                                                                                                                                                 | 22.03.2023.                                                                                                                              |  |  |
| Cena méněprací bez DPH:<br><b>0,- Kč</b>                                                                                                                                                               | Cena víceprací bez DPH:<br><b>0,- Kč</b>                                                                                                 |  |  |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><b>0,- Kč</b>                                                                                                                                                          | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br><b>BEZE ZMĚNY</b><br>(PLATNÝ TERMÍN DOKONČENÍ DLE SOD)<br><b>10.12.2025.</b><br>(MILNÍK č. 9) |  |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |                                                                                                                                          |  |  |
| Podpis za Objednatele:                                                                                                                                                                                 | Podpis za Zhotovitele:                                                                                                                   |  |  |
| <b>Fakultní nemocnice v Motole</b><br>státní příspěvková organizace                                                                                                                                    | <b>PORR,a.s.</b><br>Ing. Dušan Čížek<br>Ing.                                                                                             |  |  |
| Datum:                                                                                                                                                                                                 | Datum:                                                                                                                                   |  |  |







## POTVRZENÍ SPLNĚNÍ MILNÍKU VÝSTAVBY

Smlouva č.2203200857

na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu

„Simulační centrum intenzivní medicíny“

Datum: 09.08.2023

**Milník: Předložení Kontrolního rozpočtu pro realizaci Díla ke schválení Objednateli**

V souladu s článkem 4.2. Smlouvy o dílo oznamujeme splnění milníku „Předložení Kontrolního rozpočtu pro realizaci Díla ke schválení Objednateli“

Termín milníku: do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, nejpozději však do 30.6. 2023

(Objednatel tímto prohlašuje, že z důvodu neposkytnutí součinnosti z jeho strany byl výše uvedený milník Zhotovitelem splněn do 09.08.2023, přičemž Zhotovitel ve smyslu čl. 27.2. Smlouvy o dílo nebyl s výše uvedeným milníkem v prodlení a považuje se za řádně splněný)

**Milník splněn dne: 09.08.2023**

Za Zhotovitele předkládá:

PORR a.s.

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.08.10  
07:58:28 +02'00'



Za Objednatele potvrzuje:

Fakultní nemocnice v Motole,  
Státní příspěvková organizace

.....



PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
Strašnice, 100 00 Praha 10



Sídlo: Dubečská 3238/36  
Strašnice, 100 00 Praha 10  
OR u MŠ v Praze, Oddíl B, Vložka 1006  
IČO 43005560, DIČ CZ43005560

Raiffeisenbank a.s.  
IBAN CZ975500001091107720  
BIC R7BCC7PP



**ZMĚNOVÝ LIST**číslo: **ZL 04****Zhotovitel:****PORR, a.s.**

se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

**Objednatel:****Fakultní nemocnice v Motole**, státní příspěvková organizace

se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

Datum: 13.11.2023.

**Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny**Smlouva č. 2203200857 na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu - **Simulační centrum intenzivní medicíny**

Datum uzavření: 22. 12. 2022 /dále jen Smlouva/

Datum a čas zveřejnění Smlouvy v registru smluv: 28.12. 2022 13:30:07

ID Smlouvy: 21343257

Způsob odeslání / předání  
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒**Odkazy na**

specifikaci:

-

na výkresy:

-

na rozpočtové podklady:

-

na jinou část smlouvy:

- Odst. 2.1 Smlouvy, Příloha č. 6 Smlouvy – NABÍDKA ZHOTOVITELE

**Předmět změny:**

- **ZMĚNA – PUBLICITA – VYJMUTÍ PUBLICITY Z ROZSAHU PLNĚNÍ DÍLA**  
(PUBLICITA – Billboard o rozměrech 5,1 m šířka x 2,4 m výška)
- **PUBLICITA OBJEDNATELE – DODATEČNÝ POŽADAVEK OBJEDNATELE**

**Popis a zdůvodnění změny:**

- **ZMĚNA PUBLICITA – VYJMUTÍ PUBLICITY Z ROZSAHU PLNĚNÍ DÍLA**
  - o Na základě žádosti Objednatele ze dne 21.06.2023, týkajícího se **VYJMUTÍ PUBLICITY** bude:
    - zpracování grafického návrhu – **ODEČTENO**
    - výroba billboardu o rozměrech 5,1 m šířka x 2,4 m výška – **ODEČTENO**
    - provedení zemních prací a konstrukcí pro instalaci billboardu – **ODEČTENO**
    - následná demontáž a likvidace billboardu – **ODEČTENO**
    - zhotovení stálé pamětní desky (např. bronzový odlitek), včetně montáže, min. velikost 0,3 m x 0,4 m – **ODEČTENO**

Lze konstatovat, že **PUBLICITA – Billboard** o rozměrech 5,1 šířka x 2,4 m výška (dle výše uvedeného) **bude vyjmuta** z rozsahu plnění díla Zhotovitele.

- **PUBLICITA OBJEDNATELE – DODATEČNÝ POŽADAVEK DODAVATELE**

Předmětem toho Změnového listu (ZL) je rovněž i:

- o Zajištění základního kamene
- o Poklepová kladívka (zajištění kladívek pro poklep základního kamene)
- o PAMĚTNÍ DESKA – Gravírovaná mosazná tabule
- o Montáž informační tabule SCIM dodané objednatelem

**Stanovisko technického dozoru stavby:**-  **SOUHLASÍM.**

Počet připojených listů specifikací:

0

**Změna podle příslušného odstavce § 222 ZZVZ****Stanovisko Odboru veřejných zakázek FN Motol:**


Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☐ odstavec 7, § 222 ☐

**Příloha:**

- ŽÁDOST OBJEDNATELE O ZMĚNU DÍLA – VYJMUTÍ PUBLICITY PROJEKTU (ZE DNE 21.06.2023)
- PORR - soupis prací – Položkový rozpočet stavby
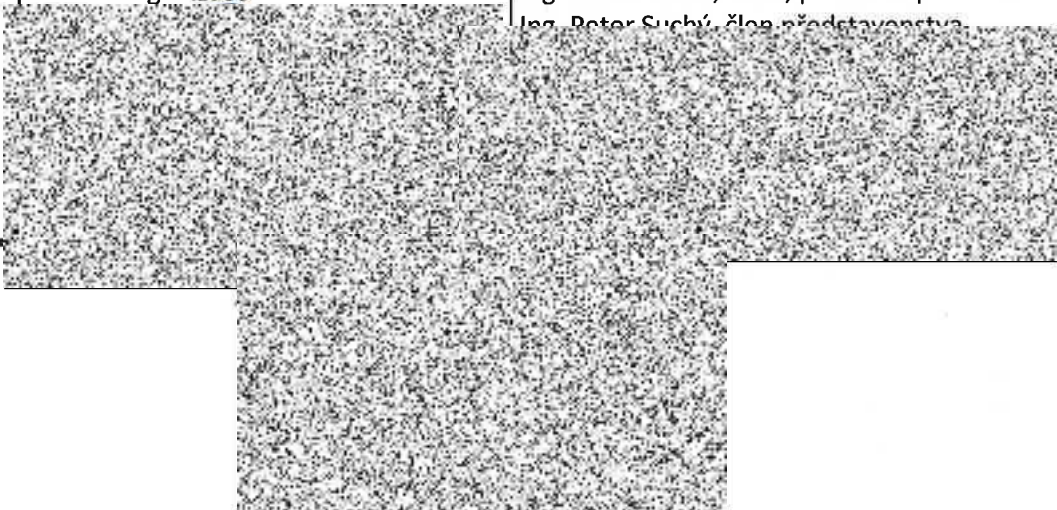
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                            | <b>PORR, a.s.</b><br>se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560                                               |  |  |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                 |                                                         |  |  |
| Datum:                                                                                                                                                                                                 | 19.12.2023.                                                                                                                              |  |  |
| Cena méněprací bez DPH:<br>- 150 000,00,- Kč                                                                                                                                                           | Cena víceprací bez DPH:<br>+ 35 474,63,- Kč                                                                                              |  |  |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br>- 114 525,37,- Kč                                                                                                                                                      | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br><b>BEZE ZMĚNY</b><br>(PLATNÝ TERMÍN DOKONČENÍ DLE SOD)<br><b>10.12.2025.</b><br>(MILNÍK č. 9) |  |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |                                                                                                                                          |  |  |
| Podpis za Objednatele:                                                                                                                                                                                 | Podpis za Zhotovitele:                                                                                                                   |  |  |
| <b>Fakultní nemocnice v Motole</b><br>státní příspěvková organizace                                                                                                                                    | <b>PORR,a.s.</b><br>Ing. Dušan Čížek, MBA, předseda představenstva<br>Ing. Peter Suchý, člen představenstva                              |  |  |
| Datum:                                                                                                                                                                                                 |                                                      |  |  |



ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL 04

Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny - Vyjmutí publicity objektu


V Praze dne 27.01.2025

Zhotovitel: PORR, a.s.  
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace  
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

| PČ                    | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem<br>přípočet | Cena celkem<br>odpočet | Cena celkem | cenová úroveň |
|-----------------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------|---------------|
| Celkem stavební práce |     |     |       |    |          |              | 35 474,63               | -150 000,00            | -114 525,37 |               |

|   |     |         |                                                                                               |     |        |            |           |             |             |                                             |
|---|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-----------|-------------|-------------|---------------------------------------------|
| 1 | K   | SOD     | Zajištění publicity projektu                                                                  | kpl | -1,000 | 150 000,00 |           | -150 000,00 | -150 000,00 | cena z kontrolního<br>rozpočtu rekapitulace |
| 2 | IND | IND     | Základní kámen                                                                                | kpl | 1,000  | 14 727,01  | 14 727,01 | 0,00        | 14 727,01   | individuální cena -<br>doklad č.1           |
| 3 | IND | IND     | Pokleповá kladívka                                                                            | kus | 8,000  | 1 494,25   | 11 954,00 | 0,00        | 11 954,00   | individuální cena -<br>doklad č.2           |
| 4 | IND | IND     | Gravírovaná mosazná cedule                                                                    | kus | 1,000  | 6 599,62   | 6 599,62  | 0,00        | 6 599,62    | individuální cena -<br>doklad č.3           |
| 5 | K   | HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník -<br>doprava kladívek a cedule               | hod | 2,000  | 331,00     | 662,00    | 0,00        | 662,00      | KROS CÚ 2022/III.                           |
| 6 | K   | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - montáž<br>informační tabule SCIM dodané objednatel | hod | 4,000  | 383,00     | 1 532,00  | 0,00        | 1 532,00    | KROS CÚ 2022/III.                           |







FN MOTOL

**Fakultní nemocnice v Motole**  
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

PORR a.s.

Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10



Č. j.: FNMO/23/064788/8PTN

Vvřizuje:

Praha 21.06.2023

**Věc: Žádost objednatele o změnu díla – vyjmutí publicity projektu**

Vážený pane řediteli,

dovolujeme si Vás tímto požádat o omezení rozsahu prováděného díla, které je realizováno na základě smlouvy č. 2203200857, na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu „Simulační centrum intenzivní medicíny“, uzavřené dne 22. 12. 2022 (dále jen „Smlouva“) mezi Fakultní nemocnicí v Motole, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha, IČO: 000 64 203 (dále jen „Objednatel“), a společností PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČO: 430 05 560 (dále jen „Zhotovitel“).

Na kontrolním dnu v rámci realizace díla byl Zhotoviteli uložen pokyn, aby Zhotovitel nevykonával činnosti spočívající v zajištění publicity projektu. Zajištění publicity projektu bylo v cenové nabídce Zhotovitele, která tvoří přílohu č. 6 Smlouvy, oceněno částkou 150.000,- Kč bez DPH.

**Objednatel v souladu s odst. 11.1 Smlouvy tímto žádá o vyjmutí položky zajištění publicity projektu Zhotovitelem v hodnotě 150.000,- Kč bez DPH z předmětu Smlouvy.**

Objednatel žádá Zhotovitele o přípravu změnového listu, který má Zhotovitel vyhotovit na základě odst. 11.1 Smlouvy a který bude podkladem pro změnu díla požadovanou Objednatелеm výše. Náležitosti změnového listu jsou uvedeny v odst. 11.2 Smlouvy. Součástí změnového listu má být podle odst. 11.5 Smlouvy také vyjádření technického dozoru a autorského dozoru Objednatele. Na základě potvrzeného změnového listu Objednatel ve smyslu odst. 11.8 Smlouvy vypracuje dodatek ke Smlouvě.

Děkujeme za spolupráci,

s pozdravem





zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 43567

**Věc: VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO A TECHNICKÉHO DOZORU**

**Předmět vyjádření:** ZL č. 04 – ZMĚNA – PUBLICITA – DODATEČNÝ POŽADAVEK OBJEDNATELE

**Název stavby:** SIMULAČNÍ CENTRUM INTENZIVNÍ MEDICÍNY

Provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu „Simulační centrum intenzivní medicíny“ číslo smlouvy objednatele 2203200857 ze dne 22. 12. 2022.

**Zhotovitel:** PORR, a.s.  
**se sídlem:** Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice  
IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

**Ev. č. vyjádření:** 172.

**Datum vyjádření:** 06.04.2025.

**AD a TDO:** PIKMA, s.r.o.

Novodvorská 1074/26, 674 01 Třebíč

IČ: 268 88 181, DIČ: CZ 268 88 181, Je plátcem DPH

**řednatel společnosti**

Autorizovaný inženýr pro obor Požemní stavby - č. 1004113

Znalec v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské.

**Vyjádření:**

**VYJÁDŘENÍ AD A TDO**

Poznámka – E-mail – PORR a  
Poznámka – E-mail – FNM,

**POKYN:**

**VYJÁDŘENÍ – POKYN**

– AD a TDO tímto souhlasí.

**ZÁVĚR:**

**AD a TDO tímto souhlasí.**

Poznámka – Zhotovitel provede příslušnou kompletaci daného ZL.

**Vypracoval:**

**Příloha:**

- **ZL č. 04 – ZMĚNA – PUBLICITA – DODATEČNÝ POŽADAVEK OBJEDNATELE**
- **ZL č. 04 – CENOVÁ KALKULACE**

V Třebíči dne 06.04.2025.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          | <b>číslo: ZL 05</b>                                                                                                                                                                       |                                              |
| <b>Zhotovitel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>PORR, a.s.</b><br>se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560                               |                                                                                                                                                                                           |                                              |
| <b>Objednatel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fakultní nemocnice v Motole</b> , státní příspěvková organizace<br>se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203 | Datum: 19.12.2023.                                                                                                                                                                        |                                              |
| <b>Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny</b><br>Smlouva č. 2203200857 na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu - <b>Simulační centrum intenzivní medicíny</b><br>Datum uzavření: 22. 12. 2022 /dále jen Smlouva/<br>Datum a čas zveřejnění Smlouvy v registru smluv: 28.12. 2022 13:30:07<br>ID Smlouvy: 21343257                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                              |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          | poštou <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                           | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | faxem <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                            | osobně <input type="checkbox"/>              |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | specifikaci:                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                         |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | na výkresy:                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                         |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | na rozpočtové podklady:                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                         |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | na jinou část smlouvy:                                                                                                   | - Odst. 2.1 Smlouvy, Příloha č. 6 Smlouvy – NABÍDKA ZHOTOVITELE                                                                                                                           |                                              |
| <b>Předmět změny:</b><br>– <b>ZMĚNA – PŘIPOJOVACÍ BOD - ZMĚNA TRASY PŘIPOJENÍ KABELU PRO ZS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                              |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>– V rámci zadávací dokumentace byl Objednatel stanoven připojovací bod pro potřeby zařízení staveniště (ZS) - pro část elektro - hlavní rozvodna objektu HB3<br>– Z důvodu nedostatečné volné kapacity v zamýšlené rozvodně bylo nutno zajistit nové připojení pro potřeby zařízení staveniště. Nový přípojný bod byl stanoven z prostor rozvaděči v ČOV (čistírny odpadních vod). Jedná se o změnu délky trasy (322m oproti původním 92 m) |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                              |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b><br>-  – SOUHLASÍM.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                         |                                              |
| <b>Změna podle příslušného odstavce § 222 ZZVZ</b><br><b>Stanovisko Odboru veřejných zakázek FN Motol:</b><br>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.<br>Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                              |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                              |
| <b>Příloha:</b><br>– SITUAČNÍ ZÁKRES – KABEL ELEKTR – PŘIPOJENÍ ZS<br>– PORR - soupis prací – Položkový rozpočet stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                              |
| <b>Zhotovitel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          | <b>PORR, a.s.</b><br>se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560                                                                                                |                                              |
| <b>Změnový list vystavil:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                        |                                              |
| <b>Datum:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          | 19.12.2023.                                                                                                                                                                               |                                              |
| Cena méněprací bez DPH:<br>- 54 080,00,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | Cena víceprací bez DPH:<br>+ 300 578,09,- Kč                                                                                                                                              |                                              |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br>+ 246 498,09,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br><b>BEZE ZMĚNY</b><br>(PLATNÝ TERMÍN DOKONČENÍ DLE SOD)<br> |                                              |



Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis za Objednatele:

**Fakultní nemocnice v Motole**  
státní příspěvková organizace

Datum

Podpis za Zhotovitele:

**PORR,a.s.**







zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 43567  
zastoupená

**Věc: VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO A TECHNICKÉHO DOZORU**

**Předmět vyjádření:** **ZL č. 05 – ZMĚNA – PŘIPOJOVACÍ BOD - ZMĚNA TRASY PŘIPOJENÍ KABELU PRO ZS**

**Název stavby:** **SIMULAČNÍ CENTRUM INTENZIVNÍ MEDICÍNY**  
Provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu „Simulační centrum intenzivní medicíny“  
číslo smlouvy objednatele 2203200857 ze dne 22. 12. 2022.

**Zhotovitel:** **PORR, a.s.**  
**se sídlem:** Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice  
IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

**Ev. č. vyjádření:** **173.**

**Datum vyjádření:** 06.04.2025.

**AD a TDO:** **PIKMA, s.r.o.**  
Novodvorská 1074/26, 674 01 Třebíč

IČ: 268 88 181, DIČ: CZ 268 88 181, Je plátcem DPH  
**objednatel společnost**

Autorizovaný inženýr pro obor inženýringu staveb - C, 1004 P13  
Znalec v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské.

**Vyjádření:**

**VYJÁDŘENÍ AD A TDO**

Poznámka – E-mail – PORR, a.s.

Poznámka – E-mail – FNM,

**POKYN:**

**VYJÁDŘENÍ – POKYN**


– AD a TDO tímto souhlasí.

**ZÁVĚR:**

**AD a TDO tímto souhlasí.**

Poznámka – Zhotovitel provede příslušnou kompletaci daného ZL.

**Vypracoval:**



**Příloha:**

- **ZL č. 05 – ZMĚNA – PŘIPOJOVACÍ BOD - ZMĚNA TRASY PŘIPOJENÍ KABELU PRO ZS**
- **ZL č. 05 – CENOVÁ KALKULACE**

V Třebíči dne 06.04.2025.

## ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL 05

## Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny - Trasy připojovacího bodu elektro pro ZS

V Praze dne 27.01.2025


Zhotovitel: PORR, a.s.  
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace  
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

| PČ                    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem připočet | Cena celkem odpočet | Cena celkem | cenová úroveň                                  |
|-----------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------|
| Celkem stavební práce |     |           |                                                                                                                       |    |          |              | 300 578,09           | -54 080,00          | 246 498,09  |                                                |
| D                     |     | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                   |    |          |              | 3 297,12             | 0,00                | 3 297,12    |                                                |
| D                     | 1   |           | Zemní práce                                                                                                           |    |          |              | 3 170,32             | 0,00                | 3 170,32    |                                                |
| 1                     | K   | 113201112 | Vytváření obrub silničních ležatých                                                                                   | m  | 2,000    | 146,000      | 292,00               |                     | 292,00      | KROS CÚ 2022/II.                               |
| 2                     | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3                | m3 | 2,400    | 328,00       | 787,20               |                     | 787,20      | cena z kontrol.rozpočtu D.1.1.1 poř.č.19       |
|                       |     |           | "zemina" 0,8*5*0,6                                                                                                    |    | 2,400    |              |                      |                     |             |                                                |
| 3                     | K   | 162751119 | Připílek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKO 1000 m přes 10000 m | m3 | 16,800   | 25,30        | 425,04               |                     | 425,04      | cena z kontrol.rozp. D.1.1.1 poř.č.20          |
|                       |     |           | "zemina" 2,4*7                                                                                                        |    | 16,800   |              |                      |                     |             |                                                |
|                       |     |           | Součet                                                                                                                |    | 16,800   |              |                      |                     |             |                                                |
| 4                     | K   | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odbadu 17.05.04                             | t  | 4,320    | 291,00       | 1 257,12             |                     | 1 257,12    | cena z kontrol.rozp. D.1.1.1 poř.č.22          |
|                       |     |           | "zemina" 2,4*1,8                                                                                                      |    | 4,320    |              |                      |                     |             |                                                |
|                       |     |           | Součet                                                                                                                |    | 4,320    |              |                      |                     |             |                                                |
| 5                     | K   | 171251201 | Uložení sypání na skládky nebo meziskládky                                                                            | m3 | 2,400    | 22,40        | 53,76                |                     | 53,76       | cena z kontrol.rozp. D.1.1.1 poř.č.23          |
|                       |     |           | "zemina" 2,4                                                                                                          |    | 2,400    |              |                      |                     |             |                                                |
|                       |     |           | Součet                                                                                                                |    | 2,400    |              |                      |                     |             |                                                |
| 6                     | K   | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním                                                         | m3 | 2,400    | 148,00       | 355,20               |                     | 355,20      | cena z kontrol.rozp. D.1.1.1 poř.č.24          |
| D                     | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                   |    |          |              | 126,80               | 0,00                | 126,80      |                                                |
| 7                     | D   | 979021113 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí                                  | m  | 2,000    | 63,40        | 126,80               |                     | 126,80      | KROS CÚ 2022/II.                               |
|                       |     |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                   |    |          |              | 264 070,00           | -54 080,00          | 209 990,00  |                                                |
| D                     | 741 |           | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                         |    |          |              | 264 070,00           | -54 080,00          | 209 990,00  |                                                |
| 8                     | K   | 741110003 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená povně                                                                | m  | 280,000  | 44,20        | 12 376,00            |                     | 12 376,00   | KROS CÚ 2022/II.                               |
| 9                     | M   | 34571355  | trubka elektroinstalací ohebná dvouplášťová korozivodná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE 280*1,05                    | m  | 294,000  | 106,00       | 31 164,00            |                     | 31 164,00   | KROS CÚ 2022/II.                               |
|                       |     |           | Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená povně                                                                | m  | 320,250  |              |                      |                     |             | KROS CÚ 2022/II.                               |
| 10                    | K   | 741110003 |                                                                                                                       |    | -80,000  | 44,20        |                      | -3 536,00           | -3 536,00   | odpočet z kontrol.rozp.kpl ZS                  |
| 11                    | M   | 34571355  | trubka elektroinstalací ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE                              | m  | -84,000  | 106,00       |                      | -8 904,00           | -8 904,00   | odpočet z kontrol.rozp.kpl ZS                  |
|                       |     |           | -34                                                                                                                   |    | -84,000  |              |                      |                     |             |                                                |
| 12                    | K   | 741123233 | Montáž kabel Al plný nebo lanový kulatý žila 3x150+70 až 240*120 mm2 uložený volně (např. AVKY)                       | m  | -80,000  | 53,60        |                      | -4 288,00           | -4 288,00   | KROS CÚ 2022/II. odpočet z kontrol.rozp.kpl ZS |

| PC | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ             | Množství | J.cena (CZK) | Cena celkem připočet | Cena celkem odpobět | Cena celkem | cenová úroveň                                     |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 13 | M   | 34113229  | kabel síťový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x150+70mm <sup>2</sup>                                                                   | m              | -92,000  | 406,00       |                      | -37 352,00          | -37 352,00  | KROS CÚ 2022/II.<br>odpočet z kontrol.rozř.knl ZS |
| 14 | K   | 741123318 | Montáž kabelu Al ploš nebo lankový kulatý 21a 3x150+70 až 240+120 mm <sup>2</sup> uložený rovně (např. AYKY)                                           | m              | -92,000  | 96,00        | 26 880,00            |                     | 26 880,00   | KROS CÚ 2022/II.                                  |
| 15 | M   | 34113241  | kabel síťový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm <sup>2</sup>                                                                  | m              | 322,000  | 555,00       | 178 710,00           |                     | 178 710,00  | KROS CÚ 2022/II.                                  |
| 16 | K   | 741136005 | Propojení kabelu celoplastový spojkou venkovní smřňovací do 1 kV 3x185+95-240+120 mm <sup>2</sup>                                                      | kus            | 350,750  | 3940,00      | 7 880,00             |                     | 7 880,00    | KROS CÚ 2022/II.                                  |
| 17 | M   | 35436032  | spojka kabelová smřňovaná přímo do 1kV 91ahsc-185 3.43 x120-185mm                                                                                      | kus            | 2,000    | 3530,00      | 7 060,00             |                     | 7 060,00    | KROS CÚ 2022/II.                                  |
|    | D   | M         | Práce a dodávky M                                                                                                                                      |                |          |              | 33 210,97            | 0,00                | 33 210,97   |                                                   |
|    | D   | 46-M      | Zemní práce při extr.monit.pracích                                                                                                                     |                |          |              | 33 210,97            | 0,00                | 33 210,97   |                                                   |
| 18 | K   | 460010024 | Výběv trasy vedení kabelového podzemního v zastřešeném prostoru                                                                                        | km             | 0,300    | 1620,00      | 486,00               |                     | 486,00      | KROS CÚ 2022/II.                                  |
| 19 | K   | 460161312 | Houbení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3                                                                                | m              | 5,000    | 870,00       | 4 350,00             |                     | 4 350,00    | KROS CÚ 2022/II.                                  |
| 20 | K   | 460171272 | Houbení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3                                                                  | m              | 5,000    | 173,00       | 865,00               |                     | 865,00      | KROS CÚ 2022/II.                                  |
| 21 | K   | 460431292 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3                                                                      | m              | 5,000    | 147,00       | 735,00               |                     | 735,00      | KROS CÚ 2022/II.                                  |
| 22 | K   | 460431662 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 80 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3                                                                      | m              | 5,000    | 209,00       | 1 045,00             |                     | 1 045,00    | KROS CÚ 2022/II.                                  |
| 23 | K   | 460661313 | Kabelové lože z písku pro kabely m kryté betonovou deskou š lože přes 40 do 50 cm                                                                      | m              | 5,000    | 187,00       | 935,00               |                     | 935,00      | KROS CÚ 2022/II.                                  |
| 24 | K   | 460881114 | Kryt vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm                                                                     | m <sup>2</sup> | 5,000    | 828,00       | 4 140,00             |                     | 4 140,00    | KROS CÚ 2022/II.                                  |
| 25 | K   | 460881223 | Kryt vozovky z asfaltového betonu při elektromontážích vstava obrusná tl 5 cm                                                                          | m <sup>2</sup> | 5,000    | 403,00       | 2 015,00             |                     | 2 015,00    | KROS CÚ 2022/II.                                  |
| 26 | K   | 460891121 | Osazení betonového obrubníku silničního ležatého do betonu při elektromontážích                                                                        | m              | 2,000    | 302,00       | 604,00               |                     | 604,00      | KROS CÚ 2022/II.                                  |
| 27 | K   | 468011131 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl do 15 cm "houbka 15cm" 0,6*5                                       | m <sup>2</sup> | 3,000    | 728,00       | 2 184,00             |                     | 2 184,00    | KROS CÚ 2022/II.                                  |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                                 |                | 3,000    |              |                      |                     |             |                                                   |
| 28 | R   | 468011132 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl přes 15 do 30 cm                                                   | m <sup>2</sup> | 4,000    | 1230,00      | 4 920,00             |                     | 4 920,00    | KROS CÚ 2022/II.                                  |
| 29 |     | 468011142 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze žulice tl přes 5 do 10 cm                                                            | m <sup>2</sup> | 4,000    | 222,00       | 888,00               |                     | 888,00      | KROS CÚ 2022/II.                                  |
| 30 | 013 | 468041123 | Rezáni živého podkladu nebo krytu při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm                                                                             | m              | 10,000   | 186,00       | 1 860,00             |                     | 1 860,00    | KROS CÚ 2022/II.                                  |
| 31 | 946 | 468051131 | Bourání základu železobetonového při elektromontážích                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 0,875    | 6440,00      | 5 635,00             |                     | 5 635,00    | KROS CÚ 2022/II.                                  |
|    |     |           | "2b píasek pod komunikaci" 5*0,350                                                                                                                     |                | 0,875    |              |                      |                     |             |                                                   |
| 32 | 013 | 469972111 | Odvoz suti a vbouraných hmot při elektromontážích do 1 km                                                                                              | t              | 2,075    | 547,00       | 1 135,03             |                     | 1 135,03    | KROS CÚ 2022/II.                                  |
|    |     |           | 0,5*2,4                                                                                                                                                |                | 1,200    |              |                      |                     |             |                                                   |
|    |     |           | 0,875 "2b vstavy pod komunikaci"                                                                                                                       |                | 2,075    |              |                      |                     |             |                                                   |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                                 |                | 3,275    |              |                      |                     |             |                                                   |
| 33 | 013 | 469972121 | Příplatek k odvozu suti a vbouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km                                                                     | t              | 30,125   | 18,90        | 569,36               |                     | 569,36      | KROS CÚ 2022/II.                                  |
|    |     |           | 0,5*2,4*20                                                                                                                                             |                | 24,000   |              |                      |                     |             |                                                   |
|    |     |           | 0,875*7                                                                                                                                                |                | 6,125    |              |                      |                     |             |                                                   |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                                 |                | 30,125   |              |                      |                     |             |                                                   |
| 34 |     | 469973125 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu olehu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t              | 1,200    | 557,00       | 668,40               |                     | 668,40      | KROS CÚ 2022/II.                                  |
|    |     |           | "přepočet na m <sup>3</sup> 0,5*2,4                                                                                                                    |                |          |              |                      |                     |             |                                                   |
| 35 |     | 469981111 | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích                                                                                            | t              | 1,200    | 261,00       | 176,18               |                     | 176,18      | KROS CÚ 2022/II.                                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                     |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | <b>číslo: ZL 06</b>                                                                 |                                              |
| <b>Zhotovitel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>PORR, a.s.</b><br>se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560                               |                                                                                     |                                              |
| <b>Objednatel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Fakultní nemocnice v Motole</b> , státní příspěvková organizace<br>se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203 | <b>Datum:</b> 19.12.2023.                                                           |                                              |
| <b>Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny</b><br>Smlouva č. 2203200857 na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu - <b>Simulační centrum intenzivní medicíny</b><br>Datum uzavření: 22. 12. 2022 /dále jen Smlouva/<br>Datum a čas zveřejnění Smlouvy v registru smluv: 28.12. 2022 13:30:07<br>ID Smlouvy: 21343257 |                                                                                                                          |                                                                                     |                                              |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          | poštou <input type="checkbox"/>                                                     | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | faxem <input type="checkbox"/>                                                      | osobně <input type="checkbox"/>              |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | specifikaci:                                                                                                             | -                                                                                   |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | na výkresy:                                                                                                              | -                                                                                   |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | na rozpočtové podklady:                                                                                                  | -                                                                                   |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | na jinou část smlouvy:                                                                                                   | - Odst. 2.1 Smlouvy, Příloha č. 6 Smlouvy – NABÍDKA ZHOTOVITELE                     |                                              |
| <b>Předmět změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                     |                                              |
| <b>ZMĚNA – NÁHRADNÍ VÝSADBA – POŽADAVEK DOSS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                              |
| (Poznámka – DOSS – Dotčený orgán státní správy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                     |                                              |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                              |
| - V rámci výkonu inženýrské činnosti, související s vydáním příslušného rozhodnutí z moci úřední, dotčený orgán státní správy (DOSS) - MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, stanovil požadavky, týkající se povinnosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Provést náhradní výsadbu v předepsaném složení</li> <li>○ Zajistit 5-ti letou následnou péči</li> </ul>              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                              |
| <b>Poznámka</b> - Součástí SOD je 5 ks nově vysázených stromů. Toto množství bylo zohledněno v rámci vypracování tohoto změnového listu.<br><b>Poznámka</b> - V rámci tohoto změnového listu Zhotovitel neoceňoval úpravu PD a rozsah prací související s realizací následné péče.                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                     |                                              |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                     |                                              |
| -  <b>SOUHLASÍM.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |  |                                              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          | 0                                                                                   |                                              |
| <b>Změna podle příslušného odstavce § 222 ZZVZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                     |                                              |
| <b>Stanovisko Odboru veřejných zakázek FN Motol:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                     |                                              |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                     |                                              |
| Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                     |                                              |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                     |                                              |
| <b>Příloha:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                     |                                              |
| - PORR - soupis prací – Položkový rozpočet stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                     |                                              |

|                                |                                                                                            |  |  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Zhotovitel:</b>             | <b>PORR, a.s.</b><br>se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560 |  |  |
| <b>Změnový list vystavil:</b>  |         |  |  |
| <b>Datum:</b>                  | 19.12.2023.                                                                                |  |  |
| <b>Cena méněprací bez DPH:</b> | <b>Cena víceprací bez DPH:</b>                                                             |  |  |
| 0,- Kč                         | + 161 842,68,- Kč                                                                          |  |  |

Výsledná cena změny bez DPH:

**+ 161 842,68,- Kč**

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

**BEZE ZMĚNY**

(PLATNÝ TERMÍN DOKONČENÍ DLE SOD)


**10.12.2025.**

(MILNÍK č. 9)

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis za Objednatele:

**Fakultní nemocnice v Motole**  
státní příspěvková organizace




Dat

Podpis za Zhotovitele:

**PORR,a.s.**

Ing. Peter Suchý, předseda představenstva

Ing. Dušan Čížek, MBA, člen představenstva

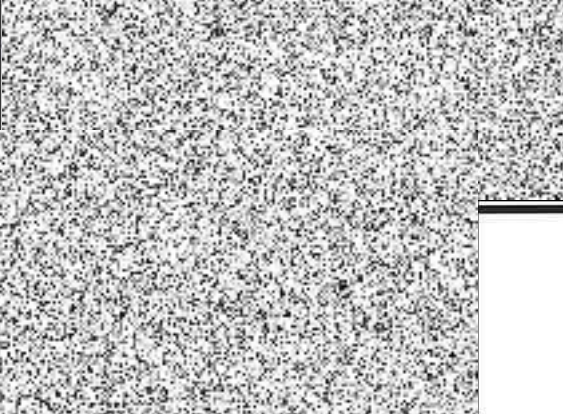



ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL 06

Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny - Náhradní výsadba vč. splnění požadavků DOSS

V Praze dne 27.01.2025

Zhotovitel: PORR, a.s.  
se sídlem Dubčská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560  
Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace  
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

| PČ                    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem připočet | Cena celkem | cenová úroveň                        |
|-----------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|
| Celkem stavební práce |     |           |                                                                                                          |     |          |              | 0,00                 | 161 842,68  |                                      |
|                       | D   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                      |     |          |              | 161 842,68           | 161 842,68  |                                      |
|                       | D   | 1.02      | Výsadba soliterních stromů vel. 16-18                                                                    |     |          |              | 142 192,64           | 142 192,64  |                                      |
| 1                     | K   | 183101221 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 11,000   | 1 570,00     | 17 270,00            | 17 270,00   | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 2  |
| 2                     | M   | 10321100  | zahradní substrát pro výsadbu VL                                                                         | m3  | 2,750    | 1 370,00     | 3 767,50             | 3 767,50    | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 3  |
| 3                     | K   | 184102114 | Výsadba dřevin s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5                   | kus | 16,000   | 346,00       | 5 536,00             | 5 536,00    | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 4  |
| 4                     | M   | 026X.001  | dodání stromů (školkařské výpěsky s balem vel. 16-18)                                                    | kus | 11,000   | 7 800,00     | 85 800,00            | 85 800,00   | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 5  |
| 5                     | K   | 184215133 | Ukrojení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m               | kus | 11,000   | 323,00       | 3 553,00             | 3 553,00    | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 6  |
| 6                     | M   | 60591257  | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m                                                          | kus | 33,000   | 179,00       | 5 907,00             | 5 907,00    | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 7  |
|                       | VV  |           | 11*3 Přepočtené koeficientem množství                                                                    |     | 48,000   |              |                      |             |                                      |
| 7                     | K   | 184215413 | Zhotovení závahové misky dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5                               | kus | 11,000   | 109,00       | 1 199,00             | 1 199,00    | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 8  |
| 8                     | M   | 10364100  | zemina pro terénní úpravy - tříděná                                                                      | t   | 0,055    | 273,00       | 15,02                | 15,02       | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 9  |
|                       | VV  |           | 11*0,005 Přepočtené koeficientem množství                                                                |     | 0,080    |              |                      |             |                                      |
| 9                     | K   | 184215X01 | Dodání a zhotovení ochranného náteru kmene                                                               | kus | 15,840   | 185,00       | 2 930,40             | 2 930,40    | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 10 |
|                       | VV  |           | 0,48*3*11                                                                                                |     | 15,840   |              |                      |             |                                      |
| 10                    | K   | 184801121 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5                                         | kus | 11,000   | 88,70        | 975,70               | 975,70      | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 11 |
| 11                    | K   | 184911421 | Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5                                              | m2  | 22,000   | 44,10        | 970,20               | 970,20      | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 12 |
|                       | VV  |           | 11,000*2                                                                                                 |     | 32,000   |              |                      |             |                                      |
| 12                    | M   | 10391100  | kůra mulčovací VL                                                                                        | m3  | 3,296    | 1 520,00     | 5 009,92             | 5 009,92    | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 13 |
|                       | VV  |           | 22*0,103 Přepočtené koeficientem množství                                                                |     | 2,266    |              |                      |             |                                      |
| 13                    | K   | 185802114 | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5                             | t   | 0,001    | 33 500,00    | 16,75                | 16,75       | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 14 |
|                       | VV  |           | 0,00005*11                                                                                               |     | 0,001    |              |                      |             |                                      |
| 14                    | M   | 25191155  | hnojivo průmyslové                                                                                       | kg  | 8,000    | 31,20        | 249,60               | 249,60      | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 15 |
| 15                    | K   | 185802114 | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5                             | t   | 0,128    | 33 500,00    | 4 288,00             | 4 288,00    | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 16 |
|                       | VV  |           | 0,008*11                                                                                                 |     | 0,880    |              |                      |             |                                      |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem připočet | Cena celkem odpočet | Cena celkem | cenová úroveň                        |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|
| 16 | M   | 2519X.01  | hnojivo dlouhodobě působícího hnojiva                                                                                                            | kg  | 8,000    | 555,00       | 4 440,00             |                     | 4 440,00    | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 17 |
| 17 | K   | 185804311 | Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2                                                                                                             | m3  | 0,550    | 481,00       | 264,55               |                     | 264,55      | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 18 |
|    | N   |           | 0,05*11                                                                                                                                          |     | 0,550    |              |                      |                     |             |                                      |
| 18 | K   | 183101221 | Výsadba soliterních stromů vel. 20 - 25 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 1,000    | 1 570,00     | 19 650,04            |                     | 19 650,04   | cena z kontrol.rozp. D.502 poř.č. 2  |
| 19 | M   | 10321100  | zahradní substrát pro výsadbu VL                                                                                                                 | m3  | 4,000    | 1 370,00     | 5 480,00             |                     | 5 480,00    | cena z kontrol.rozp D.502 poř.č. 2   |
| 20 | K   | 184102115 | Výsadba dřevin s balet D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5                                                           | kus | 1,000    | 558,00       | 558,00               |                     | 558,00      | KROS CÚ 2022/II.                     |
| 21 | IND | 02BX.002  | dodání stromů (školkařské výpěsky s baletem vel. 20-25)                                                                                          | kus | 1,000    | 9 850,00     | 9 850,00             |                     | 9 850,00    | individuální cena - doklad č.4       |
| 22 | K   | 185802114 | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5                                                                     | t   | 0,001    | 33 500,00    | 33,50                |                     | 33,50       | cena z kontrol.rozp D.502 poř.č. 14  |
| 23 | M   | 25191155  | hnojivo průmyslové                                                                                                                               | kg  | 0,001    | 31,20        | 0,03                 |                     | 0,03        | cena z kontrol.rozp D.502 poř.č. 15  |
| 24 | K   | 185802114 | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5                                                                     | t   | 0,001    | 33 500,00    | 33,50                |                     | 33,50       | cena z kontrol.rozp D.502 poř.č. 16  |
| 25 | M   | 2519X.01  | hnojivo dlouhodobě působícího hnojiva                                                                                                            | kg  | 1,000    | 555,00       | 555,00               |                     | 555,00      | cena z kontrol.rozp D.502 poř.č. 17  |
| 26 | K   | 184215133 | Ukořtení kmenů dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m                                                       | kus | 1,000    | 310,00       | 310,00               |                     | 310,00      | KROS CÚ 2022/II.                     |
| 27 | M   | 60591257  | kůl vyzávací dřeviny impregnovaný D 8cm dl 3m                                                                                                    | kus | 3,000    | 185,00       | 555,00               |                     | 555,00      | KROS CÚ 2022/II.                     |
|    | N   |           | 1*3 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                             |     | 3,000    |              |                      |                     |             |                                      |
| 30 | K   | 184215413 | Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                       | kus | 1,000    | 109,00       | 109,00               |                     | 109,00      | cena z kontrol.rozp D.502 poř.č. 8   |
| 31 | M   | 10364100  | zemina pro terénní úpravy - třídněná                                                                                                             | t   | 0,005    | 273,00       | 1,37                 |                     | 1,37        | cena z kontrol.rozp D.502 poř.č. 9   |
|    | N   |           | 1*0,005 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                         |     | 0,005    |              |                      |                     |             |                                      |
| 32 | K   | 184501141 | Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5                                                                          | m2  | 0,450    | 106,00       | 47,70                |                     | 47,70       | KROS CÚ 2022/II.                     |
| 33 | M   | 61894003  | rákos ohradový nebalupaný 60x200cm                                                                                                               | m2  | 0,495    | 66,40        | 32,87                |                     | 32,87       | KROS CÚ 2022/II.                     |
|    | N   |           | 0,45*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                        |     | 0,495    |              |                      |                     |             |                                      |
| 34 | K   | 184801121 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5                                                                                 | kus | 1,000    | 88,70        | 88,70                |                     | 88,70       | cena z kontrol.rozp D.502 poř.č. 11  |
| 35 | K   | 184911421 | Mulcování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5                                                                                      | m2  | 2,000    | 44,10        | 88,20                |                     | 88,20       | cena z kontrol.rozp D.502 poř.č. 27  |
| 36 | M   | 10391100  | kůra mulčovací VL                                                                                                                                | m3  | 0,206    | 1 520,00     | 313,12               |                     | 313,12      | cena z kontrol.rozp D.502 poř.č. 28  |
|    | N   |           | 2*0,103 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                         |     | 0,206    |              |                      |                     |             |                                      |
| 37 | K   | 185804311 | Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2                                                                                                             | m3  | 0,050    | 481,00       | 24,05                |                     | 24,05       | cena z kontrol.rozp D.502 poř.č. 29  |





zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 43567

**Věc: VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO A TECHNICKÉHO DOZORU**

**Předmět vyjádření:** ZL č. 06 – ZMĚNA – NÁHRADNÍ VÝSADBA - POŽADAVEK DOSS

**Název stavby:** SIMULAČNÍ CENTRUM INTENZIVNÍ MEDICÍNY

Provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu „Simulační centrum intenzivní medicíny“ číslo smlouvy objednatele 2203200857 ze dne 22. 12. 2022.

**Zhotovitel:** PORR, a.s.  
**se sídlem:** Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice  
IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

**Ev. č. vyjádření:** 174.

**Datum vyjádření:** 06.04.2025.

**AD a TDO:** PIKMA, s.r.o.

Novodvorská 1074/26, 674 01 Třebíč

Telex: 268881

IČ: 268 88 181. DIČ: CZ 268 88 181. Je plátcem DPH.

Autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby - č. 1004113

Znalec v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské.

**Vyjádření:**

**VYJÁDŘENÍ AD A TDO**

Poznámka – E-mail – PORR,

Poznámka – E-mail – FNM,

**POKYN:**

**VYJÁDŘENÍ – POKYN**

– AD a TDO tímto souhlasí.

**ZÁVĚR:**

**AD a TDO tímto souhlasí.**

Poznámka – Zhotovitel provede příslušnou kompletaci daného ZL.

**Vypracoval:**





**Příloha:**

- **ZL č. 06 – ZMĚNA – NÁHRADNÍ VÝSADBA - POŽADAVEK DOSS**
- **ZL č. 06 – CENOVÁ KALKULACE**

V Třebíči dne 06.04.2025.




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          | <b>číslo: ZL 07</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| <b>Zhotovitel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PORR, a.s.</b><br>se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| <b>Objednatel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Fakultní nemocnice v Motole</b> , státní příspěvková organizace<br>se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203 | <b>Datum:</b> 19.12.2023.                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| <b>Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny</b><br>Smlouva č. 2203200857 na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu - <b>Simulační centrum intenzivní medicíny</b><br>Datum uzavření: 22. 12. 2022 /dále jen Smlouva/<br>Datum a čas zveřejnění Smlouvy v registru smluv: 28.12. 2022 13:30:07<br>ID Smlouvy: 21343257                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| <b>Způsob odeslání / předání datum:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          | <b>poštou</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                 | <b>e-mailem</b> <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | <b>faxem</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                  | <b>osobně</b> <input checked="" type="checkbox"/>   |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>specifikaci:</b>                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>na výkresy:</b>                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>na rozpočtové podklady:</b>                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>na jinou část smlouvy:</b>                                                                                            | - Odst. 2.1 Smlouvy, Příloha č. 6 Smlouvy – NABÍDKA ZHOTOVITELE                                                                                                                                                                        |                                                     |
| <b>Předmět změny:</b><br>- <b>ZMĚNA – STAVEBNÍ SUŤ – VÝKOPY STAVEBNÍ JÁMY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>- V rámci provádění zemních prací (odtěžování zeminy) bylo zjištěno, že těžená stavební jáma obsahuje značné množství různorodého materiálu (jako např. beton, ocel, komunální odpad apod.) - odpadu. Tento materiál je nezbytné třídit a likvidovat v souladu s platnou legislativou. Objemy vytěženého materiálu jsou průběžně zaznamenávány ve stavebním deníku.<br>- Vzhledem k postupu výstavby byla provedena i kategorizace zjištěného odpadu a bylo provedeno i rozdělení na části 7a, 7b, 7c. |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                     |
| -  – <b>SOUHLASÍM.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| <b>Počet připojených listů specifikací:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| <b>Změna podle příslušného odstavce § 222 ZZVZ</b><br><b>Stanovisko Odboru veřejných zakázek FN Motol:</b><br>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.<br>Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| <b>Příloha:</b><br>- PORR - soupis prací – Položkový rozpočet stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| <b>Zhotovitel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | <b>PORR, a.s.</b><br>se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560                                                                                                                                             |                                                     |
| <b>Změnový list vystavil:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                     |
| <b>Datum:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          | 19.12.2023.                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| <b>Cena méněprací bez DPH:</b><br><b>- 2 321 961,14,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | <b>Cena víceprací bez DPH:</b><br><b>+ 5 712 110,59,- Kč</b>                                                                                                                                                                           |                                                     |
| <b>Výsledná cena změny bez DPH:</b><br><b>+ 3 390 149,15,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          | <b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b><br><br><b>BEZE ZMĚNY</b><br>(PLATNÝ TERMÍN DOKONČENÍ DLE SOD)<br><b>10.12.2025.</b><br>(MII NÍK č. 9)  |                                                     |

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.



Podpis za Objednatele:

**Fakultní nemocnice v Motole**  
státní příspěvková organizace



Podpis za Zhotovitele:

**PORR,a.s.**  
Ing. Peter Suchý, předseda představenstva  
Ing. Dušan Čížek, MBA, člen představenstva





ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL 07

Název akce: **Simulační centrum intenzivní medicíny - Rekapitulace - odpad ve stavební jámě (7a,b,c)**

V Praze dne 05.02.2025

Zhotovitel:

PORR, a.s.  
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

Objednatel:

Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace  
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

| PČ                    | Typ | Kód | Popis                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem<br>přičten | Cena celkem<br>odpočet | Cena celkem  | cenová úroveň |
|-----------------------|-----|-----|--------------------------|-----|----------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| Celkem stavební práce |     |     |                          |     |          |              |                        |                        |              |               |
| 1                     | κ   |     | Celkem stavební práce 7a | kpl |          |              | 3 374 235,86           | -1 323 348,16          | 2 050 887,71 |               |
| 2                     | κ   |     | Celkem stavební práce 7b | kpl |          |              | 1 772 475,43           | -893 269,97            | 879 205,45   |               |
| 3                     | κ   |     | Celkem stavební práce 7c | kpl |          |              | 565 399,31             | -105 343,01            | 460 056,29   |               |



Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny - Odpad ve stavební jámě (7a,b,c)

V Praze dne 05.02.2025

Zhotovitel: PORR, a.s.  
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace  
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

| PČ                    | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem<br>připočet | Cena celkem<br>odpočet | Cena celkem  | cenová úroveň |
|-----------------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| Celkem stavební práce |     |     |       |    |          |              | 3 374 235,86            | -1 323 348,16          | 2 050 887,71 |               |

|                     |   |             |                                                                                                                                                     |    |            |        |              |             |              |                                        |
|---------------------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|-------------|--------------|----------------------------------------|
| Práce a dodávky HSV |   |             |                                                                                                                                                     |    |            |        |              |             |              |                                        |
| D                   | D | 1           | Zemní práce                                                                                                                                         |    |            |        |              |             |              |                                        |
| 1                   | κ | 131251106   | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně                                                         | m3 | -1 075,900 | 147,00 |              | -158 157,30 | -265 846,05  | cena z kontrol.rozp. D.1.1.1 poř.č. 12 |
|                     |   |             | "půdorysná plocha hl výkopu"-1075,9*1                                                                                                               |    | -1 075,900 |        |              |             |              |                                        |
| 2                   | R | 131251106-R | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně - směr stavebního odpadu (suť, beton, komunální odpad) | m3 | 1 075,900  | 181,33 | 195 092,95   |             | 195 092,95   | individuální cena - doklad č.5         |
|                     |   |             | "půdorysná plocha hl výkopu"-1075,9*1                                                                                                               |    |            |        |              |             |              |                                        |
| 3                   | κ | 131251207   | Hloubení jam zapážených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně                                                         | m3 | -3 227,700 | 224,00 |              | -723 004,80 | -723 004,80  | cena z kontrol.rozp. D.1.1.1 poř.č. 14 |
|                     |   |             | "hlavní stavební jáma"-1075,9*3                                                                                                                     |    | -3 227,700 |        |              |             |              |                                        |
| 4                   | R | 131251207-R | Hloubení jam zapážených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně - směr stavebního odpadu (suť, beton, komunální odpad)    | m3 | 3 227,70   | 267,19 | 862 409,16   |             | 862 409,16   | individuální cena - doklad č.6         |
|                     |   |             | "hlavní stavební jáma"-1075,9*3                                                                                                                     |    | 3 227,700  |        |              |             |              |                                        |
| 5                   | κ | 162351103   | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                   | m3 | -348,164   | 87,80  |              | -30 568,80  | -30 568,80   | cena z kontrol.rozp. D.1.1.1 poř.č. 18 |
|                     |   |             | -783,37/2,25                                                                                                                                        |    | -348,164   |        |              |             |              |                                        |
| 6                   | κ | 162751117   | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                              | m3 | -348,164   | 328,00 |              | -114 197,79 | -114 197,79  | cena z kontrol.rozp. D.1.1.1 poř.č. 19 |
|                     |   |             | -783,37/2,25                                                                                                                                        |    | -348,164   |        |              |             |              |                                        |
| 7                   | κ | 162751119   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                              | m3 | -2 437,15  | 25,30  |              | -61 659,92  | -61 659,92   | cena z kontrol.rozp. D.1.1.1 poř.č. 20 |
|                     |   |             | -783,37/2,25)*7                                                                                                                                     |    | -2 437,151 |        |              |             |              |                                        |
| 8                   | κ | 171201231   | Poplatek za uložení (skládkové)                                                                                                                     | t  | -783,37    | 291,00 |              | -227 960,67 | -227 960,67  | cena z kontrol.rozp. D.1.1.1 poř.č. 22 |
|                     |   |             | -783,37                                                                                                                                             |    | -783,370   |        |              |             |              |                                        |
| 9                   | κ | 171251201   | Uložení sypání na skládky nebo meziskládky                                                                                                          | m3 | -348,16    | 22,40  |              | -7 798,87   | -7 798,87    | cena z kontrol.rozp. D.1.1.1 poř.č. 23 |
|                     |   |             | -783,37/2,25                                                                                                                                        |    | -348,164   |        |              |             |              |                                        |
| 10                  | κ | 997006002   | Přesun suť                                                                                                                                          | t  | 783,37     | 165,00 | 2 316 733,75 | 0,00        | 2 316 733,75 |                                        |
|                     |   |             | Hrubé třídění stavebního odpadu                                                                                                                     | t  | 783,370    |        | 129 256,05   |             | 129 256,05   | KROS CÚ 2022/II.                       |
| 11                  | κ | 997002611   | Nakládání suť a vybouraných hmot                                                                                                                    | t  | 783,37     | 130,00 | 101 838,10   |             | 101 838,10   | KROS CÚ 2022/III.                      |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství                                                     | J.cena [CZK] | Cena celkem<br>přiboočet | Cena celkem<br>odbočet | Cena celkem  | cenová úroveň                  |
|----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------|
|    |     |              | 783,37<br>Součet                                                                                                                                                            |     | 783,370<br>783,370                                           |              |                          |                        |              |                                |
| 12 | K   | 997006511    | Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m<br>"07/2023"21,2+97,38+56,88<br>"08/2023"91,5<br>Mezisoučet<br>"08/2023"329,25+187,16<br>Součet           | t   | 783,37<br>175,460<br>91,500<br>266,960<br>516,410<br>783,370 | 56,40        | 44 182,07                |                        | 44 182,07    | KROS CÚ 2022/II.               |
| 13 | K   | 997006512    | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km<br>"07/2023"21,2+97,38+56,88<br>"08/2023"91,5<br>Mezisoučet<br>"08/2023"329,25+187,16<br>Součet | t   | 783,37<br>175,460<br>91,500<br>266,960<br>516,410<br>783,370 | 176,00       | 137 873,12               |                        | 137 873,12   | KROS CÚ 2022/II.               |
| 14 | K   | 997006519    | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km<br>"odpad 17 01 01"266,96 3<br>"odpad 17 01 07"516,41*42<br>Součet                                    | t   | 23 024,02<br>1 334,800<br>21 689,220<br>23 024,020           | 17,00        | 391 408,34               |                        | 391 408,34   | KROS CÚ 2022/II.               |
| 15 | K   | 997013601    | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01<br>"prostý beton"266,96*0,3<br>Součet                                          | t   | 80,088<br>80,088                                             | 1 460,00     | 116 928,48               |                        | 116 928,48   | KROS CÚ 2022/II.               |
| 16 | K   | 997013602    | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01<br>"ZB"266,96*0,6<br>Součet                                              | t   | 160,176<br>160,176                                           | 1 560,00     | 249 874,56               |                        | 249 874,56   | KROS CÚ 2022/II.               |
| 17 | IND | 997013869_R1 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí zeminy, betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07<br>516,41<br>výlohové zkoušky        | t   | 516,410                                                      | 2 111,30     | 1 090 296,43             |                        | 1 090 296,43 | individuální cena - doklad č.7 |
| 18 | IND | R2           | 2<br>výlohové zkoušky                                                                                                                                                       | kpl | 2<br>2,000                                                   | 27 538,30    | 55 076,60                |                        | 55 076,60    | individuální cena - doklad č.8 |



ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL 07\_b

Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny - Odpad ve stavební jámě (7a,b,c)

V Praze dne 05.02.2025

Zhotovitel: PORR, a.s.  
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace  
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem<br>přiboočet | Cena celkem<br>odbočet | Cena celkem | cenová úroveň |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|--------------------------|------------------------|-------------|---------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|--------------------------|------------------------|-------------|---------------|

Celkem stavební práce1 772 475,43-893 269,97879 205,45

|    |     |                                 |                                                                                                                                                   |    |            |        |              |             |             |                                           |
|----|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|
| D  | HSV | Práce a dodávky HSV             |                                                                                                                                                   |    |            |        | 1 772 475,43 | -893 269,97 | 879 205,45  |                                           |
| D  | 1   | Zemní práce                     |                                                                                                                                                   |    |            |        | 862 409,16   | -893 269,97 | -30 860,81  | cena z kontrol.rozp.<br>D 1,1,1 poř.č. 14 |
| 1  | K   | 131251207                       | Hloubení jam započtených v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně                                                       | m3 | -3 227,700 | 224,00 |              | -723 004,80 | -723 004,80 |                                           |
|    |     | "hlavní stavební jáma"-1075,9*3 |                                                                                                                                                   |    | -3 227,700 |        |              |             |             |                                           |
| 2  | R   | 131251207-R                     | Hloubení jam započtených v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně - směr stavebního odpadu (sut', beton, komunální odpad) | m3 | 3 227,70   | 267,19 | 862 409,16   |             | 862 409,16  | individuální cena -<br>doklad č.5         |
|    |     | "hlavní stavební jáma"-1075,9*3 |                                                                                                                                                   |    | 3 227,700  |        |              |             |             |                                           |
| 3  | K   | 162351103                       | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z hornin tříd těžitelosti I skupiny 1 až 3                                                   | m3 | -134,218   | 87,80  |              | -11 784,32  | -11 784,32  | cena z kontrol.rozp.<br>D 1,1,1 poř.č. 18 |
|    |     | (-301,99/2,25)                  |                                                                                                                                                   |    | -134,218   |        |              |             |             |                                           |
| 4  | K   | 162751117                       | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z hornin tříd těžitelosti I skupiny 1 až 3                                              | m3 | -134,218   | 328,00 |              | -44 023,43  | -44 023,43  | cena z kontrol.rozp.<br>D 1,1,1 poř.č. 19 |
|    |     | (-301,99/2,25)                  |                                                                                                                                                   |    | -134,218   |        |              |             |             |                                           |
| 5  | K   | 162751119                       | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hornin tříd těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                              | m3 | -939,52    | 25,30  |              | -23 769,97  | -23 769,97  | cena z kontrol.rozp.<br>D 1,1,1 poř.č. 20 |
|    |     | (-301,99/2,25)*7                |                                                                                                                                                   |    | -939,524   |        |              |             |             |                                           |
| 6  | K   | 171201231                       | Poplatek za uložení (skládkové)                                                                                                                   | t  | -301,99    | 291,00 |              | -87 879,09  | -87 879,09  | cena z kontrol.rozp.<br>D 1,1,1 poř.č. 22 |
|    |     | (-301,99)                       |                                                                                                                                                   |    | -301,990   |        |              |             |             |                                           |
| 7  | K   | 171251201                       | Uložení sypání na skládky nebo meziskládky                                                                                                        | m3 | -125,37    | 22,40  |              | -2 808,36   | -2 808,36   | cena z kontrol.rozp.<br>D 1,1,1 poř.č. 23 |
|    |     | (-301,99/2,25)                  |                                                                                                                                                   |    | -125,373   |        |              |             |             |                                           |
|    | 997 | Přesun sutě                     |                                                                                                                                                   |    |            |        |              |             |             |                                           |
| 8  | K   | 997006002                       | Hrubé třídění stavebního odpadu                                                                                                                   | t  | 301,99     | 165,00 | 910 066,26   | 0,00        | 910 066,26  |                                           |
|    |     | 301,99                          |                                                                                                                                                   |    | 301,990    |        | 49 828,35    |             | 49 828,35   | KROS CÚ 2022/III.                         |
| 9  | K   | 997006511                       | Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 100 m                                                                                 | t  | 301,990    | 56,40  | 17 032,24    |             | 17 032,24   | KROS CÚ 2022/III.                         |
|    |     | "09/2023"27,54+19,9             |                                                                                                                                                   |    | 47,440     |        |              |             |             |                                           |
|    |     | Mezisoučet                      |                                                                                                                                                   |    | 47,440     |        |              |             |             |                                           |
|    |     | "09/2023"249,29                 |                                                                                                                                                   |    | 249,290    |        |              |             |             |                                           |
|    |     | Mezisoučet                      |                                                                                                                                                   |    | 249,290    |        |              |             |             |                                           |
|    |     | "09/2023"5,26                   |                                                                                                                                                   |    | 5,260      |        |              |             |             |                                           |
|    |     | Součet                          |                                                                                                                                                   |    | 301,990    |        |              |             |             |                                           |
| 10 | K   | 997006512                       | Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km                                                                       | t  | 301,990    | 176,00 | 53 150,24    |             | 53 150,24   | KROS CÚ 2022/III.                         |



| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                        | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem<br>přičten | Cena celkem<br>odpočet | Cena celkem | cenová úroveň                     |
|----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|
|    |     |              | "09/2023" 27,54+19,9                                                                                                                         |    | 47,440     |              |                        |                        |             |                                   |
|    |     |              | Mezisoučet                                                                                                                                   |    | 47,440     |              |                        |                        |             |                                   |
|    |     |              | "09/2023" 249,29                                                                                                                             |    | 249,290    |              |                        |                        |             |                                   |
|    |     |              | Mezisoučet                                                                                                                                   |    | 249,290    |              |                        |                        |             |                                   |
|    |     |              | "09/2023" 5,26                                                                                                                               |    | 5,260      |              |                        |                        |             |                                   |
|    |     |              | Součet                                                                                                                                       |    | 301,990    |              |                        |                        |             |                                   |
| 11 | K   | 997006519    | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1<br>km přes 1 km                                                                     | t  | 10 634,18  | 17,00        | 180 781,06             |                        | 180 781,06  | KROS CÚ 2022/II.                  |
|    |     |              | "odpad 17 01 01" 27,54*5                                                                                                                     |    | 137,700    |              |                        |                        |             |                                   |
|    |     |              | "odpad 17 01 07" 249,29*42                                                                                                                   |    | 10 470,180 |              |                        |                        |             |                                   |
|    |     |              | "odpad 17 09 04" 5,26*5                                                                                                                      |    | 26,300     |              |                        |                        |             |                                   |
|    |     |              | Součet                                                                                                                                       |    | 10 634,180 |              |                        |                        |             |                                   |
| 12 | K   | 997013602    | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního<br>odpadu železobetonového kod odpadu 17 01 01                                        | t  | 47,440     | 1 560,00     | 74 006,40              |                        | 74 006,40   | KROS CÚ 2022/II.                  |
|    |     |              | "28" 27,54+19,9                                                                                                                              |    | 47,440     |              |                        |                        |             |                                   |
| 13 | IND | 997013869_R1 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního<br>odpadu ze směsí zeminy, betonu, cihel a keramických<br>výrobků kód odpadu 17 01 07 | t  | 249,29     | 2 111,30     | 526 325,98             |                        | 526 325,98  | individuální cena -<br>doklad č.7 |
|    |     |              | 249,29                                                                                                                                       |    | 249,290    |              |                        |                        |             |                                   |
| 14 | K   | 997013631    | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního<br>odpadu smíslného kód odpadu 17 09 04                                               | t  | 5,26       | 1 700,00     | 8 942,00               |                        | 8 942,00    | KROS CÚ 2022/II.                  |
|    |     |              | 5,26                                                                                                                                         |    | 5,260      |              |                        |                        |             |                                   |





Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny - Odpad ve stavební jámě (7a,b,c)

V Praze dne 05.02.2025

Zhotovitel: PORR, a.s.  
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace  
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

| PČ                    | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem<br>přičten | Cena celkem<br>odpočet | Cena celkem | cenová úroveň                             |
|-----------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| Celkem stavební práce |     |              |                                                                                                                                                       |    |           |              |                        |                        |             |                                           |
|                       |     |              |                                                                                                                                                       |    |           |              | 565 399,31             | -105 343,01            | 460 056,29  |                                           |
|                       | D   | HSV          | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                   |    |           |              | 565 399,31             | -105 343,01            | 460 056,29  |                                           |
| 1                     | K   | 162351103    | Zemní práce<br>Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z<br>horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3<br>(-184,91/2,25)                | m3 | -82,182   | 87,80        | 0,00                   | -105 343,01            | -105 343,01 | cena z kontrol.rozp.<br>D.1.1.1 poř.č. 18 |
| 2                     | K   | 162751117    | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m<br>výkopku/sypání z<br>horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3<br>(-184,91/2,25)                       | m3 | -82,182   | 328,00       |                        | -26 955,77             | -26 955,77  | cena z kontrol.rozp.<br>D.1.1.1 poř.č. 19 |
| 3                     | K   | 162751119    | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z<br>horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes<br>10000 m<br>(-184,91/2,25)*7     | m3 | -575,28   | 25,30        |                        | -14 554,47             | -14 554,47  | cena z kontrol.rozp.<br>D.1.1.1 poř.č. 20 |
| 4                     | K   | 162751119    | Poplatek za uložení (skládkové)<br>(-184,91)                                                                                                          | t  | -184,91   | 291,00       |                        | -53 808,81             | -53 808,81  | cena z kontrol.rozp.<br>D.1.1.1 poř.č. 22 |
| 5                     | K   | 162751119    | Uložení sypání na skládky nebo mezikládky<br>(-184,91/2,25)                                                                                           | m3 | -125,37   | 22,40        |                        | -2 808,36              | -2 808,36   | cena z kontrol.rozp.<br>D.1.1.1 poř.č. 23 |
|                       |     | 997          | Přesun sutě                                                                                                                                           |    |           |              | 565 399,31             | 0,00                   | 565 399,31  |                                           |
| 6                     | K   | 997006511    | Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku<br>do 100 m<br>"01/2024"184,91                                                               | t  | 184,910   | 56,40        | 10 428,92              |                        | 10 428,92   | KROS CÚ 2022/II.                          |
| 7                     | K   | 997006512    | Součet<br>Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku<br>přes 100 m do 1 km<br>"01/2024"184,91                                           | t  | 184,910   | 176,00       | 32 544,16              |                        | 32 544,16   | KROS CÚ 2022/II.                          |
| 8                     | K   | 997006519    | Součet<br>Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1<br>km přes 1 km                                                                    | t  | 7 766,22  | 17,00        | 132 025,74             |                        | 132 025,74  | KROS CÚ 2022/II.                          |
|                       |     |              | Součet<br>"odpad 17 01 07"184,91*42                                                                                                                   |    | 7 766,220 |              |                        |                        |             |                                           |
| 9                     | IND | 997013869_R1 | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního<br>odpadu ze směsi zeminy, betonu, cihel a keramických<br>výrobků kod odpadu 17 01 07<br>184,91 | t  | 184,91    | 2 111,30     | 390 400,48             |                        | 390 400,48  | individuální cena -<br>doklad č.7         |



zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C. vložka 43567  
zastoupení: [redacted]

**Věc: VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO A TECHNICKÉHO DOZORU**

**Předmět vyjádření:** ZL č. 07 – ZMĚNA – STAVEBNÍ SUŤ - VÝKOPY STAVEBNÍ JÁMY

**Název stavby:** **SIMULAČNÍ CENTRUM INTENZIVNÍ MEDICÍNY**  
Provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících  
dodávek vybavení v rámci projektu „Simulační centrum intenzivní medicíny“  
číslo smlouvy objednatele 2203200857 ze dne 22. 12. 2022.

**Zhotovitel:** **PORR, a.s.**  
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice  
IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

**Ev. č. vyjádření:** **175.**

**Datum vyjádření:** 06.04.2025.

**AD a TDO:** **PIKMA, s.r.o.**

Novodvorská 1074/26, 674 01 Třebíč

[redacted]  
IČ: 268 88 181, DIČ: CZ 268 88 181, Je plátcem DPH

[redacted]  
Autorizováni inženýři pro obor Projektování staveb - C. 1004113

Znalec v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské.



**Vyjádření:**

**VYJÁDŘENÍ AD A TDO**

Poznámka – E-mail – PORR

Poznámka – E-mail – FNM

**POKYN:**

**VYJÁDŘENÍ – POKYN**

– AD a TDO tímto souhlasí.

**ZÁVĚR:**

**AD a TDO tímto souhlasí.**

Poznámka – Zhotovitel provede příslušnou kompletaci daného ZL.

**Vypracoval:**



**Příloha:**

- **ZL č. 07 – ZMĚNA – STAVEBNÍ SUŤ - VÝKOPY STAVEBNÍ JÁMY**
- **ZL č. 07 – CENOVÁ KALKULACE**

V Třebíči dne 06.04.2025.


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                 |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | <b>číslo: ZL 08</b>                                             |                                              |
| <b>Zhotovitel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PORR, a.s.</b><br>se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560                               |                                                                 |                                              |
| <b>Objednatel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Fakultní nemocnice v Motole</b> , státní příspěvková organizace<br>se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203 | <b>Datum:</b> 19.12.2023.                                       |                                              |
| <b>Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny</b><br>Smlouva č. 2203200857 na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu - <b>Simulační centrum intenzivní medicíny</b><br>Datum uzavření: 22. 12. 2022 /dále jen Smlouva/<br>Datum a čas zveřejnění Smlouvy v registru smluv: 28.12. 2022 13:30:07<br>ID Smlouvy: 21343257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                 |                                              |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | poštou <input type="checkbox"/>                                 | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | faxem <input type="checkbox"/>                                  | osobně <input type="checkbox"/>              |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | specifikaci:                                                                                                             | -                                                               |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | na výkresy:                                                                                                              | -                                                               |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | na rozpočtové podklady:                                                                                                  | -                                                               |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | na jinou část smlouvy:                                                                                                   | - Odst. 2.1 Smlouvy, Příloha č. 6 Smlouvy – NABÍDKA ZHOTOVITELE |                                              |
| <b>Předmět změny:</b><br>– <b>ZMĚNA – PODEPŘENÍ STROPU STÁVAJÍCÍHO TECHNOLOGICKÉHO KOLEKTORU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                 |                                              |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>– V rámci přípravy plánu organizace výstavby Zhotovitele (v rámci plánování dopravních tras), týkající se zejména způsobu zajištění staveništní dopravy předmětné výstavby, bylo zjištěno, že ve stanovených dopravních trasách (v rámci staveništní dopravy – v rámci staveništní areálové příjezdové komunikace) se nachází část stávajícího podzemního technologického kolektoru v délce cca. 100m. Lze konstatovat, že nad touto částí stávajícího podzemního technologického kolektoru – v rámci stanovené staveništní-areálové dopravní komunikace bude realizována intenzivní zejména staveništní doprava, týkající se provozu stavenišť.<br>– Vzhledem ke skutečnosti a z důvodu <b>zajištění bezpečnosti</b> (kdy na základě dostupné archivní dokumentace a na základě zjištěného stávajícího stavu podzemního technologického kolektoru, kdy nelze objektivně bezpečně stanovit řádný statický výpočet (nelze objektivně stanovit podstatné parametry užitných výpočtových hodnot (např. typ prefabrikátových k-cí) potřebných pro statický výpočet apod.)), bude v rámci podzemního technologického kolektoru z důvodu zajištění bezpečnosti osazena uprostřed technologického kolektoru řada stojek <b>á=0,5m</b> , kdy <b>nad</b> těmito stojkami a rovněž i <b>pod</b> těmito stojkami budou osazeny <b>ztužující roznášecí trámy</b> , zajišťující dodatečnou dočasnou únosnost a bezpečnost, zejména stropu podzemního technologického kolektoru s ohledem na stanovenou staveništní dopravu.<br>– Podepření stropu stávajícího podzemního technologického kolektoru, v rámci staveništní areálové komunikace, bude provedeno po celou dobu předmětné výstavby. |                                                                                                                          |                                                                 |                                              |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                 |                                              |
| -  <b>SOUHLASÍM.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                 |                                              |
| <b>Počet připojených listů specifikací:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          | 0                                                               |                                              |
| <b>Změna podle příslušného odstavce § 222 ZZVZ</b><br><b>Stanovisko Odboru veřejných zakázek FN Motol:</b><br>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.<br>Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                 |                                              |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                 |                                              |





**Příloha:**

- PORR – Grafický rozsah podepření – STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGICKÝ KOLEKTOR
- PORR - soupis prací – Položkový rozpočet stavby
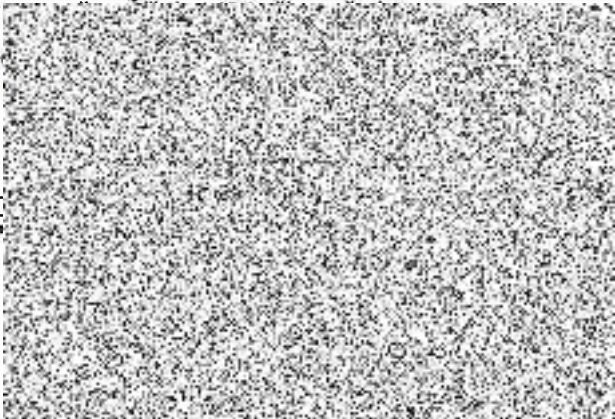
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                            | <b>PORR, a.s.</b><br>se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560                                               |  |  |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                 |                                                         |  |  |
| Datum:                                                                                                                                                                                                 | 19.12.2023.                                             |  |  |
| Cena méněprací bez DPH:<br><b>0,- Kč</b>                                                                                                                                                               | Cena víceprací bez DPH:<br><b>+ 1 154 806,70,- Kč</b>                                                                                    |  |  |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><b>+ 1 154 806,70,- Kč</b>                                                                                                                                             | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br><b>BEZE ZMĚNY</b><br>(PLATNÝ TERMÍN DOKONČENÍ DLE SOD)<br><b>10.12.2025.</b><br>(MILNÍK č. 9) |  |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |                                                                                                                                          |  |  |
| Podpis za Objednatele:                                                                                                                                                                                 | Podpis za Zhotovitele:                                                                                                                   |  |  |
| <b>Fakultní nemocnice v Motole</b><br>státní příspěvková organizace                                                                                                                                    | <b>PORR,a.s.</b><br>Ing. Peter Suchý, předseda představenstva                                                                            |  |  |
|                                                                                                                     |                                                      |  |  |





ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL 08

Název akce Simulační centrum intenzivní medicíny - Podepření kolektoru

V Praze dne 27.01.2025

Zhotovitel: PORR, a.s.  
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace  
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

| PČ                    | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                           | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem připočet | Cena celkem odpočet | Cena celkem  | cenná úroveň                    |
|-----------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|
| Celkem stavební práce |     |             |                                                                                                                                 |     |            |              | 1 154 806,70         | 0,00                | 1 154 806,70 |                                 |
|                       |     |             |                                                                                                                                 |     |            |              |                      |                     |              |                                 |
| Práce a dodávky HSV   |     |             |                                                                                                                                 |     |            |              |                      |                     |              |                                 |
| D                     | 9   |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                             |     |            |              | 1 154 806,70         | 0,00                | 1 154 806,70 |                                 |
| 1                     | IND | 101         | doprava podpěrných konstrukcí pro podepření kolektoru                                                                           | kol | 1,000      | 31 114,70    | 1 154 806,70         | 0,00                | 1 154 806,70 | individuální cena - doklad č.9  |
|                       |     |             |                                                                                                                                 |     | 1,000      |              | 31 114,70            |                     | 31 114,70    |                                 |
| 2                     | K   | HZS2111     | Hodinové zučtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař                                                      | hod | 130,0      | 429,00       | 55 770,00            |                     | 55 770,00    | KROS CÚ 2022/II.                |
|                       |     |             | montáž, demontáž                                                                                                                |     |            |              |                      |                     |              |                                 |
| 2                     | K   | HZS2112     | Hodinové zučtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař odborný                                              | hod | 80,0       | 474,00       | 37 920,00            |                     | 37 920,00    | KROS CÚ 2022/II.                |
|                       |     |             | montáž, demontáž                                                                                                                |     |            |              |                      |                     |              |                                 |
| 3                     | IND | 975121332-R | Příplatek k jednořádku podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky do v 4 m zařízení přes 1000 do 1500 kg/m za 1000 Kč | m   | 88 000,000 | 11,70        | 1 030 002,00         |                     | 1 030 002,00 | individuální cena - doklad č.11 |
|                       |     |             | 880 dní * 100mb * 880*100                                                                                                       |     | 88 000,000 |              |                      |                     |              |                                 |
|                       |     |             | Rozpis materiálů:                                                                                                               |     |            |              |                      |                     |              |                                 |
|                       |     |             | Nosník Doka H20 lop P 2,45 m                                                                                                    |     |            |              |                      |                     |              |                                 |
|                       |     |             | Stropní podpěra Doka Eures 20 lop 250                                                                                           |     |            |              |                      |                     |              |                                 |
|                       |     |             | Chvěcí síť hlavice H20                                                                                                          |     |            |              |                      |                     |              |                                 |



zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 43567  
zastoupená

**Věc:** VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO A TECHNICKÉHO DOZORU

**Předmět vyjádření:** ZL č. 08 – ZMĚNA – PODEPŘENÍ STROPU - STAV\_TECHNOLOG\_KOLEKTORU

**Název stavby:** SIMULAČNÍ CENTRUM INTENZIVNÍ MEDICÍNY

Provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících  
dodávek vybavení v rámci projektu „Simulační centrum intenzivní medicíny“  
číslo smlouvy objednatele 2203200857 ze dne 22. 12. 2022.

**Zhotovitel:** PORR, a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice  
IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

**Ev. č. vyjádření:** 176.

**Datum vyjádření:** 06.04.2025.

**AD a TDO:** PIKMA, s.r.o.

Novodvorská 1074/26, 674 01 Třebíč

IČ: 268 88 181, DIČ: CZ 268 88 181, je plátcem DPH

jednatel společnosti

Autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby - č. 1004113

Znalec v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské.

**Vyjádření:**

**VYJÁDŘENÍ AD A TDO**

Poznámka – E-mail – PORR, a.s.,

Poznámka – E-mail – FNM,

**POKYN:**

**VYJÁDŘENÍ – POKYN**

– AD a TDO tímto souhlasí.

**ZÁVĚR:**

**AD a TDO tímto souhlasí.**

Poznámka – Zhotovitel provede příslušnou kompletaci daného ZL.

**Vypracoval:**



**Příloha:**

- **ZL č. 08 – ZMĚNA – PODEPŘENÍ STROPU - STAV\_TECHNOLOG\_KOLEKTORU**
- **ZL č. 08 – CENOVÁ KALKULACE**

V Třebíči dne 06.04.2025.



**ZMĚNOVÝ LIST**číslo: **ZL 09****Zhotovitel:****PORR, a.s.**

se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

**Objednatel:****Fakultní nemocnice v Motole**, státní příspěvková organizace

se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

Datum: 19.12.2023.

**Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny**Smlouva č. 2203200857 na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu - **Simulační centrum intenzivní medicíny**

Datum uzavření: 22. 12. 2022 /dále jen Smlouva/

Datum a čas zveřejnění Smlouvy v registru smluv: 28.12. 2022 13:30:07

ID Smlouvy: 21343257

Způsob odeslání / předání  
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy na**

specifikaci: -

na výkresy: -

na rozpočtové podklady: -

na jinou část smlouvy: -

- Odst. 2.1 Smlouvy, Příloha č. 6 Smlouvy – NABÍDKA ZHOTOVITELE

**Předmět změny:**

- **ZMĚNA – ANALÝZA KLIMATICKÉHO DOPADU**

**Popis a zdůvodnění změny:**

- V průběhu výstavby, dne 31.3.2023 uveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví 1. Závazný pokyn k Obecným pravidlům pro žadatele a příjemce komponent 6.1 a 6.2 Národního plánu obnovy (NPO).
- Analýza klimatického dopadu bude zpracována s dodržením technických pokynů, dále dle metodiky stanovení ceny stínového uhlíku EIB a dalších souvisejících platných dokumentů, stanovených Evropskou komisí.

**Stanovisko technického dozoru stavby**-  **SOUHLASÍ**

Počet připojených listů specifikací:

0

**Změna podle příslušného odstavce § 222 ZZZV****Stanovisko Odboru veřejných zakázek FN Motol:**

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐odstavec 5, § 222 ☐odstavec 6, § 222 ☒odstavec 7, § 222 ☐**Prohlášení Zhotovitele:**



- Potřeba provedení změn (dodatečných víceprací) na základě tohoto změnového listu, původně neobsažených v zadávacích podmínkách, vyvstala až v průběhu provádění díla a to v důsledku vzniku nepředvídatelných okolností, které žádná ze stran nemohla s náležitou péčí předvídat.
- Současně platí, že provedení těchto změn je nezbytné pro řádné a funkční dokončení této veřejné zakázky v souladu s jejím zamýšleným účelem.
- Změny obsažené v tomto změnovém listu nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou realizovány v souladu se smlouvou o dílo (zejména čl. 11) a dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Strany v rámci jednání o změnách postupují taktéž v souladu se zásadami 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) zahrnující zejména projednání vícero v úvahu přicházejících variant technických řešení a výběr nejvhodnějšího řešení (vč. jejich zaznamenání v rámci kontrolních dnů, zápisů do stavebního deníku, průběžné písemné komunikace, změnových listech či dodatcích).



**Příloha:**

- PORR – Podrobná analýza klimatického dopadu zdravotnického zařízení
- PORR - soupis prací – Položkový rozpočet stavby

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                            | <b>PORR, a.s.</b><br>se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560                                                |  |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                 |                                                          |  |
| Datum:                                                                                                                                                                                                 | 19.12.2023.                                                                                                                               |  |
| Cena méněprací bez DPH:<br>0,- Kč                                                                                                                                                                      | Cena víceprací bez DPH:<br>+ 173 132,18,- Kč                                                                                              |  |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><br>+ 173 132,18,- Kč                                                                                                                                                  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br><b>BEZE ZMĚNY</b><br>(PLATNÝ TERMÍN DOKONČENÍ DLE SOD)<br><b>10.12.2025.</b><br>(MILNÍK č. 9)  |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |                                                                                                                                           |  |
| Podpis za Objednatele:<br><br><b>Fakultní nemocnice v Motole</b><br>státní příspěvková organizace                                                                                                      | Podpis za Zhotovitele:<br><br><b>PORR,a.s.</b><br>Ing. Dušan Čížek, MBA, předseda představenstva<br>Ing. Peter Suchý, člen představenstva |  |

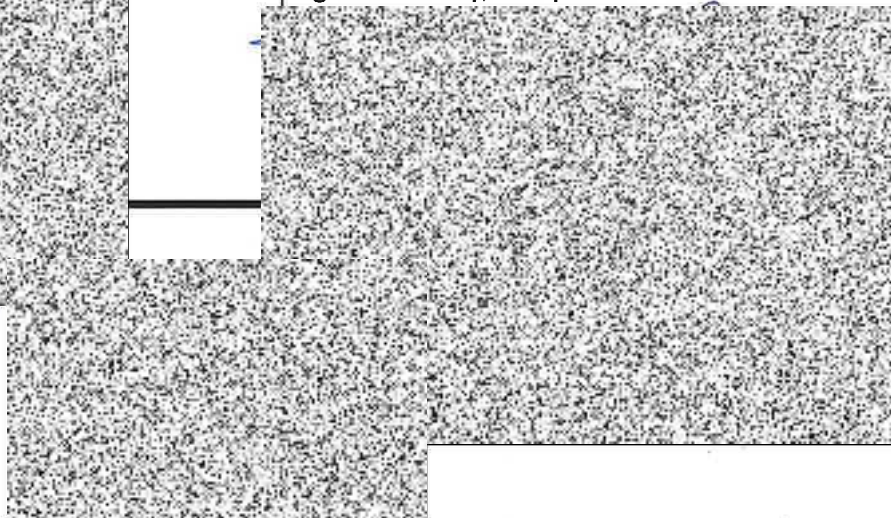



ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL 09

Název akce Simulační centrum intenzivní medicíny - Vypracování podrobného stanovení analýzy klimatického dopadu

V Praze dne 27.01.2025

Zhotovitel: PORR, a.s.  
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace  
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

| PČ                    | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena (CZK) | Cena celkem přípočet | Cena celkem odpočet | Cena celkem | cenová úroveň                   |
|-----------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|
| Celkem stavební práce |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 173 132,18           | 0,00                | 173 132,18  |                                 |
| 1                     | IND |             | Proveření projektu:<br>a) Odůvodnění potřeby výpočtu posouzení uhlíkové stopy provozu a následného<br>šetření celého životního cyklu aro<br>b) Analýza citlivosti, expozice, zranitelnost<br>2. Podrobná analýza projektu a provozu infrastruktury<br>a) Výpočet uhlíkové stopy projektu<br>b) Výpočet uhlíkové stopy provozu zařízení<br>c) Peněžení vyjádření síťové ceny uhlíku pro provoz zařízení (na každý rok provozu)<br>d) Ověření kompatibility s vývojem k celkovým cílům snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 a 2050.<br>e) Podrobná analýza klimatických rizik (kde bude potřeba)<br>f) Vyvoření doporučení/opatření pro investici | kpl | 1,000    | 135 775,86   | 135 775,86           |                     | 135 775,86  | individuální cena - doklad č.13 |
| 2                     | IND | 975121332-R | Připrava dat k vypracování Podrobné analýzy<br>Připrava a poskytování dat pro zpracovatele analýzy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl | 1,000    | 37 356,32    | 37 356,32            |                     | 37 356,32   | individuální cena - doklad č.14 |

## Podrobná analýza klimatického dopadu zdravotnického zařízení

Analýza klimatického dopadu je povinná pro výstavbu nových budov na základě předběžného prověření projektů dle Technických pokynů k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021-2027. Analýza bude zpracována s dodržáním technických pokynů, dále dle metodiky stanovení ceny stínového uhlíku EIB a dalších relevantních dokumentů stanovených Evropskou komisí tak, aby byly na těchto klíčových projektech minimalizovaná rizika krácení nebo odnětí dotace.


Struktura analýzy:

### 1. Prověřování projektu

- Odůvodnění potřeby výpočtu posouzení uhlíkové stopy provozu a následného šetření celého životního cyklu projektu
- Analýza citlivosti, expozice, zranitelnost

### 2. Podrobná analýza projektu a provozu infrastruktury

- Výpočet uhlíkové stopy projektu
  - o přímé emise – emise na stavbě (palivo, vytápění, chlazení, nájezd vozidel na stavbě apod.)
  - o nepřímé emise (spotřebovaná elektřina, příp. vzdálené vytápění a chlazení)
  - o ostatní nepřímé emise spojené s projektovými aktivitami (např. spotřeba paliv manažerských vozidel, materiály na výstavbu, odpad generovaný na stavbě apod.)
- Výpočet uhlíkové stopy provozu zařízení
  - o Přímé emise z provozu zařízení
  - o Nepřímé emise z provozu zařízení
  - o Ostatní emise spojené s fungováním zařízení (včetně dopravy zaměstnanců apod.)
- Peněžní vyjádření stínové ceny uhlíku pro provoz zařízení (na každý rok provozu zařízení)
- Ověření kompatibility s vývojem k celkovým cílům snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 a 2050
- Podrobná analýza klimatických rizik (kde bude potřeba)
- Vytvoření doporučení/opatření pro investici





zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 43567  
zastoupená

**Věc: VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO A TECHNICKÉHO DOZORU**

**Předmět vyjádření: ZL č. 09 – ZMĚNA – ANALÝZA KLIMATICKÉHO DOPADU**

**Název stavby: SIMULAČNÍ CENTRUM INTENZIVNÍ MEDICÍNY**

Provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících  
dodávek vybavení v rámci projektu „Simulační centrum intenzivní medicíny“  
číslo smlouvy objednatele 2203200857 ze dne 22. 12. 2022.

**Zhotovitel: PORR, a.s.**  
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice  
IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

**Ev. č. vyjádření: 177.**

**Datum vyjádření: 06.04.2025.**

**AD a TDO: PIKMA, s.r.o.**

Novodvorská 1074/26, 674 01 Třebíč

IČ: 268 88 181, DIČ: CZ 268 88 181. Je plátcem DPH

Autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby - č. 1004113

Znalec v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské.

**Vyjádření:**

**VYJÁDŘENÍ AD A TDO**

Poznámka – E-mail – PORR a.s.

Poznámka – E-mail – FNM

**POKYN:**

**VYJÁDŘENÍ – POKYN**


– AD a TDO tímto souhlasí.

**ZÁVĚR:**

**AD a TDO tímto souhlasí.**

Poznámka – Zhotovitel provede příslušnou kompletaci daného ZL.

**Vypracoval:**



**Příloha:**

- **ZL č. 09 – ZMĚNA – ANALÝZA KLIMATICKÉHO DOPADU**
- **ZL č. 09 – CENOVÁ KALKULACE**

V Třebíči dne 06.04.2025.



**ZMĚNOVÝ LIST**číslo: **ZL 10****Zhotovitel:****PORR, a.s.**

se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

**Objednatel:****Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace**  
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

Datum: 19.12.2023.

**Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny**Smlouva č. 2203200857 na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu - **Simulační centrum intenzivní medicíny**

Datum uzavření: 22. 12. 2022 /dále jen Smlouva/

Datum a čas zveřejnění Smlouvy v registru smluv: 28.12. 2022 13:30:07

ID Smlouvy: 21343257

Způsob odeslání / předání  
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy na**

specifikaci: -

na výkresy: -

na rozpočtové podklady: -

na jinou část smlouvy: -

- Odst. 2.1 Smlouvy, Příloha č. 6 Smlouvy – NABÍDKA ZHOTOVITELE

**Předmět změny:**

- **ZMĚNA – STÁVAJÍCÍ PILOTOVÁ STĚNA – PODZEMNÍ KORIDOR**

**Popis a zdůvodnění změny:**

- Na základě postupu výstavby bylo zjištěno, že v místě napojení objektu SCIM na stávající podzemní koridor vozíkové dopravy se nachází stávající pilotová stěna.
- Vzhledem k postupu stavebních prací, vlivem přítomnosti stávající pilotové stěny, je stanoven následující nezbytný rozsah činností:
  - Provedení zemních prací (zejména ověřovacích sond), včetně ručního dočištění z důvodu stanovení rozsahu (hloubky – paty) pilotové stěny.
  - Postupné odbourání pilotové stěny v omezeném prostoru, včetně odvozu a likvidace sutě na skládku (včetně vnitrostaveništní dopravy)
  - Postupné odbourání torkretového nástřiku v omezeném prostoru, včetně odvozu a likvidace sutě na skládku (včetně vnitrostaveništní dopravy)
  - Zapracování stávající pilotové stěny do projektové dokumentace pro provedení stavby
  - Geodetické zaměření stávající pilotové stěny.
  - Vytyčení zemních kotev (D.003 –Zajištění stavební jámy) v rámci realizace.

**Klasifikace odpadu**

- Kód odpadu 170101 množství 73,626 t
- V rámci uvedeného změnového listu bude odstraněno 73,626 t.

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

-  **SOUHLASÍM**

Počet připojených listů specifikací:

0

**Změna podle příslušného odstavce § 222 ZZVZ****Stanovisko Odboru veřejných zakázek FN Motol:**

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☒ odstavec 7, § 222 ☐**Prohlášení Zhotovitele:**



- Potřeba provedení změn (dodatečných víceprací) na základě tohoto změnového listu, původ neobsažených v zadávacích podmínkách, vyvstala až v průběhu provádění díla a to v důsledk nepředvídatelných okolností, které žádná ze stran nemohla s náležitou péčí p



- Současně platí, že provedení těchto změn je nezbytné pro řádné a funkční dokončení této veřejné zakázky v souladu s jejím zamýšleným účelem.
- Změny obsažené v tomto změnovém listu nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou realizovány v souladu se smlouvou o dílo (zejména čl. 11) a dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Strany v rámci jednání o změnách postupují taktéž v souladu se zásadami 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) zahrnující zejména projednání vícero v úvahu přicházejících variant technických řešení a výběr nejvhodnějšího řešení (vč. jejich zaznamenání v rámci kontrolních dnů, zápisů do stavebního deníku, průběžné písemné komunikace, změnových listech či dodatcích).

**Příloha:**

- PORR – SO 000\_D.003.ZSJ\_101\_R00\_Pudorys
- PORR - soupis prací – Položkový rozpočet stavby
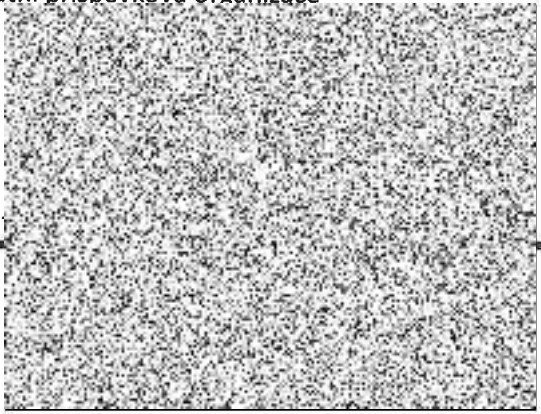
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Zhotovitel:</b>                                                                                                                                                                                     | <b>PORR, a.s.</b><br>se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560 |                                                                                                                                                  |  |
| <b>Změnový list vystavil:</b>                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                  |  |
| <b>Datum:</b>                                                                                                                                                                                          | 19.12.2025.                                                                                |                                                                                                                                                  |  |
| <b>Cena méněprací bez DPH:</b><br><b>- 39 290,36,- Kč</b>                                                                                                                                              |                                                                                            | <b>Cena víceprací bez DPH:</b><br><b>+ 439 026,36,- Kč</b>                                                                                       |  |
| <b>Výsledná cena změny bez DPH:</b><br><br><b>+ 399 736,- Kč</b>                                                                                                                                       |                                                                                            | <b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b><br><br><b>BEZE ZMĚNY</b><br>(PLATNÝ TERMÍN DOKONČENÍ DLE SOD)<br><b>10.12.2025.</b><br>(MILNÍK č. 9)  |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |                                                                                            |                                                                                                                                                  |  |
| <b>Podpis za Objednatele:</b><br><br><b>Fakultní nemocnice v Motole</b><br>státní příspěvková organizace                                                                                               |                                                                                            | <b>Podpis za Zhotovitele:</b><br><br><b>PORR,a.s.</b><br>Ing. Peter Suchý, předseda představenstva<br>Ing. Dušan Čížek, MPA, člen představenstva |  |
|                                                                                                                     |                                                                                            |                                                              |  |
| Datum:                                                                                                              |                                                                                            | Datum:                                                       |  |



ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL 10

Název akce: Simulační centrum intenzivní medicíny - Přítomnost pilotové stěny

V Praze dne 27.01.2025

Zhotovitel: PORR, a.s.  
se sídlem Dubčská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 43005560

Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace  
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

| PČ                    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem<br>připočet | Cena celkem<br>odpočet | Cena celkem | cenová úroveň                           |
|-----------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Celkem stavební práce |     |           |                                                                                                                         |    |          |              |                         |                        |             |                                         |
|                       |     |           |                                                                                                                         |    |          |              | 439 026,36              | -39 290,36             | 399 736,00  |                                         |
|                       |     | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                     |    |          |              | 18 454,05               | 0,00                   | 18 454,05   | procentuální podíl dokumentace          |
| 1                     | D   | 1         | Úprava dokumentace DPS                                                                                                  | %  | 4,840    | 3 812,82     | 18 454,05               |                        | 18 454,05   | DPS/stavebních prací z SOD              |
|                       |     | 1         | Zemní práce                                                                                                             |    |          |              | 27 121,00               | 0,00                   | 27 121,00   | 3. Nahládková cena                      |
| 2                     | K   | 132154203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3                       | m3 | 53,100   | 440,00       | 23 364,00               |                        | 23 364,00   | KROS CÚ 2022/III.                       |
| 3                     | K   | 139711111 | Výkopky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně                                     | m3 | 1,700    | 2 210,00     | 3 757,00                |                        | 3 757,00    | KROS CÚ 2022/III.                       |
| 4                     | K   | 981511114 | Ostatní konstrukce a práce, bourání Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonu postupným rozebráním              | m3 | 30,550   | 7 790,00     | 237 984,50              | -39 290,36             | 198 694,14  |                                         |
|                       |     |           | "mazanina hlav pilot" 1,3*5*0,17                                                                                        |    | 1,105    |              |                         |                        |             |                                         |
|                       |     |           | "pilotová stěna" (3,14*0,65*0,65)*5,5*3                                                                                 |    | 25,870   |              |                         |                        |             |                                         |
|                       |     |           | "torkret stěna" 6,5*0,1*5,5                                                                                             |    | 3,575    |              |                         |                        |             |                                         |
|                       |     |           | Součet                                                                                                                  |    | 30,550   |              |                         |                        |             |                                         |
| 5                     | K   | 131251106 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně                             | m3 | -30,550  | 147,00       | 0,00                    | -4 490,85              | -4 490,85   | cena z kontrol. rozp. D.1.1.1 poř.č. 12 |
|                       |     |           | -30,55                                                                                                                  |    | -30,550  |              |                         |                        |             |                                         |
| 6                     | K   | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                      | m3 | -30,550  | 87,80        | 0,00                    | -2 682,29              | -2 682,29   | cena z kontrol. rozp. D.1.1.1 poř.č. 18 |
|                       |     |           | "-30,55"                                                                                                                |    | -30,550  |              |                         |                        |             |                                         |
| 7                     | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                 | m3 | -30,550  | 328,00       | 0,00                    | -10 020,40             | -10 020,40  | cena z kontrol. rozp. D.1.1.1 poř.č. 18 |
|                       |     |           | "-30,55"                                                                                                                |    | -30,550  |              |                         |                        |             |                                         |
| 8                     | K   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | -213,85  | 25,30        | 0,00                    | -5 410,41              | -5 410,41   | cena z kontrol. rozp. D.1.1.1 poř.č. 19 |
|                       |     |           | (-30,55*7)                                                                                                              |    | -213,850 |              |                         |                        |             |                                         |
| 9                     | K   | 162751119 | Poplatek za uložení (skládkové)                                                                                         | t  | -54,99   | 291,00       | 0,00                    | -16 002,09             | -16 002,09  | cena z kontrol. rozp. D.1.1.1 poř.č. 22 |
|                       |     |           | "-30,55*1,8"                                                                                                            |    | -54,990  |              |                         |                        |             |                                         |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                             | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem<br>připočet | Cena celkem<br>odpočet | Cena celkem | cenová úroveň                             |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| 10 | K   | 162751119 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                      | m3     | -30,55   | 22,40        | 0,00                    | -684,32                | -684,32     | cena z kontrol rozp.<br>D 1.1.1 poř.č. 23 |
|    |     | 997       | Přesun sutě                                                                                       |        |          |              |                         |                        |             |                                           |
| 11 | K   | 997006511 | Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 100 m                                 | t      | 73,626   | 56,40        | 138 225,45              | 0,00                   | 138 225,46  |                                           |
|    |     |           | 73,626                                                                                            |        | 73,626   |              |                         |                        |             |                                           |
| 12 | K   | 997006512 | Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km                       | t      | 73,626   | 176,00       | 12 958,18               |                        | 12 958,18   | KROS CÚ 2022/II.                          |
| 13 | K   | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km                             | t      | 368,13   | 17,00        | 6 258,21                |                        | 6 258,21    | KROS CÚ 2022/II.                          |
|    |     |           | "odpad 17 01 01*73,626*5                                                                          |        | 368,130  |              |                         |                        |             |                                           |
|    |     |           | Součet                                                                                            |        | 368,130  |              |                         |                        |             |                                           |
| 14 | K   | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t      | 73,626   | 1 560,00     | 114 856,56              |                        | 114 856,56  | KROS CÚ 2022/II.                          |
|    |     |           | "ŽB"73,626                                                                                        |        | 73,626   |              |                         |                        |             |                                           |
|    |     | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                       |        |          |              |                         |                        |             |                                           |
|    |     | VRN1      | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                          |        |          |              | 17 241,36               | 0,00                   | 17 241,36   |                                           |
| 15 | IND | 12002000  | Geodetické práce                                                                                  | výjezd | 6,000    | 2 873,56     | 17 241,36               |                        | 17 241,36   | individuální cena -<br>doklad č. 15       |
|    |     |           | "zamežzení pillové stěny"2                                                                        |        | 2,000    |              |                         |                        |             |                                           |
|    |     |           | "výřezání vrtů kolev"4                                                                            |        | 4,000    |              |                         |                        |             |                                           |
|    |     |           | Součet                                                                                            |        | 6,000    |              |                         |                        |             |                                           |



zapsaná v OR, vedeného Kraiským soudem v Brně oddíl C. vložka 43567  
zastoupen

**Věc: VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO A TECHNICKÉHO DOZORU**

**Předmět vyjádření:** ZL č. 10 – ZMĚNA – STÁVAJÍCÍ PILOTOVÁ STĚNA - PODZEMNÍ KORIDOR

**Název stavby: SIMULAČNÍ CENTRUM INTENZIVNÍ MEDICÍNY**

Provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících  
dodávek vybavení v rámci projektu „Simulační centrum intenzivní medicíny“  
číslo smlouvy objednatele 2203200857 ze dne 22. 12. 2022.

**Zhotovitel:** PORR, a.s.  
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice  
IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

**Ev. č. vyjádření:** 178.

**Datum vyjádření:** 06.04.2025.

**AD a TDO: PIKMA, s.r.o.**

Novodvorská 1074/26, 674 01 Třebíč

IČ: 268 88 181 DIČ: CZ 268 88 181 ..le nátlcem DPH

Autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby - č. 1004113  
Znalec v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské.

**Vyjádření:**

**VYJÁDŘENÍ AD A TDO**

Poznámka – E-mail – PORR

Poznámka – E-mail – FNM, p

**POKYN:**

**VYJÁDŘENÍ – POKYN**

– AD a TDO tímto souhlasí.

**ZÁVĚR:**

**AD a TDO tímto souhlasí.**

Poznámka – Zhotovitel provede příslušnou kompletaci daného ZL.

**Vypracoval:**



**Příloha:**

- **ZL č. 10 – ZMĚNA – STÁVAJÍCÍ PILOTOVÁ STĚNA - PODZEMNÍ KORIDOR**
- **ZL č. 10 – CENOVÁ KALKULACE**

V Třebíči dne 06.04.2025.
