

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SOD:

III/27524 Dymokury

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

st. 0,045 km – 2,942 km

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

-1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.
Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
IČ: 284 47 085

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	683 179,50	683 179,50

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	-304 000,00	251 438,40	-52 561,60

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-49 950,00	0,00	-49 950,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-353 950,00	934 617,90	580 667,90

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list			
Název Stavby dle SOD: III/27524 Dymokury Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): st. 0,045 km – 2,942 km		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1.1
Strany smlouvy o dílo č.: SMLD-0503/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.04.2025 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČ: 284 47 085			
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 6 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů 5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 2 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 6 počet listů		Příjemce Objednatel Zhotovitel Stavební dozor Supervize	
Iniciátor změny: Zhotovitel Předmět Změny: Navýšení výměr dle zaměření			
Změna: Navýšení výměr dle zaměření Popis a zdůvodnění změny: 1) Na základě skutečného zaměření ploch asfaltových vrstev v rámci stavby dochází v rámci této změny k úpravě dotčených výměr. Týká se pol. č. 1, 2, 8, 9, 10, 11. Výměra dle SOD = 14 680 m2. Výměra dle skutečného provedení, dle geodetické zaměření = 15 937 m2. Rozdíl je 1257 m2. a) pol. č. 1 - 113728 - FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM - dle zaměření navýšení o 1257 m2 x 0,03 = 37,71 m3 b) pol. č. 2 - 93818 - ČIŠTĚNÍ VOZOVEK METENÍM STROJNĚ SAMOSBĚREM- dle zaměření navýšení o 1257 m2 x 2 = 2514 m2 c) pol. č. 8 - 572223 - SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 - dle zaměření navýšení o 1257 m2 d) pol. č. 9 - 574C66 - ALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM - dle zaměření navýšení o 1257 m2 e) pol. č. 10 - 572223 - SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 - dle zaměření navýšení o 1257 m2 f) pol. č. 11 - 574A34 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM - dle zaměření navýšení o 1257 m2 Změny vznikly na základě zpřesnění výměr dle skutečně provedených prací. Jedná se o Měření plynoucí ze shodného technického řešení. PDPS je provedena v úrovni a rozsahu, který je požadován a je dostatečný pro tento typ dokumentace. Tuto změnu lze považovat za "Měření", tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce na základě měřených položek uvedených v soupisu prací s výkazem výměr. Předmetné práce lze v souladu s § 100 ZZVZ resp. s ohledem na čl. 7 Směrnice RSM- 36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazu a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídatelnou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	683 179,50	683 179,50	683 179,50
Technická pomoc Objednatele jméno Ing. Markéta Grofová podpis			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Alois Holík	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno		podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Jindřich Holínský	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis

Zástupce Objednatele:	jméno	Petra Volšátová	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Alois Holík	podpis

Změnový list																															
Název Stavby dle SOD: III/27524 Dymokury Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): st. 0,045 km – 2,942 km		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1.2																												
Strany smlouvy o dílo č.: SMLD-0503/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.04.2025 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČ: 284 47 085																															
Přílohy Změnového listu:		Příjemce																													
<table><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>6</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>3</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>6</td><td>počet listů</td></tr></table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	6	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	3	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	6	počet listů	<table><tr><td>Objednatel</td></tr><tr><td>Zhotovitel</td></tr><tr><td>Stavební dozor</td></tr><tr><td>Supervize</td></tr></table>		Objednatel	Zhotovitel	Stavební dozor	Supervize
1. Krycí list	1	počet listů																													
2. Změnový list	6	počet listů																													
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																													
4. Rozpis ocenění Změn položek	3	počet listů																													
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																													
6. Přehled dokladů	1	počet listů																													
7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů																													
Další doklady dle přehledu dokladů	6	počet listů																													
Objednatel																															
Zhotovitel																															
Stavební dozor																															
Supervize																															
Iniciátor změny: Zhotovitel																															
Předmět Změny: Zpevnění krajnic																															
Změna: Zpevnění krajnic Popis a zdůvodnění změny: Dle ZD a soupisu prací, mělo být zpevnění krajnic realizováno v tloušťce 100 mm z materiálu ŠD - šterkodrt'. Zhotovitel navrhl záměnu položky na zpevnění krajnic z asfaltového recyklátu, kterého má zhotovitel přebytek z frézování jiných vozovek. Jedná se o kvalitativně srovnatelné řešení, při finanční úspoře pro objednatele. Objednatel na tuto změnu vydal pokyn (příloha 09 ze dne 22.08.2025), TDS se změnou souhlasí (příloha 10 ze dne 01.09.2025). Z těchto důvodů je v rozpočtu proveden odpočet položky týkající se zpevnění krajnic z ŠD a připočet nové položky na zpevnění krajnic z recyklátu. Změna je vyjádřena stávající položkou č. 56932 a snižuje smluvní cenu stavby o - 304 000,00 Kč a zároveň novou položkou č. 56962, která zvyšuje smluvní cenu o 251 438,40 Kč. Jednotková cena je stanovena dle OTSKP 2025 (82,71 Kč/m2) V souladu se zněním článku 5, Směrnice RSM- 36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny (Skupina 1) podle čl. 7 Směrnice, náležitosti pro Záměnu položek (Skupina 2) podle čl. 9 Směrnice a náležitosti pro Změny z nepředvídaných důvodů (Skupina 3) podle čl. 10 Směrnice nebo náležitosti pro Změny nezbytné k dokončení (Skupina 4) podle čl. 11 Směrnice se závěrem, že práce nesplňují náležitosti Vyhrazené změny ani Změny z nepředvídaných důvodů, ale splňují náležitosti pro Záměnu položek (Skupina 2) podle čl. 9 Směrnice.. Změny jsou podle čl. 5 odst. 1, písmeno b) resp. čl. 9 Směrnice RSM- 36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 2. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazu a dle § 222, odst. 7 je záměnou položek. Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. Vzhledem k výše uvedenému nelze považovat záměnu za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka pro záměny dle § 222 odst. 7 ZZVZ je splněna.																															
Údaje v Kč bez DPH:																															
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																												
-304 000,00	251 438,40	-52 561,60	555 438,40																												
Technická pomoc Objednatele																															
jméno Ing. Markéta Grofová podpis																															
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																															
Zhotovitel (stavbyvedoucí):																															
jméno Ing. Alois Holík podpis																															
Projektant (autorský dozor):																															
jméno podpis																															
Stavební dozor:																															
jméno Ing. Jindřich Holínský podpis																															
Supervize (Regionální dotační kancelář):																															
jméno podpis																															
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:																															
jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis																															

Zástupce Objednatele:	jméno	Petra Volšátová	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Alois Holík	podpis

Změnový list

Název Stavby dle SOD: III/27524 Dymokury Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): st. 0,045 km – 2,942 km	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1.3
--	---	--

Strany smlouvy o dílo č.: SMLD-0503/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.04.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČ: 284 47 085

Přílohy Změnového listu:			Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	Objednatel
2. Změnový list	6	počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	Stavební dozor
4. Rozpis ocenění Změn položek	3	počet listů	Supervize
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	
6. Přehled dokladů	1	počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů	6	počet listů	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Nerealizované obrubníky a dlažby

Změna: Nerealizované obrubníky a dlažby

Popis a zdůvodnění změny:

Dle ZD a soupisu prací, měla být provedena výšková úprava stávajících obrubníků a předláždění stávající betonové dlažby. Vzhledem k tomu, že stavbou nedošlo k porušení obrub a dlažeb, nebyly tyto práce realizovány, což zhotovitel oznámil objednateli (viz příloha č. 08 Oznámení zhotovitele ze dne 21.08.2025). Objednatel na tuto změnu vydal pokyn (příloha 09 ze dne 22.08.2025), TDS se změnou souhlasí (příloha 10 ze dne 01.09.2025).

Z těchto důvodů je v rozpočtu proveden odpočet položky týkající se obrub a dlažeb.

Změna je vyjádřena stávajícími položkami č. 12 91781, č. 13 587206 a snižují smluvní cenu stavby o - 49 950,00 Kč.

Při stanovení těchto položek zadavatele předpokládal nutnost rozebrání části chodníku, nicméně při realizaci nebylo toto nutné. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Tuto změnu bylo možné zastihnout až ve fázi samotné realizace stavby. Změny jsou podle čl. 5 odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice RSM- 36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazu a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvidatelnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-49 950,00	0,00	-49 950,00	49 950,00

Technická pomoc Objednatele jméno Ing. Markéta Grofová podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

[illegible]

Projektnat (autorský dozor): jméno podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Jindřich Holínský podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatelů odpovědný za cenové
projednání Změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Petra Volšátová podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Alois Holík	podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:
III/27524 Dymokury
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: -/01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): st. 0,045 km – 2,942 km

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
9 260 000,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	9 260 000,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-353 950,00	934 617,90	934 617,90	10,09%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-353 950,00	9 840 667,90	580 667,90	6,27%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SOD: III/27524 Dymokury Číslo a název SO/PS: st. 0,045 km – 2,942 km Číslo a název rozpočtu: -								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								-					
								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3	441,00	478,710	37,710	450	198 450,00	0,00	16 969,50 Kč	215 419,50	16 969,50	8,55%
2	93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK METENÍM STROJNĚ SAMOSBĚREM	m2	29 360,00	31874,000	2514,000	1,00	29 360,00	0,00	2 514,00 Kč	31 874,00	2 514,00	8,56%
8	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	14 680,00	15937,00	1257,000	9,00	132 120,00	0,00	11 313,00 Kč	143 433,00	11 313,00	8,56%
9	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	m2	14 680,00	15937,00	1257,000	310,00	4 550 800,00	0,00	389 670,00 Kč	4 940 470,00	389 670,00	8,56%
10	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	14 680,00	15937,00	1257,000	9,00	132 120,00	0,00	11 313,00 Kč	143 433,00	11 313,00	8,56%
11	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	14 680,00	15937,00	1257,000	200,00	2 936 000,00	0,00	251 400,00 Kč	3 187 400,00	251 400,00	8,56%
Celkem								7 978 850,00	0,00	683 179,50	8 662 029,50	683 179,50	8,56%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Alois Holík

Za Objednatele: Ing. Jindřich Holínský

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SOD: III/27524 Dymokury Číslo a název SO/PS: st. 0,045 km – 2,942 km Číslo a název rozpočtu: -								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								-					
								Skupina změn 2					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM (0/32)	m2	3 040,00	0,000	-3040,000	100,00	304 000,00	-304 000,00	0,00 Kč	0,00	-304 000,00	-100,00%
		Nové položky											
33	56962.N	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	m2	0,00	3040,000	3040,000	82,71	0,00	0,00	251 438,40 Kč	251 438,40	251 438,40	100,00%
		Celkem						304 000,00	- 304 000,00	251 438,40	251 438,40	- 52 561,60	-17,29%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Alois Holík

Za Objednatele: Ing. Jindřich Holínský

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SOD: III/27524 Dymokury Číslo a název SO/PS: st. 0,045 km – 2,942 km Číslo a název rozpočtu: -								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								-					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	bm	37,00	0,000	-37,000	350,00	12 950,00	-12 950,00	0,00 Kč	0,00	-12 950,00	-100,00%
13	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	m2	74,00	0,000	-74,000	500,00	37 000,00	-37 000,00	0,00 Kč	0,00	-37 000,00	100,00%
Celkem								49 950,00	- 49 950,00	0,00	0,00	- 49 950,00	-100,00%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Alois Holík

Za Objednatele: Ing. Jindřich Holínský

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/27524 Dymokury

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	9 260 000,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	9 840 667,90
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	11 907 208,16
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	106,27%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	7,38%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,57%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-49 950,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,54%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 778 000,00

12=(1)*0,15	Limit	1 389 000,00
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/27524 Dymokury	- 353 950,00	934 617,90	580 667,90	0,00	683 179,50	683 179,50	- 304 000,00	251 438,40	- 52 561,60	- 49 950,00	0,00	-49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	1	staničení 0,045 km - 2,942 km / Navýšení výměr dle zaměření, záměna krajnic a nerealizované obrubníky a dlažby	- 353 950,00	934 617,90	580 667,90	0,00	683 179,50	683 179,50	- 304 000,00	251 438,40	- 52 561,60	- 49 950,00	0,00	-49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/27524 Dymokury
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	st. 0,045 km – 2,942 km
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	-/01

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	2
08 Žádost zhotovitele ze dne 21.08.2025	2
09 Pokyn Objednatele ze dne 22.08.2025	1
10 Vyjádření TDS ze dne 01.09.2025	1
11 Geodetické zaměření obrusné vrstvy	1
12 Přehled nových položek a jejich zdůvodnění	1
Počet listů celkem	8

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SOD: III/27524 Dymokury Číslo a název SO/PS: st. 0,045 km – 2,942 km Číslo a název rozpočtu: -									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
									celkem po všech změnách				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM ZBV1: způsob stanovení měněné výměry: Množství dle zaměření navýšeno o 1257 m2 x 0,03 = 37,71 m3	m3	441,00	478,710	37,710	450	198 450,00	0,00	16 969,50 Kč	215 419,50	16 969,50	8,55%
2	93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK METENÍM STROJNĚ SAMOSBĚREM ZBV1: způsob stanovení měněné výměry: Množství dle zaměření navýšeno o 1257 m2 x 2 = 2514 m2	m2	29 360,00	31874,000	2514,000	1,00	29 360,00	0,00	2 514,00 Kč	31 874,00	2 514,00	8,56%
3	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	m2	4 780,00	4780,000	0,000	20,00	95 600,00	0,00	0,00 Kč	95 600,00	0,00	0,00%
4	15112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY	t	318,00	318,000	0,000	45,00	14 310,00	0,00	0,00 Kč	14 310,00	0,00	0,00%
5	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	m	4 746,00	4746,00	0,000	75,00	355 950,00	0,00	0,00 Kč	355 950,00	0,00	0,00%
6	15112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY	t	3 796,80	3796,80	0,000	45,00	170 856,00	0,00	0,00 Kč	170 856,00	0,00	0,00%
7	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	bm	37,00	37,00	0,000	50,00	1 850,00	0,00	0,00 Kč	1 850,00	0,00	0,00%
8	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 ZBV1: způsob stanovení měněné výměry: Množství dle zaměření navýšeno o 1257 m2	m2	14 680,00	15937,00	1257,000	9,00	132 120,00	0,00	11 313,00 Kč	143 433,00	11 313,00	8,56%
9	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM ZBV1: způsob stanovení měněné výměry: Množství dle zaměření navýšeno o 1257 m2	m2	14 680,00	15937,00	1257,000	310,00	4 550 800,00	0,00	389 670,00 Kč	4 940 470,00	389 670,00	8,56%
10	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 ZBV1: způsob stanovení měněné výměry: Množství dle zaměření navýšeno o 1257 m2	m2	14 680,00	15937,00	1257,000	9,00	132 120,00	0,00	11 313,00 Kč	143 433,00	11 313,00	8,56%
11	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ZBV1: způsob stanovení měněné výměry: Množství dle zaměření navýšeno o 1257 m2	m2	14 680,00	15937,00	1257,000	200,00	2 936 000,00	0,00	251 400,00 Kč	3 187 400,00	251 400,00	8,56%
12	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH ZBV1: způsob stanovení měněné výměry: Kompletní odečet - nerealizováno	bm	37,00	0,00	-37,000	350,00	12 950,00	-12 950,00	0,00 Kč	0,00	-12 950,00	-100,00%
13	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM ZBV1: způsob stanovení měněné výměry: Kompletní odečet - nerealizováno	m2	74,00	0,00	-74,000	500,00	37 000,00	-37 000,00	0,00 Kč	0,00	-37 000,00	-100,00%
14	113761	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	bm	52,00	52,00	0,000	50,00	2 600,00	0,00	0,00 Kč	2 600,00	0,00	0,00%
15	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	bm	52,00	52,00	0,000	50,00	2 600,00	0,00	0,00 Kč	2 600,00	0,00	0,00%
16	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM (0/32) ZBV1: způsob stanovení měněné výměry: Kompletní odečet - nerealizováno, nahrazeno krajnicemi z asfaltového recyklátu	m2	3 040,00	0,00	-3040,000	100,00	304 000,00	-304 000,00	0,00 Kč	0,00	-304 000,00	-100,00%
17	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	726,50	726,50	0,000	80,00	58 120,00	0,00	0,00 Kč	58 120,00	0,00	0,00%
18	DIO	Zpracování DIO + zajištění DIR komplet	kpl	1,00	1,00	0,000	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00 Kč	65 000,00	0,00	0,00%
19	2913	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	ks	1,000	1,00	0,000	25 404,00	25 404,00	0,00	0,00 Kč	25 404,00	0,00	0,00%
20	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3	9,00	9,00	0,000	500,00	4 500,00	0,00	0,00 Kč	4 500,00	0,00	0,00%
21	15112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY	t	18,00	18,00	0,000	45,00	810,00	0,00	0,00 Kč	810,00	0,00	0,00%
22	967138	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM	m3	8,00	8,000	0,000	1 500,00	12 000,00	0,00	0,00 Kč	12 000,00	0,00	0,00%
23	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	20,00	20,000	0,000	45,00	900,00	0,00	0,00 Kč	900,00	0,00	0,00%
24	129957	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	bm	25,00	25,000	0,000	400,00	10 000,00	0,00	0,00 Kč	10 000,00	0,00	0,00%
25	9183A1	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM BETONOVÝCH	bm	2,00	2,00	0,000	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00 Kč	5 000,00	0,00	0,00%
26	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM, (0-64)	m2	18,00	18,00	0,000	200,00	3 600,00	0,00	0,00 Kč	3 600,00	0,00	0,00%
27	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m3	4,50	4,500	0,000	7 500,00	33 750,00	0,00	0,00 Kč	33 750,00	0,00	0,00%
28	129971	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	bm	9,00	9,000	0,000	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00 Kč	9 000,00	0,00	0,00%
29	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM, (0-64)	m2	18,00	18,000	0,000	200,00	3 600,00	0,00	0,00 Kč	3 600,00	0,00	0,00%
30	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m3	4,50	4,500	0,000	7 500,00	33 750,00	0,00	0,00 Kč	33 750,00	0,00	0,00%
31	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	m2	18,00	18,000	0,000	500,00	9 000,00	0,00	0,00 Kč	9 000,00	0,00	0,00%
32	78441	MALBY POVRCHŮ PAČOKOVÁNÍM	m2	18,00	18,000	0,000	500,00	9 000,00	0,00	0,00 Kč	9 000,00	0,00	0,00%

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SOD: III/27524 Dymokury Číslo a název SO/PS: st. 0,045 km – 2,942 km Číslo a název rozpočtu: -								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								-					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky											
33	56962.N OTSKP 2025	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM ZBV1: způsob stanovení měněné výměry: Množství stanoveno dle položky č. 56932, zpevnění krajnic = 3 040 m2. Cena stanovena dle OTSKP 2025 <i>jedná se o kvalitativně srovnatelné řešení s nižší cenou pro objednatele</i>	m2	0,00	3040,000	3040,000	82,71	0,00	0,00	251 438,40 Kč	251 438,40	251 438,40	100,00%
		Celkem						9 260 000,00	- 353 950,00	934 617,90	9 840 667,90	580 667,90	- 1,49

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001
Identifikátor DS: a6ejgmx

Věc:
Žádost zhotovitele

Dílo:
III/27524 Dymokury
(na základě smlouvy o dílo ze dne 10.04.2025)

Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(IČ: 00066001)

Zhotovitel:
SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.
(IČ: 28447085)

Zhotovitel žádá o změnu rozsahu díla na akci „**III/27524 Dymokury**“.

Změna č.1: Navýšení výměr dle zaměření

Popis a zdůvodnění změny: Změny vznikly na základě zpřesnění výměr dle skutečně provedených prací. Jedná se o Měření plynoucí ze shodného technického řešení.

Změna č.1 je vyjádřena změnou množství stávajících položek (viz příloha).

Smluvní cena stavby se zvyšuje o 683 179,50 Kč bez DPH.

Změna č.2: Zpevnění krajnic

Popis a zdůvodnění změny: Dle ZD a soupisu prací, mělo být zpevnění krajnic realizováno v tloušťce 100 mm z materiálu ŠD - šterkodrť. Zhotovitel navrhl záměnu položky na zpevnění krajnic z asfaltového recyklátu, kterého má zhotovitel přebytek z frézování jiných vozovek.

Jedná se o kvalitativně srovnatelné řešení, při finanční úspoře pro objednatele.

Změna č.2 je vyjádřena stávající položkou č. 56932 a snižuje smluvní cenu stavby o 304 000,00 Kč a zároveň novou položkou č. 56962, která zvyšuje smluvní cenu o 251 438,40 Kč (viz příloha).

Smluvní cena stavby se snižuje o 52 561,60 Kč bez DPH.

Změna č.3: Nerealizované obrubníky a dlažby

Popis a zdůvodnění změny: Dle ZD a soupisu prací, měla být provedena výšková úprava stávajících obrubníků a předláždění stávající betonové dlažby. Vzhledem k tomu, že stavbou nedošlo k porušení obrub a dlažeb, nebyly tyto práce realizovány.

Změna č.3 je vyjádřena nulovým množstvím u stávajících pol. č. 12_91781 a č. 13_587206 (viz příloha).

Smluvní cena stavby se snižuje o 49 950,00 Kč bez DPH.

Rekapitulace:

Tyto 3 změny znamenají navýšení smluvní ceny stavby o 580 667,90 Kč bez DPH.

Přílohy:

- Změnový list

Ve Zbraslavicích

27.08.2025

Ing. Alois Holík
jednatel společnosti
SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

Zbraslavice 2,
285 21 Zbraslavice

V Kolíně dne 22.8.2025

III/27524 Dymokury– žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo **SMLD-0503/00066001/2025**, odst. 6.7.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

na základě skutečností zjištěných na stavbě:

- 1) na základě geodetického zaměření dojde k zpřesnění výměr skutečně provedených prací
- 2) zpevnění krajnic ze štěrkodrti nahradit zpevnění krajnice z asfaltového recyklátu
(dodavatel disponuje přebytkem tohoto materiálu z jiných vozovek)
- 3) při realizaci stavby nebyla nutná výšková úprava obrub a předláždění betonové dlažby

požadujeme změnu rozsahu díla v souladu s návrhem spočívajícím v:

- 1) přesný rozsah skutečně provedených prací bude určen geodetickým zaměřením, následně budou upraveny položky č.1-113728, pol. č. 2–93818, pol. č. 8–572223, pol. č. 9 - 574C66, pol. č.10-572223, pol. č. 11 - 574A34
- 2) zpevnění krajnice změna položky č.16–56932 na položku č.16–56962
- 3) při realizaci stavby nebyla nutná výšková úprava obrub a předláždění betonové dlažby, provést odpočet položky č.12–91781, položky č.13–587206

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV1).

za

Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00

Stavba: III/27524 Dymokury – oprava silnice

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Zhotovitel: Silnice Čáslav s.r.o.
Zbraslavice 2
285 21 Zbraslavice

TDS: Ing. Jindřich Holínský
Kutná 35
25244 Psáry

Návrh na změnu rozsahu díla.

Změna č.1: Navýšení výměr dle zaměření

Změna vznikla z důvodu přesného geodetického zaměření skutečné stavby. Měření bylo nezávisle ověřeno s totožným výsledkem. Předpokládaná plocha byla navýšena o 1257m², tj. 8,56%.

Změna č.2: Zpevnění krajnic

Zhotovitel nabídl změnu položky materiálu krajnice ze štěrkodrtě na asfaltový recyklát. Tato záměna je technicky možná. Používání recyklovaných materiálů je ekonomické i ekologické. Použitím recyklátu došlo ke snížení ceny.


Změna č.3: Obrubníky a dlažby

V zadání bylo uvažováno s možností potřeby opravy obrubníků a dlažeb v části stavby. Vzhledem k tomu, že zhotovitel postupoval při realizaci opravy šetrně, potřeba opravy dlažeb a obrubníků nenastala. Jedná se o méněpráce.

Součet výše uvedených změn činí 580 667,90Kč při započtení víceprací i méněprací. Předložené jednotkové ceny odpovídají cenám smluvním.

1.9.2025

TDS: Ing. Jindřich Holínský

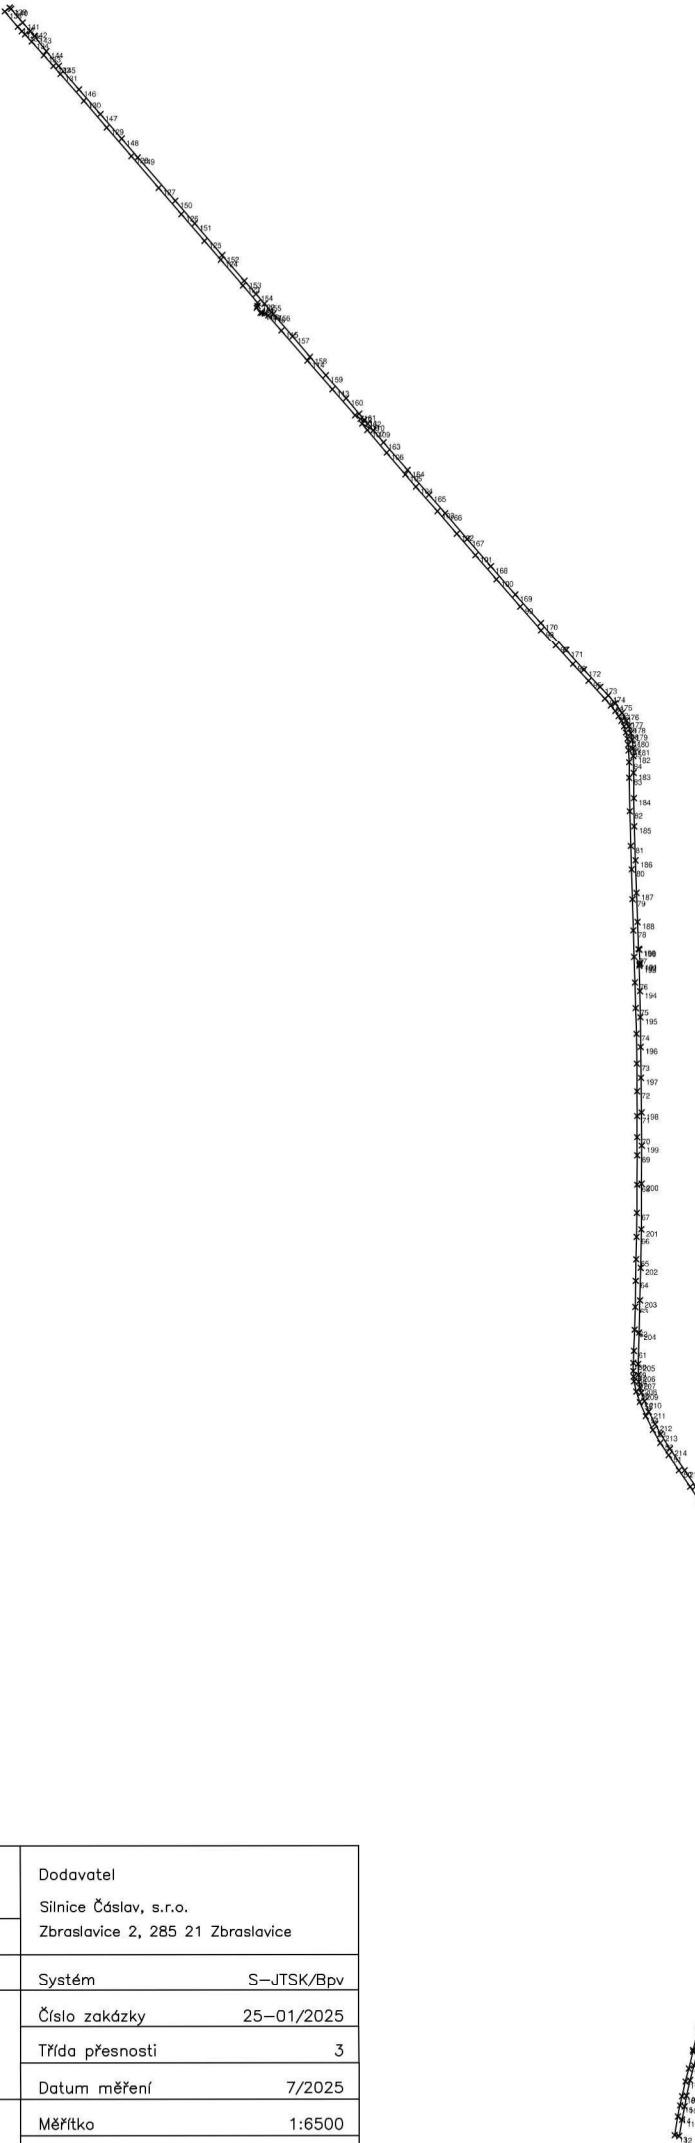

LEGENDA	
	kraj AČO, pl. 15937m2

Měřil a vypracoval Ing. Miška Roman	Kontroloval Ing. Štolba Robert	Dodavatel Silnice Čáslav, s.r.o. Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
Investor	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.	
Místo stavby:	sil. III/27524 – staničení 0,045 km – 2,942 km	Systém S–JTSK/Bpv
Akce III/27524 Dymokury Zaměření skutečného provedení stavby		Číslo zakázky 25–01/2025
		Třída přesnosti 3
		Datum měření 7/2025
Výkres Situace, čísla bodů		Měřítko 1:6500
		Číslo ověření 1027/2025
		Číslo výkresu 1

Přehled nových položek a jejich zdůvodnění				
Název a číslo stavby		III/27524 Dymokury	číslo objektu	číslo změny
Název objektu:		silnice III/27524 Dymokury staničení 0,045 km - 2,942 km	-	001
Číslo a název pol.		nová j.c.		m.j
Nové položky				
33	56962.N	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM <i>Cena převzata z OTSKP 2025, která je nižší než smluvní cena krajnic z ŠD</i>	82,71	M2
Původní položka				
16	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM (0/32)	100,00	M2
Zdůvodnění:				
Jedná se o záměnu položek dle čl. 9 Směrnice : RSM- 36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) Záměna položek položkového rozpočtu (dále též „Záměna položek“) představuje stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 7 ZZVZ, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že: a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - ANO - místo krajnic z ŠD budou provedeny z asfaltového recyklátu b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, - ANO - cena krajnic z asfaltového recyklátu bude nižší než cena krajnic z ŠD c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - ANO, v tomto případě se jedná o kvalitativně stejné řešení. Asfaltový recyklát má díky zbytkům pojiva (bitumenu) vyšší kohezi, což vede k lepší zhutnitelnosti materiálu. To přispívá k vyšší stabilitě krajnice a snižuje riziko jejího rozplavení nebo rozjždění při provozním zatížení. Oproti štěrkodrti, která je méně soudržná, tak recyklát lépe odolává dynamickému zatížení od projíždějících vozidel Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o záměnu položek v souladu s §9 odst 1. písm a) až d) dle RSM- 36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) Souhlasím s novými jednotkovými cenami a způsobem jejich určení, jenž je v souladu s platnou RSM- 36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024)				
Změnu navrhl:		SILNICE ČÁSLAV, s.r.o. Ing. Alois Holík		
Datum:		22.08.2025 Podpis:		
Změnu odsouhlasil:		Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Petr Tyl, Provozní cestmistr CMS Městec Králové		vyhotovení číslo
Datum:		Podpis:		strana číslo
				1
