

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Prodloužení silnice III/0164

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:
101 / 03

Číslo ZBV:
009

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11., 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 53003 Pardubice
IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 009 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
009.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
009.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
009.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
009.4	0,00	54 096,00	54 096,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
009.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
009	0,00	54 096,00	54 096,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Změnový list																										
Název stavby dle SoD Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Prodloužení silnice III/0164	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 101 / 03	Číslo ZBV / Skupina změny: 009.4																								
Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0302/00066001/2024 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.04.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11., 150 21 Praha 5 - Smíchov Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice																										
<u>Přílohy změnového listu:</u> <table><tbody><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>3</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>28</td><td>počet listů</td></tr></tbody></table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	3	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	28	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
1. Krycí list	1	počet listů																								
2. Změnový list	2	počet listů																								
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																								
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																								
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																								
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																								
7. Soupis prací SO po všech změnách	3	počet listů																								
Další doklady dle přehledu dokladů	28	počet listů																								
Iniciátor změny:																										
Předmět Změny: Prodloužení silnice III/0164																										
<u>Popis a zdůvodnění Změny:</u> Zadávací dokumentace Díla předpokládala pouze „případné“ dopravní opatření na Stavbě. V důsledku skutečností oznámených v Oznámení o nové skutečnosti č. 1 - nepřístupné pozemky (příloha č.09) nebyly v době provádění stavby Zhotoviteli předány všechny pozemky tvořící Staveniště ve smyslu čl. 3.1 Smlouvy. Tato situace znemožnila Zhotoviteli zajistit návaznost prací na Díle v souladu s původním harmonogramem, což ovlivnilo dobu trvání a rozsah nezbytných dopravně inženýrských opatření. Vzhledem k tomuto Zhotovitel navrhl: - zajistit řešení dopravně inženýrského opatření na Stavbě nad rámec původního, které zohlední výše uvedené skutečnosti; - zajistit vydání příslušného dopravně inženýrského rozhodnutí a zpracovat změny do realizační dokumentace Stavby. V návaznosti na výše uvedené Zhotovitel zajistil vydání příslušného DIR (příloha č.15), které bylo vydáno i na základě souhlasného stanoviska ze strany Objednatele (příloha č. 16). Zhotovitel oznámil tuto skutečnost Pověřené osobě Objednatele dopisem č. j. 25_SOD-2024-15/12 dne 2.5.2025 (příloha č.08). Pověřená osoba Objednatele následně vydala, na základě stanoviska TDS ze dne 7.5.2025 (příloha č. 10) a stanoviska AD č.j. LI I_Bm-0029-2025 ze dne 27.6.2025 (příloha č.11), Stanovisko Pověřené osoby Objednatele dne 9.7.2025 (příloha č. 12) Z návrhu změny vyplývá, že její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat z důvodu podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o Změnu, která podle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) ("Směrnice") upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek splňuje náležitosti pro Změny nezbytné k dokončení díla (Skupina 4) podle § 11 Směrnice. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a se jedná o změnu nezbytnou.																										

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných
0,00	54 096,00	54 096,00	54 096,00

Technická pomoc Objednatele jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Josef Mikel podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Michal Bočánek podpis

Stavební dozor jméno Petr Jiřímský podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele jméno Ing. Milan Fiala podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání změny jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Mgr.Michal Kropáč

Zhotovitel jméno podpis

Ing. Zdeněk Babka

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 009

Název stavby:

Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

101 / 03

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Prodloužení silnice III/0164

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
35 420 666,94

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	17 673 995,28	53 094 662,22	17 673 995,28

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	54 096,00	17 728 091,28	50,05

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	53 148 758,22	17 728 091,28	50,05

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 Číslo a název SO/PS: 101 - Prodloužení silnice III/0164 Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 03					
								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou											0,00%
Nové položky													
102	02720.N	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	0,000	1,000	1,000	54 096,00	0,00	0,00	54 096,00	54 096,00	54 096,00	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	54 096,00	54 096,00	54 096,00	100,00%
		Celkem za všechny změněné položky						0,00	0,00	54 096,00	54 096,00	54 096,00	100,00%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Josef Mikel, (stavbyvedoucí)

Podpis:

Za Objednatele: Petr Jiřímský, (TDS/TDI)

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 - 925124011

12=(1)*0,15	Limit	11 640 000,01 Kč
13=(39)/(1)	Sledovník limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00 Kč

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Změnového listu ke schválení.

Poznámka

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	009
Název stavby:	Propojení průmyslové zóny Plazy s MUK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Prodloužení silnice III/0164
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101 / 03

Doklad	počet listů
8. Plazy_Oznámení 8_DIO_GLP	2
9. Priloha 1_Oznameni 1_Nepristupne pozemky	2
10. Vyjádření TDS Oznámení 8 - DIO	1
11. Vyjadreni_AD_c16_Vyjadreni_k_Oznameni_8_DIO	1
12. Stanovisko KSUS_Plazy_SO 102 DIO	2
13. Stanovení Mag. MB	3
14. Rozhodnutí Mag.MB	2
15. Stanovisko DI MB	2
16. Vyjádření KSÚS_souhlas s návrhem DIO	3
17. Vyjádření Středočeského kraje k návrhu spol. M-silnice	1
18. Cenové nabídky	5
19. Srovnávací tabulka DIO_SO 101	4
Počet listů celkem	28

[illegible]

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21
Praha 5 - Smíchov

k rukám ředitele: Ing. Aleše Čermáka, Ph.D.,
MBA

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/tel.

V Praze dne

25_SOD-2024-15/12

2.5. 2025

Dílo „Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164“ (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“), smlouva o dílo č. objednatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace SMLD-0302/00066001/2024 (dále jen „Objednatel“), č. zhotovitele M-SILNICE a.s. 25-SOD-2024-011 (dále jen „Zhotovitel“), ze dne 10.4. 2024 (dále jen „Smlouva“).

Oznámení o nové skutečnosti č. 8 – nové dopravně inženýrské opatření na SO 101 a SO 102

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás s oznámením o nové skutečnosti zjištěné při realizaci Díla a žádostí o vydání pokynu představující změnu Díla ve smyslu čl. 6.7 Smlouvy.

Podle zadávací dokumentace Díla (dále jen „Zadávací dokumentace“) je v soupisu prací DIO navrženo jako „případné“ a je tedy pouze v omezeném rozsahu. Vzhledem k níže popsaným skutečnostem je nutné DIO v rozsahu Zadávací dokumentace přepracovat.

1. Nepředané Staveniště

V důsledku skutečností oznámených v oznámení o nové skutečnosti č. 1 – nepřístupné pozemky, sp. zn. 25_SOD-2024-15/2 ze dne 10.10.2024, které přikládáme jako přílohu č. 1, nebyly dosud Zhotoviteli předány všechny pozemky tvořící Staveniště ve smyslu čl. 3.1 Smlouvy. Tato situace znemožňuje Zhotoviteli zajistit návaznost prací na Díle v souladu s původním harmonogramem, což ovlivňuje dobu trvání a rozsah nezbytných dopravně inženýrských opatření.

Vznikla zejména nutnost zajistit dopravní inženýrská opatření související s nepřístupností Staveniště po SO 102, která dosud nebyla dokončena.

2. Požadavek skupiny GLP

Podle požadavku členů skupiny GLP, vlastníků pozemků přilehlých k SO 102, který tvoří přílohu č. 2, je Zhotovitel povinen zajistit nepřerušovanou průjezdnost (24/7) do jejich areálů, a to bez omezení. Tento požadavek je z hlediska GLP klíčový, jelikož jeden z klientů GLP dodává komponenty na výrobní linku společnosti Škoda Auto a.s. v režimu „just-in-second“, kde jakékoliv zpoždění je nepřijatelné.

Zhotovitel proto navrhuje:

- zajistit řešení dopravně inženýrského opatření na Stavbě nad rámec původního, které zohlední výše uvedené skutečnosti;
- zajistit vydání příslušného dopravně inženýrského rozhodnutí; a

- zpracovat změny do realizační dokumentace Stavby.
(dále jen „Změna“).

Změna má dopad do smluvní ceny Díla do výše až 1.000.000 Kč, přičemž Zhotovitel dodá změnový rozpočet do 15. května 2025.

Zhotovitel považuje Změnu za Nepředvídatelnou změnu ve smyslu Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb R-Sm-08.

Zhotovitel Vás tímto v souladu s čl. 6.7 Smlouvy žádá o schválení Změny a vydání pokynu k zpracování a předložení ZBV v souvislosti se Změnou, a to nejpozději do 11.4.2025, aby se minimalizovalo časové zpoždění a předešlo vzniku dodatečných nákladů.

Pokud nesouhlasíte s výše popsaným postupem, tak tímto Zhotovitel žádá Objednatele, aby ve stejném termínu určil jiné řešení, podle kterého má Zhotovitel postupovat tak, aby bylo zajištěno dodržení plynulého postupu prací.

S pozdravem

Ing. Filip Sláma
zástupce Zhotovitele

Přílohy:

- 1) oznámení o nové skutečnosti č. 1 – nepřístupné pozemky, sp. zn. 25_SOD-2024-15/2 ze dne 10.10.2024
- 2) Požadavek GLP

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21
Praha 5 - Smíchov

k rukám ředitele: Ing. Aleše Čermáka, Ph.D.,
MBA

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/tel.

V Praze dne

25_SOD-2024-15/2

10. 10. 2024

Dílo „Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164“ (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“), smlouva o dílo č. objednatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace SMLD-0302/00066001/2024 (dále jen „Objednatel“), č. zhotovitele M – SILNICE a.s. 25-SOD-2024-011 (dále jen „Zhotovitel“), ze dne 10.4. 2024 (dále jen „Smlouva“).

Oznámení o nové skutečnosti č. 1 – nepřístupné pozemky

Vážený pane řediteli,

dne 19.9.2024 byl ze strany Objednatele, Zhotovitele a stavebního dozoru stavby podepsán protokol o předání Staveniště (dále jen „**Protokol**“), který tvoří i přílohu č. 1 tohoto oznámení. Podle Protokolu nebyly Zhotoviteli předány všechny pozemky tvořící Staveniště ve smyslu čl. 3.1 Smlouvy (dále jen „**Staveniště**“), jelikož některé pozemky tvořící Staveniště nejsou dosud Objednatelům vykoupeny nebo jinak zpřístupněny.

Nepřístupné pozemky pro realizaci Stavby

Zhotoviteli nebyly podle Protokolu předány pozemky, na nichž má být realizována Stavba. Jedná se zejména o pozemky pod částmi SO 102, SO 113, SO 114, SO 130 a dále také SO 201 a SO 112 (dále jen „**Nepřístupné pozemky**“).

Zhotovitel může v tuto chvíli zahájit práce na Díle, avšak pouze v rozsahu, který mu umožňují aktuální majetkoprávní poměry na Staveništi. Zhotovitel tímto žádá, aby Nepřístupné pozemky byly zpřístupněny nejpozději do 16. října 2024.

Pokud Objednatel nezajistí včasný přístup na Nepřístupné pozemky, bude mít tato skutečnost dopad do:

- harmonogramu Díla,
- termínu pro dokončení a předání Díla ve smyslu čl. 4.1 Smlouvy; a
- do ceny Díla.

Nepřístupné plochy deponie a zařízení Staveniště

V souladu s projektovou dokumentací Stavby (dále jen „**PDPS**“) a čl. 3.1 Smlouvy je Objednatel povinen zajistit Zhotoviteli plochy pro zařízení Staveniště a pro deponii ornice pro zpětné použití (dále jen „**Plochy**“). Nicméně pozemky, které měly sloužit Zhotoviteli jako Plochy, nebyly Zhotoviteli zpřístupněny, a to z důvodu dosud nevyřešených majetkoprávních vztahů Objednatele a třetích stran.

PDPS předpokládala Plochy deponií v místech (i) podél SO 101, (ii) v blízkosti MÚK Kosmonosy ve staničení přibližně km 1,250, a (iii) ve staničení přibližně km 0,600. Plocha pro zařízení Staveniště se má dle PDPS nacházet ve staničení přibližně km 1,200.

Pokud Objednatel nezpřístupní původně určené Plochy nebo nezajistí náhradní nejpozději do 15. října 2024, vzniknou Zhotoviteli vícenáklady, které způsobí navýšení ceny Díla. Zároveň tato skutečnost může mít dopad do harmonogramu Díla a termínu pro dokončení a předání Díla ve smyslu čl. 4.1 Smlouvy.

Konkrétní časové a cenové dopady budou Zhotovitelem vyčísleny v navazujícím řízení.

V návaznosti na výše uvedené tímto Zhotovitel žádá Objednatele, aby nejpozději do 16. října 2024 vydal:

- stanovisko s předpokládaným harmonogramem předání Nepřístupných pozemků a Ploch Zhotoviteli; nebo
- pokyn s určením jiného řešení podle kterého má Zhotovitel postupovat tak, aby bylo zajištěno dodržení plynulého postupu prací.

S po

Ing.
zástupce Zhotovitele

Přílohy:

- 1) protokol o předání Díla ze dne 19.9.2024

V Liberci dne 7. května 2025

Adresát:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření TDS k oznámení Zhotovitele č. 8

Vážený pane řediteli,

na stavbě „**Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164**“ zhotovitel stavby, společnost M - Silnice a.s., navrhuje změnu na dopravně-inženýrských opatřeních (DIO).

Změna je vyvolaná nepřístupností pozemků určených pro výstavbu Díla.

Za TDS konstatují, že **doporučujeme** zabývat se změnou. Dále doporučujeme vyžádat si konkrétní návrhy DIO s uvedením rozsahu dopravních značek nad rámec DIO uvažovaného v zadávací dokumentaci a uvažovanou dobu jejich trvání nad rámec původní doby trvání.

Pet



Naše značka: LI I-Bm-0029-2025

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum:



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje

Ing. Milan Fiala

Žižkova 263/1

Říčany u Prahy 251 01

Akce: **Propojení PZ Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164**

Věc: **Vyjádření AD č. 15 k Oznámení Zhotovitele o nové skutečnosti č. 8 – nové dopravně inženýrské opatření na SO 101 a SO 102**

Dobrý den,

na základě žádosti objednatele stavby sděluji stanovisko AD k **Oznámení Zhotovitele stavby o nové skutečnosti č. 8** týkající se změnou DIO SO 101 a 102 (ze dne 2.5.2025 zn. 25-SOD-2024-15/12).

Změna je vyvolána nepřístupností pozemků určených pro realizaci stavby a s tím spojené zvýšené nároky na DIO SO 101 a 102.

K výše uvedenému AD vydává následující vyjádření:


Se změny DIO jako z uvedených důvodů jako AD souhlasím, konkrétní návrh DIO nebyl AD předložen a není předmětem schválení.

AD konstatuje, že se nevyjadřuje a ani mu nepřísluší se vyjadřovat k dopadu výše uvedených změn do ceny díla.

S pozdravem



Ing. Michal Bočánek
autorský dozor stavby
PRAGOPROJEKT, a.s.



V Říčanech

9.7.2025

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan
Ing. Filip Slaba
výrobní náměstek
M - SILNICE a.s.
oblastní závod JIH
Trabantská 290/31
190 15 Praha 9

Věc: Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy, prodloužení silnice III/0164- Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci- ZBV, úprava DIO- vyjádření

Vážený pane řediteli,

krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor výše uvedené akce je seznámena s žádostí o zpracování ZBV, které bylo oznámeno zhotovitelem dne 5.5.2025 (viz příloha - Oznámení zhotovitele). Dodatečný požadavek se týká změny DIO z důvodu zajištění dopravní obslužnosti území a změny organizace výstavby z důvodu nedostupnosti některých pozemků - probíhající majetkoprávní příprava.

Uvedené skutečnosti zhotovitel nemohl předvidat při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. Uvedené práce budou zohledněny v závěrečném vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla. S uvedeným návrhem změny souhlasí AD a TDS.

KSÚS s změnou souhlasí a dále žádá zhotovitele - společnost M-SILNICE, a.s. o vypracování Změnových listů, v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto Změnové listy budou následně projednány a podrobně posouzeny vedením KSÚS a technickou asistencí.

Technické řešení změny bude následně upřesněno projekčně v rámci aktualizace RDS. Změnový list s vyčíslením množství u jednotlivých položek, cenovým dopadem změny, stejně jako veškeré předložené podklady ke změně budou řádně projednány a připomínkovány ze strany TDI a AD.

Přílohy:

1. Oznámení zhotovitele o zjištěných okolnostech oproti zadávací dokumentaci (úprava DIO) u akce „**Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy, prodloužení silnice III/0164**“ ze dne 5. 5.2025.





MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

ODDĚLENÍ DOPRAVY A SPRÁVY DOPRAVY

Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav

Spisová značka: MMMB/58546/2025/ODSD/VeTy

Č.j.: MMMB/58578/2025/ODSD/VeTy

Vyřizuje/Oprávněná Bc. Veronika Tyllarová

úřední osoba:

Tel.:

E-mail:

Datum:



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě žádosti, kterou dne 14.05.2025 podala společnost M - SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice III-Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3, v zastoupení: JAZNAK spol. s r.o., Mladá Boleslav, Vinec 26, PSČ 29301, a po předchozím písemné vyjádření Policie ČR Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav ze dne 23.04.2025.

I. ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm.c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

stanovuje přechodné dopravní značení na silnici č. III/0164, která je v předčasném užívání a na souvisejících ostatních komunikacích v k. ú. Kosmonosy, Plazy, z důvodu propojení průmyslové zóny Plazy, viz. DIO S 4748, S 4749, S 4774, které je součástí tohoto opatření, formou opatření obecné povahy podle ust. § 173 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád.

spočívající v umístění svislého dopravního značení, dle návrhu dopravního opatření, zpracovaného společností JAZNAK spol. s r.o., Mladá Boleslav, Vinec 26, PSČ 29301, potvrzené Policií ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor, dopravní inspektorát Mladá Boleslav ze dne 23.04.2025 a Magistrátem města Mladá Boleslav, odbor dopravy a SH ze dne 14.05.2025

Přechodná úprava provozu je platná v termínu:

22.05.2025 – 23.12.2025

Podmínky provedení dopravního značení :

- 1) Bude užito reflexní dopravní značení 1. třídy (R 1) v základní velikosti.
- 2) Dopravní značení musí svým provedením a rozmístěním odpovídat zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dále ČSN EN 12899-1 a musí být v souladu se zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 66.
- 3) Magistrát města Mladá Boleslav odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to vyžádá situace v silničním provozu nebo veřejný zájem.

- 4) Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, KRPS-112546/ČJ-2025-010706-KOM ze dne 23.04.2025, a dále s vyjádřením Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, č.j.: 3049/25/KSUS/MHT/TKA ze dne 12.05.2025.
- 5) **Celkové umístění všech dopravních značek je patrné z grafické části dopravně inženýrského opatření, které je součástí tohoto opatření - DIO S 4748, S 4749, S 4774**
- 6) **Za instalaci a stav místní úpravy provozu dopravního značení bude odpovědný: p. Josef Mikel, tel.: 702 262 621, stavbyvedoucí**
- 7) **Zodpovědná osoba za organizaci a zabezpečení akce: Josef Mikel, tel.: 702 262 621, stavbyvedoucí**
- 8) Proti tomuto stanovení nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

O d ů v o d n ě n í

Dne 14.05.2025 podala společnost M - SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice III-Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3, v zastoupení: JAZNAK spol. s r.o., Mladá Boleslav, Vinec 26, PSČ 29301, zdejšímu správnímu orgánu návrh na stanovení přechodného dopravního značení na silnici č. III/0164, která je v předčasném užívání a na souvisejících ostatních komunikacích v k. ú. Kosmonosy, Plazy, z důvodu propojení průmyslové zóny Plazy, viz. DIO S 4748, S 4749, S 4774, které je součástí tohoto opatření.

Zdejší správní orgán návrh v souladu s § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu projednal s dotčeným orgánem - Policií ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, KRPS-112546/ČJ-2025-010706-KOM ze dne 23.04.2025.

Na podkladě žádosti a souhlasného stanoviska Policie ČR a vyjádření Krajské správy a údržby silnic dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena výše uvedená přechodná úprava provozu. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření příslušného orgánu policie jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté správního řádu.

P o u č e n í

Podle § 173 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení.

Bc. Veronika Tyllarová
referent dopravy, správy dopravy a
stavebního úřadu 1

Za správnost vyhotovení:

Bc. Veronika Tyllarová

referent dopravy, správy dopravy a stavebního úřadu 1

Příloha:

- situace dopravního značení

Rozdělovník:

Účastník řízení:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice III-Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3,

v zastoupení: JAZNAK spol. s r.o., Mladá Boleslav, Vinec 26, PSČ 29301, DS: a4jdnas

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Mnichovo Hradiště,
Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, DS: a6ejgmx

Dotčený orgán:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Zbraslav, 156 00 Praha-Zbraslav,
doručovací adresa: Štefánikova 1304, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1, DS: 2dtai5u

Ostatní:

Obec Plazy

Město Kosmonosy

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení:

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmутí:

Magistrát města Mladá Boleslav

Obec Plazy

Město Kosmonosy



MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

ODDĚLENÍ DOPRAVY A SPRÁVY DOPRAVY

Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav

Spisová značka: MMBB/58546/2025/ODSD/VeTy

Č.j.: MMBB/58546/2025/ODSD/VeTy

Vyřizuje/Oprávněná Bc. Veronika Tyllerovalá

úřední osoba:

Tel.:

E-mail:

Datum:



ROZHODNUTÍ

Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Mladá Boleslav, jako věcně příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic, dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě předchozího souhlasu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, Policie ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor, dopravní inspektorát Mladá Boleslav a po projednání s dotčenými úřady a subjekty

p o v o l u j e

ve smyslu ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu § 39 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, žadateli: M - SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice III-Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3, v zastoupení: JAZNAK spol. s r.o., Mladá Boleslav, Vinec 26, PSČ 29301, **dopravní omezení – částečná uzavírka silnice č. III/0164, která je v předčasném užívání v k. ú. Kosmonosy, Plazy, z důvodu propojení průmyslové zóny Plazy, viz. DIO S 4748, S 4749, které je součástí tohoto rozhodnutí.**

Údaje o uzavírcce :

- 1) Úsek částečné uzavírky: *částečná uzavírka silnice č. III/0164*
- 2) Důvod částečné uzavírky: *propojení průmyslové zóny*
- 3) Druh uzavírky: *částečná*
- 4) Termín uzavírky: **22.05.2025 – 23.12.2025**
- 5) Odpovědná osoba za organizaci a zabezpečení akce: **stavbyvedoucí p. Josef Mikel**
- 6) Specifikace dopravního značení: v místech omezení bude instalováno DZ zpracované dle návrhu, které je součástí tohoto rozhodnutí

Uzavírka je povolena za těchto podmínek :

- 1) Žadatel zodpovídá po celou dobu uzavírky za řádné rozmístění stanoveného dopravního značení a jeho údržbu tak, jak bylo odsouhlaseno. Žadatel je povinen učinit taková opatření, aby doba uzavírky byla dodržena, případně zkrácena.
- 2) Úplná uzavírka bude řádně označena dopravními značkami, zábranami a informačními tabulemi v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu **Opatření obecné povahy, tj. „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ ze dne 14.05.2025 Č.j.: MMM/58578/2025/ODSD/VeTy**
- 3) Po skončení uzavírky budou ihned odstraněna všechna zařízení umístěná v souvislosti s povolenou uzavírkou.

- 4) Budou dodrženy podmínky souhlasu Policie ČR Krajské ředitelství policie SK ÚO-DI Mladá Boleslav ze dne 23.04.2025 č.j.: KRPS-112546/ČJ-2025-010706-KOM a podmínky vypracované Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace zn.: 3049/25/KSUS/MHT/TKA ze dne 12.05.2025
- 5) Nebudou-li dodrženy podmínky tohoto rozhodnutí bude postupováno dle přísl. ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a SH a Policie ČR KŘP SK ÚO-DI Ml. Boleslav si vyhrazují právo změnit nebo doplnit podmínky tohoto rozhodnutí, pokud si to vyžádá veřejný zájem nebo bezpečnost a plynulost silničního provozu.

O d ů v o d n ě n í

Žadatel společnost M - SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice III-Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3, v zastoupení: JAZNAK spol. s r.o., Mladá Boleslav, Vinec 26, PSČ 29301, požádala dne 14.05.2025 o povolení dopravního omezení – částečná uzavírka silnice č. III/0164, která je v předčasném užívání v k. ú. Kosmonosy, Plazy, z důvodu propojení průmyslové zóny Plazy, viz. DIO S 4748, S 4749, které je součástí tohoto rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že umístění bylo projednáno s příslušnými majetkovými správci dotčené komunikace, bylo konstatováno, že žádosti lze vyhovět. Pro zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění prací rozhodl odbor dopravy a SH Magistrátu města Mladá Boleslav, jako příslušný silniční správní úřad, tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, podáním u odboru dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Mladá Boleslav. Dle ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá případné odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek.

Bc. Veronika Tyllarová
referent dopravy, správy dopravy a
stavebního úřadu 1

Za správnost vyhotovení:
Bc. Veronika Tyllarová
referent dopravy, správy dopravy a stavebního úřadu 1

Příloha: - DIO S 4748, S 4749

Rozdělovník:

Účastník řízení:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice III-Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3,
v zastoupení: JAZNAK spol. s r.o., Mladá Boleslav, Vinec 26, PSČ 29301, DS: a4jdnas

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Mnichovo Hradiště,
Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, DS: a6ejgmx

Dotčený orgán:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Zbraslav, 156 00 Praha-Zbraslav,
doručovací adresa: Štefánikova 1304, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1, DS: 2dtai5u

Ostatní:

Obec Plazy

Město Kosmonosy



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Mladá Boleslav
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPS-112546/ČJ-2025-010706-KOM

Mladá Boleslav 23. dubna 2025

Počet stran: 2

Přílohy: 3Jaznak, spol. s r. o.
Vinec 26
293 01 Mladá Boleslav-----
Věc: Dopravní opatření – přechodná úprava provozu, zvláštní užívání pozemních komunikací – souhrnné stanovisko

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, dopravní inspektorát, jako věcně a místně příslušný dotčený orgán vydávající stanovisko v souladu s ustanovením §77, odst. 2, písm. b), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění, vydávající závazné stanovisko v souladu s ustanovením §25, odst. 1, 6, písm. c), bodu 3, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

S O U H L A S Í

s přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích – silnice III/0164, místní komunikace v průmyslové zóně Plazy, a dále se zvláštním užíváním pozemní komunikace – silnice III/0164 v k. ú. Plazy a Kosmonosy, podle předloženého návrhu (viz přílohy) a při splnění níže uvedených podmínek. Dopravní opatření spočívá v úplné uzavírcce PK.

Podmínky:

- Dopravní značení musí být provedeno, umístěno a udržováno v souladu s platnými právními předpisy a normami. Pracovní místo musí být řádně označeno a zabezpečeno zábranami nebo jinými prostředky proti vstupu nepovolaných osob z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na PK a ochrany zdraví. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pohybu pěších.
- Termín provedení: **od 2. 5. do 23. 12. 2025**

Odůvodnění:

Dne 9. 4. 2025 byla přijata žádost o stanovisko k návrhu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a k zvláštnímu užívání pozemních komunikací, kterou podala společnost Jaznak, spol. s r. o., IČ: 48952621, Vinec 26, 293 01 Mladá Boleslav. Přechodná úprava provozu a zvláštní

Štefánikova 1304/3
293 01 Mladá Boleslav

užívání spočívají v dopravním opatření – částečné uzavírce silnice III/0164 v k. ú. Plazy a Kosmonosy, podle přiložené dokumentace (viz přílohy), z důvodu výstavby prodloužení silnice III/0164 směrem k MÚK Kosmonosy. K žádosti je doložen schématický návrh přechodného dopravního značení.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, dopravní inspektorát, jako věcně a místně příslušný dotčený orgán vydávající závazné stanovisko s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. **Zároveň si vyhrazuje právo stanovit další podmínky, které si vyžádají naléhavé okolnosti při zajišťování bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu.**

Zpracoval:
por. Ing. Tomáš Bláha

npor. Mgr. Miloš Černý
vedoucí oddělení



JAZNAK spol. s.r.o.
Vinec 26
293 01 Mladá Boleslav
e-mail: -
IDDS: -

Naše značka Vyřizuje
č. ev.: 25851/2025-KSUS Tkaczová
č. j.: 3049/25/KSUS/MHT/TKA

Praha
12.05.2025

Věc: „Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164“, k Vašemu dopisu ze dne 25.4.2025

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce silnic II. a III. tříd na území Středočeského kraje a zástupce Středočeského kraje v rozsahu oprávnění vyplývajícího ze Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., v platném znění, souhlasí s návrhem DIO, s přechodnou úpravou provozu a částečnou uzavírkou silnice č. III/0164 v termínu 19.5.2025 do 23.12.2025, (z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při výše uvedené stavbě), a to za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Případné znečištění nebo poškození silničních pozemků bude uvedeno do původního stavu.
2. Dopravní značení bude schválené Policií ČR, přechodnou úpravu provozu na silnici Vám stanoví příslušný odbor dopravy.
3. Zhotovitel: M – Silnice a.s., Husova 1697, 530 02 Pardubice
Odpovědná osoba: Josef Mikel, tel.: 702 262 621

V případě změn – dalších skutečností, které nebyly v době vydání vyjádření známy a které by se dotýkaly silniční sítě, bude záměr předem projednán se správcem silnice, který si vyhrazuje právo své vyjádření doplnit, upřesnit nebo změnit.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.

Přílohy: DIO

S pozdravem




Lenka Chmelová

Vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště



Dopravní opatření při prodloužení silnice III/0164 v Průmyslové zóně Plazy I. etapa

Evidenční číslo: S 4748

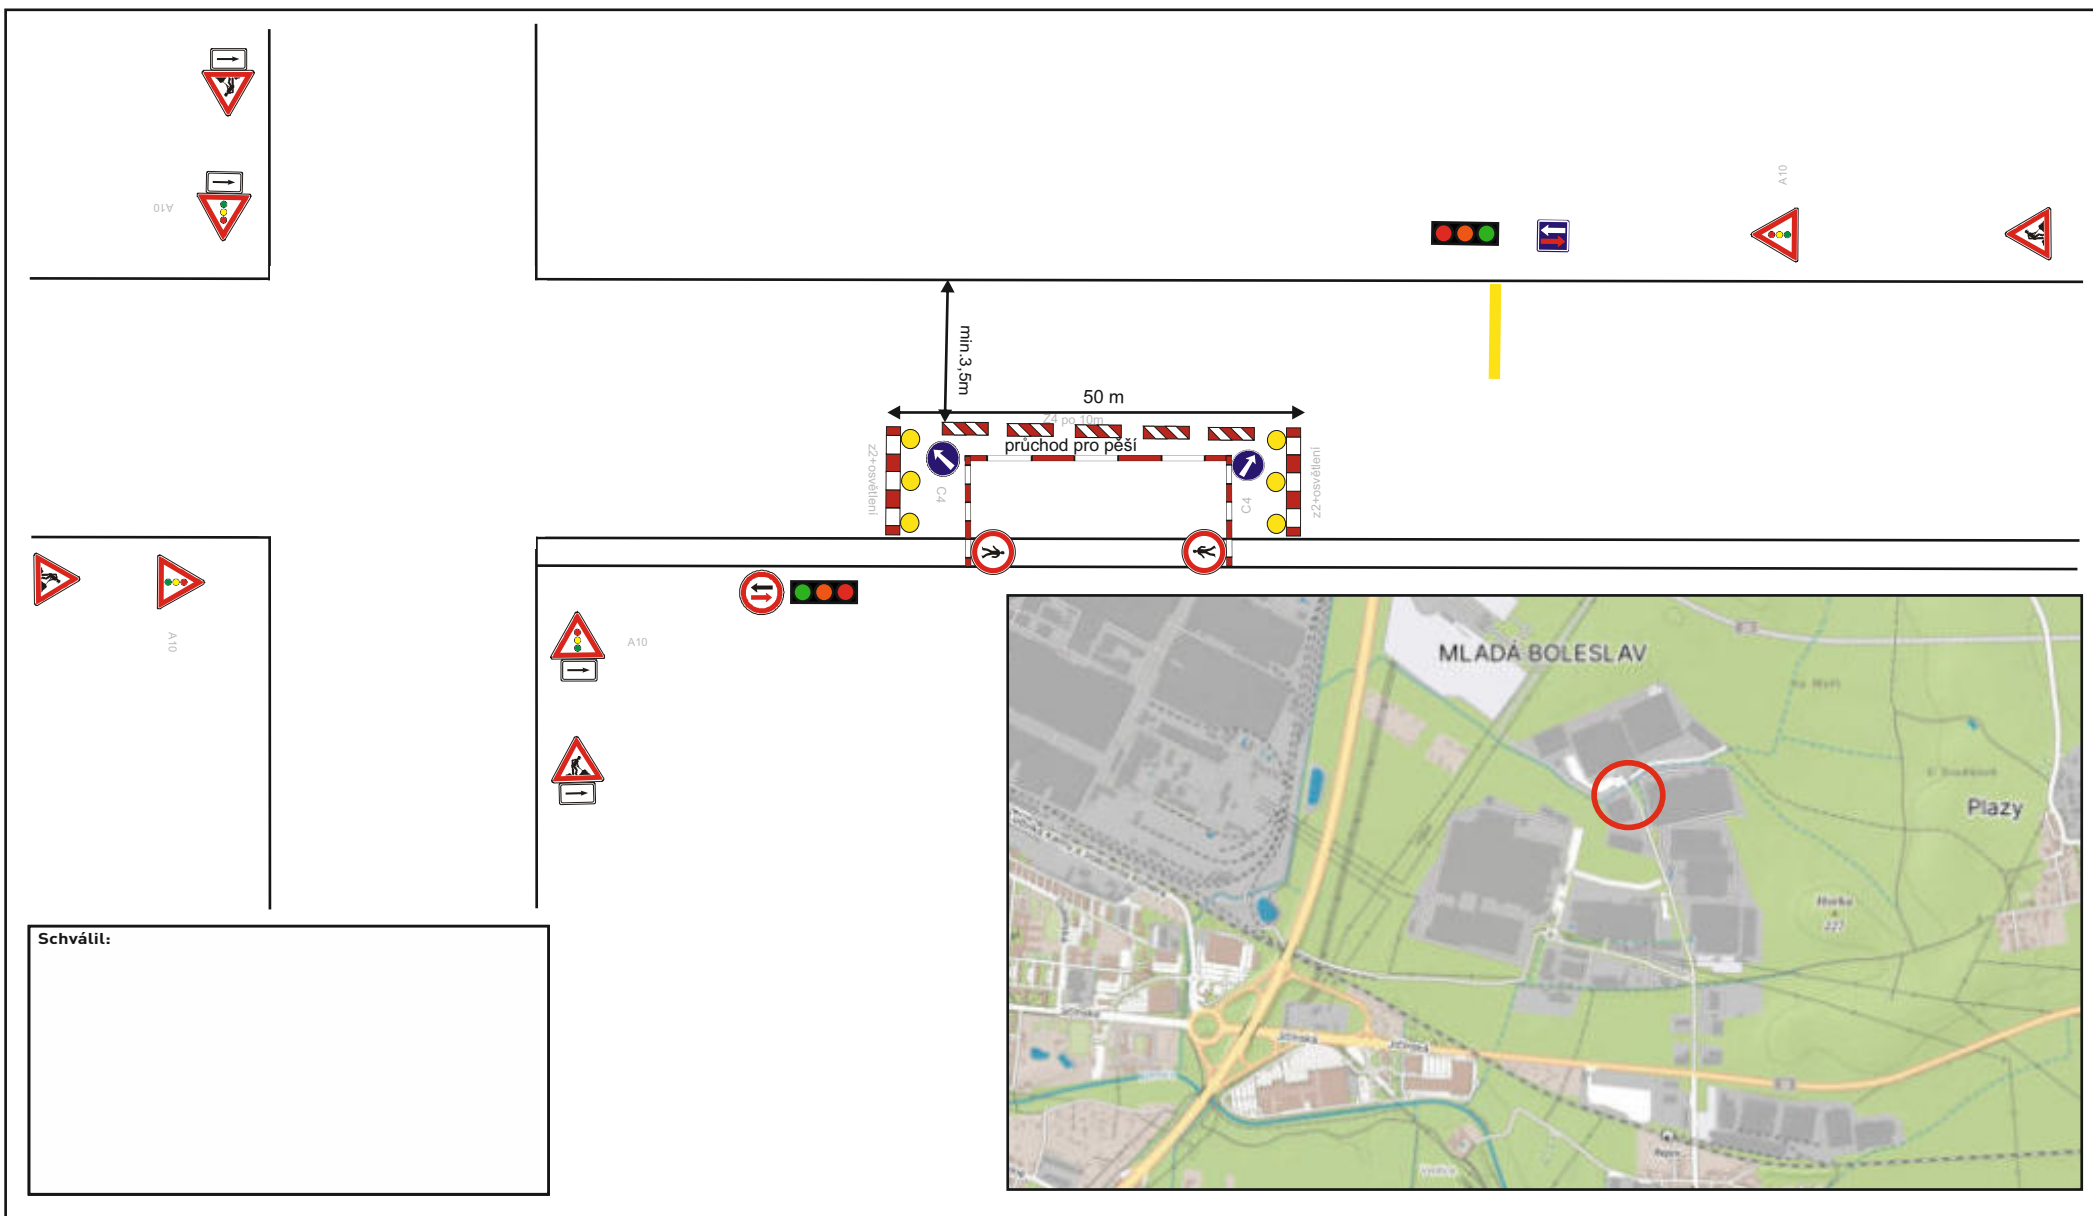


Schválil:



Dopravní opatření při prodloužení silnice III/0164 v Průmyslové zóně Plazy II. etapa

Evidenční číslo: S 4749

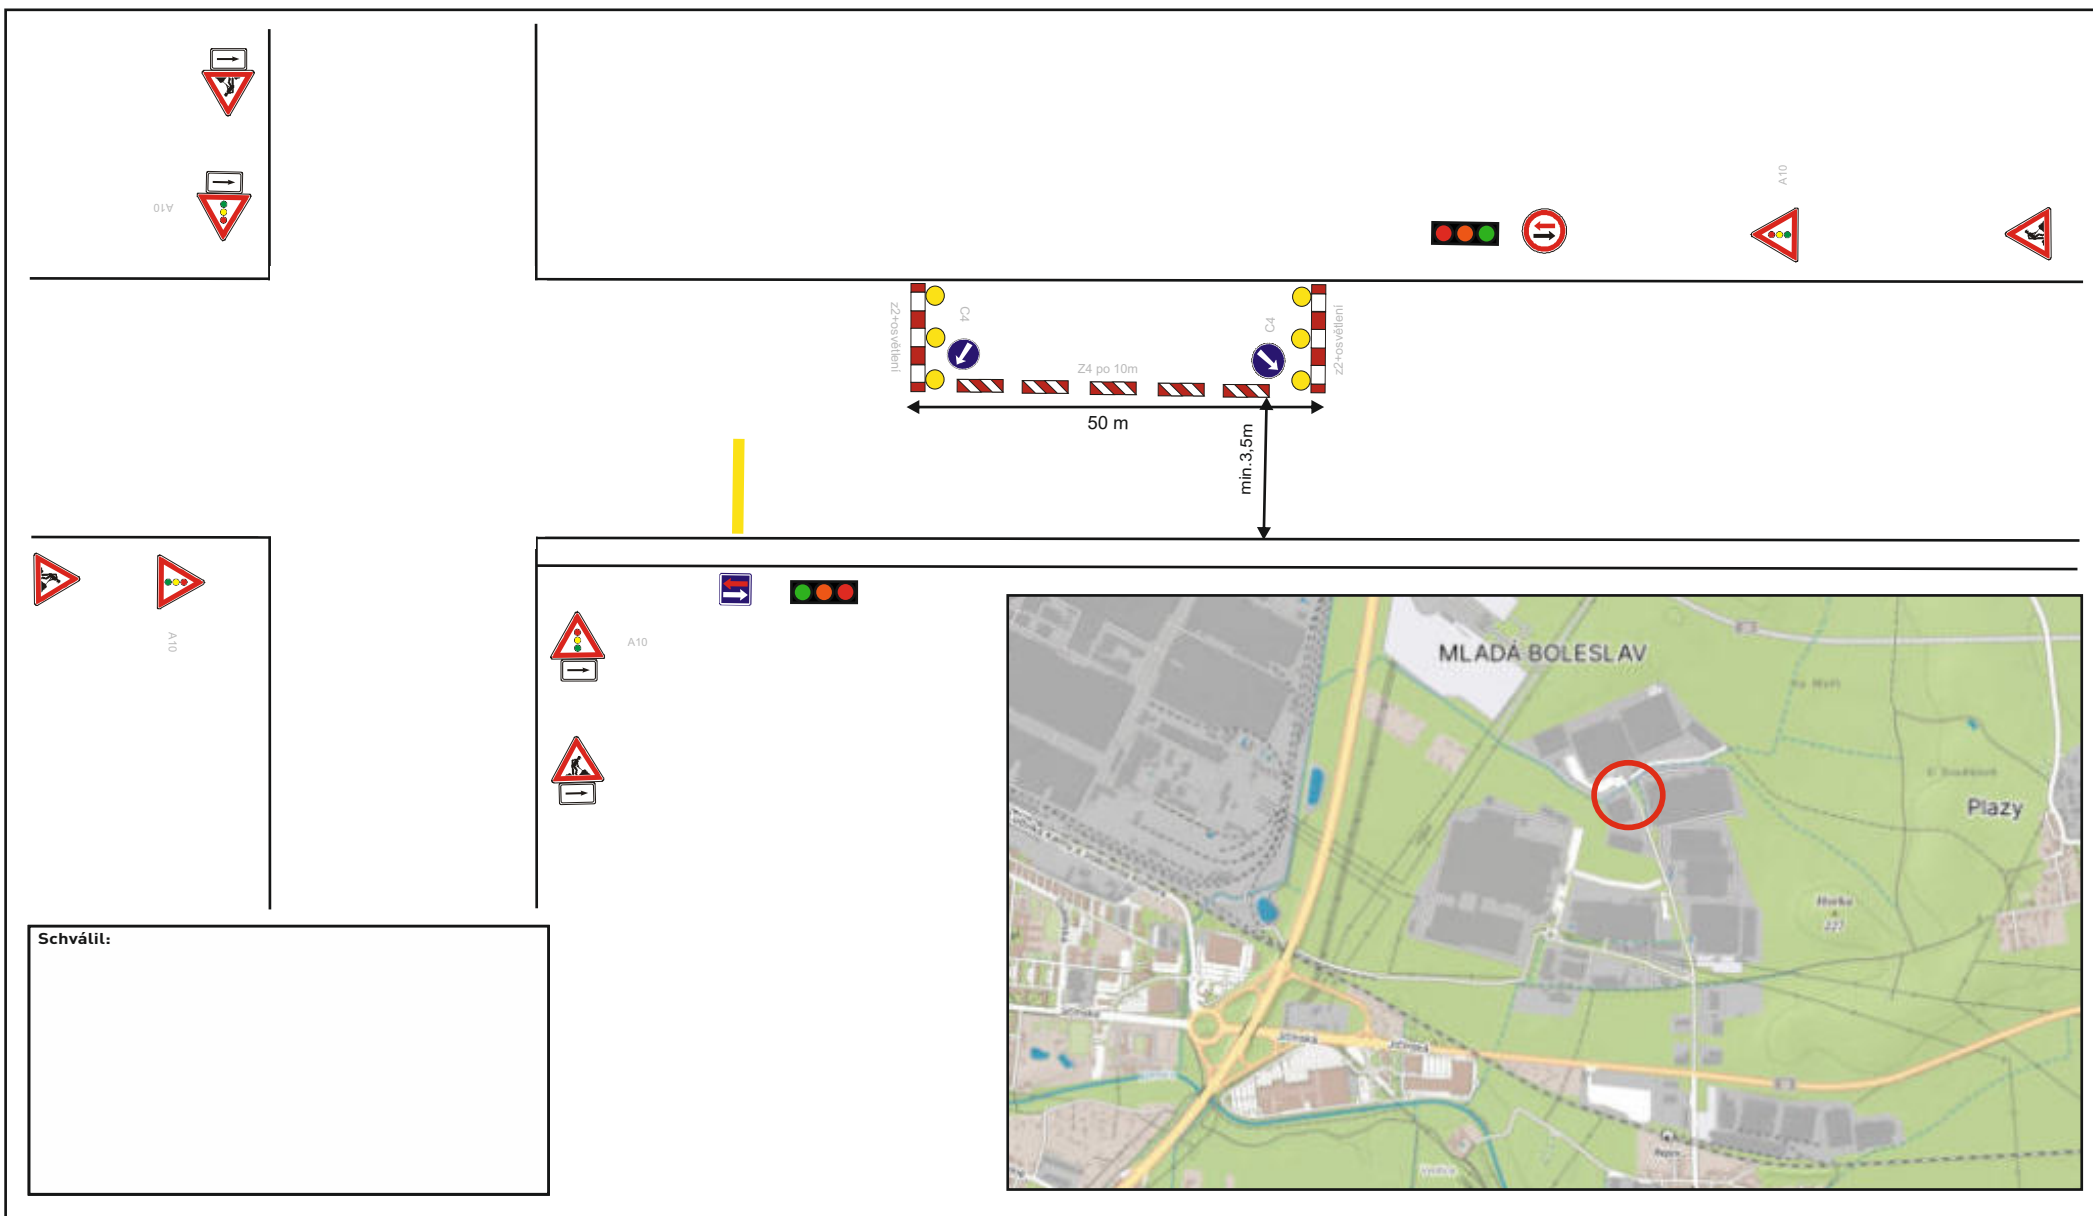

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR DOPRAVY

Praha: 14.05.2025
Číslo jednací: 064901/2025/KUSK-DOP/HOL
Spisová značka: SZ_064901/2025/KUSK
Oprávněná úřední osoba: Mgr. Michal Holub, I. 137
Značka: DOP/HOL

Jaznak spol. s r.o.
Vinec 26
Mladá Boleslav

Vyjádření k návrhu o stanovení přechodné úpravy provozu na novém úseku silnice – mimoúrovňová křižovatka nad dálnicí D10 Kosmonosy, návrh společnosti M-Silnice a.s. v souvislosti s uzavírkou silnice č. III/0164 Plazy, termín 12.05.-23.12.2025.

V současné době se jedná o úsek silnice nezařazený do silniční sítě, tudíž se nejedná o silnici I. třídy, z tohoto důvodu je vyřízení návrhu v působnosti Magistrátu města Mladá Boleslav.

Mgr. Michal Holub

Odborný referent silničního hospodářství

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: **Michal Holub**
Organizace: Středočeský kraj
Sériové č. cert.: 23686088
Vydávatel cert.: PostSignum Qualified CA 1
Datum a čas: 14.05.2025 14:09:40

Přehled cenových nabídek							
Poř. Č. pol.	kód položky	Název položky	Jednotková cena	Cena celkem	Cena vč. DPH	str/počet str.	Firma
102	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY		498 000,00 Kč	602 580,00 Kč	1	JAZNAK spol. s. r. o.
				608 493,19 Kč	736 276,76 Kč	1	SEDOZ DZ s. r. o.
				730 340,00 Kč	883 711,40 Kč	1	Quo s. r. o.

Výsledná cena byla navýšena o 15%. Toto navýšení se skládá z:

5% výrobní režie

5% správní režie

5% zisk

Celková cena vč. navýšení : 572 700Kč

JAZNAK spol. s r. o.

Vínec 26
Mladá Boleslav
293 01

Odběratel: M-Silnice a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

V Mladé Boleslavi dne 28.03.2025

Cenová nabídka

akce: Plazy - zajištění přístupu cesty na staveniště u areálu firmy GLP

Pronájem DZ 1.5.-31.8.2025	počet	dní	cena/den	celkem
A15	2	123	25,00 Kč	6 150,00 Kč
A10	2	123	25,00 Kč	6 150,00 Kč
C4	2	123	25,00 Kč	6 150,00 Kč
Z4	6	123	25,00 Kč	18 450,00 Kč
SSZ (vč. servisu a výměny baterií)	1	123	2 500,00 Kč	307 500,00 Kč
denní servis	2	123	125,00 Kč	30 750,00 Kč
Montáž v dílně	2	hod.	390,00 Kč	780,00 Kč
Montáž na místě	8	hod.	390,00 Kč	3 120,00 Kč
Demontáž	8	hod.	390,00 Kč	3 120,00 Kč
Doprava	62	km	20,00 Kč	1 230,00 Kč
Návrh+projednání DIO	1	x	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
CELKEM				398 400,00 Kč

Pronájem DZ 1.5.-23.12.2025	počet	dní	cena/den	celkem
IP22	1	237	80,00 Kč	18 960,00 Kč
P4+C1	1	237	35,00 Kč	8 295,00 Kč
denní servis	2	237	125,00 Kč	59 250,00 Kč
Montáž v dílně	4	hod.	390,00 Kč	1 560,00 Kč
Montáž na místě	8	hod.	390,00 Kč	3 120,00 Kč
Demontáž	8	hod.	390,00 Kč	3 120,00 Kč
Doprava	67	km	20,00 Kč	1 330,00 Kč
Návrh+projednání DIO	1	x	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
Zakrytí DZ	4	ks	90,00 Kč	360,00 Kč
Aplikace textu IP22	1	ks	105,00 Kč	105,00 Kč
CELKEM				99 600,00 Kč

CELKOVÁ CENA bez DPH 21% 498 000,00 Kč

Zpracoval:
Kateřina Kotěrová

Bank. spojení: č. účtu:
KB Ml. Boleslav 2519760267/0100

IČO DIČ
48952621 CZ 48952621

Cenová nabídka

Číslo: CN20250245

Dodavatel:

SEDOZSEDOZ DZ s.r.o.
Primátorská 296/38 180 00 Praha 8

IČ: 24218537

DIČ: CZ24218537

Korespondenční adresa:

Poděbradova 1751, 289 22 Lysá nad Labem

Odběratel:

M-SILNICE a.s. oblaštří závod JIH
Trabantská 290/31 19015 Praha 9 - Satalice

IČ:

DIČ:

Korespondenční adresa:

Datum vystavení dokladu: 26.03.2025

Cenová nabídka na pronájem dopravního značení pro realizaci stavby: Přesky - MÚK Kosmonosy: propojení silnice III/0164

Etapa 1 01.05.2025 - 30.06.2025 + Etapa 2 1.7.2025 - 31.8.2025

Název	Mn.	J.	Dny	Kč/J	Sleva %	slevě	Celkem	DPH%
A10 - světelné signály	2,00	ks	123	30,00	33,33	20,00	4920,25	21,00
A15 - práce	2,00	ks	123	20,00	33,33	13,33	3280,16	21,00
A6b - zúžení vozovka z jedné strany	2,00	ks	123	30,00	33,33	20,00	4920,25	21,00
B1 - zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech	2,00	ks	123	30,00	33,33	20,00	4920,25	21,00
C4b - přikázaný směr objezdění vlevo	1,00	ks	123	30,00	33,33	20,00	2460,12	21,00
E13 - text nebo symbol 500 x 150	3,00	ks	123	30,00	33,33	20,00	7380,37	21,00
IP22 - změna organizace dopravy	3,00	ks	123	60,00	33,33	40,00	14760,74	21,00
sada semaforů (2ks)	1,00	ks	123	2850,00	33,33	1900,10	233711,69	21,00
souprava 3 světél	1,00	ks	123	900,00	33,33	600,03	73803,69	21,00
Z4a - směr, deska se šikmými pruhy sklon vlevo	25,00	ks	123	30,00	33,33	20,00	61503,08	21,00
B24a - zákaz odbočení vpravo	1,00	ks	123	30,00	33,33	20,00	2460,12	21,00
Celkem :							414120,71	,- + DPH

Jednorázové položky

Název	Mn.	J.	Kč/J	Sleva %	slevě	Celkem	DPH%
doprava paušál	1,00	ks	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	21,00
demontáž	43,00	ks	50,00	0,00	50,00	2150,00	21,00
montáž	43,00	ks	50,00	0,00	50,00	2150,00	21,00
Celkem :						5800,00	,- + DPH

Etapa 2 01.05.2025 - 23.12.2025

Název	Mn.	J.	Dny	Kč/J	Sleva %	slevě	Celkem	DPH%
E13 - text nebo symbol 500 x 150	3,00	ks	237	15,00	33,33	10,00	7110,36	21,00
C4b - přikázaný směr objezdění vlevo	1,00	ks	237	30,00	33,33	20,00	4740,24	21,00
B24a - zákaz odbočení vpravo	1,00	ks	237	30,00	33,33	20,00	4740,24	21,00
B1 - zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech	2,00	ks	237	30,00	33,33	20,00	9480,47	21,00
A6b - zúžení vozovka z jedné strany	2,00	ks	237	30,00	33,33	20,00	9480,47	21,00
A15 - práce	2,00	ks	237	15,00	33,33	10,00	4740,24	21,00
A10 - světelné signály	2,00	ks	237	30,00	33,33	20,00	9480,47	21,00
Z4a - směr, deska se šikmými pruhy sklon vlevo	25,00	ks	237	30,00	33,33	20,00	118500,00	21,00
Celkem :							168272,48	,- + DPH

Jednorázové položky

Název	Mn.	J.	Kč/J	Sleva %	slevě	Celkem	DPH%
doprava paušál	1,00	ks	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	21,00
demontáž	38,00	ks	50,00	0,00	50,00	1900,00	21,00
montáž	38,00	ks	50,00	0,00	50,00	1900,00	21,00
Celkem :						5300,00	,- + DPH

DIO + DIR

Název	Mn.	J.	Kč/J	Cena po		Celkem	DPH%
				Sleva %	slevě		
zpracování DIO + zajištění DIR KOMPLET	1,00	ks	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	21,00
Celkem :						15000,00	,- + DPH

Celkem za dopravní značení

582393,19 ,+ + DPH

Celkem za ostatní služby

26100,00 ,+ + DPH

III V CENĚ PRONÁJMU JSOU ZAHRNUTY NÁKLADY NA VÝMĚNY BATERIE III

III V CENĚ PRONÁJMU JSOU ZAHRNUTY NÁKLADY NA PVC PODSTAVCE A JACKEL NOSIČE III

III V CENĚ PRONÁJMU JSOU ZAHRNUTY NÁKLADY NA VÝŘEZY TEXTŮ NA DOPRAVNÍ ZNAČKY III

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)	Razítko a podpis:
21.0	608493,19	127783,57	736276,76	
15.0	0,00	0,00		
Pořetou Převzat:				

Nabídka

M-Silnice



Název akce: III/0164 Píazy

Termín: 1.5.2025 - 31.8.2025

ETAPA 1 + ETAPA 2 - SO 102

Pronájem a údržba svíslého dopravního značení včetně sloupků, objímek a podstavce	Množství	M.J.	Cena za jednotku	počet dní	Celkem bez DPH
Základní DZ	20	ks	23,00	123	56 580,00
Zvětšená DZ	10	ks	30,00	123	36 900,00
Výstražné světlo S7x3 (souprava)	4	ks	120,00	123	59 040,00
Semaforová souprava 3 ks (včetně baterií)	2	ks	1 000,00	123	246 000,00
Z4, Z5	10	ks	5,00	123	6 150,00
Předpokládaný pronájem					404 670,00
DIO + vyřízení DIR (týká se vyřízení na všechny SO)	1	kpl	15 000,00		15 000,00
Montáž DZ	35	ks	110,00		3 850,00
Demontáž DZ	35	ks	110,00		3 850,00
Montáž výstražných světel	4	ks	500,00		2 000,00
Demontáž výstražných světel	4	ks	250,00		1 000,00
Montáž semaforů	2	ks	1 500,00		3 000,00
Demontáž semaforů	2	ks	1 000,00		2 000,00
Kontrola výstražných světel, výměna baterií	34	kpl	3 600,00		122 400,00
Doprava	8	kpl	4 000,00		32 000,00
Cena bez DPH					185 100,00

ETAPA 3: VÝJEZD VOZIDEL STAVBY


Pronájem a údržba svíslého dopravního značení včetně sloupků, objímek a podstavce	Množství	M.J.	Cena za jednotku	počet dní	Celkem bez DPH
Základní DZ	10	ks	23,00	237	54 510,00
Zvětšená DZ	2	ks	30,00	237	14 220,00
Předpokládaný pronájem					68 730,00
DIO + vyřízení DIR (týká se vyřízení na všechny SO)	0	kpl	15 000,00		0,00
Montáž DZ	12	ks	110,00		1 320,00
Demontáž DZ	12	ks	110,00		1 320,00
Kontrola výstražných světel, výměna baterií	17	kpl	3 600,00		61 200,00
Doprava	2	kpl	4 000,00		8 000,00
Cena bez DPH					71 840,00
Celková cena bez DPH 21%					730 340,00 Kč

Fakturovaná částka bude stanovena dle počtu dnů pronájmu včetně montáže, skutečně použitých DZ a jednotkové ceny.

Provedení dopravních značek bude odpovídat platné příloze vyhlášky MDS 294/2015Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních kom. a úprava provozu na pozemních kom., ČSN EN 12899-1a Vzorových listů staveb PK, část VL 6.1. Svíslé DZ Značení bude provedeno v souladu s TP 65 a TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích.

V Benešově dne 27.3.2025

Quo s.r.o., Středisko dopravního značení, Křížkova 2158, 256 01 Benešov



SROVNÁVACÍ TABULKA PRO ZBV č. 009 - SO 101, DIO

Zhotovitel **M - SILNICE a.s.** níže uvádí srovnání cenových nabídek uchazečů pro ZBV č. 009 – SO 101, DIO.

Tabulka uvádí pořadí uchazečů, původní nabídkové ceny uvedených v jednotlivých nabídkách, přepočtené ceny nabídek dle skutečného počtu dnů v dané etapě a ceny do ZBV.

Nabídka společnosti **JAZNAK spol. s r.o.** byla vybrána jako cenově nejvýhodnější z předložených nabídek.

Srovnávací tabulka - pouze pro objekt SO 101				
POŘADÍ	UCHAZEČ	NABÍDKOVÁ CENA (237 dnů)	Přepočtená cena (93 dnů)	Cena do ZBV
1	JAZNAK spol. s r.o.	99 600,00	47 040,00	54 096,00
2	Quo s.r.o.	140 570,00	61 200,00	70 380,00
3	SEDOZ DZ s.r.o.	173 572,49	71 330,00	82 029,50

Podrobné výpočty a výňatky z nabídek jednotlivých uchazečů jsou uvedeny na následujících listech.



SROVNÁVACÍ TABULKA PRO ZBV č. 009 - SO 101, DIO

Zhotovitel M – SILNICE a.s. vybral jako vítěznou nabídku nabídku společnosti **JAZNAK spol. s r.o.**

Pro doložení skutečných nákladů byla celková částka zhotovitelem ponížena podle skutečného počtu dnů pronájmu (93 dní namísto 237 dnů uvedených ve vítězné nabídce).

Zhotovitel níže dokládá postup výpočtu, na jehož základě byla stanovena výsledná částka. Změna ceny vyplývá výhradně z úpravy počtu dnů v dané etapě ve vítězné nabídce.

SO 101 - výpočet ponížené částky (vypracoval Zhotovitel)				
Pronájem DZ 25.06.2025-26.09.2025	počet	dny	cena/den	celkem
IP22		1 93	80,00	7 440,00
P4+C1		1 93	35,00	3 255,00
denní servis		2 93	125,00	23 250,00
Montáž v dílně		4 hod.	390,00	1 560,00
Montáž na místě		8 hod.	390,00	3 120,00
Demontáž		8	390,00	3 120,00
Doprava		67 km	20,00	1 330,00
Návrh+projednání DIO		1 x	3 500,00	3 500,00
Zakrytí DZ		4 ks	90,00	360,00
Aplikace textu IP22		1 ks	105,00	105,00
CELKEM				47 040,00

počet dní v etapě (upraven z původních 237 na 93)

Výsledná cena byla navýšena o 15%. Toto navýšení se skládá z:

5% výrobní režie

5% správní režie

5% zisk

Celková cena vč. navýšení: 54 096,00 Kč

Pro přehlednost Zhotovitel níže dokládá výňatek z vítězné cenové nabídky společnosti **JAZNAK spol. s r.o.**, v níž jsou uvedeny původní počty dnů v dané etapě – 237.

SO 101 - výňatek z výherní cenové nabídky společnosti JAZNAK spol. s r.o.

Pronájem DZ 1.5.-23.12.2025	počet	dny	cena/den	celkem
IP22	1	237	80,00 Kč	18 960,00 Kč
P4+C1	1	237	35,00 Kč	8 295,00 Kč
denní servis	2	237	125,00 Kč	59 250,00 Kč
Montáž v dílně	4	hod.	390,00 Kč	1 560,00 Kč
Montáž na místě	8	hod.	390,00 Kč	3 120,00 Kč
Demontáž	8	hod.	390,00 Kč	3 120,00 Kč
Doprava	67	km	20,00 Kč	1 330,00 Kč
Návrh+projednání DIO	1	x	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
Zakrytí DZ	4	ks	90,00 Kč	360,00 Kč
Aplikace textu IP22	1	ks	105,00 Kč	105,00 Kč
CELKEM				99 600,00 Kč

SROVNÁVACÍ TABULKA PRO ZBV č. 009 - SO 101, DIO

Zhotovitel M – SILNICE a.s. obdržel rovněž nabídku od společnosti **Quo s.r.o.**, která se v rámci hodnocení umístila na druhém místě.

Zhotovitel níže dokládá postup výpočtu, na jehož základě byla stanovena výsledná částka. Změna ceny vyplývá výhradně z úpravy počtu dnů v dané etapě.

SO 101 - výpočet ponížené částky (vypracoval Zhotovitel)					
Pronájem DZ 25.06.2025-26.09.2025	počet	J.	dny	cena/den	celkem
Základní DZ	10	ks	93	23,00	21 390,00
Zvětšená DZ	2	ks	93	30,00	5 580,00
DIO + vyřízení DIR	1	kpl		0,00	0,00
Montáž DZ	12	ks		110,00	1 320,00
Demontáž DZ	12	ks		110,00	1 320,00
Kontrola výstražných světel	17	kpl		3 600,00	61 200,00
Doprava	2	kpl		4 000,00	8 000,00
CELKEM					98 810,00

počet dní v etapě (upraven z
původních 237 na 93)

Výsledná cena byla navýšena o 15%. Toto navýšení se skládá z:

5% výrobní režie

5% správní režie

5% zisk

Celková cena vč. navýšení:

113 631,50 Kč

Pro přehlednost Zhotovitel níže dokládá výňatek z cenové nabídky společnosti **Quo s.r.o.**, v níž jsou uvedeny původní počty dnů v dané etapě – 237.

SO 101 - výňatek z cenové nabídky společnosti Quo s.r.o.					
ETAPA 3: VÝJEZD VOZIDEL STAVBY					
Pronájem a údržba svíslého dopravního značení včetně sloupků, objímk a podstavce	Množství	M.J.	Cena za jednotku	počet dní	Celkem bez DPH
Základní DZ	10	ks	23,00	237	54 510,00
Zvětšená DZ	2	ks	30,00	237	14 220,00
Předpokládaný pronájem					68 730,00
DIO + vyřízení DIR (týká se vyřízení na všechny SO)	0	kpl	15 000,00		0,00
Montáž DZ	12	ks	110,00		1 320,00
Demontáž DZ	12	ks	110,00		1 320,00
Kontrola výstražných světel, výměna baterií	17	kpl	3 600,00		61 200,00
Doprava	2	kpl	4 000,00		8 000,00
Cena bez DPH					71 840,00

Pozn.: Položka "kontrola výstražných světel" v nabídce QUO představuje pravidelný servis a kontrolu dopravně-inženýrského opatření (DIO). Jedná se pouze o nepřesně zvolený název položky.

SROVNÁVACÍ TABULKA PRO ZBV č. 009 - SO 101, DIO

Zhotovitel M – SILNICE a.s. obdržel rovněž nabídku od společnosti **SEDOZ DZ s.r.o.**, která se v rámci hodnocení umístila na třetím místě.

Zhotovitel níže dokládá postup výpočtu, na jehož základě byla stanovena výsledná částka. Změna ceny vyplývá výhradně z úpravy počtu dnů v dané etapě.

SO 101 - výpočet ponížené částky (vypracoval Zhotovitel)					
Pronájem DZ 25.06.2025-26.09.2025	počet	J.	dny	cena/den	celkem
E13 - text nebo symbol 500 x 150	3 ks		93	10,00	2 790,00
C4b - příkazový směr objíždění vlevo	1 ks		93	20,00	1 860,00
B24a - zákaz odbočení vpravo	1 ks		93	20,00	1 860,00
B1 - zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech	2 ks		93	20,00	3 720,00
A6b - zúžená vozovka z jedné strany	2 ks		93	20,00	3 720,00
A15 - práce	2		93	10,00	1 860,00
A10 - světelné signály	2 ks		93	20,00	3 720,00
Z4a - směr. deska se šikmými pruhy sklon vlevo	25 ks		93	20,00	46 500,00
doprava paušál	1 ks			1 500,00	1 500,00
demontáž	38 ks			50,00	1 900,00
montáž	38 ks			50,00	1 900,00
zpracování DIO+DIR komplet	1 ks			0,00	0,00
CELKEM					71 330,00

počet dní v etapě (upraven z
původních 237 na 93)

Výsledná cena byla navýšena o 15%. Toto navýšení se skládá z:

- 5% výrobní režie
- 5% správní režie
- 5% zisk

Celková cena vč. navýšení:

82 029,50 Kč

Pro přehlednost Zhotovitel níže dokládá výňatek z cenové nabídky společnosti **SEDOZ DZ s. r.o.**, v níž jsou uvedeny původní počty dnů v dané etapě – 237.

SO 101 - výňatek z cenové nabídky společnosti SEDOZ DZ s. r.o.

Etapa 2 01.06.2025 - 23.12.2025							
Název	Mn.	J.	Dny	Kč/J	Sleva % slevě	Celkem	DPH%
E13 - text nebo symbol 500 x 150	3,00	ks	237	15,00	33,33	10,00	7110,36 21,00
C4b - příkazový směr objíždění vlevo	1,00	ks	237	30,00	33,33	20,00	4740,24 21,00
B24a - zákaz odbočení vpravo	1,00	ks	237	30,00	33,33	20,00	4740,24 21,00
B1 - zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech	2,00	ks	237	30,00	33,33	20,00	9480,47 21,00
A6b - zúžená vozovka z jedné strany	2,00	ks	237	30,00	33,33	20,00	9480,47 21,00
A15 - práce	2,00	ks	237	15,00	33,33	10,00	4740,24 21,00
A10 - světelné signály	2,00	ks	237	30,00	33,33	20,00	9480,47 21,00
Z4a - směr. deska se šikmými pruhy sklon vlevo	25,00	ks	237	30,00	33,33	20,00	118500,00 21,00
Celkem :						166272,49	+ DPH
Jednorázové položky							
Název	Mn.	J.		Kč/J	Sleva % slevě	Celkem	DPH%
doprava paušál	1,00	ks		1500,00	0,00	1500,00	1500,00 21,00
demontáž	38,00	ks		50,00	0,00	50,00	1900,00 21,00
montáž	38,00	ks		50,00	0,00	50,00	1900,00 21,00
Celkem :						5300,00	+ DPH
