

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo



č. zhotovitele:

č. objednatele: CES2015/1017

I. Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Zastoupený: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 – 511/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních:
PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph. D., náměstek primátora
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Valentýn Avramov, vedoucí investičního odboru
Alena Knajflová, investiční technik, tel: 495 707 686
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: SPOLEČNOST M – SILNICE a SOVIS, OK U Koruny HK
Sídlem společnosti je sídlo ředitelství vedoucího společníka na adrese: M – SILNICE a.s.,
Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové
Vedoucí společník: M - SILNICE a.s.
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
jednající: 
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 
ID dat schránky: jwtq7ju
společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 430
Společník: SOVIS CZ a.s.
Se sídlem: Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové
jednající: 
IČ: 27532208
DIČ: CZ27532208
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v
oddíle B, vložka 2720

(dále jen zhotovitel)

I. Preambule dodatku č. 3

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo CES2015/1017, ze dne 07. 05. 2015, (dále pouze základní smlouva), jejímž předmětem je etapizace akce.

II. Důvod uzavření dodatku č. 3

Nezbytnost projednání nové etapizace výstavby díla se všemi subjekty dotčenými plánovanou stavební akcí, která oproti postupu předepsanému schválenou projektovou dokumentací vystihuje aktuální situaci v prostoru rekonstruované okružní křižovatky a jejím bezprostředním okolí a v návaznosti na výstavbu přilehlé stavby AU-PARKu.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 k uvedené smlouvě o dílo takto:

Původní článek IV. „**Doba plnění**“, odst. 1 smlouvy se doplňuje a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. III. této smlouvy ve lhůtách:
 - a) Dokončení II. etapy (z důvodu klimatických podmínek) 20. 03. 2016
 - b) Zahájení prací III. etapy: 21. 03. 2016
Dokončení a předání III. etapy: 31. 07. 2016
 - e) Dokončení a předání díla: nejpozději do 310 dní od zahájení prací I. etapy
 - termín dle SOD (310 dní od zahájení I. etapy) 05. 05. 2016
 - termín prodloužený o dny nevhodných klimatických podmínek 18.12.2015 - 28.1.2016 – celkem 42 dní 16. 06. 2016
 - termín prodloužený z důvodu koordinace a součinnosti prací se stavbou AU-PARK – celkem 45 dní 31. 07. 2016
 - dokončení a předání díla: 31. 07. 2016

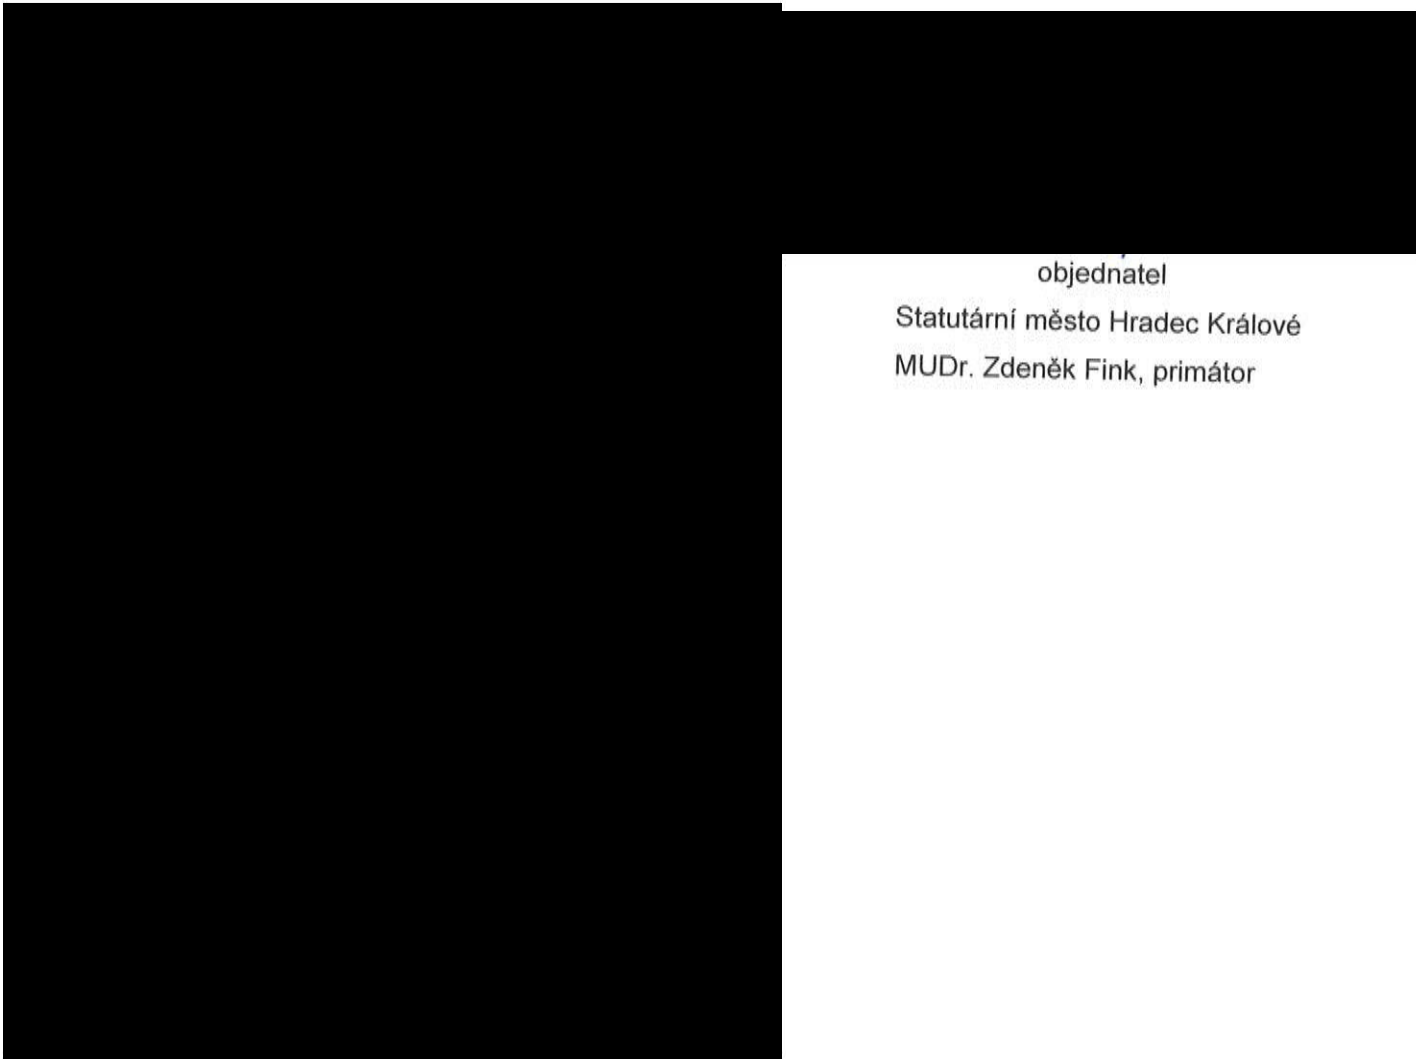
Pokud z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebude možné provádět práce v zimních měsících, prodlouží se doba plnění o dobu, kdy z důvodu klimatických podmínek nebylo možné práce realizovat.

III. Závěrečná ustanovení dodatku č. 3

1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo CES2015/1017 ze dne 07. 05. 2015 je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo CES2015/1017, ze dne 07. 05. 2015 a následných dodatků, nedotčena tímto dodatkem č.: 3 zůstávají v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne 20. 04. 2016



objednatel

Statutární město Hradec Králové

MUDr. Zdeněk Fink, primátor

A small, handwritten mark or signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page.
