

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

II/273 Střemy, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 191 - DIO

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

191 / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 48035599

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-224 500,00	760 157,06	535 657,06

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-224 500,00	760 157,06	535 657,06

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/273 Střemy, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 191 - DIO	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 191 / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1.3
--	--	--

Strany smlouvy o dílo S-1400/00066001/2023, zhotovitel: S24-058-0002 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne [12.5.2023] (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín,

<u>Přílohy Změnového listu:</u>			<u>Příjemce</u>	
1. Krycí list	1	počet listů	Objednatel	
2. Změnový list	2	počet listů	Zhotovitel	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	Projektant (AD)	
4. Rozpis ocenění Změn položek	4	počet listů	Stavební dozor	
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	Supervize	
6. Přehled dokladů	1	počet listů		
7. Soupis prací SO po všech změnách	4	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	23	počet listů		

Iniciátor Změny: Správce komunikace
Předmět Změny: Jiné vedení objízdných tras / změna rozsahu DIO

Název (dílčí) Změny: SO 191 - DIO/ změna vedení objízdných tras
Popis a zdůvodnění Změny:
Při projednávání DIO dle schématu ze zadávací dokumentace bylo správcem komunikace zamítnuto plánované vedení objízdné trasy (viz příloha č.09) a proto bylo DIO kompletně přepracováno dle požadavku a v návaznosti na zajištění souhlasného stanoviska Policie ČR - DI (příloha č. 10).
Toto odlišné vedení trasy objízdné trasy má za následek výrazné navýšení počtu dopravního značení.

Změna byla způsobena zjištěnými odchylkami od zadávací dokumentace, které nebylo možné předvídat, proto byla Změna zařazena do skupiny 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle článku 10 odst.10.1 bodu a) a odst.10.2 bodu a) Směrnice R-Sm-16 KSÚS SK v platném znění.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-224 500,00	760 157,06	535 657,06	984 657,06

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Milan Listopad podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Dávid Kuczik podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Michal Pietsch podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Miroslav Týnek podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, Dis. podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Tomáš Zdražila Ing. Milan Listopad podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	II/273 Střemy, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	191 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 191 - DIO

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
224 500,00

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	224 500,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-224 500,00	760 157,06	760 157,06	338,60%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-224 500,00	760 157,06	535 657,06	238,60%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

N13	916721	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DOD A MONTÁŽ	KUS	0,000	115,000	115,000	996,81	0,00	0,00	114 633,15	114 633,15	114 633,15	100,00%
		Položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x ZBV1: Dopravní značení dle schváleného schématu PÚP - viz příloha 15 celkem 47+20+48=115 ks patek dopravních značek zvětšené a složené (víceprvkové) značky á 2 patky / 1 sloupek											
N14	916729	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	22540,000	22540,000	3,00	0,00	0,00	67 620,00	67 620,00	67 620,00	100,00%
		Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití. ZBV1: Dopravní značení dle schváleného schématu PÚP - viz příloha 15 celkem 47+20+48=115 ks patek dopravních značek po dobu realizace díla: 28 týdnů zvětšené a složené (víceprvkové) značky á 2 patky / 1 sloupek											
N15	916723	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	115,000	115,000	25,81	0,00	0,00	2 968,15	2 968,15	2 968,15	100,00%
		Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x ZBV1: Dopravní značení dle schváleného schématu PÚP - viz příloha 15 celkem 47+20+48=115 ks patek dopravních značek po dobu realizace díla: 28 týdnů zvětšené a složené (víceprvkové) značky á 2 patky / 1 sloupek											
		Celkem						224 500,00	- 224 500,00	760 157,06	760 157,06	535 657,06	238,60%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Milan Listopad, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Michal Pietsch, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/273 Střemy, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	10 942 234,90
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	11 477 891,96
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	13 888 249,27
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	104,90%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	535 657,06
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	4,90%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 282 670,47

12=(1)*0,15	Limit	1 641 335,24
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/273 Střemy, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy	- 224 500,00	760 157,06	535 657,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 224 500,00	760 157,06	535 657,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.191	1	DIO/ změna vedení objízdných tras	- 224 500,00	760 157,06	535 657,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 224 500,00	760 157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	II/273 Střemy, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 191 - DIO
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	191 / 1

Doklad	počet listů
08 DIO - plánované ze ZD (2022-09)	6
09 Nesouhlasné stanovisko provozního cestmistra ze dne 10.4.2025	1
10 Přechodná úprava provozu / schálené DIO , MÚ Mělník ze dne 16.5.2025	7
11 Oznámení zhotovitele o změně ze dne 2.5.2025	2
12 Sdělení AD ze dne 3.5.2025	1
13 Stanovisko TDI ze dne 16.10.2025	1
14 Pokyn KSÚS ke změně díla ze dne 16.10.2025	1
15 Pomocná tabulka na výpočet dopravního značení a příslušenství	1
16 Stanovisko AD k předloženému ZBV ze dne 22.10.2025	1
17 Stanovisko TDI k předloženému ZBV ze dne 23.10.2025	2
Počet listů celkem	23

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/114 Dobříš, most ev.č. 114-017 Číslo a název SO/PS: SO 191 / DIO Číslo a název rozpočtu: SO 191 / DIO								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 191					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9 Ostatní konstrukce a práce													
1	99999	DIO - pronájem - kompletní dopravní opatření při stavbě - včetně návrhu a projednání dočasného dopravního značení s policií ČR a dopravním úřadem, včetně návrhu značení na objízdných trasách v dostatečném předstihu před zahájením stavby - kompletní provedení (dopravní značky, směrovací desky, výstražná světla, vodičí desky, vodorovné značky vč. Odstranění, atd.) - včetně nákladů na případné doplnění značení dle aktuálního požadavku Policie ČR - včetně případného doplnění značek IP22 (viz. vyjádření Policie ČR v dokladové části) - včetně případného zakrytí (ne pouze přeškrtnutí!) nebo demontáže dočasně zneplatněného značení, včetně zpětného odkrytí a montáže - včetně nákladů na přesuny dopravního značení dle jednotlivých fází výstavby, resp. dle potřeby - dopravní značení musí splňovat vnitropodnikové předpisy ŘSD PPK-PRE, PPK-FOL a TP 143 - položka je pouze se souhlasem objednatele! - bude fakturováno dle skutečnosti	KPL	1,000	0,000	-1,000	224 500,00	224 500,00	-224 500,00	0,00	0,00	-224 500,00	-100,00%
		ZBV 1 : Odečet kompletní položky z důvodu výrazně odlišného schématu DIO dle požadavku správce komunikace											
Nové položky OTSKP 2025-I													
N1	914142	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL TR RA3 - MONT S PŘESUNEM	KUS	0,000	75,000	75,000	389,77	0,00	0,00	29 232,75	29 232,75	29 232,75	100,00%
		Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky ZBV1: Dopravní značení dle schváleného schématu PÚP - viz příloha 15 celkem 75 ks dopravních značek základní velikosti											
N2	914149	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL TR RA3 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	14700,000	14700,000	9,98	0,00	0,00	146 706,00	146 706,00	146 706,00	100,00%
		Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití ZBV1: Dopravní značení dle schváleného schématu PÚP - viz příloha 15 celkem 75 ks základních značek po dobu realizace díla: 28 týdnů											
N3	914143	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL TR RA3 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	75,000	75,000	227,17	0,00	0,00	17 037,75	17 037,75	17 037,75	100,00%

		Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x ZBV1: Dopravní značení dle schváleného schématu PÚP - viz příloha 15 celkem 75 ks dopravních značek základní velikosti											
N4	914442	DOPR ZNAČKY 100X150CM OCEL TŘ RA3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	24,000	24,000	882,54	0,00	0,00	21 180,96	21 180,96	21 180,96	100,00%
		Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky ZBV1: Dopravní značení dle schváleného schématu PÚP - viz příloha 15 celkem 24 ks zvětšených dopravních značek											
N5	914449	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA3 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	4704,000	4704,000	30,86	0,00	0,00	145 165,44	145 165,44	145 165,44	100,00%
		Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití ZBV1: Dopravní značení dle schváleného schématu PÚP - viz příloha 15 celkem 24 ks zvětšených dopravních značek po dobu realizace díla: 28 týdnů											
N6	914443	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL TŘ RA3 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	24,000	24,000	453,07	0,00	0,00	10 873,68	10 873,68	10 873,68	100,00%
		Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x ZBV1: Dopravní značení dle schváleného schématu PÚP - viz příloha 15 celkem 24 ks zvětšených dopravních značek											
N7	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	107,000	107,000	317,77	0,00	0,00	34 001,39	34 001,39	34 001,39	100,00%
		Položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení ZBV1: Dopravní značení dle schváleného schématu PÚP - viz příloha 15 celkem 59+48=107 ks sloupků dopravních značek zvětšené značky á 2 sloupky / 1 DZ											
N8	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	20972,000	20972,000	6,28	0,00	0,00	131 704,16	131 704,16	131 704,16	100,00%

		Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití ZBV1: Dopravní značení dle schváleného schématu PÚP - viz příloha 15 celkem 59+48=107 ks sloupků dopravních značek po dobu realizace díla: 28 týdnů											
N9	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	0,000	107,000	107,000	227,17	0,00	0,00	24 307,19	24 307,19	24 307,19	100,00%
		Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x ZBV1: Dopravní značení dle schváleného schématu PÚP - viz příloha 15 celkem 59+48=107 ks sloupků dopravních značek zvětšené značky á 2 sloupky / 1 DZ											
N10	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TR RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	4,000	4,000	285,42	0,00	0,00	1 141,68	1 141,68	1 141,68	100,00%
		Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x ZBV1: Dopravní značení dle schváleného schématu PÚP - viz příloha 15 celkem 4 ks vodících dopravních značek											
N11	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	784,000	784,000	16,50	0,00	0,00	12 936,00	12 936,00	12 936,00	100,00%
		Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití. ZBV1: Dopravní značení dle schváleného schématu PÚP - viz příloha 15 celkem 4 ks vodících dopravních značek po dobu realizace díla: 28 týdnů											
N12	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TR RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	4,000	4,000	162,19	0,00	0,00	648,76	648,76	648,76	100,00%
		Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x ZBV1: Dopravní značení dle schváleného schématu PÚP - viz příloha 15 celkem 4 ks vodících dopravních značek											
N13	916721	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DOD A MONTÁŽ	KUS	0,000	115,000	115,000	996,81	0,00	0,00	114 633,15	114 633,15	114 633,15	100,00%

		Položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x ZBV1: Dopravní značení dle schváleného schématu PÚP - viz příloha 15 celkem 47+20+48=115 ks patek dopravních značek zvětšené a složené (víceprvkové) značky á 2 patky / 1 sloupek											
N14	916729	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	22540,000	22540,000	3,00	0,00	0,00	67 620,00	67 620,00	67 620,00	100,00%
		Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití. ZBV1: Dopravní značení dle schváleného schématu PÚP - viz příloha 15 celkem 47+20+48=115 ks patek dopravních značek po dobu realizace díla: 28 týdnů zvětšené a složené (víceprvkové) značky á 2 patky / 1 sloupek											
N15	916723	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	115,000	115,000	25,81	0,00	0,00	2 968,15	2 968,15	2 968,15	100,00%
		Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x ZBV1: Dopravní značení dle schváleného schématu PÚP - viz příloha 15 celkem 47+20+48=115 ks patek dopravních značek po dobu realizace díla: 28 týdnů zvětšené a složené (víceprvkové) značky á 2 patky / 1 sloupek											
		Celkem						224 500,00	- 224 500,00	760 157,06	760 157,06	535 657,06	238,60%

03	...		
02	...		
01	...		
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5
IČO: 000 660 01 DIČ: CZ000 660 01



ZHOTOVITEL

SPOLEČNOST BIM SAS4S ZASTOUPENA SPOLEČNÍKY:

SAGASTA s.r.o.

SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555



AFRY CZ s.r.o.

SÍDLO: MAGISTRŮ 1275/13, 140 00 PRAHA 4, MICHLE
IČ: 453 066 05 DIČ: CZ453 06 605



SATRA spol. s r.o.

SÍDLO: POD PEKÁRNAMI 878/2, 190 00 PRAHA 9
IČ: 185 842 09 DIČ: CZ185 842 09



4 roads s.r.o.

SÍDLO: SLUNNÁ 541/27, STŘEŠOVICE, 162 00 PRAHA 6
IČ: 063 273 54 DIČ: CZ063 273 54



SHB, akciová společnost

SÍDLO: MASNÁ 1493/8, MORAVSKÁ OSTRAVA, 702 00 OSTRAVA
IČ: 253 243 65 DIČ: CZ253 243 65



SAGASTA s.r.o. SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555						JTSK Bpv ČÍSLO SOUPRAVY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP				
OBSAH II/273 STŘEMY, MOST EV. Č. 273-005 PŘES PŮTOK PŘED OBCÍ STŘEMY - PD				ČÍSLO ZAKÁZKY 121 019 DOKUMENTACE PDPS MĚŘÍTKO - DATUM 09/2022 POČET FORMÁTŮ A4			
NÁZEV PŘÍLOHY SO 191 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ				ČÁST D		ČÍSLO PŘÍLOHY 2	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘŮVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.							



1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3
2	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	4
3	NÁVRH OBJÍZDNÝCH TRAS	4
4	PROVOZ LINKOVÝCH AUTOBUSŮ	5
5	CHODCI	5
6	DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENÍ	5
7	TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENÍ	5

**1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE****a) Údaje o stavbě**

Název stavby: II/273 Střemy, most ev. č. 273-005 přes potok před obcí
Střemy - PD
Katastrální území: Lhotka u Mělníka, Střemy
Obec: Lhotka
Kraj: Středočeský kraj
Označení pozemní
komunikace: II/273
Druh stavby: Rekonstrukce
Stupeň PD: Projektová dokumentace pro provádění stavby - PDPS

b) Údaje o stavebníkovi

Název investora: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Adresa: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
DIČ: CZ 00066001

c) Údaje o zpracovateli dokumentace**Společnost BIM SAS4S**

zastoupená společností:

SAGASTA s.r.o.	Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
AFRY CZ s.r.o.	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
SATRA, spol. s r.o.	Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9
4roads s.r.o.	Slunná 541/27, 162 00 Praha 6
SHB, akciová společnost	Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

Zpracovatel části dokumentace:

Název: Sagasta s.r.o.
Adresa: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČ: 04598555
DIČ: CZ04598555

Hlavní inženýr projektu: Ing. Dávid Kuczik

Odpovědný projektant
objektu: Ing. Dávid Kuczik

Pozemní komunikace: II/273



2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Při přestavbě mostu ev. č. 273-005 dojde po dobu přibližně 28 týdnů k uzavření komunikace II/273 před a za mostem. To znamená, že bude přerušeno dopravní spojení po této komunikaci v obci Lhotka u Mělníka směrem na Střemy i Mělník.

Provizorní trasa pro pěší není navržena s ohledem na situování mostu na samém okraji obce.

Provoz vozidel automobilové dopravy bude odkloněn na objízdnou trasu.

V dopravně inženýrských opatřeních (DIO) je navržena objízdná trasa, dopravní značení a další doporučená opatření potřebná pro občany a řidiče po dobu uzavírky mostu.

Podkladem pro návrh DIO byl průzkum objízdných tras a jejich současného dopravního značení.

2.1 Návaznost na předchozí stupně PD

Projekt navazuje dokumentaci pro společné povolení z roku 2021. Hlavním účelem projektu je řešení havarijního stavu mostu.

2.2 Územní podmínky

Most se nachází v intravilánu obce Lhotka (u Mělníka), na samém okraji obce. Na mostě není chodník ani na ní žádný chodník před a za mostem nezasahuje. Terén v okolí mostu je rovinatý, koryto potoka vede kolmo pod objektem. Kolem mostu se nachází obytný dom a garáž v obci. Po severní straně se most nachází

V celé své šířce je na mostě živíčná vozovka.

Komunikace procházející na mostě je II/273. Silnice je vedena na mostě v přímé a následně přechází do oblouku levostranného oblouku. Úprava komunikace spočívá v obnově vozovkového souvrství do původního výškového i směrového vedení tak, aby bylo možno navázat na stávající stav.

V místě stavby se nenachází žádné inženýrské sítě.

Stavba se nachází na okraji chráněného území - Natura 2000, oblast Kokořínsko, velkoplošné ZCHÚ Kokořínsko-Máchův kraj a maloplošné ZCHÚ Kokořínský důl. Dále stavba zasahuje do vodního toku. S ohledem na tyto skutečnosti je nutné v průběhu stavebních prací dbát zvýšené pozornosti, aby nedocházelo k znečištění dotčených chráněných území a bude nutné dodržet závazné požadavky Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a AOPK ČR. Dále je nutné dodržet veškeré požadavky správce vodního toku – Povodí Ohře s.p.

2.3 Objekty stavby a vztah k území

Související SO

SO 001 Demolice a bourací práce

SO 201 Most ev.č. 273-005

3 NÁVRH OBJÍZDNÝCH TRAS

Objízdná trasa je navržena po komunikacích II/273, III/25931 a III/27314 po trase Lhotka u Mělníka – Hledsebe – Jeníčov – Střemy a zpátky. Vymezení tras bude pomocí provizorních dopravních značek – směrových tabulí IS11b. Změna místní úpravy před důležitými křižovatkami bude označena pomocí DZ IP22 „SILNICE II/273 SMĚR STŘEMY. (v opačném směru LHOTKA) UZAVŘENA - OPRAVA MOSTU“ a dále pomocí značky IS11a s údajem délky objízdné trasy. Na uzavřený úsek bude upozorněno taktéž značkou „slepá pozemní komunikace“ - IP10a s dodatkovou tabulkou E3a s údajem vzdálenosti. Silniční uzávěra bude provedena ve směru od obce Střemy zhruba ve vzdálenosti 50 m od mostu a ve směru od Lhotky ve vzdálenosti 30 m



od mostu pomocí zábrany Z2, zákazové značky „zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)“ – B1 s dodatkovou tabulkou „Mimo vozidel stavby“ – E13. Před silniční uzávěrou budou umístěny značky snižující maximální povolenou rychlost B20a nejprve na 30 km/h.

Uvedená objíždňá trasa je určena pro všechna vozidla v obou směrech.

4 PROVOZ LINKOVÝCH AUTOBUSŮ

Uzavírka mostu ev.č. 273-005 neovlivní trasy autobusů, případně budou využívat objíždňé trasy nebo jiné trasy dle upraveného jízdního řádu autobusové společnosti. S ohledem na tuto skutečnost budou dotčené autobusové společnosti informovány investorem o termínu zahájení stavby v dostatečném předstihu.

5 CHODCI

Vzhledem k situování uzavírky na samém okraji obce a ke skutečnosti že na most nenavazují žádné chodníky, tak pohyb chodců bude omezen a v rámci stavby se nepočítá s provedením provizorní lávky.

6 DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENÍ

Na několika křižovatkách bude potřeba nasměrovat vozidla jedoucí do uzavřeného úseku na objíždňou trasu. Neplatné směry na směrových případně návěstních tabulích budou zakryty lepicí páskou.

Přechodné dopravní značky budou pokud možno umístěny na sloupcích stávajících značek. V místech, kde tato možnost nebude, budou osazeny sloupky nové nebo budou použity sloupky osazené do podkladní desky.

Přechodné dopravní značky budou v základní velikosti se světelně technickými vlastnostmi třídy I podle ČSN 018020.

Provedení značek z hlediska přesnosti a hodnoty součinitele jasu musí odpovídat ČSN 018020 (dle příslušných tabulek).

Umístění dopravních značek ve výkresové dokumentaci je schematické. Osazení je třeba provést dle TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na PK po konzultaci s dopravním inženýrem Policie ČR. DIO by měla realizovat odborná firma zabývající se dopravním značením.

Po ukončení stavby budou dočasné dopravní značky odstraněny a trvalé dopravní značení bude uvedeno do projektovaného stavu.

Detailní řešení jednotlivých křižovatek bude součástí dokumentace RDS a zhotovitel stavby provede v dostatečném předstihu řádně projednání s dotčeným dopravním inspektorátem Policie ČR.

7 TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENÍ

Trvalé dopravní značení související s přestavbou mostu bude provedeno v následujícím rozsahu:



- na mostě bude umístěna evidenční tabulka mostu
- na mostě a v přilehlém úseku bude provedeno vodorovné značení – V04
- za mostem bude osazena tabule IZ4a a IZ4b označující začátek a konec obce

Materiál a způsob provedení vodorovného značení bude v souladu s příslušnými technickými předpisy.

Praha, září 2022

Vypracoval: Ing. Dávid Kuczik

CELKOVÁ SITUACE OBJÍZDNÉ TRASY

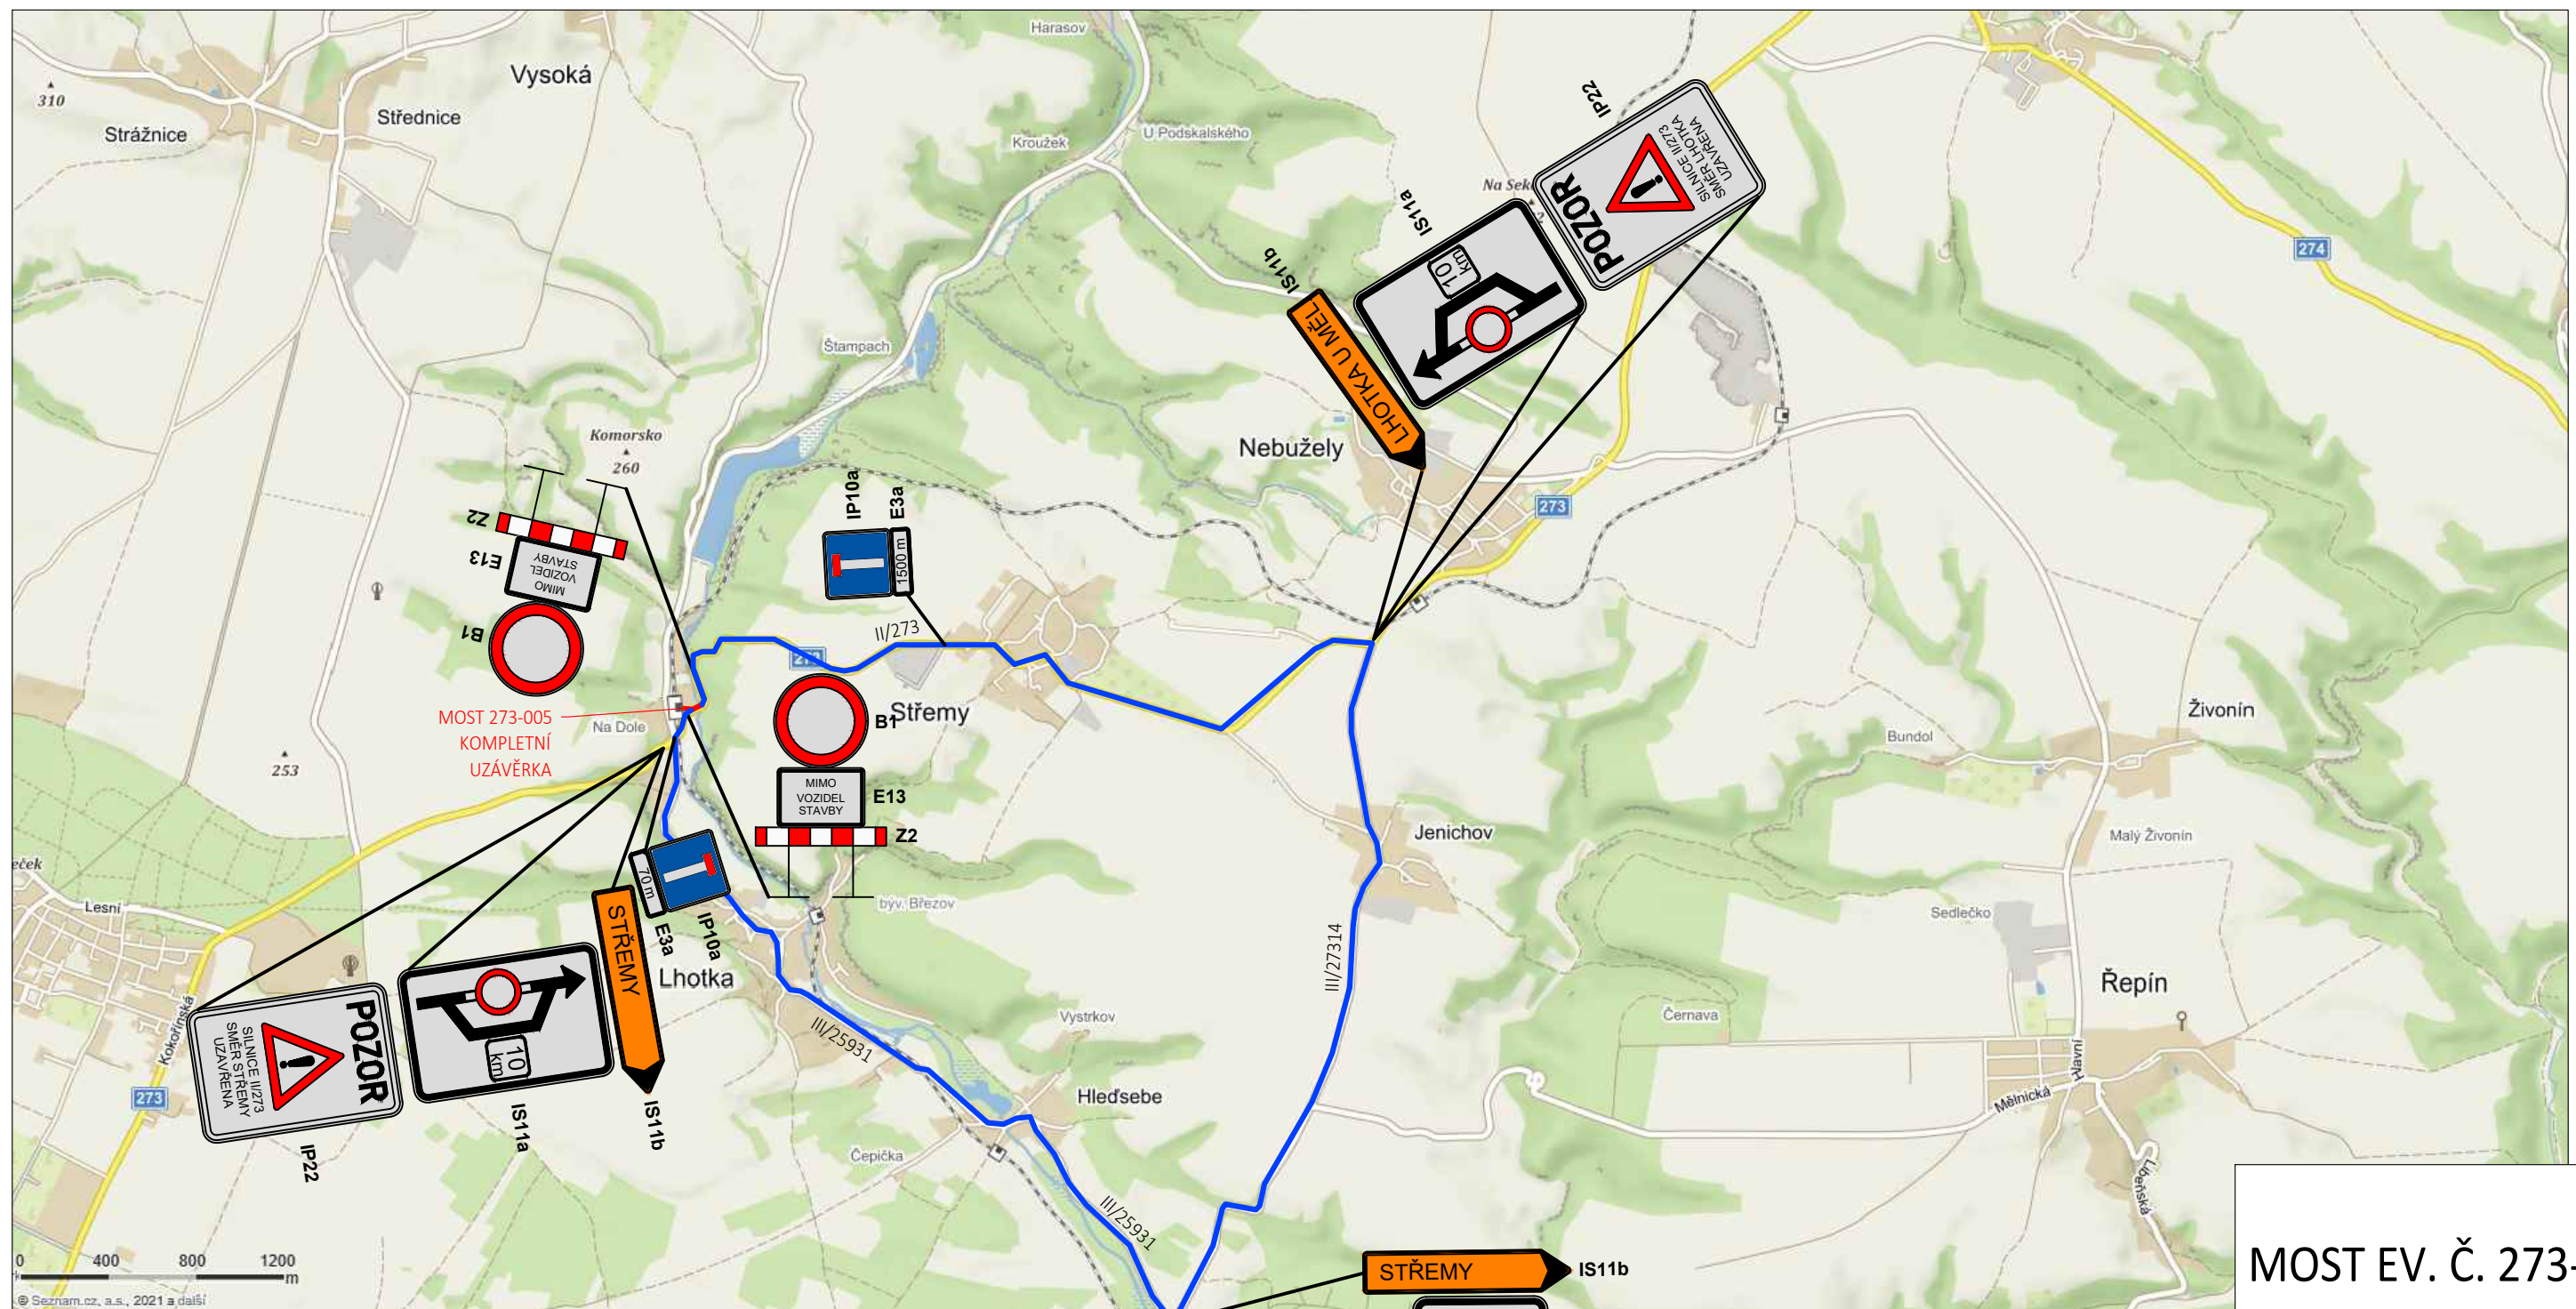

MOST EV. Č. 273-005

J.i.P Dopravní značení, s.r.o.
Hlavní 13
250 67 Větrušice

Náš značka
č. ev.:2952/25

Vyřizuje
Milan Šimůnek

Tel. číslo e-mail

Praha
10.4.2025

Věc: „ Uzavírku mostu ev.č. 273-005 Střemy – nesouhlas s objízdnou trasou“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce silnic II. a III. tříd na území Středočeského kraje a zástupce Středočeského kraje v rozsahu oprávnění vyplývajícího ze Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., v platném znění, nesouhlasí s původně navrženou objízdnou trasou dle DUSP přes obce Hleďsebe a Jenichov po komunikaci III/25931 a III/27314.

S Vámi navrhovanou trasou nesouhlasíme z důvodu zhoršení stavebně technického stavu komunikace III/27314 po zimním období, na což dne 09.04.2025 také upozornil silniční právní úřad Mělník. Z důvodu nevyhovujícího stavu, šířkového uspořádání a BESIP tato komunikace není vhodná po převedení dopravy ze silnice vyšší kategorie. Převedení dopravy není vhodné i s ohledem na další nárůst intenzit dopravy (především TNV) na komunikaci II/273 směr Střemy – Mšeno – Mladá Boleslav.

Z výše uvedených důvodů požadujeme vést objízdnou trasu po silnicích č. I/16, III/ 25923, č. II/259 a II/273 přes obce Byšice, Bezno a Mšeno zpět na Střemy.

S pozdravem

Milan Šimůnek, provozní cestmistr CMS Mělník

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
IČ: 00066001
150 21 Praha
DIČ: CZ00066001

Odbor dopravních agend a přestupků

Spis. zn.: MUME-36601/DAP/25
Naše č.j.: MUME-37137/DAP/25/VAKO
Vyřizuje: 
T:
E:
Mělník: 16.05.2025

SWIETELSKY stavební s.r.o.
závod dopravní stavby STŘED
Žižkova 150
261 01 Příbram IX – Nová Hospoda
IČ: 48035599

Příloha: DIO

K vyvěšení:
Městský úřad Mělník, Mšeno,
Obecní úřad Lhotka, Střemy, Nebužely, Stránka, Mělnické Vtelno, Byšice, Liblice

V e ř e j n á v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Městský úřad Mělník, odbor dopravních agend a přestupků (dále jen „správní orgán“), jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po předchozím písemném vyjádření Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, dopravního inspektorátu Mělník (dále jen „Policie ČR DI Mělník“) pod č.j. KRPS-122908/ČJ-2025-010606 ze dne 12.05.2025 v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) posoudil žádost ze dne 13.05.2025 podanou spol.:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
závod dopravní stavby STŘED
Žižkova 150
261 01 Příbram IX – Nová Hospoda
IČ: 48035599

v zastoupení
J.i.P. dopravní značení s.r.o.
Hlavní 13
250 67 Větrušice
IČ: 25762001
(„dále jen žadatel“)

ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Mladoboleslavská, Blatecká, Mělník, a na silnici č. II/273, 274, 259 a č. III/2734, 2736, 25931, 2733, 27314, 27316, 27317, 27319 v rámci ORP Mělník z důvodu opravy mostu 273-005 na silnici č. II/273 Mělník – Střemy na hranici katastrálních území Lhotka u Mělníka a Střemy, okr. Mělník.

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

1. Druh úpravy: přechodná pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu z důvodu opravy mostu 273-005 na silnici č. II/273 Mělník – Střemy na hranici katastrálních území Lhotka u Mělníka a Střemy, okr. Mělník v úseku dle Policií ČR schváleného DIO.
2. DZ na komunikaci: na místní komunikaci v ul. Mladoboleslavská, Blatecká, Mělník, a na silnici č. II/273, 274, 259 a č. III/2734, 2736, 25931, 2733, 27314, 27316, 27317, 27319 v rámci ORP Mělník
3. Provedení: svislé přenosné dopravní značky schváleného typu, retroreflexní provedení, základní rozměrová řada – dle ČSN EN 12899-1, v souladu s grafickým návrhem DIO včetně rozmístění.
4. Termín osazení dopravního značení: **19.05.2025 – 31.10.2025**
5. Za instalaci a provedení dopravního značení je zodpovědný p. Petr Havlíček, tel. 777 327 311.

Stanovení je vydáno za těchto podmínek:

- a) Výše uvedené dopravní značení bude užito v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích a umístěno v souladu s TP 65 a TP 66, dle přiloženého grafického návrhu DIO, který je přílohou tohoto stanovení.
- b) Stávající dopravní značení, které není v souladu s přechodným značením, bude zakryto nebo odstraněno.
- c) Dopravní značky budou osazeny na červenobíle pruhované sloupky, spodní strana značky je min. 60 cm nad vozovkou a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa. Dále budou zajištěny proti posunutí, otočení a pádu vlivem provozu nebo povětrnostních podmínek.
- d) V průběhu akce bude prováděna pravidelná kontrola úplnosti a správnosti značení. V případě zničení nebo zcizení bude neprodleně zajištěna obnova dopravního značení.
- e) Přechodná úprava bude instalována pouze po dobu nezbytně nutnou pro daný účel a poté, co její umístění ztratí své opodstatnění, musí být ihned odstraněno nejpozději však s ukončením platné uzavírky. Zakryté nebo odstraněné značky budou vráceny do původního stavu.
- f) Městský úřad Mělník, odbor dopravních agend a přestupků, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.
- g) Orgány Policie mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajišťujících bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, které budou žadatelem dodrženy.
- h) Budou dodrženy podmínky Policie ČR DI Mělník pod č.j. KRPS-122908/ČJ-2025-010606 ze dne 12.05.2025.

Provedení a umístění: v souladu se zákonem o silničním provozu, vyhláškou č. 294/2015 Sb., TP 65,66 a ČSN 12899-1.

Odůvodnění

Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Související dokumentace dopravního značení je k dispozici k nahlédnutí na zdejším úřadě.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek v souladu s § 173 odst. 2 správního řádu.

Mgr. Josef Daniška
vedoucí odboru dopravních agend a přestupků

Doručuje se:

- SWIETELSKY stavební s.r.o., závod Dopravní stavby STŘED, Žižkova 150, 261 01 Příbram IX – Nová Hospoda, IČ: 48035599 v zastoupení J.i.P. dopravní značení s.r.o., Hlavní 13, 250 67 Větrušice, IČ: 25762001
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Praha, Brankovická 337, 280 02 Kolín V, IČ: 65993390
- Městský úřad Mělník **(k vyvěšení)**
- Městský úřad Mšeno, náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno, IČ: 00237078 **(k vyvěšení)**
- Obec Lhotka, Lhotka 55, 277 31 Lhotka, IČ: 00662275 **(k vyvěšení)**
- Obec Střemy, Střemy 27, 277 34 Nebužely, IČ: 00237213 **(k vyvěšení)**
- Obec Nebužely, Nebužely 14, 277 34 Nebužely, IČ: 00237086 **(k vyvěšení)**
- Obec Stránka, Stránka 70, 277 35 Mšeno, IČ: 00662216 **(k vyvěšení)**
- Obec Mělnické Vtelno, Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno, IČ: 00237060 **(k vyvěšení)**
- Obec Byšice, Tyršovo náměstí 153, 277 32 Byšice, IČ: 00236756 **(k vyvěšení)**
- Obec Liblice, Liblice 57, 277 32 Byšice, IČ: 00510548 **(k vyvěšení)**
- Policie ČR DI Mělník
- Statutární město Mladá Boleslav, Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav 1, IČ: 00238295

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Mělník, Mšeno a Obecního úřadu Lhotka, Střemy, Nebužely, Stránka, Mělnické Vtelno, Byšice a Liblice.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku do datové schránky města Mělník, IDDS:
hqjb2kg

Vyvěšeno dne:..... sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Průběh 1. et. J.Ř.P. - 21.09.2025 - 07.06.06

Průběh 1. et. 6



J.I.P. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ s.r.o.
Jankovcova 22
170 00 Praha 7

Vypracoval: Petr Havlíček
Rekonstrukce mostu 273-000 Střemy

pracováno: 2. 5. 2025
ŠOIV do 1. 6. 2025



POLICE ČESKÉ REPUBLIKY

STŘE
STŘE
STŘE



J.I.P. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ s.r.o.
Jankovcova 22
170 00 Praha 7


Vypracoval: Petr Havlíček
Rekonstrukce mostu 273-000 Střemy

pracováno: 2. 5. 2025
bliží ŠOIV



POLICE ČESKÉ REPUBLIKY


STŘE
STŘE
STŘE

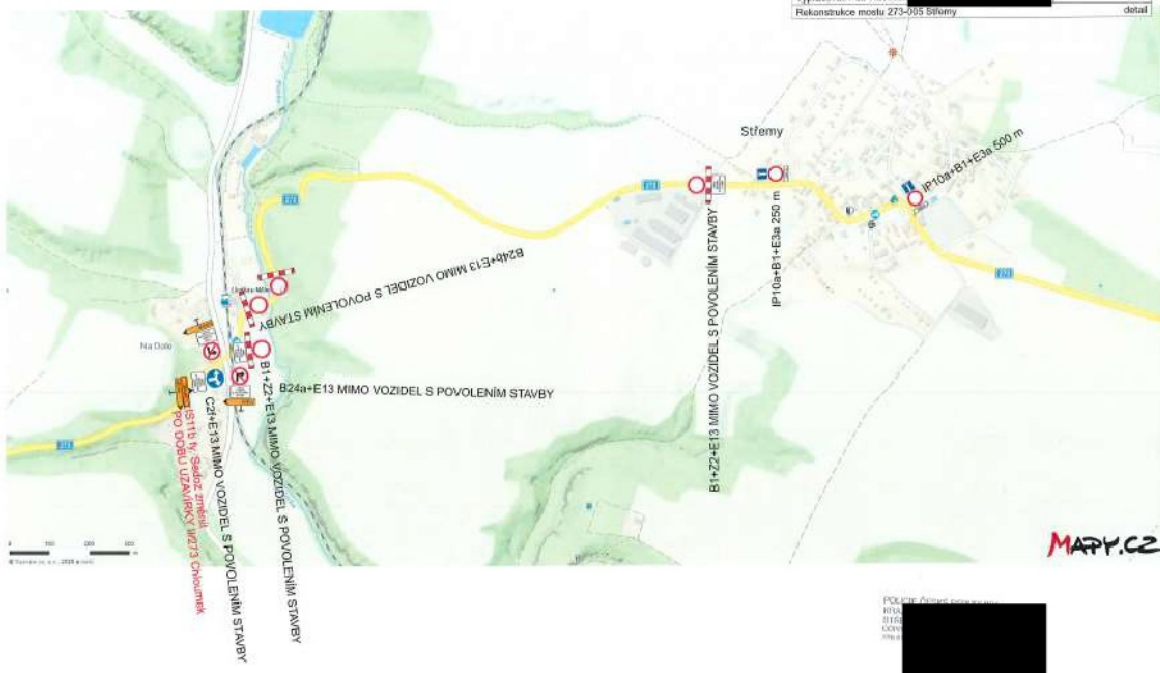




J.I.P. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ s.r.o.
Janáčkova 22

Vypracoval: Petr Havlíček
Rekonstrukce mostu 273-005 Střemylhotka
Zpracováno: 2. 9. 2025
SDV od 1. 6. 2025

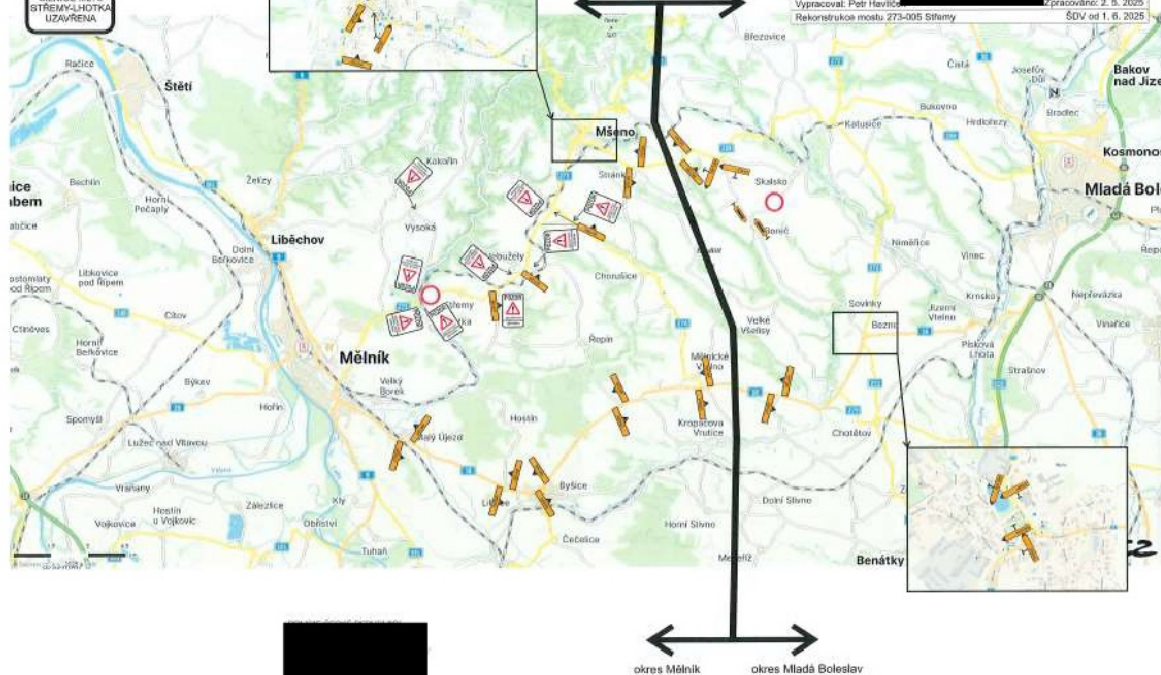

Střemylhotka, odštěpení BUS: B28+E13 s textem „termín MIMO BUS“

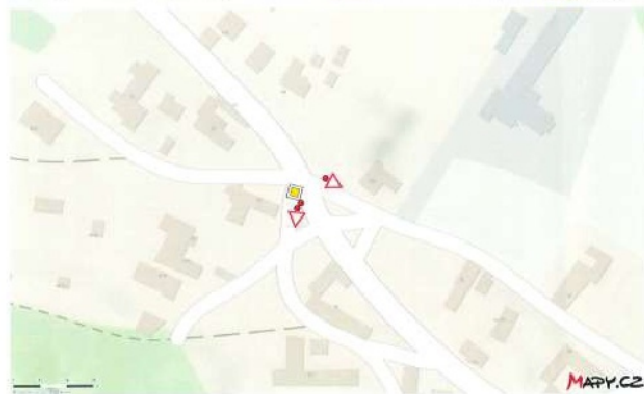

Lhotka, odštěpení BUS: 2x P4 a 1x P2 přesun z pevného sloupu na přenosné značení

„handbýrení, pracovníci“

SDV od 1. 6. 2025



**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001

SWIETELSKY stavební s.r.o.
závod DS STŘED
Oblast Příbram
Žižkova 150

K rukám: Miroslav Týnek

Váš dopis zn. / ze dne: Naše značka
0508-10-2102_D01 Vyřizuje:
Ing. Milan Listopad

M:

Datum:
02.05.2025

Oznámení nároku zhotovitele č.1

Vážený pane,

chtěl bych touto cestou oznámit zjištěné odchylky od zadávací dokumentace, které byly zastiženy při realizaci „II/273 Střemy, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy“.

Při projednávání dopravně inženýrských opatření souvisejících s realizací výše uvedené stavby byl vznesen požadavek na jiné vedení objízdných tras provozním cestmistrem a tím i na rozdílné osazení dopravního značení.

V příloze přiložen písemný požadavek, respektive nesouhlas s původním vedením objízdné trasy dle zadávací dokumentace a rozdílový soupis.

Odhadovaný finanční dopad je vyčíslen na cca 536 tis Kč, což je cca 5 % hodnoty zakázky.

Díky nasazení zhotovitele (personálnímu i technickému) zjištěná odchylka nebude mít dopad do délky realizace/ dokončení díla.

Předem děkuji za potvrzení a vydání pokynu pro zpracování ZBV a tím i přesné vyčíslení pro dodatek / ZBV smlouvy o dílo po dokončení realizace dotčených položek SO.

S pozdravem

Ing. Milan Listopad
Ředitel oblasti
SWIETELSKY stavební

Příloha: Dopis s nesouhlasem MS Mělník

Kopie:

J.i.P Dopravní značení, s.r.o.
Hlavní 13
250 67 Větrušice

Náš značka
č. ev.:2952/25

Vyřizuje
Milan Šimůnek

Tel. číslo e-mail

Praha
10.4.2025

Věc: „ Uzavírku mostu ev.č. 273-005 Střemy – nesouhlas s objízdnou trasou“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce silnic II. a III. tříd na území Středočeského kraje a zástupce Středočeského kraje v rozsahu oprávnění vyplývajícího ze Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., v platném znění, nesouhlasí s původně navrženou objízdnou trasou dle DUSP přes obce Hleďsebe a Jenichov po komunikaci III/25931 a III/27314.

S Vámi navrhovanou trasou nesouhlasíme z důvodu zhoršení stavebně technického stavu komunikace III/27314 po zimním období, na což dne 09.04.2025 také upozornil silniční právní úřad Mělník. Z důvodu nevyhovujícího stavu, šířkového uspořádání a BESIP tato komunikace není vhodná po převedení dopravy ze silnice vyšší kategorie. Převedení dopravy není vhodné i s ohledem na další nárůst intenzit dopravy (především TNV) na komunikaci II/273 směr Střemy – Mšeno – Mladá Boleslav.

Z výše uvedených důvodů požadujeme vést objízdnou trasu po silnicích č. I/16, III/ 25923, č. II/259 a II/273 přes obce Byšice, Bezno a Mšeno zpět na Střemy.

S pozdravem

Milan Šimůnek, provozní cestmistr CMS Mělník

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO: 00066001

150 21 P
DIČ: CZ000

NAŠE ZNAČKA: 121019-SAG-AD-000

VYŘIZUJE: Ing. Dávid Kuczik

TEL.:

E-MAIL:

MÍSTO / DATUM: Praha / 03. května 2025

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace**Zborovská 11
Praha 5**II/273, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy**
Sdělení AD č.000 – k oznámení zhotovitele č.1

AD obdržel dne 2.5.2025 od zástupce investora stavby oznámení od zhotovitele stavby č. 1.

Obsahem je oznámení nutnosti provedení objízdné trasy včetně příslušných dopravních značení v jiném rozsahu, než bylo v rámci projektu PDPS navrhováno. Návrh objízdných tras v rámci PDPS vycházel z projednané a schválené dokumentace DUSP, na které bylo vydáno právoplatné společné povolení stavby.

Návrh na změnu objízdné trasy vyplynul z dodatečného požadavku Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

AD s navrhovanou změnou v rámci oznámení zhotovitele č. 1 souhlasí.Sagasta s.r.o. Novodvorská 1010/14
DIČ: CZ04598555 142 00 Praha 4.....
Ing. Dávid Kuczik
Autorský dozor



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o

Zborovská 11

Č.j.:OZN č .1

Vyřizuje/kontakt

Praha
16.10.2025

Stavba: II/273, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy
Věc: Oznámení Zhotovitele o zjištění nezbytných prací k provedení díla č.j. SMLD-0402/00066001/2025 z 27.3.2025.

S předloženým Oznámením Zhotovitele o zjištění nezbytných prací k provedení díla č.j. SMLD-0402/00066001/2025 z 27.3.2025. v rámci stavby „II/273, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy“, **souhlasím.**

Toto Oznámení vyjadřuje :

Obsahem je oznámení nutnosti provedení objízdné trasy včetně příslušných dopravních značení v jiném rozsahu, než bylo v rámci projektu PDPS navrhováno. Návrh objízdných tras v rámci PDPS vycházel z projednané a schválené dokumentace DUSP, na které bylo vydáno právoplatné společné povolení stavby. Návrh na změnu objízdné trasy vyplynul z dodatečného požadavku Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

Tuto skutečnost nemohl zhotovitel při podávání nabídky předpokládat a její provedení je pro zdámé dokončení akce nezbytné.

Doporučuji Objednateli vyhotovení Pokynu k provedení a k vyzvání Zhotovitele k předložení ZBV.

S pozdravem



Ing. Michal Pietsch

SHP TS s. r. o.

Šumavská 33, 602 00 Brno, tel.: +420 549 133 405, fax: +420 549 133 406, e-mail: ts@shp.eu, www.shpts.eu
IČ: 28342771, DIČ: CZ 28342771, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 210228101/2700
Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice

**Pokyn Objednatele k provedení změny během výstavby Díla „ II/273 Střemy ,
most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy “**

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S - 0402/00066001/2025 ze dne 1.4. 2025, odst 6.7 a předložené oznámení zhotovitele žádáme o tyto změny v rozsahu díla :

1. Objízdná trasa nebude vedena po původně navržených komunikacích dle PDPS, tedy sil. III/25931 a III/27314 přes obce Hleďsebe a Jenichov , ale po silnicích č. I/16, III/ 25923, č. II/259 a II/273 přes obce Byšice, Bezno a Mšeno zpět na Střemy.

Zdůvodnění požadavku:

1/ Po zimním období 2024/2025 došlo k prudkému zhoršení stavebně technického stavu komunikace III/27314 (viz vyjádření cstm. KSÚS) , po které měla vést původně navržená objízdná trasa . Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce silnic II. a III. tříd na území Středočeského kraje proto nesouhlasila s původně navrženou objízdou trasou dle PDPS přes obce Hleďsebe a Jenichov po komunikaci III/25931 a III/27314 a požaduje vést objízdou trasu po silnicích č. I/16, III/ 25923, č. II/259 a II/273 přes obce Byšice, Bezno a Mšeno zpět na Střemy.

Zhotovitel sděluje , že tato změna bude mít vliv na celkovou cenu díla .

Zhotovitel zpracuje Změnové listy dle SOD – odstavce 6.7. a v souladu se Směrnicí R-SM-36, v jejím aktuálním znění. Obsah a vyčíslení změn bude ještě předmětem kontroly a supervize ze strany technického dozoru Objednatele a externí organizace, která provádí kontrolu změn v průběhu zpracování změnových listů stavby.

Na základě výše uvedených skutečností souhlasíme s navrhovaným technickým řešením a se zpracováním ZBV dle smlouvy o dílo. Financování změnových položek (fakturace) bude probíhat na základě rozdílového soupisu prací odsouhlaseného technickým dozorem a Objednatelem, nejdříve však po uveřejnění ZBV v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 11, Praha 5
IČO: 00066001

Miroslav Týnek

Provozní manažer úseku mosty

II/273 Střemy, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy

Rozpis dopravních značek - DIO z výkresů schváleného přechodného dopravního značení - MÚ Mělník, 16.5.2025

	Výkres 1	Výkres 2	Výkres 3	Výkres 4	Výkres 5	Výkres 6	Výkres 7	celkem
DZ - základní	1	18	7	3	24	15	7	75
Sloupek á 1ks / DZ	1	8	3	3	24	15	5	59
patka á 1ks / DZ	1	0	1	3	24	15	3	47
patka á 2ks / DZ	0	16	2	0	0	0	2	20

DZ - zvětšená	9	0	0	5	10	0	0	24
Sloupek á 2ks / DZ	18	0	0	10	20	0	0	48
patka á 2ks / DZ	18	0	0	10	20	0	0	48

DZ - vodící Z2	0	4	0	0	0	0	0	4
Sloupek á 1ks / DZ	0	0	0	0	0	0	0	0
patka á 1ks / DZ	0	0	0	0	0	0	0	0



NAŠE ZNAČKA: 121019-SAG-AD-003

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

MÍSTO / DATUM: Praha / 22. října 2025

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace**

Zborovská 11
Praha 5

II/273, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy **Sdělení AD č.003 – k ZBV č.1**

AD obdržel dne 22.10.2025 od zhotovitele stavby návrh ZBV č. 1 pro změnu DIO během stavby.

Změna byla vyvolaná nutností provedení objízdné trasy včetně příslušných dopravních značení na základě dodatečného požadavku Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Z tohoto důvodu nemohlo být DIO provedeno dle zadávací dokumentace.

AD s navrhovanou změnou ZBV č. 1 souhlasí.



Sagasta s.r.o.

DIČ: CZ04598555

Novodvorská 1010/14

142 00 Praha 4

-1-

Ing. Dávid Kuczik
Autorský dozor



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o

Zborovská 11

Č.j.:ZBV č. 1

Vyřizuje/kontakt

Praha
23. 10. 2025

Stavba: II/273, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy
Věc: Stanovisko TDS k ZBV č.1

Popis a zdůvodnění změny :

Změnu DIO během stavby.

Změna byla vyvolaná nutností provedení objízdny trasy včetně příslušných dopravních značení na základě dodatečného požadavku Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Z tohoto důvodu nemohlo být DIO provedeno dle zadávací dokumentace.

Toto odlišné vedení objízdny trasy má za následek výrazné navýšení počtu dopravního značení.

Cena navrhovaných změn záporných	- 224 500,- Kč bez DPH.
Cena navrhovaných změn kladných	+ 760 157,06 Kč bez DPH.

Celková hodnota ZBV č. 01 je 535 657,06 Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle §5, odst. 1, písm. c), resp. podle §10 Směrnice R-SM_36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, upřesňující provádění změn zakázek dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle §222 se jedná o změnu nezbytnou.

TDS provedl kontrolu zhotovitelem předloženého znění ZBV č. 01 včetně všech jeho příloh a konstatuje :

- 1) Doklady ZBV č.01 jsou zpracovány dle Směrnice upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.
- 2) Soupis změn předložený zhotovitelem je Úplný a je zpracován správně.
- 3) Deklarovaná množství a výměry v soupisu změn odpovídají skutečnosti.
- 4) Způsob ocenění jednotlivých položek a doložení cen v oceněném soupisu změn je zpracováno v souladu s platným zněním Smlouvy o dílo.
- 5) Výpočty uvedené v jednotlivých tabulkách a listech příloh ZBV č.01 jsou provedeny správně.
- 6) Nový požadavek KSÚS Stř.kraje nebylo možno předvídat, jedná se o novou nepředvídatelnou okolnost.

Za TDS s navrženým ZBV č.01 **souhlasím.**

SHP TS s. r. o.

Šumavská 33, 602 00 Brno,
IČ: 28342771, DIČ: CZ 28342771

Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512

S pozdravem



Ing. Michal Pietsch

